

Principal	: Secretaria Estadual Extraordinária da Copa do Mundo – FIFA 2014
Relator	: Conselheiro Antônio Joaquim Rodrigues Neto
Assunto	: Relatório Extraordinário obras da Copa FIFA 2014 Situação em 30/06/2013

Excelentíssimo Conselheiro Relator.

Dentro das atribuições do controle externo simultâneo e em atendimento à determinação de V. Exa, apresenta-se Relatório Extraordinário sobre as obras necessárias para realização da Copa do Mundo FIFA 2014.

Este relatório abrange a análise do avanço físico de 27 contratos, no valor total de R\$ 2.307.587.658,47 e apresenta a situação em 30/06/2013.

## 1. O PPA e a LOA

O Plano Plurianual 2012-2015 do Estado de Mato Grosso estabelece três programas para atender às demandas específicas da Copa do Mundo 2014, que são apresentados no quadro a seguir.

	Programa	Objetivo Estratégico	Órgão Executor
325	Copa Verde	10- Expandir a atividade econômica com agregação de valor à produção local	SECOPA
336	Segurança na Copa	7. Reduzir a violência e a insegurança do cidadão	Secretaria de Estado de Segurança Pública
341	Implantação de Ações Estratégicas de Saúde para a Copa 2014	5. Ampliar a rede de atenção e vigilância em Saúde	Secretaria de Estado de Saúde

Um dos programas engloba as ações na área de segurança pública e outro na área de saúde e estão sendo executados pelas Secretarias afins. O programa Copa Verde que compete à Secopa abrange ações referentes à construção e adequação dos espaços para a realização do evento, como a Arena e todo o entorno, aos Centros de Treinamento, ao FanFest, às intervenções nos sistemas de transporte, à capacitação de pessoas, à publicidade e ao fomento a novos negócios.

O Programa Copa Verde é responsável por 98,67% dos recursos autorizados para a SECOPA na LOA 2013. O quadro a seguir apresenta os valores alocados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2013) e suas alterações referentes ao Programa Copa Verde. Destacou-se as sete ações referentes a obras e serviços de engenharia de maiores recursos orçamentários.



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO  
Secex de Obras e Serviços de Engenharia  
Telefone: 3613-7631/7632  
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

AÇÃO	PROGRAMA 325			
	PROGRAMA 325 - COPA VERDE	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado
5000	Estruturação da Arena Multiuso	212.060.894,26	16.821.546,96	228.882.441,22
5001	Implantação do Entorno da Arena Multiuso	121.474.354,12	-40.832.341,60	80.642.012,52
5002	Implantação de Centros Oficiais de Treinamento	50.000.000,00	4.392.969,27	54.392.969,27
5003	Organização FIFA FAN FEST	2.189.189,00	-1.934.459,40	254.729,60
5004	Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para a Copa 2014	132.099.168,48	166.904.830,92	299.003.999,40
5006	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana na Região	75.724.993,14	-2.000,00	75.722.993,14
5009	Publicidade, Promoção e Divulgação da Copa do Mundo FIFA 2014	15.243.532,00	-4.360.000,00	10.883.532,00
5021	Inserção de ações sustentáveis de Incentivo ao Esporte	364.865,00	56.875,19	421.740,19
5027	Portal de Comunicação da Copa	0,00	0,00	0,00
5032	Estímulo à Participação Voluntária de Grupos Org da Sociedade para Eventos Relacionados à Copa do Mundo	364.865,00	60.000,00	304.865,00
5036	Fomento às Atividades Lúdicas nas Escolas para o Fortalecimento do Espírito da Copa	364.865,00	0,00	364.865,00
5044	Fomento à Captação de Investimento Geração de Novos Negócios	364.865,00	-300.000,00	64.865,00
5070	Estímulo à Produção de Programas Especiais Sobre Mato Grosso	0,00	0,00	0,00
5074	Fomento a Articulação das Ações do Turismo para a Copa do Mundo FIFA 2014	729.730,00	-391.770,00	337.960,00
5076	Promoção de eventos Turísticos voltados para a Copa do Mundo	729.730,00	-720.730,00	9.000,00
5077	Mobilização de Fornecedores de Suprimento para Copa do Mundo FIFA 2014	364.865,00	-330.000,00	34.865,00
5079	Implantação do Selo da Copa	150.944,00	-92.764,19	58.179,81
5081	Fomento à Qualificação de Mão de Obra Especializada para o Receptivo Turístico da Copa do Mundo FIFA 2014	3.148.465,00	-2.108.979,59	1.039.485,41
5104	Implantação dos Projetos de sustentabilidade e gestão dos Legados Físicos	1.500.000,00	-1.373.026,82	126.973,18
5105	Revitalização de Áreas Urbanas	300.000,00	-300.000,00	0,00
5106	Elaboração de Estudo de Impacto dos Investimentos Públicos na Realização da Copa do Mundo FIFA 2014	117.600,00	58.800,00	176.400,00
5107	Gestão das Ações Interinstitucionais	72.973,00	0,00	72.973,00
5108	Gestão dos Legados Sociais	0,00	0,00	0,00
5109	Criação e Ampliação da Oferta de Acomodações de Atendimento da demanda para Copa do Mundo	72.973,00	1.630.000,00	1.702.973,00
5110	Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo	569.894.380,00	504.805.231,04	1.074.699.611,04
5111	Capacitação dos Servidores	218.919,00	0,00	218.919,00
5112	Implementação de Tecnologia de Informação da Comunicação - TIC	2.089.189,00	0,00	2.089.189,00
5887	Desenvolvimento de Planos de Segurança e de Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento das Exigências	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00
7015	Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e ao desenvolvimento Sustentável do Estado na Programação da Copa	1.105.000,00	1.042.500,00	2.147.500,00
7019	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação - SE-COPA	584.000,00	0,00	584.000,00
TOTAL		1.192.330.359,00	642.266.681,78	1.834.597.040,78

Destaca-se que as ações 5027 (Portal de Comunicação da Copa),

Tribunal de Contas de Mato Grosso

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo  
Cuiabá-MT - CEP 78049-915 – [www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)

5070 (Estímulo à produção de Programas Especiais sobre Mato Grosso) e 5108 (Gestão dos Legados Sociais) que constavam da LOA 2012 não contaram com recursos na LOA 2013.

O quadro a seguir apresenta os valores alocados para a SECOPA na LOA 2013, por fonte de recursos.

FONTE	LOA 2013				
		Dot Inicial	Alteração	Autorizado	% alteração
100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	44.476.778,00	44.476.778,00	-----
151	OPERAÇÕES DE CRÉDITO ADM DIRETA	966.889.000,00	437.490.222,00	1.404.379.222,00	45,25%
161	CONV COM OUTRA ESFERA DE GOV E ONGs FIRMADOS ADM DIRETA	130.597.172,00	84.991.492,76	215.588.664,76	65,08%
202	FETHAB, FUNDEIC E FUNDESMAT PARA FUNDO DA COPA DO MUNDO	131.648.397,00	0,00	131.648.397,00	0,00%
351	OPERAÇÕES DE CRÉDITO ADM DIRETA EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	34.290.525,44	34.290.525,44	-----
361	CONV COM OUTRA ESFERA DE GOV E ONGs FIRMADOS ADM DIRETA EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.913.337,24	28.913.337,24	-----
<b>TOTAL</b>		<b>1.229.134.569</b>	<b>630.162.355,44</b>	<b>1.859.296.924,44</b>	<b>51,27%</b>

## 2. Execução Orçamentária

### 2.1. Execução dos contratos

O quadro a seguir apresenta um resumo da situação dos contratos em 30/06/2013. Obteve-se o percentual executado comparando-se o valor executado acumulado constante da medição de junho/2013 com o valor contratual. O valor previsto foi obtido no cronograma físico e financeiro vigente para cada obra. O atraso em dias apontado é a defasagem entre a data de 30/06/2013 e a data no cronograma da obra em que o valor medido acumulado em 30/06/2013 deveria ser atingido. Esse atraso não reflete a complexidade da obra, onde alguns serviços estão em dia e outros apresentam diferentes graus de atraso. Gráficos com a

situação de cada tipo de serviço serão apresentados no item 2.2 para cada contrato.

Diversas obras sofreram alterações no planejamento inicialmente previsto, tornando-se necessário o adiamento da data de conclusão da obra em alguns casos. Esta revisão do planejamento é uma necessidade da gestão, pois as etapas a serem executadas são readequadas em um novo cronograma de modo a permitir um acompanhamento mais próximo da realidade a partir dali.

Ao indicar nova data de conclusão da obra assume-se um atraso, referido como atraso consolidado, que corresponde aos aditamentos de prazo e as paralizações oficializadas. Ressalta-se que havendo responsabilidade dos contratados pelos atrasos, poderão ser aplicadas penalidades aos mesmos. Nota-se que muitas obras apresentam atrasos consolidados significantes e em alguns contratos estes atrasos superam o prazo de execução inicialmente previsto da obra.

## OBRAS INICIADAS - (27 unidades)

	Contrato	Descrição da Obra	Valor Contratado (R\$)	Valor executado última medição (R\$)	% executado	Valor previsto até 30/06/13 (R\$)	% previsto	Atraso em dias
1.	019/2011	Duplicação da Avenida Vereador Juliano Costa Marques, com extensão de 3.120 metros, compreendidos entre entr. Av. Historiador Rubens de Mendonça – Entr. Av. Jurumirim/Av. Dos Trabalhadores.	2.907.596,83	2.002.123,74	68,86%	2.498.683,05	100,00%	0
2.	09/2010	Construção da Arena Multiuso, o 'Novo Verdão', em Cuiabá/MT.	420.113.185,74	337.184.123,33	80,26%	361.722.488,67	86,10%	30 a 60
3.	09/2012	Construção Ponte em Concreto Armado sobre o rio Coxipó, do entroncamento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da Avenida Arquimedes Pereira de Lima, no Bairro Jd. Das Palmeiras, com 130,00 metros de extensão, no Município de Cuiabá-MT.	3.992.308,88	3.992.308,88	100,00%	3.992.308,88	100,00%	0
4.	014/2012	Construção, Duplicação e Reforço de Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Pari com 56,00 e 54,55m de extensão, localizada na Estrada da Guarita, nos Bairros Guarita I e II, no Município de Várzea Grande/MT.	2.907.808,21	2.907.808,21	100,00%	2.907.808,21	100,00%	0
5.	020/2012	Execução da Obra de Duplicação da Estrada da Guarita, trecho compreendido entre o entroncamento com a Avenida Ulisses Pompeu de Campos e Passagem da Conceição, totalizando 8.472,39 metros de extensão, localizado nos Bairros Guarita I e II, município Várzea Grande-MT.	27.381.516,17	14.106.475,82	51,52%	17.819.801,46	65,08%	60 a 90
6.	023/2012	"Trincheira Jurumirim" Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela Vista no Jardim Leblon– Entr. Av. Marechal Deodoro), extensão 2,40 km.	46.673.356,27	22.638.485,68	48,50%	42.336.069,83	90,71%	180 a 210
7.	024/2012	Pavimentação da Avenida Camburiu/ rua cabeceiras, trecho urbano, totalizando 1.136,50 metros de extensão, no Município de Cuiabá-MT.	2.083.859,61	1.957.508,06	93,94%	2.083.859,61	100,00%	286
8.	025/2012	Prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima, totalizando 1.235,32 metros de extensão, localizado no Bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Cuiabá-MT".	1.963.292,28	1.916.766,31	97,63%	1.963.292,28	100,00%	47
9.	032/2012	"Viaduto do Despraiado" Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT,	18.974.928,43	14.827.322,81	78,14%	16.009.203,91	84,37%	30 a 60

Contrato	Descrição da Obra	Valor Contratado (R\$)	Valor executado última medição (R\$)	% executado	Valor previsto até 30/06/13 (R\$)	% previsto	Atraso em dias
	Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Av. Marechal Deodoro – Entr. Centro de Eventos do Pantanal), extensão 1,80 km.						
10. 037/2012	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, arquitetura e sistemas ferroviários para a elaboração dos projetos básicos, executivos e as “built”, realização das obras, obtenção das licenças ambientais e fornecimento e montagem de sistemas e material rodante para implantação dos corredores estruturais de transporte coletivo na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC.	1.477.617.277,15	524.237.988,03	35,48%	936.740.393,87	63,40%	180 a 210
11. 038/2012	Implantação da Ligação da Avenida Beira Rio à Rua Antônio Dorileo, trecho compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antônio Dorileo, totalizando 2.551,67 metros de extensão.	7.884.001,60	4.646.831,57	58,94%	5.662.759,50	71,83%	0 a 30
12. 039/2012	Ponte de Concreto Pré-Moldado sobre o Rio Coxipó, trecho compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antônio Dorileo, com 155,00 metros de extensão e 12,80 metros de largura.	5.839.896,06	5.839.896,06	100,00%	5.839.896,06	100,00%	0
13. 040/2012	Pavimentação de Ruas Diversas no Entorno da Arena Pantanal, trecho compreendido entre a Rua Begônias (Entr. Rua das Tulipas - Entr. Av. das Flores /Entr. Rua das Violetas - Entr. Av. 8 de Abril). Rua dos Crisântemos (Entr. Rua das Begônias - Entr. Ruas das Camélias). Rua Onze de Maio (Entr. Rua A - Entr. Av. Miguel Sutil ), Rua das Papoulas (Entre. Rua das Begônias - Entr. Rua das Margaridas). Av. Dom Carlos L. D’amour (Entr. Av. Agrícola Paes de Barros - Entr. Av. Ciríaco Candia), Rua das Almas ( Entr. Av. Miguel Sutil - Entr. Rua da Fé ) e Rua da Caridade (Entr. Av. Miguel sutil - Entr. Rua da Fé), totalizando 2.231,99 metros.	2.810.777,29	554.810,47	19,74%	732.763,54	26,07%	0 a 30
14. 042/2012	Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Trecho : Divisa MS/MT – Divisa MT/PA, Subtrecho 01: Entr. MT-407 (Rod. Imigrantes) – Acesso Tijucal (Contorno de Cuiabá), extensão 2,90 km; Subtrecho 02: Entr. Av. Miguel Sutil (Areão) - Entr. Rua Bela Vista (Jardim Leblon), extensão 1,00 km. Complexo Viário do Tijucal-	30.141.135,71	11.771.601,31	39,05%	24.454.822,84	81,13%	90 a 120

	Contrato	Descrição da Obra	Valor Contratado (R\$)	Valor executado última medição (R\$)	% executado	Valor previsto até 30/06/13 (R\$)	% previsto	Atraso em dias
		Areão.						
15.	049/2012	Construção do viaduto Entr. MT050B/351B – Entr. Av. da FEB com Av. Dom Orlando Chaves, extensão 2,90 km.	16.723.705,93	6.021.359,49	36,00%	12.463.071,18	74,52%	90 a 120
16.	055/2012	Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, em Várzea Grande – MT, com área total de 52.170,00m <sup>2</sup> , contemplando fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto.	25.535.184,42	2.867.541,23	11,23%	17.430.423,81	68,26%	210 a 240
17.	056/2012	Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Reforma e readequação do complexo de atletismo e drenagem de águas pluviais no Campus da UFMT, no Município de Cuiabá-MT.	201.237,75	201.237,75	100,00%	201.237,75	100,00%	0
18.	060/2012	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Restauração de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Município de Cuiabá-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo Pereira, General Rabelo, das Orquídeas, das Violetas, dos Girassóis, Cuiabá, São Sebastião, Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço, Dom Bosco, Crisântemos, Tulipas, Agrícola Paes de Barro	10.168.145,03	1.361.303,506	13,39%	8.874.368,55	87,28%	150 a 180
19.	063/2012	Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Restauração do Córrego Mané Pinto, Restauração da Av. Oito de Abril e Implantação do Coletor Tronco – Emissários da Sub-bacia 16 e 17, com uma extensão de 3.167,00 m no Município de Cuiabá-MT	19.849.814,45	1.453.750,40	7,32%	17.656.517,97	88,95%	150 a 180
20.	065/2012	Contratação de empresa para realização de obras e serviços de engenharia relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon.	77.289.283,09	10.058.942,75	13,01%	33.355.075,18	43,16%	90 a 120
21.	04/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Implantação e Duplicação da Avenida Parque do Barbado, do Entr. Avenida Arquimedes P. Lima – Entr. Avenida Fernando Corrêa da Costa, com uma extensão de 1.644,77 m no município de	23.034.586,02	-	-	9.640.5930	41,85%	60

	Contrato	Descrição da Obra	Valor Contratado (R\$)	Valor executado última medição (R\$)	% executado	Valor previsto até 30/06/13 (R\$)	% previsto	Atraso em dias
		Cuiabá-MT.						
22.	08/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra denominada restauração e duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima, com extensão de aproximadamente 4,42 km contemplando a duplicação e alargamentos das pontes sobre o córrego do moinho e Rio Coxipó, com extensão de 44m e 84m no município de Cuiabá-MT.	23.696.504,41	4.150.062,43	17,51%	2.803.753,35	11,83%	0
23.	13/2013	Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treinamento da UFMT, no município de Cuiabá – MT, com área total construída de 5.438,06 m <sup>2</sup> , contemplando fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto.	15.860.605,12	676.623,33	4,27%	2.316.693,74	14,61%	60 a 90
24.	15/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da Reforma de Quadra Poliestportiva totalizando 1.082,30 m <sup>2</sup> , localizada na Rua José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés), nº 510, SECOPA – Duque de Caxias, no Município de Cuiabá-MT.	147.835,64	147.835,64	100,00%	147.835,64	100,00%	0
25.	17/2013	“Trincheira Santa Rosa”. Rodovia BR-163/364/070/MT; Trecho Divisa MS/MT - Divisa MT/PA; Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do Pantanal – Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha); Segmento Km 331,4 – 339,20 (7,8 Km); extensão 2,48 km; Código do PNV: Código do PNV - 163BMT0710 -163BMT0715 / 364BMT0795–364BMT0800 / 070BMT0470–070BMT0490; Natureza dos serviços: Obra de Arte Especial;	22.992.469,43	2.998.534,55	13,04%	6.296.604,6	27,39%	0 a 30
26.	18/2013	“Trincheira Santa Isabel”. RODOVIA – BR-163/364/070/MT; TRECHO – Divisa MS/MT – Divisa MT/PA; SUBTRECHO – Av. Miguel Sutil (Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha – Entr. Rod. Mário Andreazza MT-444); SEGMENTO – (KM 331,4 – KM 3339,20 = 7,80 KM); EXTENSÃO - 2,32 km; CÓDIGO DO PNV - 163BMT0710 - 163BMT0715 / 364BMT0795–364BMT0800 / 070BMT0470 –070BMT0490; NATUREZA DOS SERVIÇOS – Obra de Arte Especial.	19.103.344,35	2.854.615,51	14,94%	5.499.319,1	28,79%	30 a 60

	Contrato	Descrição da Obra	Valor Contratado (R\$)	Valor executado última medição (R\$)	% executado	Valor previsto até 30/06/13 (R\$)	% previsto	Atraso em dias
27.	19/2013	“Trincheira Mário Andreazza”. RODOVIA – BR-163/364/070/MT; TRECHO – Divisa MS/MT – Divisa MT/PA; SUBTRECHO – Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do Pantanal – Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha); SEGMENTO – (KM 331,4 – KM 3339,20 = 7,80 KM); EXTENSÃO - 2,48 km; CÓDIGO DO PNV - 163BMT0710 -163BMT0715 / 364BMT0795 –364BMT0800 / 070BMT0470 – 070BMT0490; NATUREZA DOS SERVIÇOS – Obra de Arte Especial;	1.694.002,60	933.524,52	55,11%	1.107.403,72	65,37%	0 a 30
		<b>TOTAL</b>	<b>2.307.587.658,47</b>	<b>982.309.381,39</b>	<b>42,57%</b>	<b>1.629.322.386,30</b>	<b>70,61%</b>	
		<b>TOTAL SEM OBRA DO VLT</b>	<b>829.970.381,32</b>	<b>458.071.393,36</b>	<b>55,19%</b>	<b>692.581.992,43</b>	<b>83,45%</b>	

## ATRASO CONSOLIDADO DAS OBRAS EM ANDAMENTO

	Contrato	Descrição da Obra	Prazo de execução inicial (dias)	Previsão de conclusão inicial	Previsão de conclusão pós-aditivo	Atraso consolidado (dias)
1.	019/2011	Duplicação da Avenida Vereador Juliano Costa Marques, com extensão de 3.120 metros, compreendidos entre entr. Av. Historiador Rubens de Mendonça – Entr. Av. Jurumirim/Av. Dos Trabalhadores.	240	28/03/2012	15/02/2013	324
2.	009/2010	Construção da Arena Multiuso, o 'Novo Verdão', em Cuiabá/MT.	960	05/12/2012	31/10/2013	330
3.	009/2012	Construção Ponte em Concreto Armado sobre o rio Coxipó, do entroncamento da Rua dos Eucaliptos ao entroncamento da Avenida Arquimedes Pereira de Lima, no Bairro Jd. Das Palmeiras, com 130,00 metros de extensão, no Município de Cuiabá-MT.	180	02/09/2012	21/01/2013 (a)	141
4.	014/2012	Construção, Duplicação e Reforço de Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Pari com 56,00 e 54,55m de extensão, localizada na Estrada da Guarita, nos Bairros Guarita I e II, no Município de Várzea Grande/MT.	180	19/09/2012	15/02/2013 (a)	149
5.	020/2012	Execução da Obra de Duplicação da Estrada da Guarita, trecho compreendido entre o entroncamento com a Avenida Ulisses Pompeu de Campos e Passagem da Conceição, totalizando 8.472,39 metros de extensão, localizado nos Bairros Guarita I e II, município Várzea Grande-MT.	300	17/01/2013	12/11/2013	299
6.	023/2012	"Trincheira Jurumirim" Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela Vista no Jardim Leblon-Entr. Av. Marechal Deodoro), extensão 2,40 km.	360	05/04/2013	02/10/2013	180
7.	024/2012	Pavimentação da Avenida Camburiu/ rua cabeceiras, trecho urbano, totalizando 1.136,50 metros de extensão, no Município de Cuiabá-MT.	150	20/09/2012	28/02/2013	161
8.	025/2012	Prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima, totalizando 1.235,32 metros de extensão, localizado no Bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Cuiabá-MT".	150	30/09/2012	14/05/2013	226
9.	032/2012	"Viaduto do Despraído" Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Av. Marechal Deodoro – Entr. Centro de Eventos do Pantanal), extensão 1,80 km.	360	27/05/2013	24/09/2013	120
10.	037/2012	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, arquitetura e sistemas ferroviários para a elaboração dos projetos básicos, executivos e as "built", realização das obras, obtenção das licenças ambientais e fornecimento e montagem de sistemas e material rodante para implantação dos corredores estruturais de transporte coletivo na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC.	630	13/03/2014	-	-
11.	038/2012	Implantação da Ligação da Avenida Beira Rio à Rua Antônio Dorileo, trecho compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antônio Dorileo, totalizando 2.551,67 metros de extensão.	180	29/12/2012	31/08/2013	245
12.	039/2012	Ponte de Concreto Pré-Moldado sobre o Rio Coxipó, trecho compreendido entre a Avenida beira e a Rua Antônio Dorileo, com 155,00 metros de extensão e 12,80 metros de largura.	180	25/12/2012	03/07/2013	190
13.	040/2012	Pavimentação de Ruas Diversas no Entorno da Arena Pantanal, trecho compreendido entre a Rua Begônias (Entr. Rua das Tulipas - Entr. Av. das Flores /Entr. Rua das Violetas - Entr. Av. 8 de Abril). Rua dos Crisântemos (Entr. Rua das	120	30/10/2012	19/09/13	324



		Begônias - Entr. Ruas das Camélias). Rua Onze de Maio (Entr. Rua A - Entr. Av. Miguel Sutil ), Rua das Papoulas (Entre. Rua das Begônias - Entr. Rua das Margaridas). Av. Dom Carlos L. D'amour (Entr. Av. Agrícola Paes de Barros - Entr. Av. Ciriaco Candia), Rua das Almas ( Entr. Av. Miguel Sutil - Entr. Rua da Fé ) e Rua da Caridade (Entr. Av. Miguel sutil - Entr. Rua da Fé), totalizando 2.231,99 metros.				
14.	042/2012	Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Trecho : Divisa MS/MT – Divisa MT/PA, Subtrecho 01: Entr. MT-407 (Rod. Imigrantes) – Acesso Tijucal (Contorno de Cuiabá), extensão 2,90 km; Subtrecho 02: Entr. Av. Miguel Sutil (Areão) - Entr. Rua Bela Vista (Jardim Leblon), extensão 1,00 km. Complexo Viário do Tijucal- Areão.	540	21/01/2014	-	-
15.	049/2012	Construção do viaduto Entr. MT050B/351B – Entr. Av. da FEB com Av. Dom Orlando Chaves, extensão 2,90 km.	360	22/09/2013	-	-
16.	055/2012	Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, em Várzea Grande – MT, com área total de 52.170,00m <sup>2</sup> , contemplando fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto.	360	10/10/2013	-	-
17.	056/2012	Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Reforma e readequação do complexo de atletismo e drenagem de águas pluviais no Campus da UFMT, no Município de Cuiabá-MT.	60	14/12/2012	20/01/2013 (a)	37
18.	060/2012	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Restauração de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Município de Cuiabá-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo Pereira, General Rabelo, das Orquídeas, das Violetas, dos Girassóis, Cuiabá, São Sebastião, Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço, Dom Bosco, Crisântemos, Tulipas, Agrícola Paes de Barro	240	11/07/2013	-	-
19.	063/2012	Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Restauração do Córrego Mané Pinto, Restauração da Av. Oito de Abril e Implantação do Coletor Tronco – Emissários da Sub-bacia 16 e 17, com uma extensão de 3.167,00 m no Município de Cuiabá-MT	240	24/07/2013	-	-
20.	065/2012	Contratação de empresa para realização de obras e serviços de engenharia relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon.	450	08/03/2014	-	-
21.	004/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Implantação e Duplicação da Avenida Parque do Barbado, do Entr. Avenida Arquimedes P. Lima – Entr. Avenida Fernando Corrêa da Costa, com uma extensão de 1.644,77 m no município de Cuiabá-MT.	180	21/10/2013	-	-
22.	008/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra denominada restauração e duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima, com extensão de aproximadamente 4,42 km contemplando a duplicação e alargamentos das pontes sobre o córrego do moinho e Rio Coxipó, com extensão de 44m e 84m no município de Cuiabá-MT.	360	12/04/2014	-	-
23.	013/2013	Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treinamento da UFMT, no município de Cuiabá – MT, com área total construída de 5.438,06 m <sup>2</sup> , contemplando fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto.	300	29/12/2013	-	-

24.	015/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da Reforma de Quadra Poliesportiva totalizando 1.8082,3 m <sup>2</sup> , localizada na Rua José Monteiro Figueiredo (Lava Pés), nº 510, SECOPA – Duque de Caxias, no Município de Cuiabá - MT	90	08/07/2013	-	-
25.	017/2013	“Trincheira Santa Rosa”. Rodovia BR-163/364/070/MT; Trecho Divisa MS/MT - Divisa MT/PA; Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do Pantanal – Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha); Segmento Km 331,4 – 339,20 (7,8 Km); extensão 2,48 km; Código do PNV: Código do PNV - 163BMT0710 -163BMT0715 / 364BMT0795–364BMT0800 / 070BMT0470–070BMT0490; Natureza dos serviços: Obra de Arte Especial;	240	19/12/13	-	-
26.	018/2013	“Trincheira Santa Isabel”. RODOVIA – BR-163/364/070/MT; TRECHO – Divisa MS/MT – Divisa MT/PA; SUBTRECHO – Av. Miguel Sutil (Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha – Entr. Rod. Mário Andreazza MT-444); SEGMENTO – (KM 331,4 – KM 3339,20 = 7,80 KM); EXTENSÃO - 2,32 km; CÓDIGO DO PNV - 163BMT0710 - 163BMT0715 / 364BMT0795–364BMT0800 / 070BMT0470 –070BMT0490; NATUREZA DOS SERVIÇOS – Obra de Arte Especial.	240	20/12/13	-	-
27.	019/2013	“Trincheira Mário Andreazza”. RODOVIA – BR-163/364/070/MT; TRECHO – Divisa MS/MT – Divisa MT/PA; SUBTRECHO – Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do Pantanal – Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha); SEGMENTO – (KM 331,4 – KM 3339,20 = 7,80 KM); EXTENSÃO - 2,48 km; CÓDIGO DO PNV - 163BMT0710 -163BMT0715 / 364BMT0795 –364BMT0800 / 070BMT0470 – 070BMT0490; NATUREZA DOS SERVIÇOS – Obra de Arte Especial;	90	23/07/2013	-	-

(a) Data da medição final

**Da análise destes quadros destaca-se:**

- a. No relatório extraordinário que refletia a situação das obras em 31/12/2012 foram apontados atrasos na obra da Arena e solicitado da Secopa que apresentasse plano de ação para que a obra fosse concluída no prazo. A Secopa encaminhou plano de providências que apontava, entre outras coisas a necessidade de se atacar um caminho crítico que compreendia a execução das estruturas metálicas até abril/2013 para então se realizar os trabalhos no campo que iriam até outubro/2013. A estrutura metálica que, no caminho crítico deveria estar concluída no final de abril/2013, apresenta-se 86,74% executada. Portanto, apesar do incremento no ritmo dos serviços, os serviços referentes ao caminho crítico estão atrasados.
- b. Algumas obras apresentam Medição Final e aguardam a emissão dos Termos de Recebimento .
- c. Das 27 obras acompanhadas, 20 apresentaram atrasos.
- d. Das sete obras acompanhadas que não apresentaram atrasos, seis possuem

medição final e uma está sendo executada.

- e. Das seis obras que possuem medição final, cinco tiveram seus atrasos consolidados.
- f. Portanto, das 27 obras acompanhadas, duas estão dentro do inicialmente planejado: uma com medição final e outra em execução.
- g. O número elevado de obras que tiveram seus atrasos consolidados indica que o planejamento inicial foi deficiente e já sofreu ajustes.
- h. O número elevado de obras que apresenta atrasos na execução indica que a fiscalização precisa estabelecer planos de recuperação dos atrasos, definindo as causas e corrigindo os problemas.
- i. Constatou-se a execução de 42,57% dos contratos em andamento, restando 57,43% a executar. Excluindo-se a implantação do VLT, o percentual executado corresponde a 55,19%.

## 2.2. Situação dos Contratos com obras em andamento

### 2.2.1. Contrato nº 09/2010

#### **ARENA MULTIUSO “NOVO VERDÃO”**

Obra	Prestação de Serviços de Engenharia para execução completa e perfeita dos serviços de Construção da Arena Multiuso, o ‘Novo Verdão’, em Cuiabá/MT.
Contrato	09/2010
Contratada	MENDES JUNIOR
Assinatura	20/04/2010
Valor	R\$ 343.630.404,03 R\$ 342.060.007,96 (TCE)
Prazo	960 (novecentos e sessenta) dias.
1º Aditivo	Adita-se o valor contratual com supressão de R\$ 28.368,00 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais).
2º Aditivo	Adita-se o valor contratual com o acréscimo de R\$ 1.229.307,00 (Hum milhão, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e sete reais).
3º Aditivo	Adita-se o valor contratual com supressão de R\$ 2.282.682,32 (Dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) e acréscimo de R\$ 14.343.063,75 (Catorze milhões, trezentos e quarenta e três mil, sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), totalizando ao aditivo contratual de R\$ 12.060.381,43 (Doze milhões, sessenta mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e três

	centavos).
4º Aditivo	Aditar modificações nas medições. Acréscimo de R\$ 4.135.713,55
5º Aditivo	Em virtude da extinção da AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO FIFA BRASIL – 2014 – AGE COPA, o presente termo aditivo tem por finalidade alterar o contratante e o CNPJ para adequar os novos dados à SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014.
6º Aditivo	O valor do contrato fica deduzido de R\$ 15.826.637,91 (quinze milhões oitocentos e vinte seis mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), consoante com o cronograma físico-financeiro revisado.
7º Aditivo	Prazo: aditaram-se 330 (trezentos e trinta) dias ao prazo conclusão inicial, passando a ser 1.290 (um mil, duzentos e noventa) dias consecutivos, e aditaram-se 330 (trezentos e trinta) dias ao prazo de vigência, que passou para 1.470 (um mil, quatrocentos e setenta) dias consecutivos. Valor: R\$ 60.656.143,80, passando o contrato para R\$ 420.113.185,74
8º Aditivo	O CONSÓRCIO transfere sua posição no contrato à MENDES JUNIOR, de forma que a MENDES JUNIOR passa a figurar como CONTRATADA no âmbito do contrato.
<b>Valor atual</b>	<b>R\$ 420.113.185,74</b>
Ordem Serviço	20/04/2010
Conclusão	31/10/13
Fiscal :João Paulo Curvo Borges	

**Tabela I**

38ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 420.113.185,74</b>	<b>R\$ 337.184.123,33</b>	<b>R\$ 82.929.062,41</b>	<b>80,26%</b>

**Tabela II**

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executa-do	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	2.888.677,79	2.653.515,01	91,86%	2.653.539,42	91,86%
2.0	Demolições	5.896.940,42	5.764.417,34	97,75%	5.896.940,42	100,00%
3.0	Administração local	18.893.623,98	17.048.166,77	90,23%	17.047.716,92	90,23%
4.0	Movimento de terra	9.764.444,31	9.123.096,10	93,43%	8.566.346,99	87,73%
5.0	Pavimentação	11.421.496,09	760.744,85	6,66%	4.911.243,32	43,00%
6.0	Drenagem	5.558.927,75	3.738.372,21	67,25%	5.558.927,75	100,00%
7.0	Elementos de contenção	1.363.125,81	1.123.039,23	82,39%	1.363.125,81	100,00%
8.0	Elementos de fundação	34.444.062,06	34.438.803,97	99,98%	34.444.062,06	100,00%
9.0	Estrutura de concreto	69.319.615,82	69.267.090,08	99,92%	69.319.615,82	100,00%
10.0	Estrutura metálica	122.418.957,95	106.184.249,76	86,74%	122.418.957,95	100,00%
11.0	Instalações	75.191.480,83	51.438.826,47	68,41%	49.212.824,20	65,45%
12.0	Locação de Equipamentos	2.962.263,52	2.962.263,52	100,00%	2.962.263,52	100,00%


13.0	Acabamentos	53.823.995,74	28.171.778,03	52,34%	31.487.037,51	58,50%
14.0	Campo	1.045.705,30	0,00	0,00%	760.018,61	72,68%
15.0	Drenagem do lençol freático	1.815.452,02	1.815.452,02	100,00%	1.815.452,02	100,00%
16.0	Colchão Reno	841.932,58	841.932,57	100,00%	841.932,58	100,00%
17.0	Sustentabilidade	2.462.483,77	1.852.375,40	75,22%	2.462.483,77	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>420.113.185,74</b>	<b>337.184.123,33</b>	<b>80,26%</b>	<b>361.722.488,67</b>	<b>86,10%</b>

**Tabela III**


Medição	Valor (R\$)
<b>Total</b>	<b>347.664.686,83</b>

O valor acumulado atual que consta na 38ª medição, R\$ 337.184.123,33 (Tabela II), diverge do somatório das 38 medições, R\$ 347.664.686,83 (Tabela III).

#### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

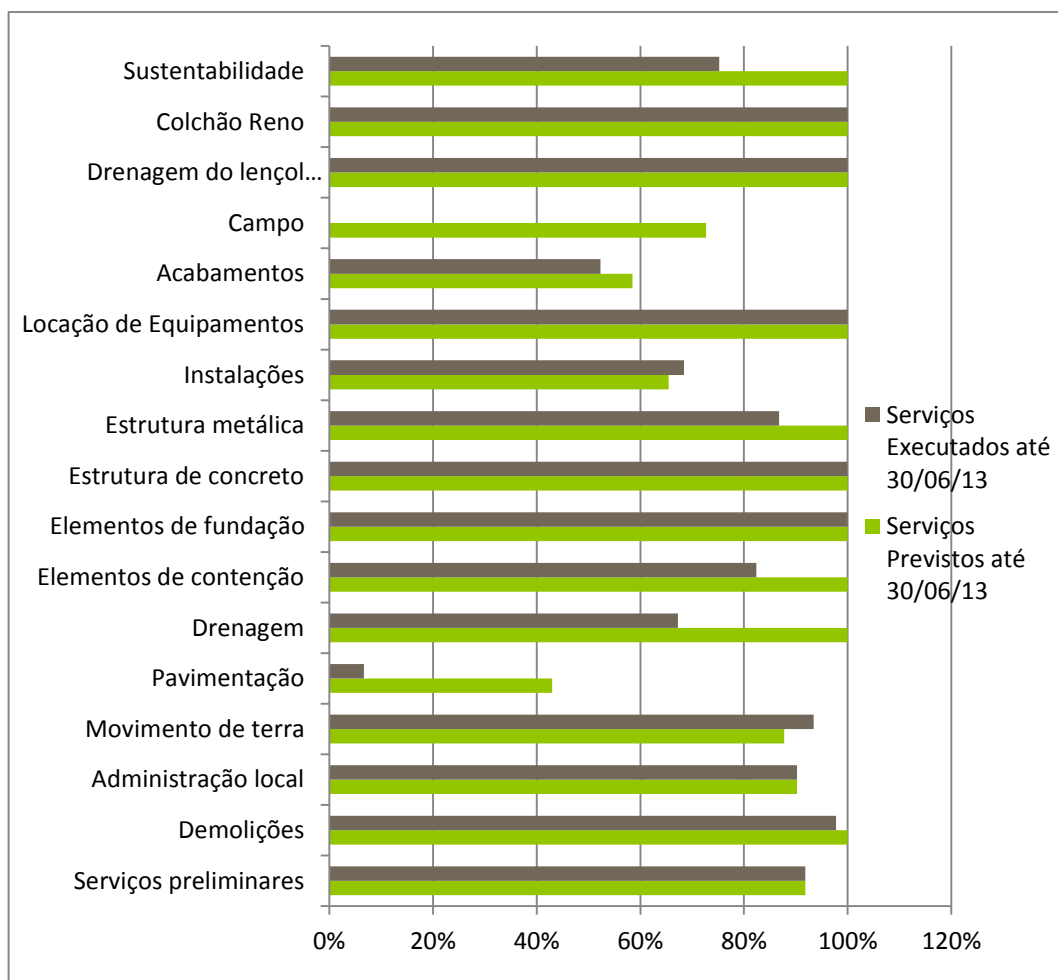

## DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (ARENA MULTIUSO “NOVO VERDÃO”)

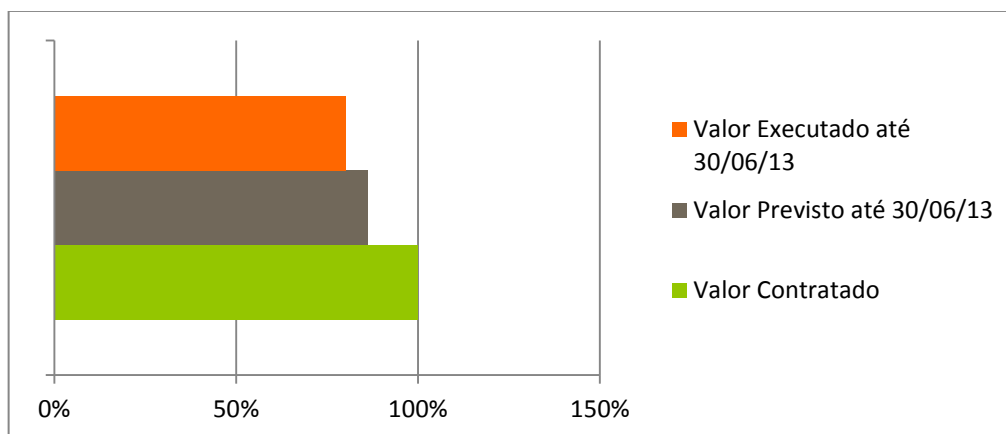

## OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA READEQUADO

### 2.2.2. Contrato nº 20/2012

#### DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DA GUARITA

Obra	Execução da Obra de Duplicação da Estrada da Guarita, trecho compreendido entre o entroncamento com a Avenida Ulisses Pompeu de Campos e Passagem da Conceição, totalizando 8.472,39 metros de extensão, localizado nos Bairros Guarita I e II, município Várzea Grande-MT.
Contrato	020/2012
Contratada	AGRIMAT ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Assinatura	23/03/12
Valor	R\$ 29.220.521,04
Valor atual	<b>R\$ 27.381.516,17</b>
Prazo execução	300 (trezentos) dias consecutivos.
Prazo vigência	420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos.
1º Aditivo	300 (trezentos) dias consecutivos.
Ordem Serviço	23/03/12
Início	23/03/12
Conclusão	<b>12/11/13</b>
Fiscal	André Luiz Costa Ferreira

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2012	
Objeto	Aditar o prazo de execução e vigênciado Contrato nº 020/2012.
Alteração	Aditam-se os prazos de execução e vigência em 300 (trezentos) dias.
Assinatura	17/01/13
Publicação	31/01/13
Prazo Execução	<b>12/11/13</b>
Prazo Vigência	13/03/14

SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2012	
Objeto	Fica suprimido o valor de R\$ 1.839.004,87, passando o contrato para o valor de R\$ 27.381.516,17.
Assinatura	16/04/13
Publicação	16/04/13
Prazo Execução	<b>12/11/13</b>
Prazo Vigência	13/03/14

**Tabela I**

16ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 27.381.516,17</b>	<b>R\$ 14.106.475,82</b>	<b>R\$ 13.275.040,35</b>	<b>51,52%</b>

**Tabela II**


Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	326.463,25	45.073,05	13,81%	326.463,25	100,00%
2.0	Terraplenagem	7.331.493,87	6.347.612,92	86,58%	7.331.493,87	100,00%
3.0	Pavimentação	6.756.749,78	2.304.790,19	34,11%	3.448.645,09	51,04%
4.0	Drenagem	8.746.855,78	4.935.367,01	56,42%	5.966.230,33	68,21%
5.0	Sinalização	325.389,30	0,00	0,00%	102.009,55	31,35%
6.0	Obras Complementares	2.191.503,12	473.633,17	21,61%	644.959,37	29,43%
7.0	Proteção ao meio ambiente	1.703.061,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>27.381.516,17</b>	<b>14.106.476,34</b>	<b>51,52%</b>	<b>17.819.801,46</b>	<b>65,08%</b>

**Tabela III**


Medição	Valor (R\$)
1ª	18.863,10
2ª	1.160.040,02
3ª	574.841,71
4ª	502.958,32

5 <sup>a</sup>	583.550,74
6 <sup>a</sup>	344.622,34
7 <sup>a</sup>	1.393.262,53
8 <sup>a</sup>	2.112.080,04
9 <sup>a</sup>	363.027,57
10 <sup>a</sup>	228.777,11
11 <sup>a</sup>	368.661,73
12 <sup>a</sup>	1.431.630,66
13 <sup>a</sup>	192.408,91
14 <sup>a</sup>	306.096,95
15 <sup>a</sup>	2.701.302,31
16 <sup>a</sup>	1.824.351,78
<b>Total</b>	<b>14.106.475,82</b>

#### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

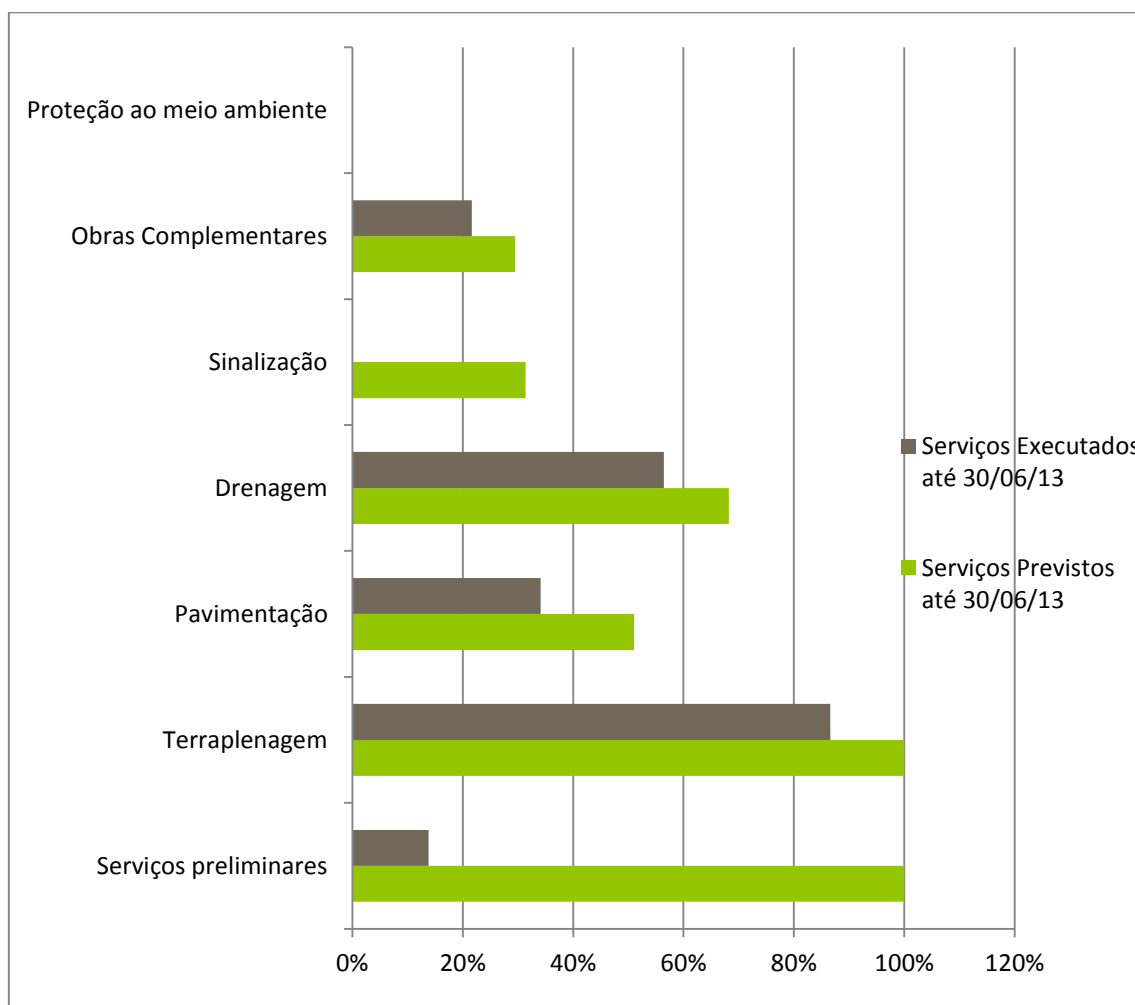

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (DUPLICAÇÃO ESTRADA DA GUARITA)**

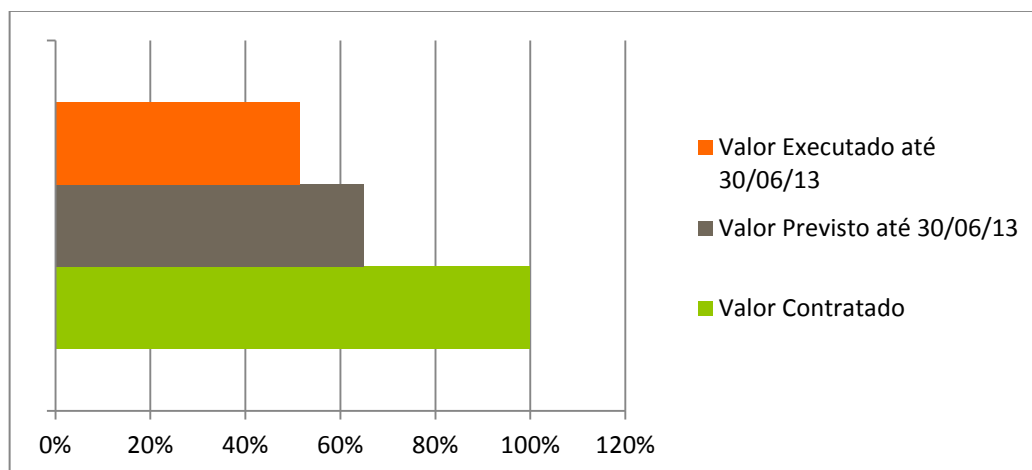

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA READEQUADO**

2.2.3. Contrato nº 23/2012

**TRINCHEIRA TRABALHADORES– JURUMIRIM**

Obra	<b>LOTE 01 - Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Rua Bela Vista no Jardim Leblon– Entr. Av. Marechal Deodoro), extensão 2,40 km. <b>Trincheira Trabalhadores Jurumirim</b></b>
Contrato	023/2012
Contratada	CONSÓRCIO SOBELLTAR-SECOPA
Assinatura	29/03/2012
Valor	R\$ 39.345.540,47
Prazo execução	360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos.
Aditivo	180 (cento e oitenta) dias consecutivos
Ordem Serviço	10/04/12
Início	10/04/12
Conclusão	<b>02/10/13</b>
Fiscal:	Tássio de Souza Rodrigues

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2012	
Objeto	Aditar prazo e valor ao Contrato nº 023/2012. Fica acrescido o valor de R\$ 7.327.815,80, passando o valor contratual para R\$ 46.673.356,27. Ficam acrescidos 180 (cento e oitenta) dias ao prazo de conclusão e vigência do contrato.
Assinatura	22/03/13
Publicação	15/05/13
Prazo Execução	<b>02/10/13</b>
Prazo Vigência	19/11/13

**Tabela I**

15ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual aditado	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 46.673.356,27</b>	<b>R\$ 22.638.485,68</b>	<b>R\$ 24.034.870,59</b>	<b>48,50%</b>

**Tabela II**


Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% execu- tado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	1.411.331,84	883.874,33	62,63%	1.326.651,93	94,00%
2.0	Terraplenagem	972.036,90	41.294,93	4,25%	923.435,06	95,00%
3.0	Pavimentação	5.138.992,30	444.884,50	8,66%	4.111.193,84	80,00%
4.0	Drenagem	3.548.752,26	1.376.290,98	38,78%	3.105.158,23	87,50%
5.0	Sinalização	213.249,67	0,00	0,00%	42.649,93	20,00%
6.0	Obras Complementares	420.811,53	38.282,71	9,10%	336.649,22	80,00%
7.0	Obras de Artes Especiais	34.837.410,34	19.853.858,23	56,99%	32.398.791,62	93,00%
8.0	Proteção ao meio ambiente	130.771,43	0,00	0,00%	91.540,00	70,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>46.673.356,27</b>	<b>22.638.485,68</b>	<b>48,50%</b>	<b>42.336.069,83</b>	<b>90,71%</b>

**Tabela III**

Medição	Valor (R\$)
1ª	69.514,51
2ª	659.267,33
3ª	1.919.460,55
4ª	664.622,04
5ª	1.450.592,90
6ª	937.849,45
7ª	1.401.061,63
8ª	911.688,97


9 <sup>a</sup>	1.259.249,17
10 <sup>a</sup>	572.034,65
11 <sup>a</sup>	2.237.087,34
12 <sup>a</sup>	2.043.217,98
13 <sup>a</sup>	2.349.111,79
14 <sup>a</sup>	2.493.549,35
15 <sup>a</sup>	3.670.660,70
<b>Total</b>	<b>22.638.968,36</b>

### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

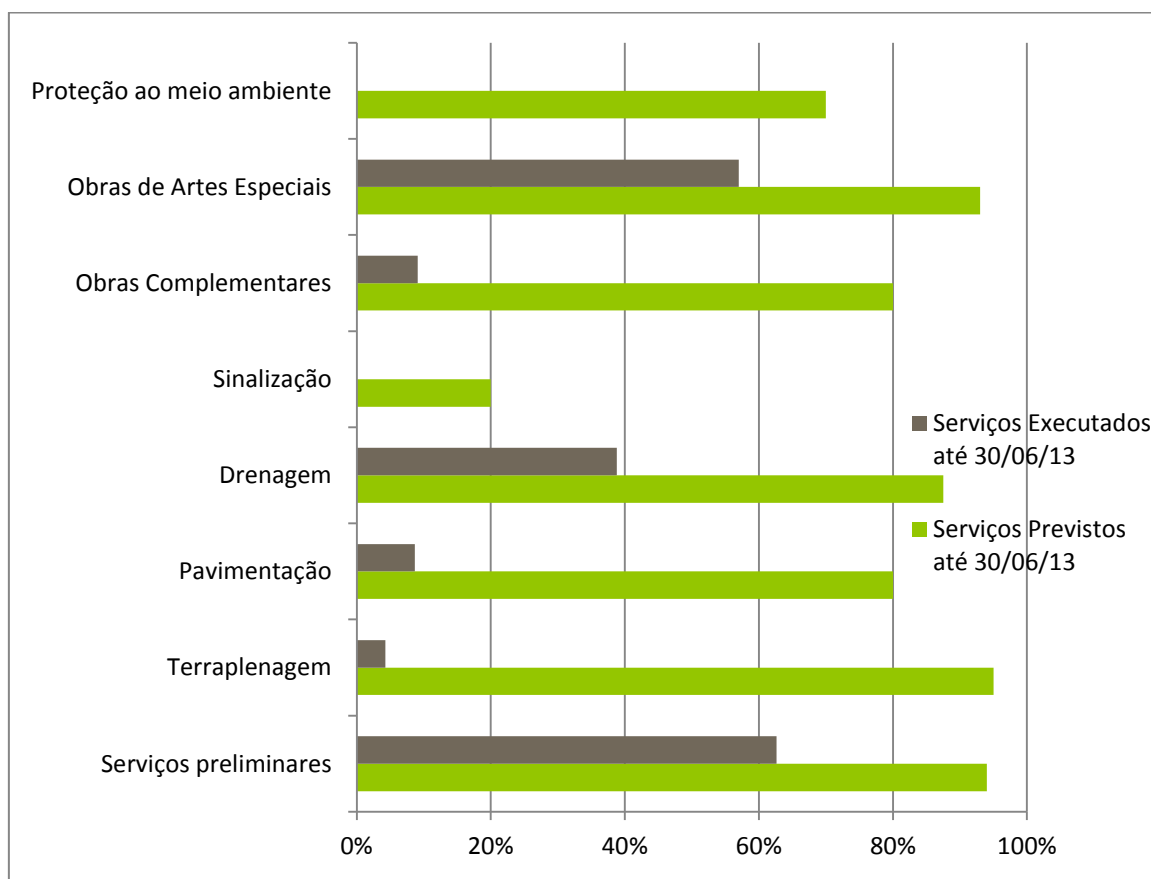

**Conclusão :** Os serviços efetivamente executados na obra Trincheira Trabalhadores Jurumirim, não condizem com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, apresentado pela empresa CONSÓRCIO SOBELLTAR-SECOPA. Todas as execuções das etapas da obra encontram-se aquém do previsto no cronograma, obra com nível de atraso elevado, apesar de cronograma readequado.

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA JURUMIRIM)**

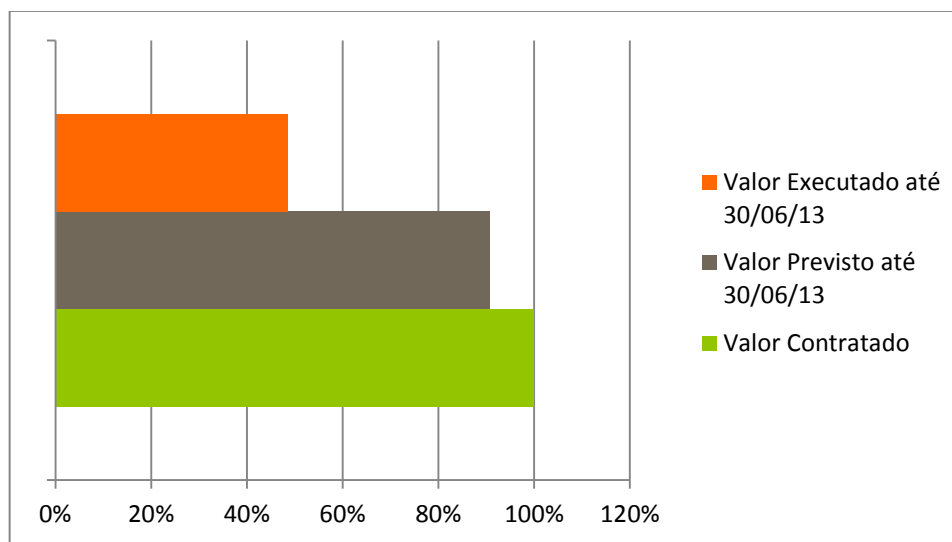

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA READEQUADO**

2.2.4. Contrato nº 24/2012

**AVENIDA CAMBURIU – PARQUE GEÓRGIA – Trecho :Entr. Rua Caravela – Acesso ao São Gonçalo.**

Obra	Pavimentação da Avenida Camburiu/ rua cabeceiras, trecho urbano, totalizando 1.136,50 metros de extensão, no Município de Cuiabá-MT.
Contrato	024/2012
Contratada	CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA
Assinatura	19/04/2012
<b>Valor</b>	<b>R\$ 1.878.029,15</b>
Prazo execução	150 (cento e cinquenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.
1º Aditivo	Suprimiu R\$ 502,61, onde o contrato passa a ser de R\$ 1.877.526,54.
2º Aditivo	Ficam aditados os prazos de execução e vigência em 45(quarenta e cinco) dias. Prazo de execução será contado a partir de 17/09/2012 com término em 31/10/2012; Prazo de vigência será contado a partir de 16/12/2012 com término para 29/01/2013.
3º Aditivo	Ficam aditados os prazos de execução e vigência em 45(quarenta e cinco)

	dias.
4 <sup>o</sup> Aditivo	Adita-se o valor do contrato em R\$ 206.333,04, passando a ser de R\$ 2.083.859,58. Ficam aditados os prazos de execução e vigência em 45(quarenta e cinco) dias.
5 <sup>o</sup> Aditivo	Ficam aditados os prazos de execução e vigência em 30 (trinta) dias.
<b>Valor atual</b>	<b>R\$ 2.083.859,58</b>
Ordem Serviço	23/04/12
Início	23/04/2012
Conclusão	<b>28/02/13</b>
Fiscal :Lauro Pepiliasco.	

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2012	
Objeto	Supressão de valor do Contrato nº 024/2012.
Alteração	Suprimem-se R\$ 502,61, onde o contrato passa a ser de R\$ 1.877.526,54.
Assinatura	25/07/12
Prazo Execução	<b>20/09/12</b>
Prazo Vigência	19/12/12

SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2012	
Objeto	Aditar prazo ao Contrato nº 024/2012.
Alteração	Ficam acrescidos 45 (quarenta e cinco) dias ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 31/10/2012 e da vigência em 29/01/13.
Assinatura	17/09/12
Prazo Execução	<b>31/10/12</b>
Prazo Vigência	29/01/13

TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2012	
Objeto	Aditar prazo ao Contrato nº 024/2012.
Alteração	Ficam acrescidos 45 (quarenta e cinco) dias ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 15/12/2012 e da vigência em 15/03/13.
Assinatura	01/11/12
Prazo Execução	<b>15/12/12</b>
Prazo Vigência	15/03/13

QUARTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2012	
Objeto	Aditar valor e prazo ao Contrato nº 024/2012.
Alteração	Adita-se o valor do contrato em R\$ 206.333,04, passando a ser de R\$ 2.083.859,58. Ficam <b>acrescido 45 (quarenta e cinco) dias</b> ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 29/01/13 e da

	vigência em 29/04/13.
Assinatura	14/12/12
Prazo Execução	<b>29/01/13</b>
Prazo Vigência	29/04/13

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2012	
Objeto	Aeditar valor e prazo ao Contrato nº 024/2012.
Alteração	Ficam <b>acrescidos 30 (trinta) dias</b> ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 28/02/13 e da vigência em 29/05/13.
Assinatura	29/01/13
Publicação	19/02/13
Prazo Execução	<b>28/02/13</b>
Prazo Vigência	29/05/13

**Tabela I**

9ª Medição (período 01/01/13 a 31/01/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 2.083.859,58</b>	<b>R\$ 1.957.508,06</b>	<b>R\$ 126.351,52</b>	<b>93,94%</b>

**Tabela II**


Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% execu- do	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	70.036,85	57.588,61	82,23%	70.036,85	100,00%
2.0	Terraplenagem	197.589,87	187.927,20	95,11%	197.589,87	100,00%
3.0	Pavimentação	461.497,51	461.497,81	100,00%	461.497,51	100,00%
4.0	Drenagem	1.104.269,45	1.017.883,46	92,18%	1.104.269,45	100,00%
5.0	Sinalização	19.944,47	12.585,64	63,10%	19.944,47	100,00%
6.0	Obras Complementares	202.552,46	202.552,46	100,00%	202.552,46	100,00%
7.0	Proteção ao meio ambiente	27.969,00	17.473,00	62,47%	27.969,00	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.083.859,61</b>	<b>1.957.508,18</b>	<b>93,94%</b>	<b>2.083.859,61</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela III**


Medição	Valor (R\$)
1ª	20.910,76
2ª	402.404,40
3ª	486.515,33
4ª	583.608,45
5ª	136.806,47
6ª	67.829,47
7ª	30.657,20
8ª	20.994,95
9ª	207.781,03

<b>Total</b>	<b>1.957.508,06</b>
--------------	---------------------

**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**

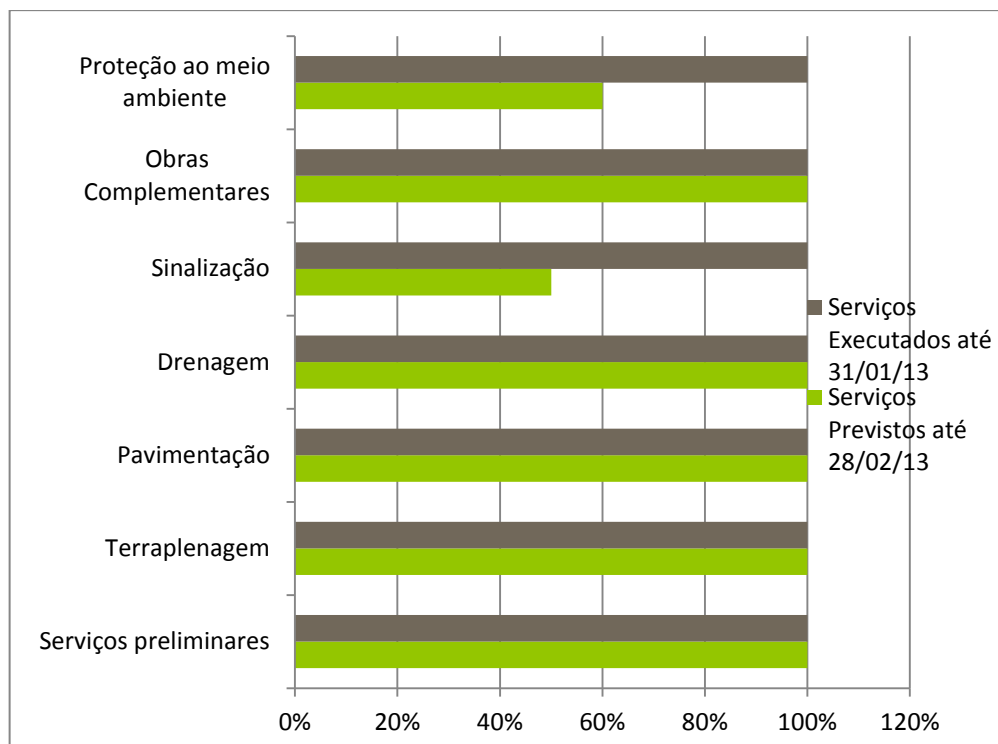

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (AVENIDA CAMBURIU – PARQUE GEÓRGIA – Trecho : Entr. Rua Caravela – Acesso ao São Gonçalo).**

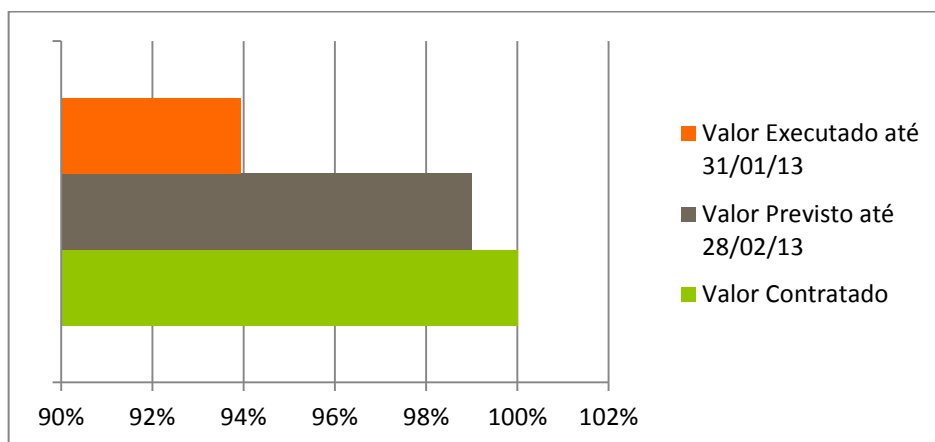

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA READEQUADO**

## 2.2.5. Contrato nº 25/2012

### **PROLONGAMENTO DA RUA DOS EUCALIPTOS – TRECHO: entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima.**

Obra	Prolongamento da Rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima, totalizando 1.235,32 metros de extensão, localizado no Bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Cuiabá-MT”.
Contrato	025/2012
Contratada	BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Assinatura	19/04/2012
<b>Valor</b>	<b>R\$ 1.727.813,99 (com isenção de ICMS)</b>
<b>Valor atual</b>	<b>R\$ 1.963.292,28 (sem isenção de ICMS)</b>
Prazo execução	150 (cento e cinquenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.
Prazo aditado	240 dias
Ordem Serviço	03/05/12
Início	03/05/12
Conclusão	<b>14/05/13</b>
Fiscal	:Jhonatan Augusto Lazarin Santana

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2012	
Objeto	Aditar o prazo de execução e vigência do contrato nº 025/2012
Alteração	Ficam aditados <b>60 (sessenta) dias</b> ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 15/11/2012 e da vigência em 13/02/13.
Assinatura	17/09/12
Prazo Execução	<b>15/11/12</b>
Prazo Vigência	13/02/13

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2012	
Objeto	Aditar o prazo de execução e vigência do contrato nº 025/2012
Alteração	Ficam aditados <b>60 (sessenta) dias</b> ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 14/01/2013 e da vigência em 12/04/13.
Assinatura	14/11/12
Prazo Execução	<b>14/01/13</b>
Prazo Vigência	12/04/13

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2012	
Objeto	Aditar o prazo de execução e vigência do contrato nº 025/2012
Alteração	Ficam aditados <b>30 (trinta) dias</b> ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 13/02/2013 e da vigência em 12/05/13.
Assinatura	15/01/13
Publicação	23/01/13
Prazo Execução	<b>13/02/13</b>
Prazo Vigência	12/05/13

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2012	
Objeto	Aditar o prazo de execução e vigência do contrato nº 025/2012
Alteração	Ficam aditados <b>45 (quarenta e cinco) dias</b> ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 30/03/2013 e da vigência em 26/06/2013. Fica acrescido o valor de R\$ 235.478,29, passando o contrato para o valor de R\$ 1.963.292,28.
Assinatura	13/02/13
Publicação	07/03/13
Prazo Execução	<b>30/03/13</b>
Prazo Vigência	26/06/13

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2012	
Objeto	Aditar o prazo de execução e vigência do contrato nº 025/2012
Alteração	Ficam aditados <b>45 (quarenta e cinco) dias</b> ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 14/05/2013 e da vigência em 10/08/2013.
Assinatura	27/03/13
Publicação	23/04/13
Prazo Execução	<b>14/05/13</b>
Prazo Vigência	10/08/13

**Tabela I**

12ª Medição (período 01/05/13 a 31/05/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 1.963.292,28</b>	<b>R\$ 1.916.766,31</b>	<b>R\$ 46.525,97</b>	<b>97,63%</b>

**Tabela II**  
**(Contrato sem isenção do ICMS)**

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executa- do	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços	66.314,25	66.314,25	100,00%	66.314,25	100,00%


	preliminares					
2.0	Terraplenagem	617.927,25	617.994,58	100,01%	617.927,25	100,00%
3.0	Pavimentação	305.541,15	330.039,85	108,02%	305.541,15	100,00%
4.0	Drenagem	753.250,98	716.831,08	95,16%	753.250,98	100,00%
5.0	Sinalização	26.108,13	26.108,14	100,00%	26.108,13	100,00%
6.0	Obras Complementares	152.181,83	148.148,88	97,35%	152.181,83	100,00%
7.0	Proteção ao meio ambiente	41.968,69	27.058,00	64,47%	41.968,69	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.963.292,28</b>	<b>1.932.494,78</b>	<b>98,43%</b>	<b>1.963.292,28</b>	<b>100%</b>

**Tabela III**


Medição	Valor (R\$)
1 <sup>a</sup>	178.588,22
2 <sup>a</sup>	29.523,24
3 <sup>a</sup>	94.155,24
4 <sup>a</sup>	175.897,44
5 <sup>a</sup>	93.726,32
6 <sup>a</sup>	64.674,37
7 <sup>a</sup>	223.955,25
8 <sup>a</sup>	44.901,73
9 <sup>a</sup>	414.561,87
10 <sup>a</sup>	126.022,96
11 <sup>a</sup>	147.909,97
12 <sup>a</sup>	322.849,70
<b>Total</b>	<b>1.916.766,31</b>

O Valor total acumulado na 12<sup>a</sup> medição (Tabela II) diverge do valor da somatória das doze medições (Tabela III) em R\$ 15.728,47.

**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**

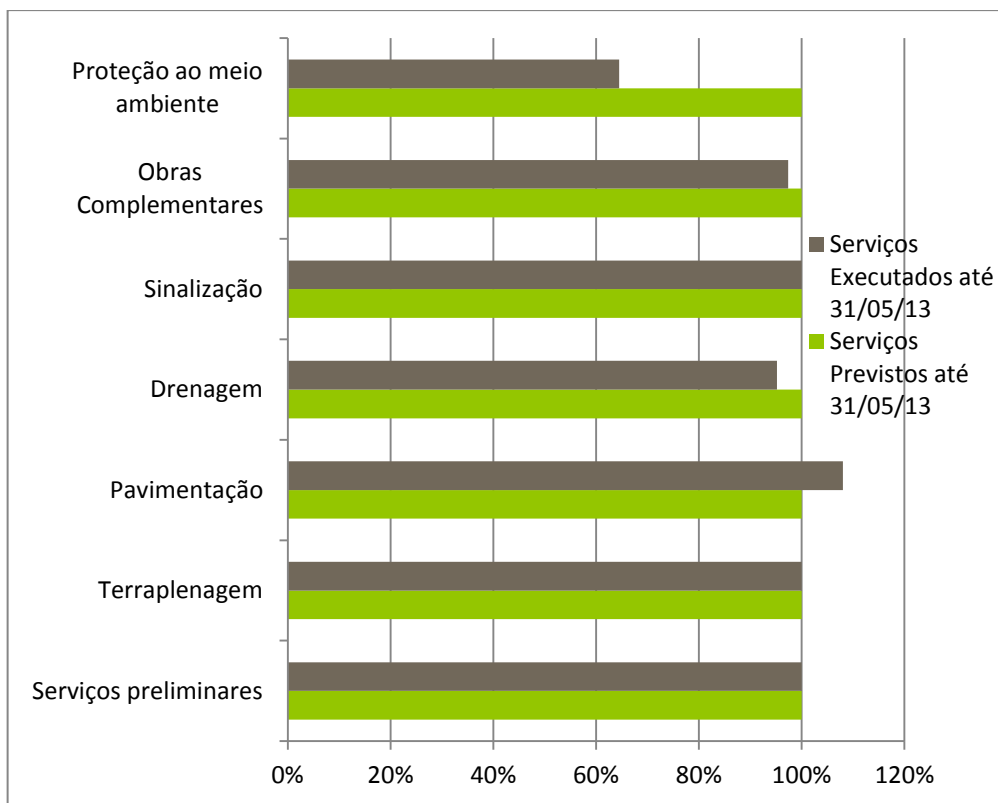

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PROLONGAMENTO DA RUA DOS EUCALIPTOS – TRECHO: entre o entroncamento com Avenida das Palmeiras e o entroncamento com a Avenida Archimedes Pereira Lima).**

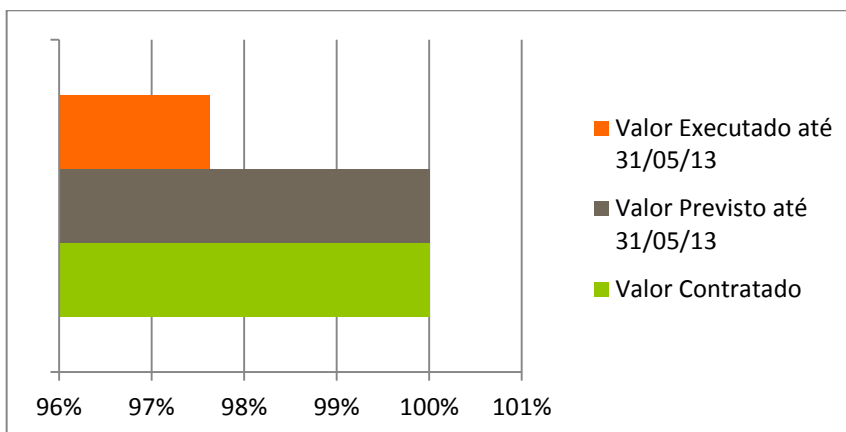

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA READEQUADO**

## 2.2.6. Contrato nº 32/2012

### VIADUTO DO DESPRAIADO

Obra	<b>LOTE 02</b> - Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Av. Marechal Deodoro – Entr. Centro de Eventos do Pantanal), extensão 1,80 km. <b>Viaduto do Despraiado.</b>
Contrato	032/2012
Contratada	CONSÓRCIO ATRACON – constituído pelas empresas : - ATRATIVA ENGENHARIA LTDA - CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA.
Assinatura	28/05/12
Valor	R\$ 18.974.928,43 (dezoito milhões novecentos e setenta e quatro mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) sem isenção de ICMS.
Prazo execução	360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos.
Ordem Serviço	01/06/12
Início	01/06/12
Conclusão	27/05/13
Fiscal :Priscila Guterres dos Santos	

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2012	
Objeto	Aditar prazo ao Contrato nº 032/2012.
Alteração	Ficam <b>acrescidos 120 (cento e vinte) dias</b> ao prazo de conclusão e vigência.
Assinatura	<b>24/05/13</b>
Publicação	<b>13/06/13</b>
Prazo Execução	<b>24/09/2013</b>
Prazo Vigência	19/11/2013

### Tabela I

13ª Medição (período 26/05/13 a 25/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 18.974.928,43</b>	<b>R\$ 14.827.322,81</b>	<b>R\$ 4.147.605,62</b>	<b>78,14%</b>


**Tabela II**

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	1.058.670,89	753.652,68	71,19%	803.742,94	75,92%
2.0	Terraplenagem	150.295,77	124.925,09	83,12%	109.114,73	72,60%
3.0	Pavimentação	2.140.902,82	312.117,07	14,58%	897.252,37	41,91%
4.0	Drenagem	1.320.277,13	712.607,54	53,97%	818.439,79	61,99%
5.0	Sinalização	102.156,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	Obras Complementares	330.149,69	34.614,81	10,48%	118.061,53	35,76%
7.0	Obras de Artes Especiais	13.832.491,19	12.889.405,62	93,18%	13.262.592,55	95,88%
8.0	Proteção ao meio ambiente	39.984,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>18.974.928,43</b>	<b>14.827.322,81</b>	<b>78,14%</b>	<b>16.009.203,91</b>	<b>84,37%</b>


**Tabela III**

Medição	Valor (R\$)
1 <sup>a</sup>	253.609,25
2 <sup>a</sup>	336.700,56
3 <sup>a</sup>	819.307,18
4 <sup>a</sup>	854.803,70
5 <sup>a</sup>	2.540.491,21
6 <sup>a</sup>	2.707.563,86
7 <sup>a</sup>	2.816.866,14
8 <sup>a</sup>	1.421.218,23
9 <sup>a</sup>	535.521,16
10 <sup>a</sup>	736.279,89
11 <sup>a</sup>	803.053,17
12 <sup>a</sup>	721.553,66
13 <sup>a</sup>	280.354,35
<b>Total</b>	<b>14.827.322,36</b>

### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

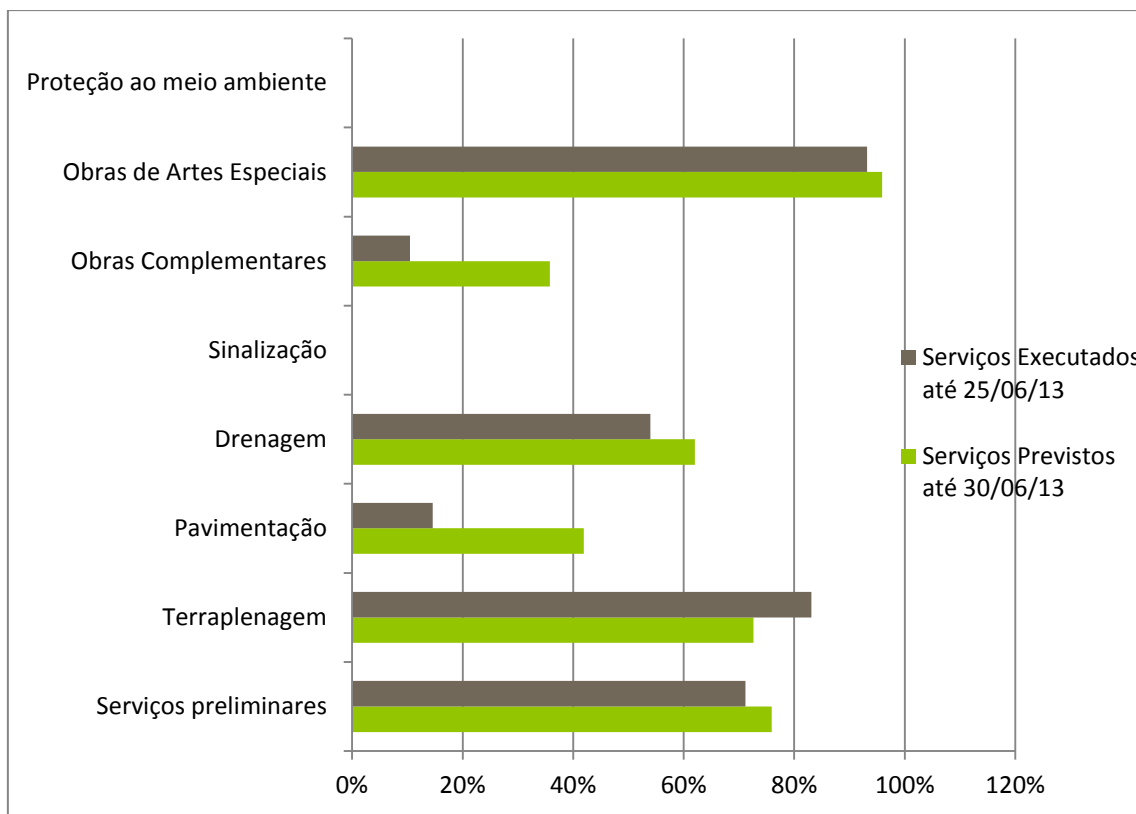

### DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (VIADUTO DO DESPRAIADO)

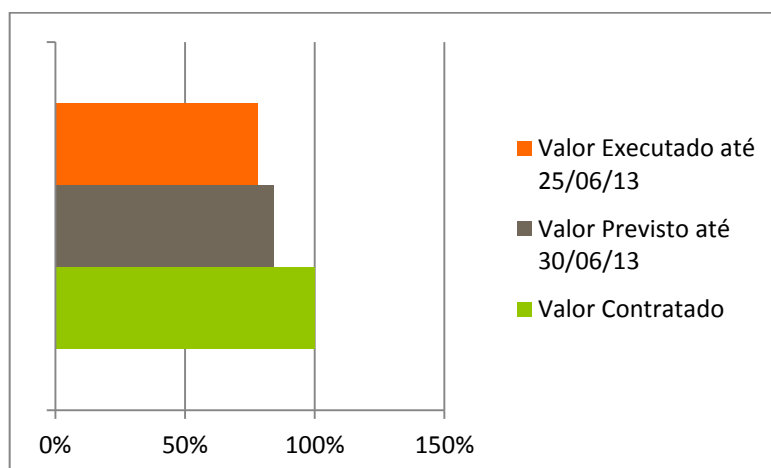

### OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA READEQUADO

## 2.2.7. Contrato nº 37/2012

### VLT

Obra	Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, arquitetura e sistemas ferroviários para a elaboração dos projetos básicos, executivos e as “built”, realização das obras, obtenção das licenças ambientais e fornecimento e montagem de sistemas e material rodante para implantação dos corredores estruturais de transporte coletivo na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC.
Contrato	037/2012
Contratada	CONSÓRCIO VLT CUIABÁ – VÁRZEA GRANDE
Assinatura	20/06/2012
Valor	R\$ 1.477.617.277,15
Prazo execução	630 (seiscentos e trinta) dias consecutivos.
Prazo vigência	720 (setecentos e vinte) dias consecutivos.
Ordem Serviço	21/06/2012
Início	21/06/12
Conclusão	13/03/2014
Fiscais: Edno Martimiano de Carvalho – Engenheiro Civil Kamilla Auxiliadora Monteiro Fujita – Arquiteta Urbanista André Luis Correia Gomes de Bento – Arquiteto Urbanista Lairson Ferreira da Silva – Engenheiro Eletricista Joel Divino da Silva – Engenheiro Agrônomo Diomário Pereira do Lago – Engenheiro Eletricista Rozeny Dantas Munis – Engenheira Sanitarista Priscila Gutierrez – Engenheira Civil Camila Diel – Engenheira Civil	

### Tabela I

11ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
R\$ 1.477.617.277,15	R\$ 524.237.988,03	R\$ 953.379.289,12	35,48%

### Tabela II

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
	TOTAL	1.477.617.277,15	524.237.988,03	35,48%	936.740.393,87	63,40%


**Tabela III**

Medição	Valor (R\$)	Valor (R\$) com adiantamento
1 <sup>a</sup>	17.479.819,24	166.879.781,23
2 <sup>a</sup>	8.332.488,79	36.746.921,27
3 <sup>a</sup>	13.526.635,57	13.526.635,57
4 <sup>a</sup>	38.744.070,09	38.744.070,09
5 <sup>a</sup>	4.228.454,00	4.228.454,00
6 <sup>a</sup>	2.212.529,88	2.212.529,88
7 <sup>a</sup>	126.498.152,60	126.498.152,60
8 <sup>a</sup>	9.570.740,71	9.570.740,71
9 <sup>a</sup>	5.990.741,56	5.990.741,56
10 <sup>a</sup>	98.438.090,07	98.438.090,07
11 <sup>a</sup>	24.620.373,57	24.620.373,57
<b>Total</b>	<b>349.642.096,08</b>	<b>527.456.490,55</b>

A 11<sup>a</sup> medição (período 01/06/13 a 30/06/13) apresentada pela equipe de fiscalização de obras da SECOPA indica como valor total acumulado **R\$ 524.237.988,03** (Tabela II), no entanto o somatório das seis medições totaliza **R\$ 527.456.490,55** (Tabela III).

Valor total executado (conforme 11 <sup>a</sup> medição)	<b>524.237.988,03</b>
Valor total medido (somatório das 11 medições)	<b>527.456.490,55</b>
<b>Divergência de valores</b>	<b>3.218.502,52</b>

DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (VLT).

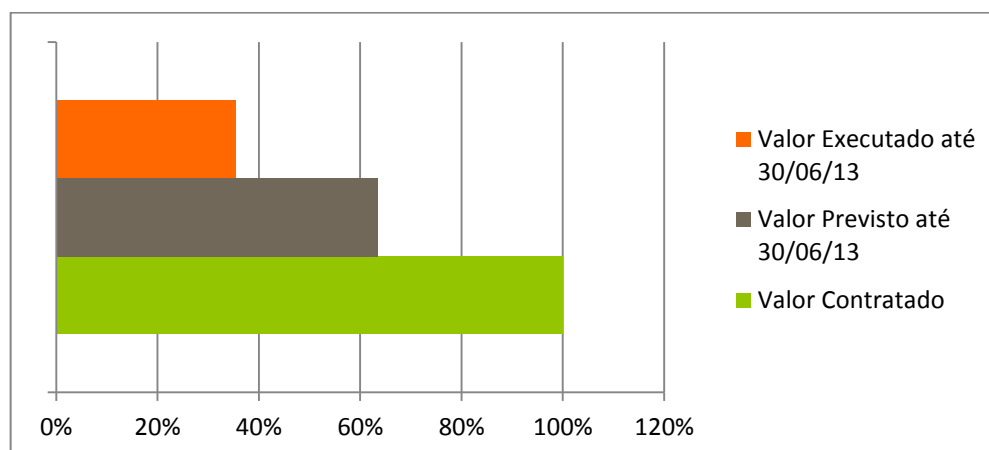

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL**

2.2.8. Contrato nº 38/2012

**LIGAÇÃO DA AV. BEIRA RIO À RUA ANTÔNIO DORILEO  
OBRA ATRASADA CONFORME CRONOGRAMA READEQUADO**

Obra	Implantação da Ligação da Avenida Beira Rio à Rua Antônio Dorileo, trecho compreendido entre a Avenida Beira e a Rua Antônio Dorileo, totalizando 2.551,67 metros de extensão.
Contrato	038/2012
Contratada	Três Irmãos Engenharia LTDA
Assinatura	25/06/12
Valor	R\$ 7.884.001,60
Prazo execução	180 (cento e oitenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	300 (trezentos) dias consecutivos.
Ordem Serviço	02/07/12
Início	02/07/12
Conclusão	31/08/13
Fiscal : Tássio de Souza Rodrigues	

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2012	
Objeto	Aditar prazo ao Contrato nº 038/2012.
Alteração	Ficam <b>acrescidos 150 (cento e cinquenta) dias</b> ao prazo de conclusão e vigência, após a dilação do prazo o término da execução será em 22/05/2013 e da vigência em 18/09/2013.
Assinatura	<b>21/12/12</b>
Publicação	<b>21/01/13</b>
Prazo Execução	<b>22/05/13</b>
Prazo Vigência	18/09/13

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2012	
Objeto	Aditar prazo ao Contrato nº 038/2012.
Alteração	Ficam aditados os prazos de execução e vigência em 101 dias <b>(cento e um) dias</b> . Após a dilação do prazo o término da execução será em 31/08/2013 e da vigência em 28/12/2013.
Assinatura	<b>22/05/13</b>
Publicação	<b>20/06/2013</b>
Prazo Execução	<b>31/08/13</b>
Prazo Vigência	28/12/13

### Tabela I

12ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 7.884.001,60</b>	<b>R\$ 4.646.831,57</b>	<b>R\$ 3.237.170,03</b>	<b>58,94%</b>


### Tabela II

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% execu- do	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	89.739,51	89.739,51	100,00%	89.739,51	100,00%
2.0	Terraplenagem	4.372.111,79	3.783.396,86	86,53%	4.226.520,47	96,67%
3.0	Pavimentação	697.716,99	15.852,56	2,27%	15.838,18	2,27%
4.0	Drenagem	1.929.053,84	757.842,64	39,29%	1.330.661,34	68,98%
5.0	Sinalização	213.576,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	Obras Complementares	174.001,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	Proteção ao meio ambiente	407.801,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>7.884.001,60</b>	<b>4.646.831,57</b>	<b>58,94%</b>	<b>5.662.759,50</b>	<b>71,83%</b>


### Tabela III

Medição	Valor (R\$)
1ª	91.356,47
2ª	366.640,81
3ª	487.414,77
4ª	892.691,56
5ª	260.820,68
6ª	325.976,42
7ª	303.939,97
8ª	0,00
9ª	263.575,14
10ª	368.618,37
11ª	608.644,62
12ª	677.152,75
<b>Total</b>	<b>4.646.831,56</b>

**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**

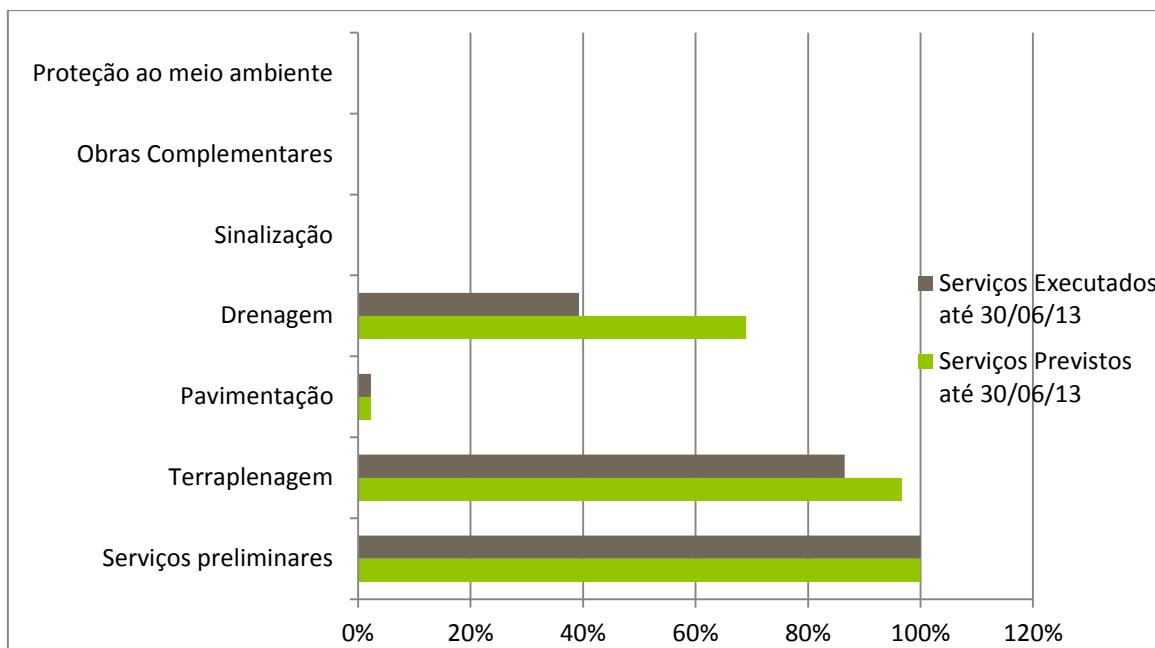

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (LIGAÇÃO DA AV. BEIRA RIO À RUA ANTÔNIO DORILEO).**

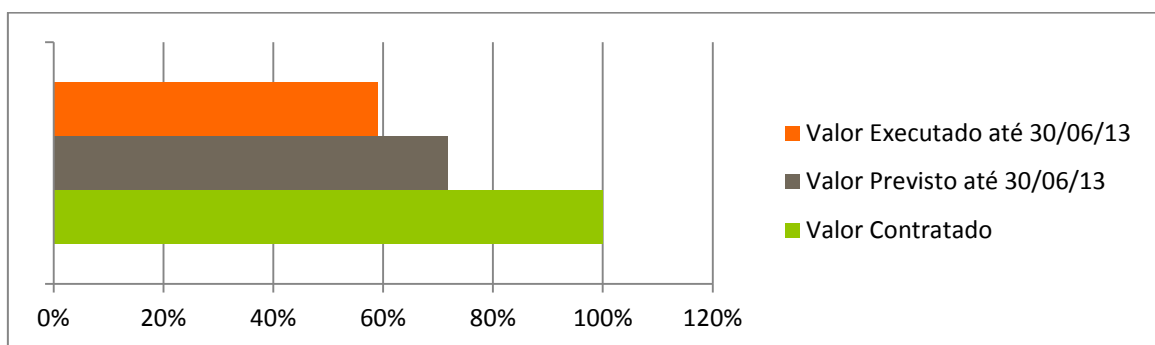

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA READEQUADO**

2.2.9. Contrato nº 39/2012

**PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SOBRE O RIO COXIPÓ – TRECHO : Av. Beira Rio e a Rua Antônio Dorileo.**

Obra	Execução de Ponte de Concreto Pré-Moldado sobre o Rio Coxipó, trecho compreendido entre a Avenida Beira Rio e a Rua Antônio Dorileo, com 155,00 metros de extensão e 12,80 metros de largura.
Contrato	039/2012
Contratada	ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
Assinatura	25/06/2012
Valor	R\$ 5.156.718,23
Prazo execução	180 (cento e oitenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	300 (trezentos) dias consecutivos.
Aditivo	90 (noventa) dias.
Ordem Serviço	28/06/12
Início	28/06/12
Conclusão	<b>03/07/13</b>
Fiscal : Tássio de Souza Rodrigues	

<b>TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 039/2012</b>	
Objeto	Suspensão da contagem dos prazos contratuais, referente ao contrato n 039/2012, a partir de 03/12/12.
Assinatura	12/12/12
Publicação	21/12/12
Prazo Execução	<b>25/12/12</b>
Prazo Vigência	21/04/13
Obs.:	Devido a paralização a partir de 03/12/12 decorreu-se 158 dias de execução do contrato, restando 22 dias para findar o prazo de execução.

<b>TERMO DE REINICIO DO CONTRATO Nº 039/2012</b>	
Objeto	Retomada do contrato, autorizando a reiniciar os serviços referente à execução da Ponte de Concreto Pré-Moldado sobre o Rio Coxipó.
Assinatura	15/03/13
Publicação	01/04/13
Prazo Execução	<b>05/04/13</b>
Prazo Vigência	21/04/13

<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2012</b>	
Objeto	Aditar os prazos de execução e vigência do contrato, ficando aditados os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias. O prazo de execução será contado a partir de 05/04/13 com término em 03/07/13 e o prazo de

	vigência será contado a partir de 01/08/13 com término para 30/10/13.
Assinatura	04/04/13
Publicação	24/04/13
Prazo Execução	<b>03/07/13</b>
Prazo Vigência	30/10/13

<b>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2012</b>	
Objeto	Aditar valor ao contrato 039/2012. Fica acrescido o valor de R\$ 818.902,82, suprimido o valor de R\$ 135.724,99, totalizando um acréscimo de R\$ 683.177,83.
Assinatura	08/07/2013
Publicação	08/07/2013
Valor atual	<b>R\$ 5.839.896,06</b>

**Tabela I**

9ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 5.839.896,06</b>	<b>R\$ 5.839.896,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela II**


item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	265.686,81	265.686,81	100,00%	265.686,81	100,00%
2.0	Infra-estrutura	839.288,89	839.288,89	100,00%	839.288,89	100,00%
3.0	Mesoestrutura	678.143,28	678.143,28	100,00%	678.143,28	100,00%
4.0	Superestrutura	3.812.157,36	3.812.157,36	100,00%	3.812.157,36	100,00%
5.0	Acabamentos	54.820,44	54.820,44	100,00%	53.820,44	100,00%
6.0	Transportes	65.702,14	65.702,14	100,00%	65.702,14	100,00%
7.0	Caminho de serviço	124.097,14	124.097,14	100,00%	124.097,14	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>5.839.896,06</b>	<b>5.839.896,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.838.896,06</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela III**


Medição	Valor (R\$)
1ª	90.102,75
2ª	260.088,03
3ª	483.519,55
4ª	1.290.821,59
5ª	1.208.438,28
6ª	1.090.971,31

7 <sup>a</sup>	274.939,29
8 <sup>a</sup>	232.752,39
9 <sup>a</sup>	908.262,87
<b>Total</b>	<b>5.839.896,06</b>

### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

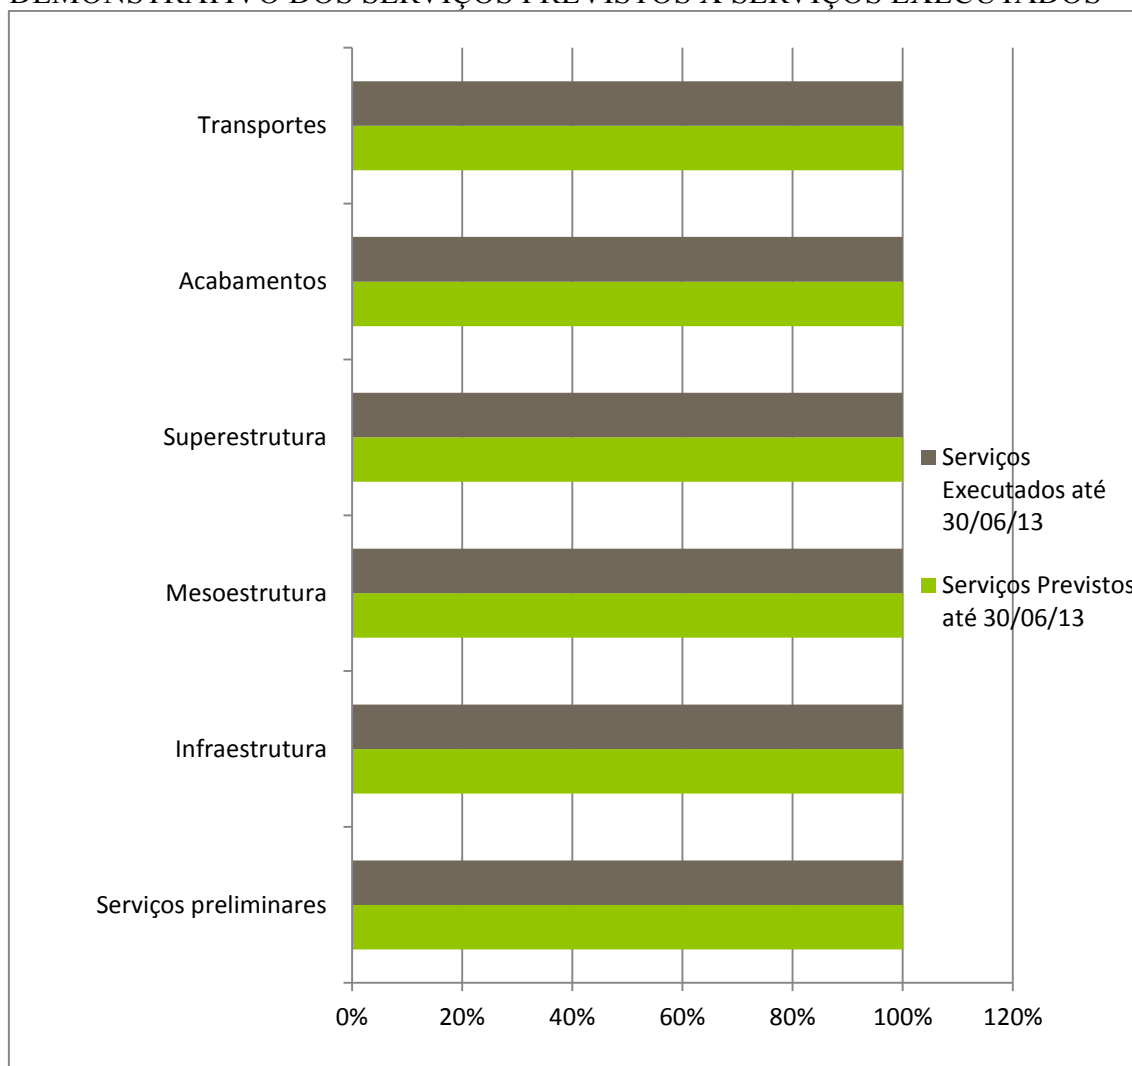

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SOBRE O RIO COXIPÓ – TRECHO : Av. Beira Rio e a Rua Antônio Dorileo)**

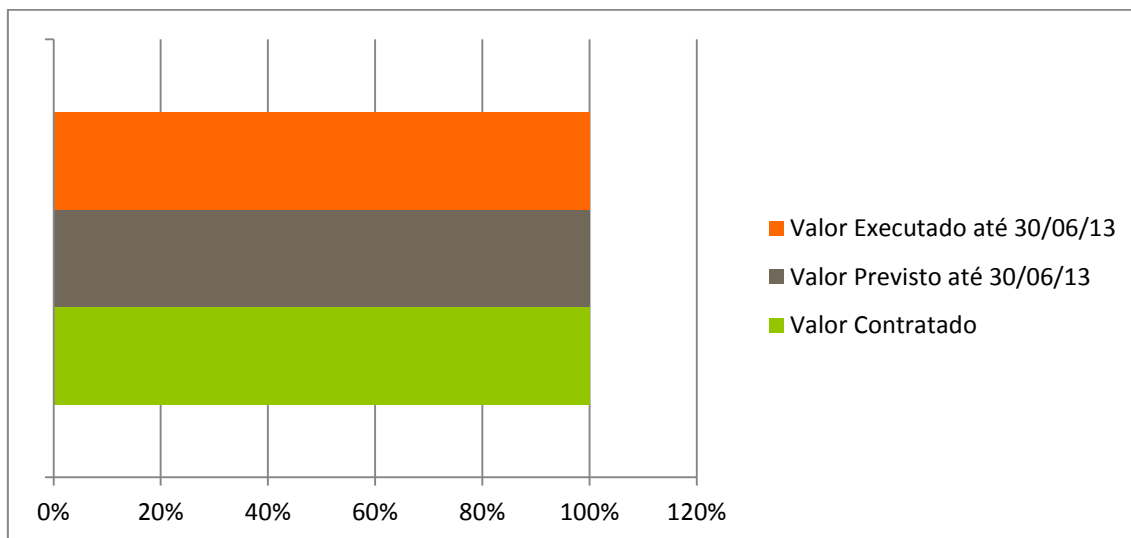

**OBRA COM MEDIÇÃO FINAL - AGUARDANDO TERMO DE RECEBIMENTO**

2.2.10. Contrato nº 40/2012

**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL OBRA ATRASADA APESAR DO CRONOGRAMA READEQUADO**

Obra	<b>Lote 3:</b> Pavimentação de Ruas Diversas no Entorno da Arena Pantanal, trecho compreendido entre a Rua Begônias (Entr. Rua das Tulipas - Entr. Av. das Flores /Entr. Rua das Violetas - Entr. Av. 8 de Abril). Rua dos Crisântemos (Entr. Rua das Begônias - Entr. Ruas das Camélias). Rua Onze de Maio (Entr. Rua A - Entr. Av. Miguel Sutil ), Rua das Papoulas (Entre. Rua das Begônias - Entr. Rua das Margaridas). Av. Dom Carlos L. D´amour (Entr. Av. Agrícola Paes de Barros - Entr. Av. Ciríaco Candia), Rua das Almas ( Entr. Av. Miguel Sutil - Entr. Rua da Fé ) e Rua da Caridade (Entr. Av. Miguel sutil - Entr. Rua da Fé), totalizando 2.231,99 metros.
Contrato	040/2012
Contratada	TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
Assinatura	25/06/12
Valor original	R\$ 2.924.008,33
<b>Valor atual</b>	<b>R\$ 2.810.777,32</b>

Prazo execução	120 (cento e vinte) dias consecutivos.
Prazo vigência	240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.
1º Aditivo	Suprimiu o valor original do contrato R\$ 239.659,03, passando o valor do contrato a ser de R\$ 2.684.349,30.
2º Aditivo	Aditou-se 60 (sessenta) dias.
3º Aditivo	Fica aditado ao contrato o valor de R\$ 126.428,02, passando para o valor contratual de R\$ 2.810.777,32. Ficam aditados o prazo de execução e vigência em 150 (cento e cinquenta) dias.
Ordem Serviço	02/07/12
Início	02/07/12
<b>Conclusão</b>	<b>19/09/13</b>
Fiscal : Lauro Pepiliasco	

<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2012</b>	
Objeto	Supressão de valor do contrato nº 040/2012.
Alteração	Fica suprimido do valor original do contrato n 040/2012 R\$ 239.659,03, passando a ser o valor do contrato R\$ 2.684.349,30.
Assinatura	22/08/12
Publicação	24/08/12
Prazo Execução	<b>23/10/12</b>
Prazo Vigência	20/02/13

<b>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2012</b>	
Objeto	Aditar prazo de vigência e de execução ao Contrato nº 040/2012.
Alteração	Ficam aditados os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias; o prazo de execução será contado a partir de 25/10/12 com término em 23/12/12; e o prazo de vigência será contado a partir de 21/02/12 com término em 21/04/13.
Assinatura	25/10/12
Publicação	06/11/12
Prazo Execução	<b>23/12/12</b>
Prazo Vigência	21/04/13

<b>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2012</b>	
Objeto	Aditar valor e prazo de vigência e de execução ao Contrato nº 040/2012
Alteração	Ficam aditados os prazos de execução e vigência em 150 (cento e cinquenta) dias. Fica aditado ao contrato o valor de R\$ 126.428,02, passando o valor contratual para R\$ 2.810.777,32.
Assinatura	25/10/12
Publicação	21/01/13
Prazo Execução	<b>22/05/13</b>
Prazo Vigência	21/04/13

<b>QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2012</b>	
Objeto	Aditar prazo de vigência e de execução ao Contrato nº 040/2012.
Alteração	Ficam aditados os prazos de execução e vigência em <b>120 (cento e vinte) dias</b> . o prazo de execução será contado a partir de 23/05/13 com término em <b>19/09/2013</b> ; e o prazo de vigência será contado a partir de 19/09/13 com término em 16/01/14.
Assinatura	22/05/13
Publicação	20/06/13
Prazo Execução	<b>19/09/13</b>
Prazo Vigência	16/01/14

**Tabela I**

11ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 2.810.777,32</b>	<b>R\$ 554.810,47</b>	<b>R\$ 2.255.966,85</b>	<b>19,74%</b>

**Tabela II**

**Rua Dom Carlos Luis D'Amour**

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	41.005,56	39.421,80	96,14%		
2.0	Terraplanagem	36.753,69	34.655,59	94,29%		
3.0	Pavimentação	104.522,92	96.054,24	91,90%		
4.0	Drenagem	415.697,47	369.274,35	88,83%		
5.0	Sinalização	7.241,85	0,00	0,00%		
6.0	Obras Complementares	69.328,66	7.395,09	10,67%		
7.0	Proteção ao meio ambiente	24.467,25	0,00	0,00%		
	<b>TOTAL</b>	<b>699.017,40</b>	<b>546.801,07</b>	<b>78,22%</b>		

**Rua Onze de Maio**

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	44.964,96	0,00	0,00%		
2.0	Terraplanagem	331.138,15	3.081,40	0,93%		
3.0	Pavimentação	202.096,53	0,00	0,00%		
4.0	Drenagem	432.610,09	0,00	0,00%		
5.0	Sinalização	11.038,57	0,00	0,00%		
6.0	Obras	127.342,96	0,00	0,00%		

**Tribunal de Contas de Mato Grosso**

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo  
Cuiabá-MT - CEP 78049-915 - [www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)

	Complementares					
7.0	Proteção ao meio ambiente	49.523,75	0,00	0,00%		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.198.715,01</b>	<b>3.081,40</b>	<b>0,26%</b>		

### Ruas do Jardim Cuiabá

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	41.005,56	3.787,20	9,24%		
2.0	Terraplanagem	108.650,14	1.140,80	1,05%		
3.0	Pavimentação	182.405,88	0,00	0,00%		
4.0	Drenagem	423.479,73	0,00	0,00%		
5.0	Sinalização	12.709,57	0,00	0,00%		
6.0	Obras Complementares	106.248,00	0,00	0,00%		
7.0	Proteção ao meio ambiente	38.546,00	0,00	0,00%		
	<b>TOTAL</b>	<b>913.044,88</b>	<b>1.144,787</b>	<b>0,54%</b>		

### Totalização de ruas diversas em entorno da Arena Pantanal

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	126.976,08	43.209,00	34,03%	81.302,78	64,03%
2.0	Terraplanagem	476.541,98	38.877,79	8,16%	112.177,98	23,54%
3.0	Pavimentação	489.025,33	96.054,24	19,64%	93.012,62	19,02%
4.0	Drenagem	1.271.787,29	369.274,35	29,04%	446.270,16	35,09%
5.0	Sinalização	30.989,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	Obras Complementares	302.919,62	7.395,09	2,44%	0,00	0,00%
7.0	Proteção ao meio ambiente	112.537,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.810.777,29</b>	<b>554.810,47</b>	<b>19,74%</b>	<b>732.763,54</b>	<b>26,07%</b>


### Tabela III

Medição	Valor (R\$)
1 <sup>a</sup>	5.104,82
2 <sup>a</sup>	121.924,24
3 <sup>a</sup>	37.911,45
4 <sup>a</sup>	59.509,67
5 <sup>a</sup>	16.593,72
6 <sup>a</sup>	78.310,75


7 <sup>a</sup>	0,00
8 <sup>a</sup>	83.168,90
9 <sup>a</sup>	43.488,21
10 <sup>a</sup>	45.660,51
11 <sup>a</sup>	68.364,95
<b>Total</b>	<b>560.037,22</b>

Há divergência entre os valores constantes da tabela de medição apresentada pelo fiscal da SECOPA (Tabela II) e o somatório das onze medições já realizadas (Tabela III). Divergência de **R\$ 5.226,75**

#### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

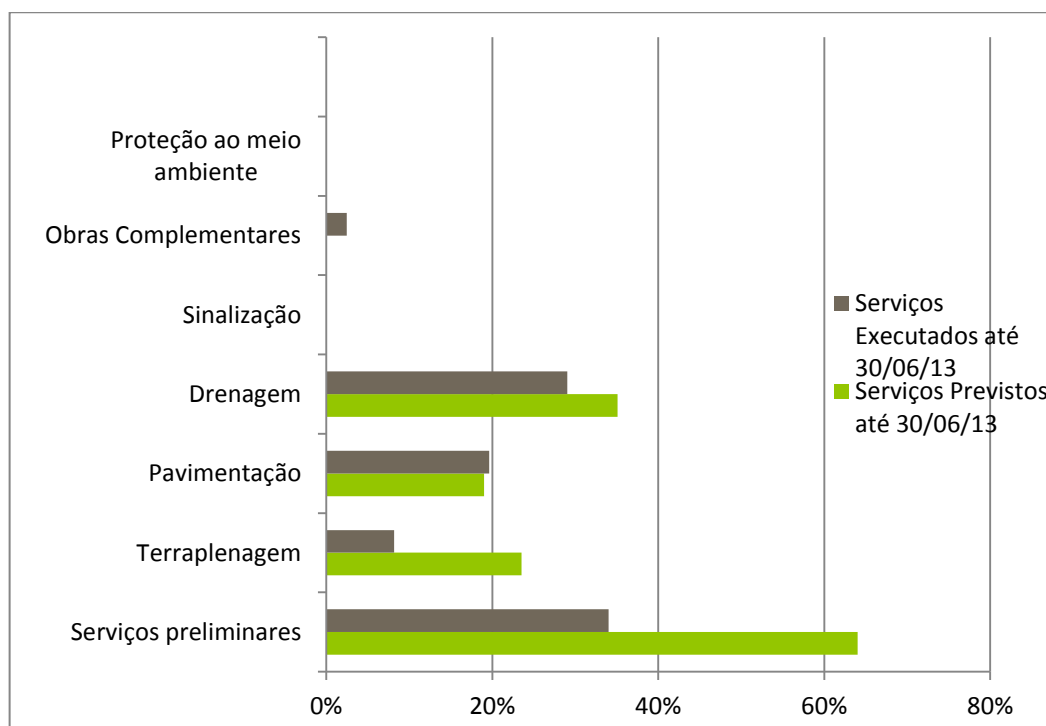

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL).**

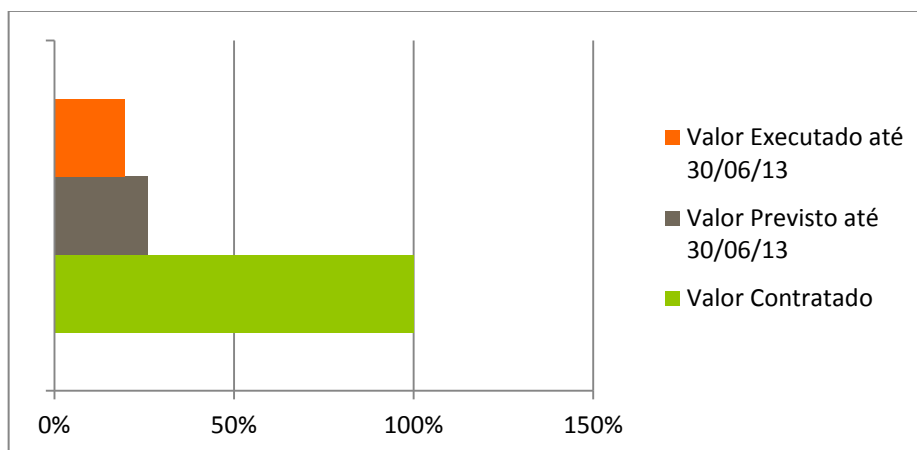

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA READEQUADO**

2.2.11. Contrato nº 42/2012

**COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL – MIGUEL SUTIL (AREÃO – JARDIM LEBLON)**

Obra	Obras de Adequação da Capacidade e Melhoria da Segurança Viária da Travessia Urbana de Cuiabá e Várzea Grande na Rodovia BR-163/364/070/MT, Trecho : Divisa MS/MT – Divisa MT/PA, Subtrecho 01: Entr. MT-407 (Rod. Imigrantes) – Acesso Tijucal (Contorno de Cuiabá), extensão 2,90 km; Subtrecho 02: Entr. Av. Miguel Sutil (Areão) - Entr. Rua Bela Vista (Jardim Leblon), extensão 1,00 km. <b>Complexo Viário do Tijucal-Areão.</b>
Contrato	042/2012
Contratada	CONSÓRCIO EEF – constituído por : - ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA - ENPA – ENGENHARIAE PARCERIA LTDA - FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Assinatura	27/07/12
Valor	R\$ 30.141.135,72
Prazo execução	540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	660 (seiscentos e sessenta) dias consecutivos.
Ordem Serviço	30/07/12

Início	30/07/12
Conclusão	21/01/14
Fiscal :Jamir Silva Sampaio	

### Tabela I

12ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 30.141.135,72</b>	<b>R\$ 11.771.601,31</b>	<b>R\$ 18.369.534,41</b>	<b>39,05%</b>

### Tabela II

#### Sub-Trecho 1

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1	Instalação e Manutenção do Canteiro	294.471,36	293.705,73	99,74%	282.441,29	95,91%
2	Mobilização	44.727,57	47.532,35	106,27%	44.727,57	100,00%
3	Desmobilização	44.727,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Terraplanagem	2.638.590,90	1.035.664,40	39,25%	2.374.731,81	90,00%
5	Drenagem	4.720.252,01	546.533,16	11,58%	4.130.220,51	87,50%
6	Pavimentação	4.847.102,82	86.330,59	1,78%	3.770.130,43	77,78%
7	Sinalização	295.389,75	0,00	0,00%	126.591,39	42,86%
8	Obras Complementares	37.933,64	0,00	0,00%	31.612,63	83,34%
9	Proteção ao meio ambiente	94.190,08	0,00	0,00%	82.416,32	87,50%
10	Paisagismo	213.751,08	0,00	0,00%	42.750,22	20,00%
11	Obras de Arte Especiais	14.946.051,25	9.292.831,91	62,18%	11.956.841,01	80,00%
	<b>Sub-total</b>	<b>28.177.188,03</b>	<b>11.302.598,14</b>	<b>40,11%</b>	<b>22.842.463,18</b>	<b>81,07%</b>

#### Sub-Trecho 2

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1	Instalação e Manutenção do Canteiro	221.569,77	109.389,00	49,37%	209.532,85	94,57%
2	Mobilização	40.547,63	40.531,42	99,96%	40.547,63	100,00%
3	Desmobilização	40.547,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Drenagem	1.087.207,30	319.043,24	29,35%	951.306,39	87,50%
5	Pavimentação	465.338,98	39,51	0,01%	361.945,83	77,78%
6	Sinalização	66.268,00	0,00	0,00%	28.399,62	42,86%
7	Proteção ao meio ambiente	10.400,00	0,00	0,00%	7.800,00	75,00%
8	Paisagismo	32.068,37	0,00	0,00%	12.827,34	40,00%
		<b>1.963.947,68</b>	<b>469.003,17</b>	<b>23,88%</b>	<b>1.612.359,66</b>	<b>82,10%</b>

**Sub-Trecho 1 + Sub-Trecho 2 :**

	<b>Contratado</b>	<b>Executado</b>	<b>% executado</b>	<b>Previsto</b>	<b>% previsto</b>
Sub-Trecho 1	<b>28.177.188,03</b>	<b>11.302.598,14</b>	<b>40,11%</b>	<b>22.842.463,18</b>	<b>81,07%</b>
Sub-Trecho 2	<b>1.963.947,68</b>	<b>469.003,17</b>	<b>23,88%</b>	<b>1.612.359,66</b>	<b>82,10%</b>
<b>Total</b>	<b>30.141.135,71</b>	<b>11.771.601,31</b>	<b>39,05%</b>	<b>24.454.822,84</b>	<b>81,13%</b>

**Tabela III**


Medição	Valor (R\$)
1 <sup>a</sup>	0,00
2 <sup>a</sup>	273.605,70
3 <sup>a</sup>	322.754,81
4 <sup>a</sup>	700.103,17
5 <sup>a</sup>	487.758,86
6 <sup>a</sup>	1.678.512,94
7 <sup>a</sup>	1.689.133,66
8 <sup>a</sup>	1.607.761,19
9 <sup>a</sup>	1.187.013,08
10 <sup>a</sup>	2.158.267,72
11 <sup>a</sup>	1.839.913,09
12 <sup>a</sup>	1.666.747,94
<b>Total</b>	<b>13.611.572,16</b>

A 12<sup>a</sup> medição (período 01/06/13 a 30/06/13) apresentada pela equipe de fiscalização de obras da SECOPA indica como valor total acumulado R\$ 11.771.601,31 (Tabela II), no entanto o somatório das seis medições totaliza R\$ 13.611.572,16 (Tabela III).


Valor total executado ( <b>conforme 12<sup>a</sup> medição</b> )	<b>R\$ 11.771.601,31</b>
Valor total medido ( <b>somatório das 12 medições</b> )	<b>R\$ 13.611.572,16</b>
<b>Divergência de valores</b>	<b>R\$ 1.839.970,85</b>

## DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS


### Sub-Trecho 1

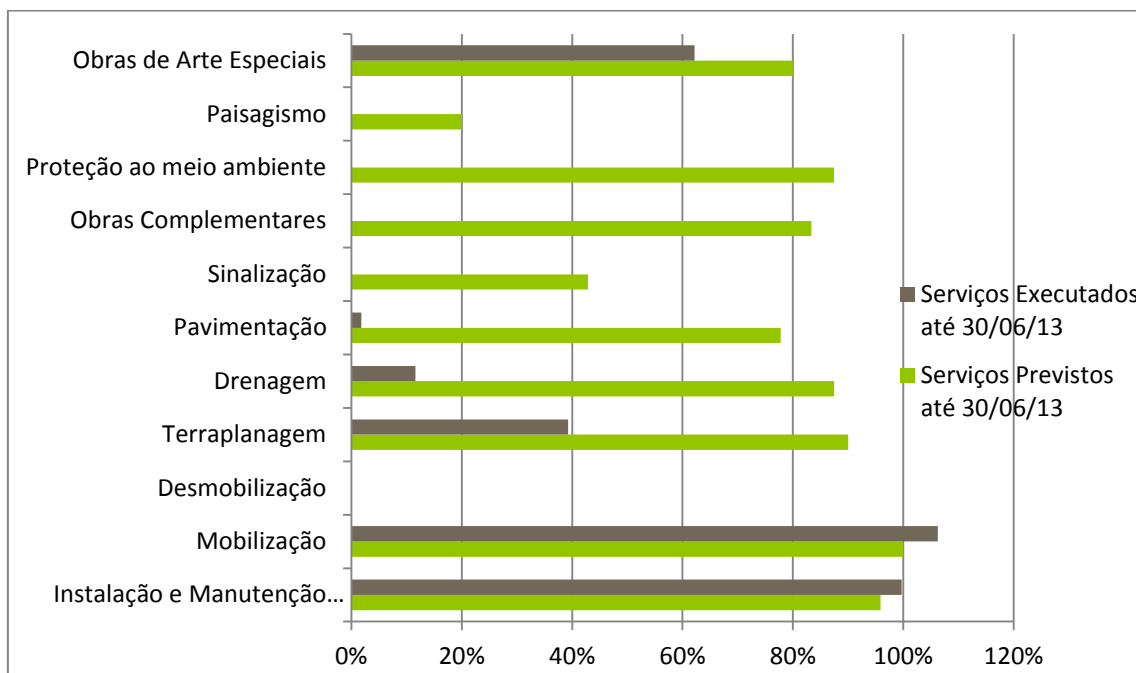

### Sub-Trecho 2

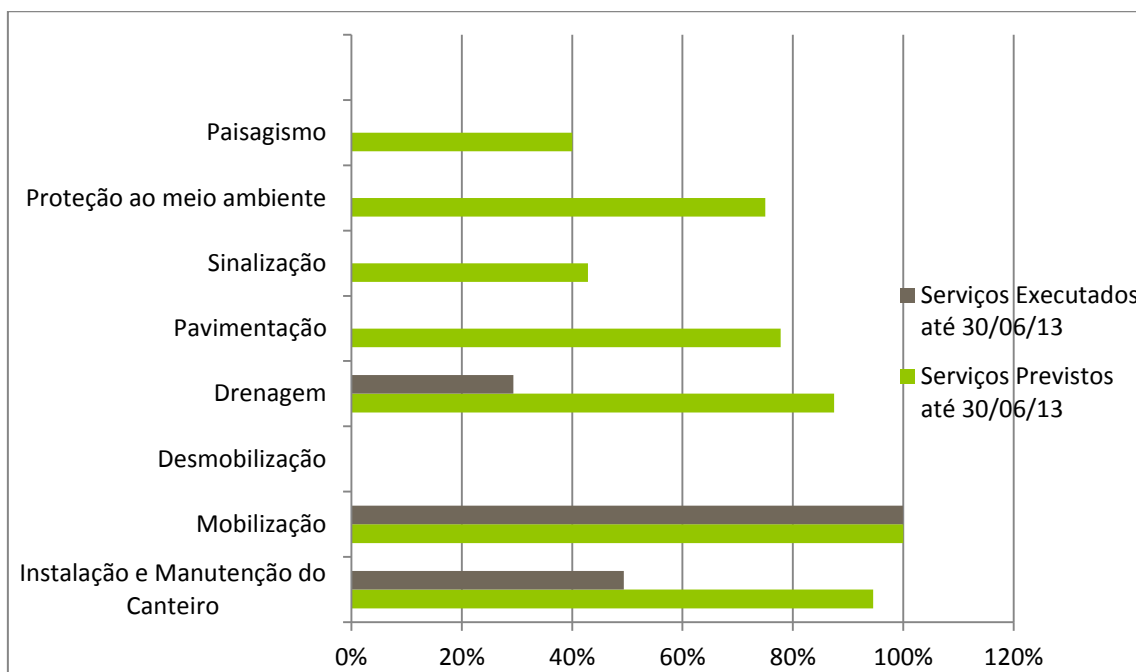

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (COMPLEXO VIÁRIO DO TIJUCAL – MIGUEL SUTIL (AREÃO – JARDIM LEBLON))**

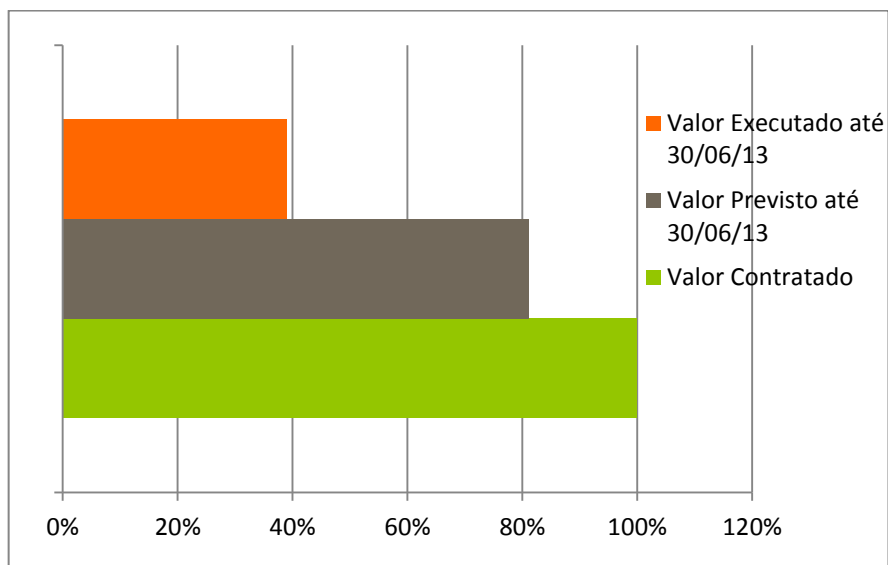

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL**

2.2.12. Contrato nº 49/2012

**VIADUTO DOM ORLANDO CHAVES.**

Obra	Construção do viaduto Entr. MT050B/351B – Entr. Av. da FEB com Av. Dom Orlando Chaves, extensão 2,90 km.
Contrato	049/2012
Contratada	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
Assinatura	21/09/2012
Valor	R\$ 16.723.705,93
Prazo execução	360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos.
Ordem Serviço	27/09/12
Início	27/09/12
Conclusão	22/09/13
Fiscal	Alexandre ZigoskiAmerico Vieira

**Tabela I**

10ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 16.723.705,93</b>	<b>R\$ 6.021.359,49</b>	<b>R\$ 10.702.346,44</b>	<b>36,00%</b>

**Tabela II**


Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Terraplenagem	424.449,05	2.349,89	0,55%	424.449,05	100,00%
2.0	Obras de Arte Correntes	1.607.350,27	102.345,02	6,37%	1.510.909,25	94,00%
3.0	Obras de Arte Especial	8.260.512,96	5.236.140,22	63,39%	6.030.174,46	73,00%
4.0	Pavimentação	3.692.299,62	3.002,50	0,08%	2.658.455,73	72,00%
5.0	Sinalização	943.918,33	12.609,76	1,34%	585.229,36	62,00%
6.0	Obras Complementares	814.604,69	10.073,59	1,24%	505.054,91	62,00%
7.0	Instalação e Manutenção Canteiro de Obras	965.719,12	649.928,96	67,30%	733.946,53	76,00%
8.0	Mobilização e Desmobilização	14.851,89	4.909,55	33,06%	14.851,89	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16.723.705,93</b>	<b>6.021.359,49</b>	<b>36,00%</b>	<b>12.463.071,18</b>	<b>74,52%</b>

**Tabela III**


Medição	Valor (R\$)
1ª	0,00
2ª	0,00
3ª	95.082,79
4ª	158.197,56
5ª	322.266,83
6ª	273.145,86
7ª	566.863,69
8ª	1.597.613,81
9ª	1.933.912,88
10ª	1.080.093,27
<b>Total</b>	<b>6.027.176,69</b>

Divergência constatada entre o valor acumulado na 10ª medição, R\$ 6.021.359,49 (Tabela II), e a soma das dez medições R\$ 6.027.176,69 (Tabela III), no valor de R\$ 5.817,2.

**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**

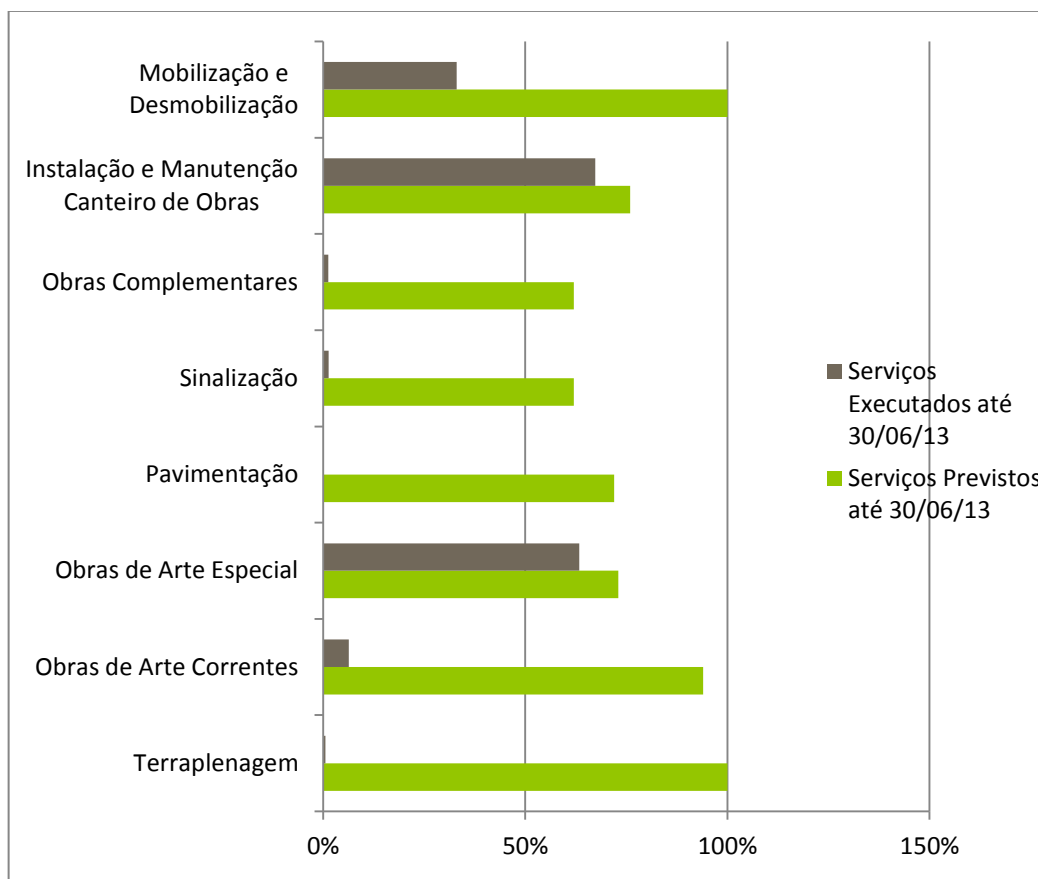

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (VIADUTO DOM ORLANDO CHAVES).**

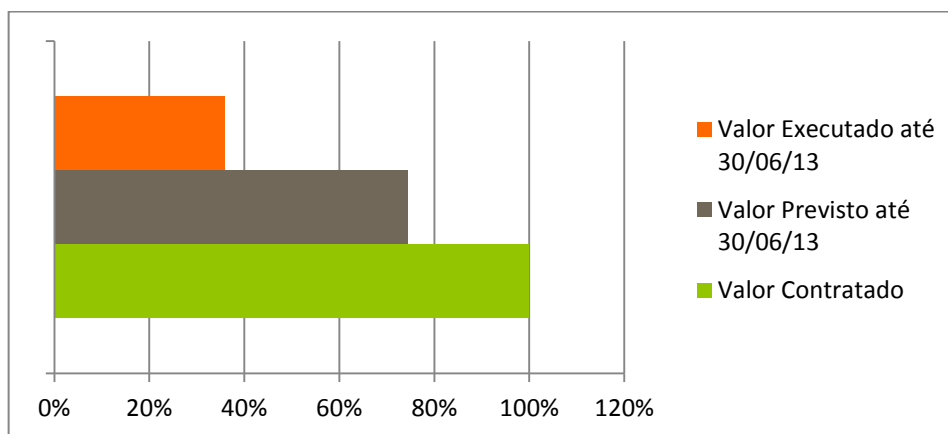

## OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL

### 2.2.13. Contrato nº 55/2012

#### CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO DA BARRA DO PARI - VG.

Obra	Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, em Várzea Grande – MT, com área total de 52.170,00m <sup>2</sup> , contemplando fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto.
Contrato	55/2012
Contratada	Consórcio Barra do Pari – constituído pelas empresas : - ENEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA; - TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA; - VALOR ENGENHARIA LTDA.
Assinatura	10/10/12
Valor	R\$ 25.535.184,42
Prazo execução	360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos.
Ordem Serviço	15/10/12
Início	15/10/12
Conclusão	10/10/13
Fiscais :	Julia Martinaitis Gonçalves (Arquiteta e Urbanista) Jorge Henrique Bedin (Engenheiro Civil)

**Tabela I**

9ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 25.535.184,42</b>	<b>R\$ 2.867.541,23</b>	<b>R\$ 22.667.643,19</b>	<b>11,23%</b>

**Tabela II**

item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.	Serviços iniciais	1.034.266,24	713.626,15	69,00%	1.034.266,24	100,00%
2.	Movimento de terra/drenagem/contenção	2.513.823,44	889.660,49	35,39%	2.513.823,44	100,00%
3.	Fundações	938.945,35	538.211,62	57,32%	938.945,35	100,00%

**Tribunal de Contas de Mato Grosso**

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo  
Cuiabá-MT - CEP 78049-915 – [www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)


4.	Estrutura de Concreto	4.057.491,42	704.529,08	17,36%	4.057.491,42	100,00%
5.	Estrutura metálica	2.744.176,73	0,00	0,00%	2.744.176,73	100,00%
6.	Impermeabilização	59.019,05	1.373,30	2,33%	59.019,05	100,00%
7.	Alvenarias / divisórias	596.081,75	20.140,59	3,38%	596.081,75	100,00%
8.	Revestimento Interno e Externo	424.988,69	0,00	0,00%	424.988,69	100,00%
9.	Tetos / forros	286.086,88	0,00	0,00%	286.086,88	100,00%
10.	Pisos internos	976.348,22	0,00	0,00%	976.348,22	100,00%
11.	Esquadrias de madeira	185.657,05	0,00	0,00%	37.131,41	20,00%
12.	Esquadrias de alumínio	363.066,48	0,00	0,00%	72.613,30	20,00%
13.	Esquadrias de ferro	456.575,22	0,00	0,00%	91.315,04	20,00%
14.	Pintura	310.347,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.	Vidros	373.060,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.	Aparelhos sanitários / metais	280.837,78	0,00	0,00%	140.418,89	50,00%
17.	Bancadas de granito / espelhos	61.758,57	0,00	0,00%	30.879,29	50,00%
18.	Instalações elétricas	1.883.977,39	0,00	0,00%	659.392,09	35,00%
19.	Instalações hidráulicas	598.370,21	0,00	0,00%	299.185,11	50,00%
20.	Instalações contra incêndio	97.709,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21.	Instalações de ar-condicionado / venti	1.854.623,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22.	Elevadores / monta carga	419.363,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23.	Campo de futebol	1.106.892,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24.	Diversos	1.355.300,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.	Limpeza	88.155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26.	Imp - implantação	2.468.260,91	0,00	0,00%	2.468.260,91	100,00%
27.	<b>TOTAL</b>	<b>25.535.184,42</b>	<b>2.867.541,23</b>	<b>11,23%</b>	<b>17.430.423,81</b>	<b>68,26%</b>

Observação : Na planilha da 8ª medição consta na coluna preço total projeto executivo o valor de R\$ 25.548.572,85, todavia, o valor contratual é R\$ 25.535.184,42, tendo um acréscimo com uma diferença a maior de R\$ 13.388,43.


**Tabela III**

Medição	Valor (R\$)
1ª	0,00
2ª	0,00
3ª	0,00
4ª	242.174,82
5ª	324.262,28
6ª	109.567,29
7ª	237.999,59
8ª	705.469,72
9ª	1.248.067,49
<b>Total</b>	<b>2.867.541,19</b>

**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**

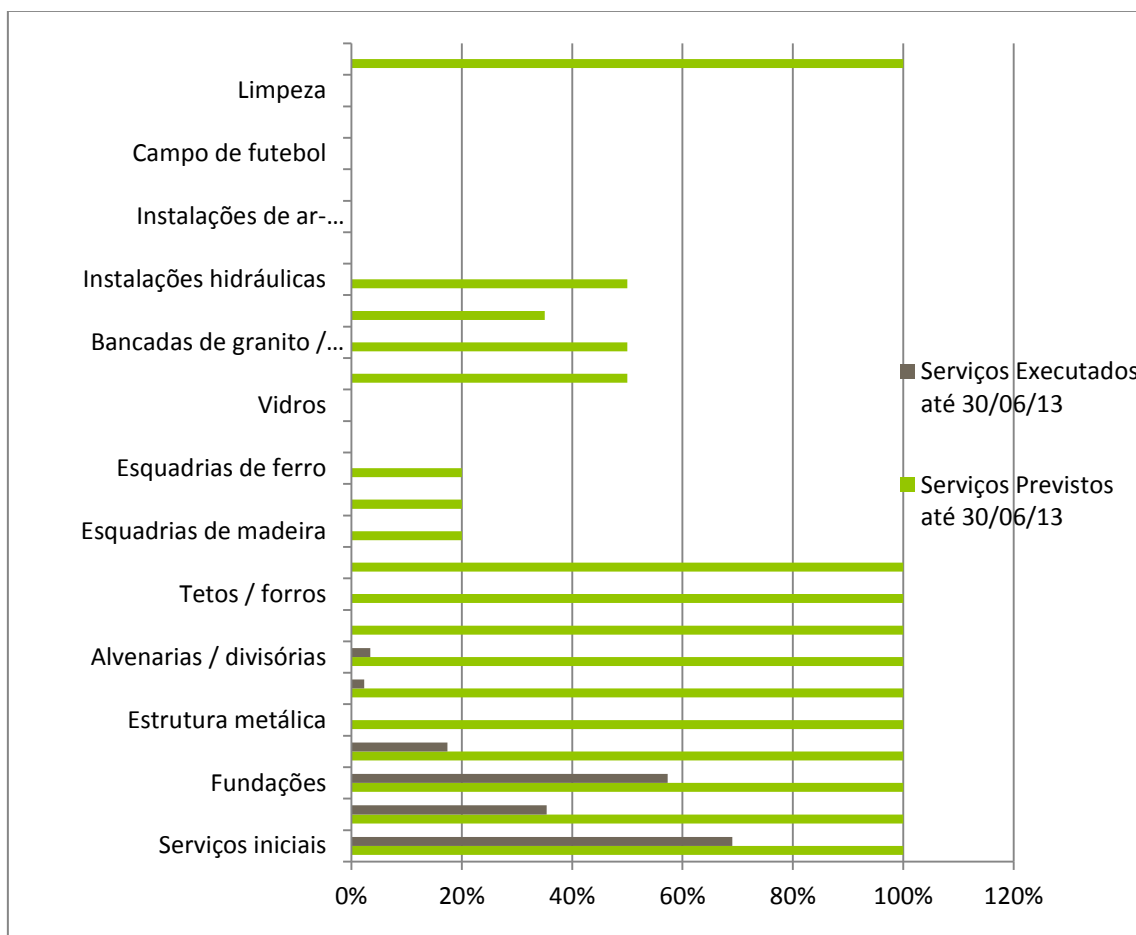

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (COT – BARRA DO PARI).**

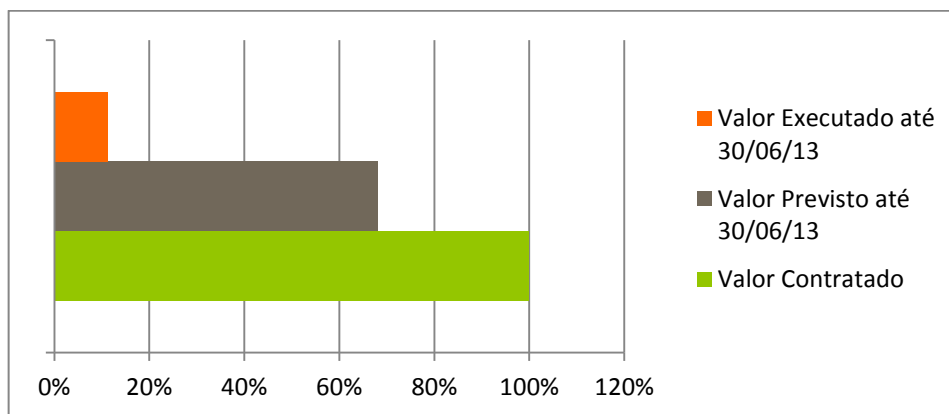

## OBRA COM ATRASO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL

### 2.2.14. Contrato nº 60/2012

### RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DA ARENA PANTANAL.

Obra	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Restauração de Diversas Ruas no Entorno da Arena Pantanal no Município de Cuiabá-MT, compreendendo as seguintes Ruas e Avenidas: Thogo Pereira, General Rabelo, das Orquídeas, das Violetas, dos Girassóis, Cuiabá, São Sebastião, Comandante Costa, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço, Dom Bosco, Crisântemos, Tulipas, Agrícola Paes de Barro
Contrato	060/2012
Contratada	Três Irmãos Engenharia LTDA
Assinatura	05/11/2012
Valor	R\$ 10.168.145,03
Prazo execução	240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	330 (trezentos e trinta) dias consecutivos.
Ordem Serviço	13/11/2012
Início	13/11/2012
Conclusão	11/07/2013
Fiscal: Gamaliel Cruz Soares.	

**Tabela I**

7ª Medição (período 01/06/13 A 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 10.168.145,03</b>	<b>R\$ 1.361.303,506</b>	<b>R\$ 8.806.841,52</b>	<b>13,39%</b>

**Tabela II**


Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	374.449,60	169.711,67	45,32%	355.727,12	95,00%
2.0	Pavimentação	5.907.995,43	1.184.559,65	20,05%	5.169.496,00	87,50%
3.0	Drenagem	1.852.017,00	0,00	0,00%	1.620.514,88	87,50%
4.0	Sinalização	672.727,35	0,00	0,00%	571.818,25	85,00%
5.0	Obras Complementares	1.360.955,65	7.032,186	0,52%	1.156.812,30	85,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>10.168.145,03</b>	<b>1.361.303,506</b>	<b>13,39%</b>	<b>8.874.368,55</b>	<b>87,28%</b>

**Tabela III**


Medição	Valor (R\$)
1 <sup>a</sup>	4.691,80
2 <sup>a</sup>	187.341,27
3 <sup>a</sup>	0,00
4 <sup>a</sup>	58.431,52
5 <sup>a</sup>	304.248,55
6 <sup>a</sup>	509.528,72
7 <sup>a</sup>	423.748,95
<b>Total</b>	<b>1.487.990,81</b>

O valor total acumulado que consta na 7<sup>a</sup> medição R\$ 1.361.303,50, apresentada pelo fiscal da SECOPA (Tabela II), diverge da soma das 7 medições R\$ 1.487.990,81 (Tabela III).

**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**

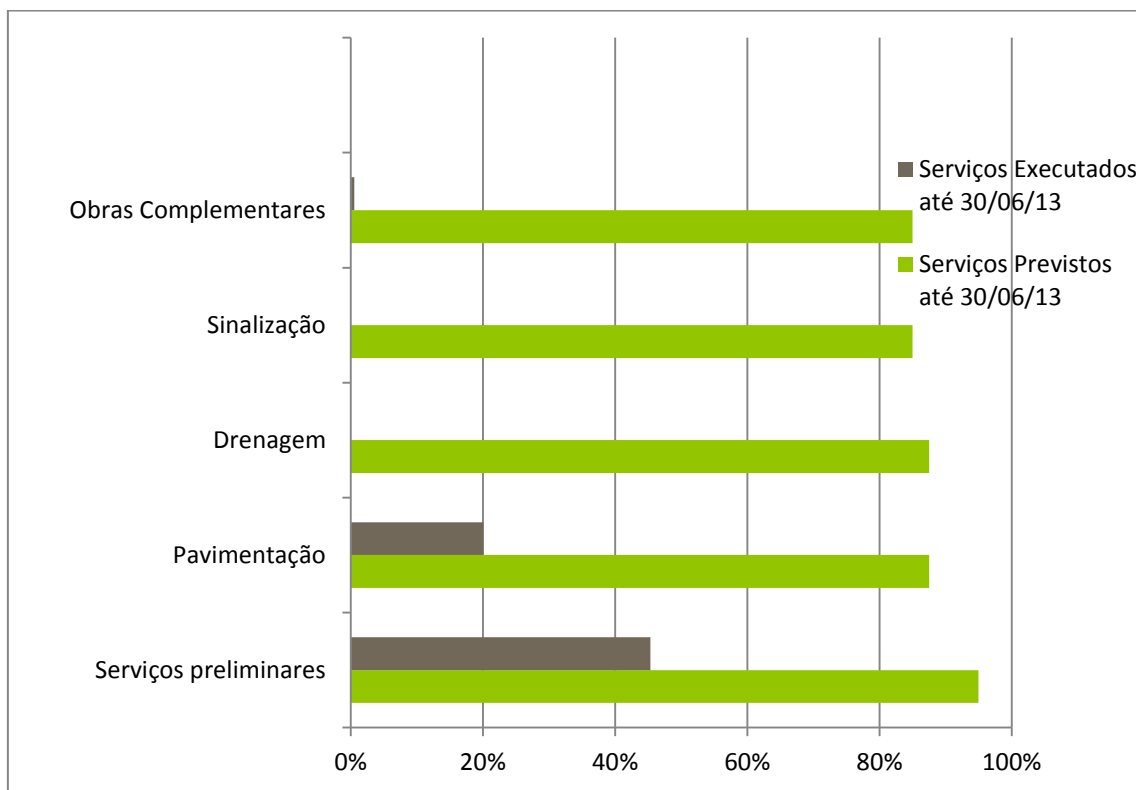

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS RUAS ENTORNO ARENA).**

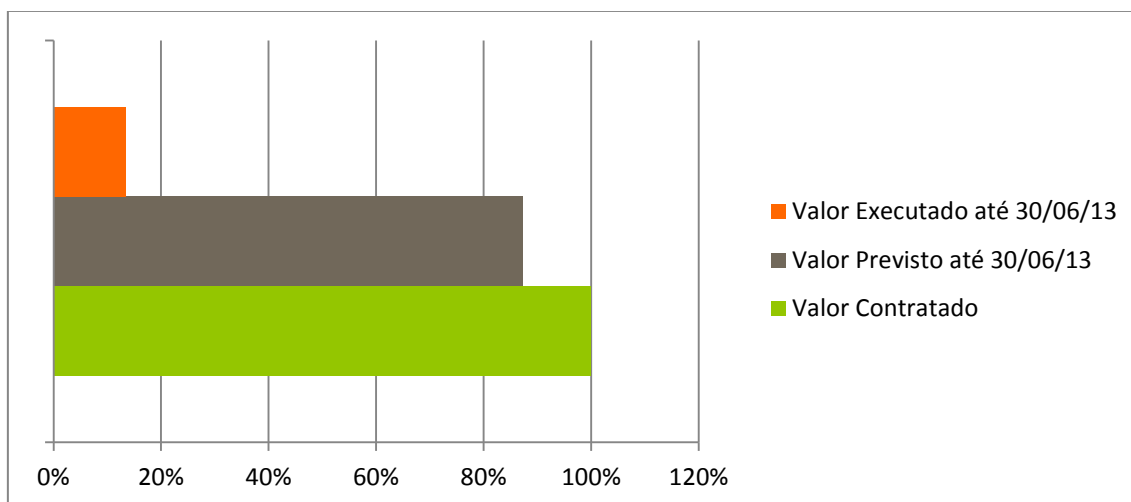

**OBRA COM ATRASO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL**

2.2.15. Contrato nº 63/2012

**RESTAURAÇÃO DA AV. 8 DE ABRIL E CÓRREGO MANÉ PINTO.**

Obra	Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Restauração do Córrego Mané Pinto, Restauração da Av. Oito de Abril e Implantação do Coletor Tronco – Emissários da Sub-bacia 16 e 17, com uma extensão de 3.167,00 m no Município de Cuiabá-MT
Contrato	063/2012
Contratada	ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA
Assinatura	21/11/2012
Valor	R\$ 19.849.814,45
Prazo execução	240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	330 (trezentos e trinta) dias consecutivos.
Ordem Serviço	26/11/2012
Início	26/11/2012
Conclusão	24/07/2013
Fiscal	Jhonatan Augusto Lazarin Santana.

### Tabela I

7ª Medição (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 19.849.814,45</b>	<b>R\$ 1.453.750,40</b>	<b>R\$ 18.396.064,05</b>	<b>7,32%</b>

### Tabela II

#### Obra 1 : Restauração do Córrego Mané Pinto e da Av. 8 de Abril

item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	446.589,17	371.835,75	83,26%	435.424,44	95,00%
2.0	Terraplanagem	71.664,70	0,00	0,00%	71.664,70	100,00%
3.0	Pavimentação	1.485.746,37	0,00	0,00%	1.337.171,73	77,50%
4.0	Drenagem	1.697.053,99	0,00	0,00%	1.527.348,59	80,00%
5.0	Sinalização	175.258,45	0,00	0,00%	35.051,69	0,00%
6.0	Obras Complementares	5.692.862,39	508.971,88	8,94%	5.123.576,15	75,00%
7.0	Obra de Artes Especiais	5.562.284,47	815.762,87	14,67%	5.284.170,25	80,00%
8.0	Proteção ao Meio Ambiente	133.017,90	0,00	0,00%	133.017,90	90,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>15.264.477,44</b>	<b>1.696.570,5</b>	<b>11,11%</b>	<b>13.947.425,45</b>	<b>91,37%</b>

#### Obra 2 : Implantação do Coletor Tronco – Emissários das Sub-bacias 16 e 17

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Rede de distribuição d'água	133.552,42	0,00	0,00%	133.552,42	100,00%
2.0	Redes coletoras e ligações domiciliares	4.381.222,45	0,00	0,00%	3.504.977,96	80,00%
3.0	Elaboração do projeto executivo	70.562,14	0,00	0,00%	70.562,14	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.585.337,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.709.092,52</b>	<b>80,89%</b>

#### Obra 1 + Obra 2 :

	Contratado	Executado	% executado	Previsto	% previsto
Obra 1	<b>15.264.477,44</b>	<b>1.696.570,5</b>	<b>11,11%</b>	<b>13.947.425,45</b>	<b>91,37%</b>
Obra 2	<b>4.585.337,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.709.092,52</b>	<b>80,89%</b>
<b>Total</b>	<b>19.849.814,45</b>	<b>1.696.570,5</b>	<b>8,55%</b>	<b>17.656.517,97</b>	<b>88,95%</b>


**Tabela III**

Medição	Valor (R\$)
51 <sup>a</sup>	0,00
2 <sup>a</sup>	0,00
3 <sup>a</sup>	255.804,71
4 <sup>a</sup>	55.063,08
5 <sup>a</sup>	221.164,01
6 <sup>a</sup>	467.655,03
7 <sup>a</sup>	454.063,57
<b>Total</b>	<b>1.453.750,40</b>


A 7<sup>a</sup> medição (período 01/06/13 a 30/06/13) apresentada pela equipe de fiscalização de obras da SECOPA, indica como valor total medido acumulado R\$ 1.696.570,5 (Tabela II), no entanto a somatória das seis medições totalizam R\$ 1.453.750,4 (Tabela III).

Valor total executado (conforme 7 <sup>a</sup> medição)	<b>R\$ 1.696.570,5</b>
Valor total medido (somatório das 7 medições)	<b>R\$ 1.453.750,4</b>
<b>Divergência de valores</b>	<b>R\$ 242.820,10</b>


**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**  
**Obra 1 : Restauração do Córrego Mané Pinto e da Av. 8 de Abril**

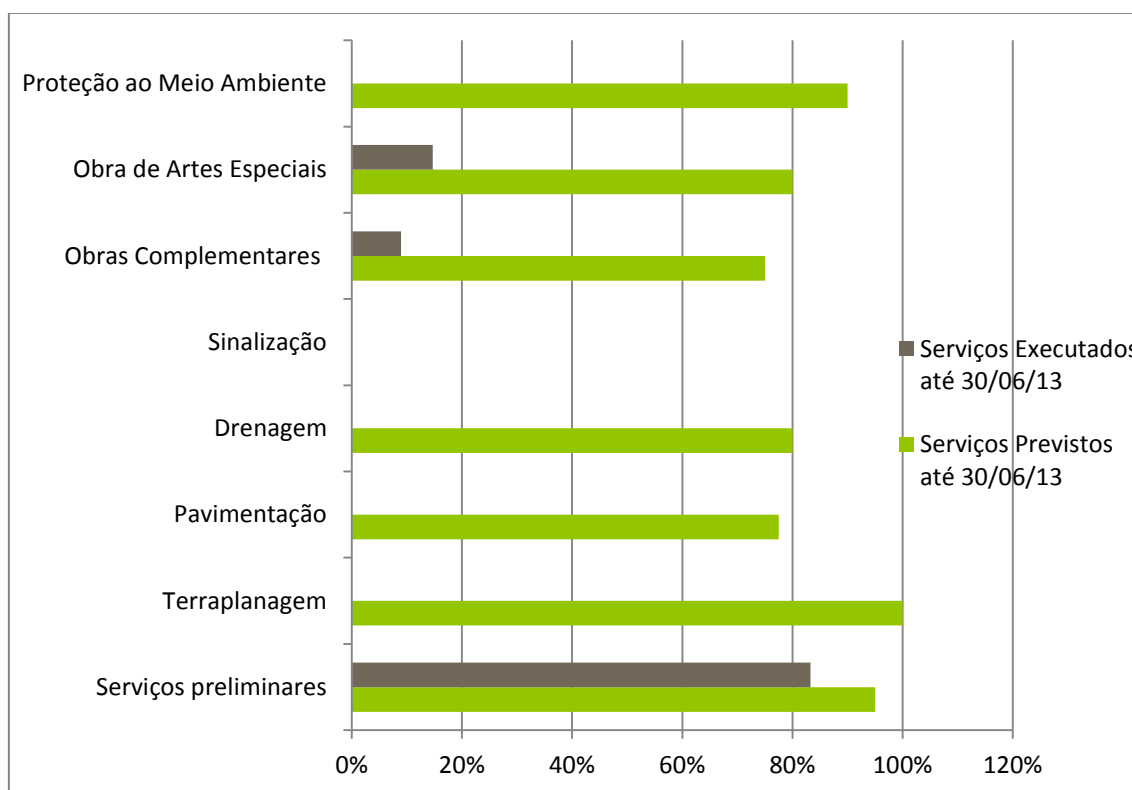

**Obra 2 : Implantação do Coletor Tronco – Emissários das Sub-bacias 16 e 17**

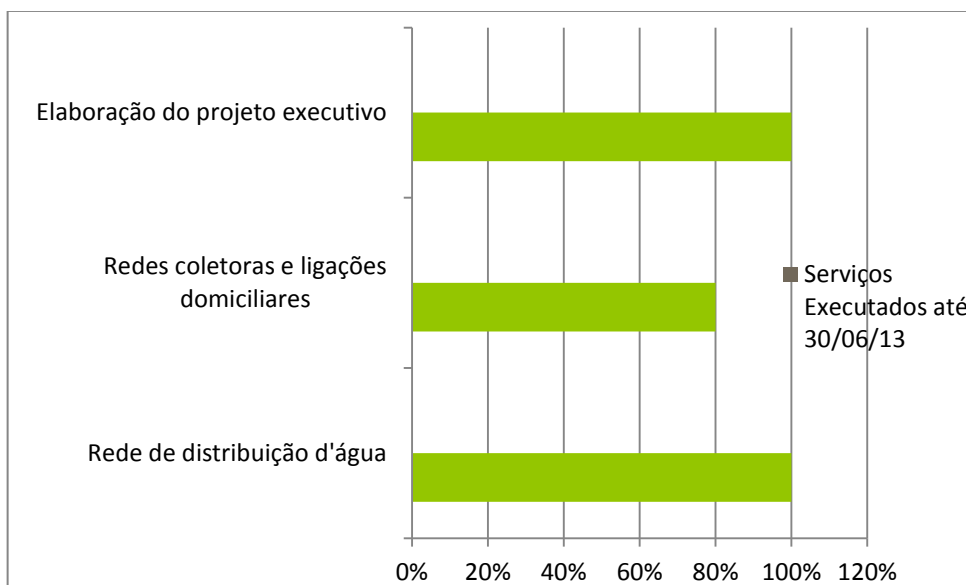

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (RESTAURAÇÃO DA AV. 8 DE ABRIL E CÓRREGO MANÉ PINTO).**

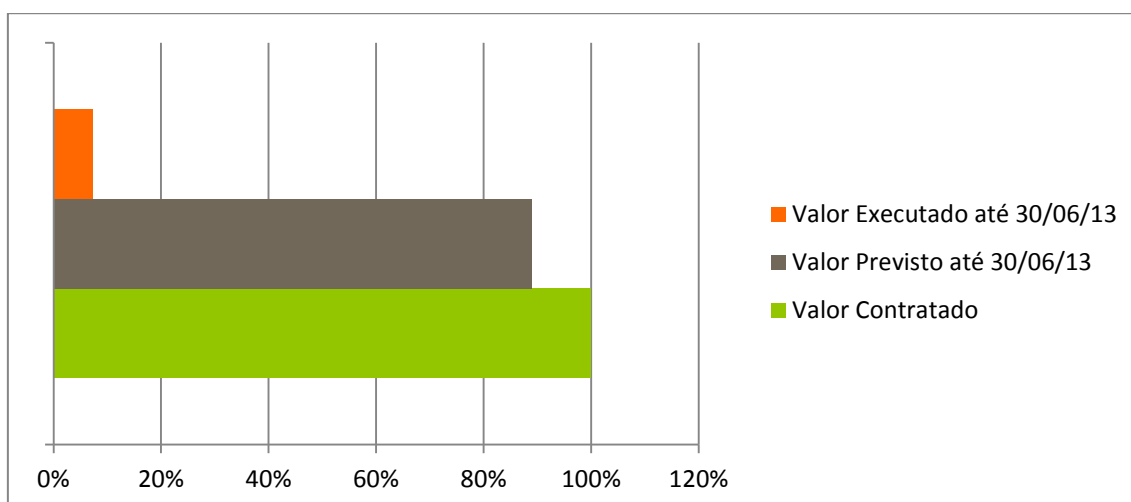

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL**

## 2.2.16. Contrato nº 65/2012

### AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON

Obra	Contratação de empresa para realização de obras e serviços de engenharia relacionados ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon.
Contrato	065/2012
Contratada	Consórcio Marechal Rondon - ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA - FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. - MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS LTDA.
Assinatura	12/12/2012
Valor	R\$ 77.289.283,09
Prazo execução	450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	510 (quinhentos e dez) dias consecutivos.
Ordem Serviço	13/12/2012
Início	13/12/2012
Conclusão	08/03/2014
Fiscal :Alexandre Zigoski	

#### Tabela I

6ª Medição (01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 77.289.283,09</b>	<b>R\$ 10.058.942,75</b>	<b>R\$ 67.230.340,34</b>	<b>13,01%</b>

#### Tabela II

##### Lote 2

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1	Gerenciamento do empreendimento	5.130.197,39	618.341,72	12,05%		
2	Serviços técnicos profissionais	104.962,84	73.063,24	69,61%		
3	Serviços preliminares	1.432.528,28	932.407,93	65,09%		
4	Infra-estrutura	143.434,58	81.190,29	56,60%		
5	Fundações e estruturas	17.815.854,54	6.192.721,16	34,76%		
6	Arquitetura e urbanismo	13.297.128,40	42.940,27	0,32%		
7	Sistemas elétricos	5.976.452,54	470.202,68	7,87%		
8	Rede telemática	2.986.607,24	111.996,85	3,75%		

9	Instalações hidrossanitárias	1.204.142,36	79.223,27	6,58%		
10	Sistemas eletromecânicos	4.738.209,94	298.802,37	6,31%		
11	Sistemas eletrônicos	7.587.770,82	0,00	0,00%		
12	Instalações de combate a incêndio	860.690,48	0,00	0,00%		
13	Serviços complementares	83.021,48	0,00	0,00%		
	<b>TOTAL</b>	<b>61.361.000,89</b>	<b>8.900.889,78</b>	<b>14,51%</b>		

#### Lote 4

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1	Serviços preliminares	19.131,70	0,00	0,00%		
2	Sistemas eletromecânicos	5.033.800,32	586.081,91	11,64%		
	<b>TOTAL</b>	<b>5.052.932,02</b>	<b>586.081,91</b>	<b>11,60%</b>		

#### Lote 5

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1	Serviços preliminares	84.025,80	0,00	0,00%		
2	Sistemas eletromecânicos	1.522.275,29	0,00	0,00%		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.606.301,09</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>		

#### Lote 6

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1	Serviços preliminares	234.914,26	0,00	0,00%		
2	Sistemas eletromecânicos	1.553.668,35	0,00	0,00%		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.788.582,61</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>		

#### Lote 9

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
2	Serviços preliminares	1.068.203,32	338.035,79	31,65%		
3	Infra-estrutura	4.697.177,34	233.935,27	4,98%		
4	Arquitetura e urbanismo	1.027.592,96	0,00	0,00%		
5	Sistemas elétricos	556.476,32	0,00	0,00%		
6	Gest – sistema gestor de estacionamento	131.016,54	0,00	0,00%		
	<b>TOTAL</b>	<b>7.480.466,48</b>	<b>571.971,06</b>	<b>7,65%</b>		


### Resumo da somatória dos lotes 2, 4, 5, 6 e 9

Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
Lote 2	61.361.000,89	8.900.889,78	14,51%	26.998.840,39	35,50%
Lote 4	5.052.932,02	586.081,91	11,60%	2.526.466,01	25,00%
Lote 5	1.606.301,09	0,00	0,00%	642.520,44	15,00%
Lote 6	1.788.582,61	0,00	0,00%	643.889,74	24,00%
Lote 9	7.480.466,48	571.971,06	7,65%	2.543.358,60	26,00%
	<b>77.289.283,09</b>	<b>10.058.942,75</b>	<b>13,01%</b>	<b>33.355.075,18</b>	<b>43,16%</b>


### Tabela III

Medição	Valor (R\$)
1ª	642.408,46
2ª	709.674,82
3ª	710.510,01
4ª	1.994.378,74
5ª	1.854.656,28
6ª	4.147.314,35
<b>Total</b>	<b>10.058.942,66</b>

### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

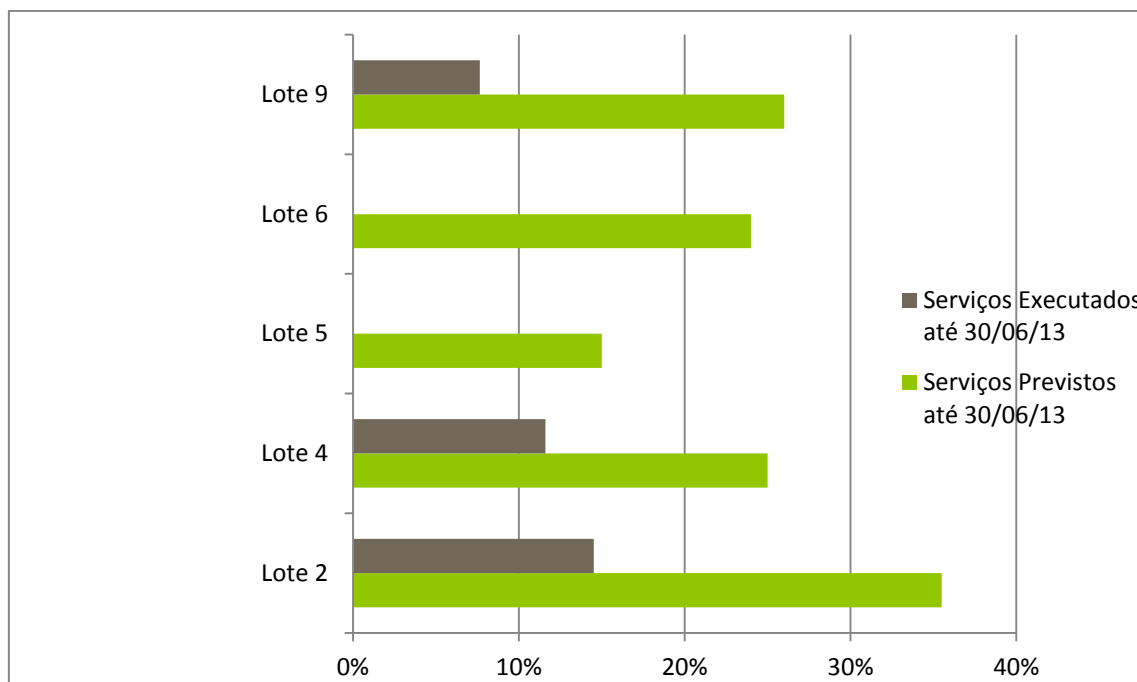

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (AEROPORTO)**

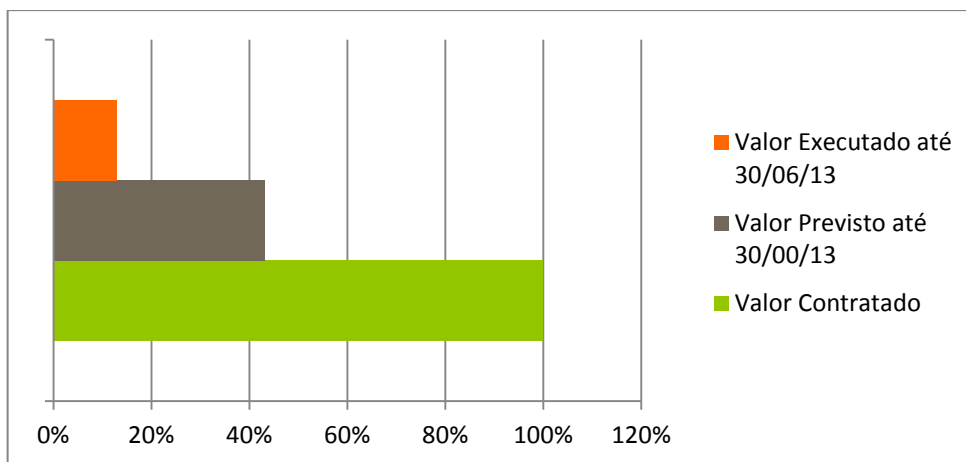

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL**

2.2.17. Contrato nº 04/2013

**AVENIDA PARQUE DO BARBADO**

Obra	Contratação de empresa de engenharia para execução da Obra de Implantação e Duplicação da Avenida Parque do Barbado, do Entr. Avenida Arquimedes P. Lima – Entr. Avenida Fernando Corrêa da Costa, com uma extensão de 1.644,77 m no município de Cuiabá-MT.
Contrato	04/2013
Contratada	CONSÓRCIO GUAXE – ENCOMIND, constituído pelas empresas: -Guaxe Construtora Ltda - ENCOMIND – Engenharia, Comércio e Indústria Ltda.
Assinatura	04/02/2012
Valor	R\$ 23.034.586,02
Prazo execução	180 (cento e oitenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	270 (duzentos e setenta) dias consecutivos.
Ordem Serviço	24/04/2013
Início	24/04/2013
Conclusão	21/10/2013
Fiscal: Jamir Silva Sampaio	

**OBRA SEM MEDIÇÃO**

## 2.2.18. Contrato nº 08/2013

### RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA

Obra	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra denominada restauração e duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima, com extensão de aproximadamente 4,42 km contemplando a duplicação e alargamentos das pontes sobre o córrego do moinho e Rio Coxipó, com extensão de 44m e 84m no município de Cuiabá-MT.
Contrato	08/2013
Contratada	CONSÓRCIO TRIMEC HYTEC, constituído pelas empresas : - TRIMEC – Construções e Terraplanagem Ltda; - HYTEC – Construções Terraplanagem e Incorporação Ltda.
Assinatura	08/02/13
Valor	R\$ 23.696.504,41
Prazo execução	360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos.
Ordem Serviço	17/04/2013
Início	17/04/2013
Conclusão	12/04/14
Fiscal: Rutílio Braz de Figueiredo	

**Tabela I**

2ª Medição (01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 23.696.504,41</b>	<b>R\$ 4.150.062,43</b>	<b>R\$ 19.546.441,98</b>	<b>17,51%</b>

**Tabela II**

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1	Serviços Preliminares / Administração Local	1.916.548,81	410.791,04	21,43%	404.585,53	21,11%
2	Terraplanagem	3.697.534,51	2.206.059,23	59,66%	1.257.161,73	34,00%
3	Pavimentação	4.480.928,66	130.073,31	2,90%	0,00	0,00%
4	Drenagem	5.288.844,92	1.301.887,14	24,62%	1.092.023,13	20,65%
5	Serviços Complementares /Sinalização	2.759.625,10	25.765,71	0,93%	4.691,36	0,17%
6	Obras de Arte Especial	5.402.050,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Projeto Executivo	150.972,00	75.486,00	50,00%	45.291,60	30,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>23.696.504,41</b>	<b>4.150.062,43</b>	<b>17,51%</b>	<b>2.803.753,35</b>	<b>11,83%</b>


**Tabela III**

Medição	Valor (R\$)
1ª	1.668.931,77
2ª	2.558.256,53
<b>Total</b>	<b>4.227.188,3</b>


A 2ª medição (período 01/06/13 a 30/06/13) apresentada pela equipe de fiscalização de obras da SECOPA indica como valor total acumulado **R\$ 4.150.062,43** (Tabela II), no entanto o somatório das seis medições totaliza **R\$ 4.227.188,3** (Tabela III).

Valor total executado (conforme 2ª medição)	<b>R\$ 4.150.062,43</b>
Valor total medido (somatório das 2 medições)	<b>R\$ 4.227.188,3</b>
<b>Divergência de valores</b>	<b>R\$ 77.125,87</b>

#### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

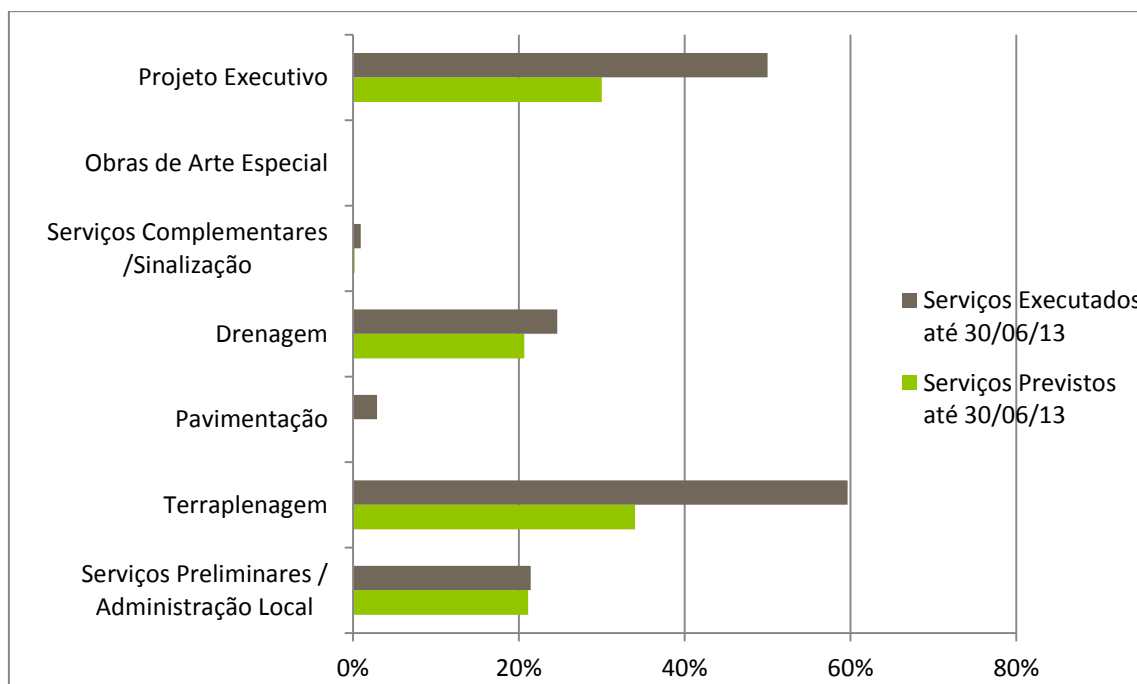

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO ARQUIMEDES P. LIMA)**

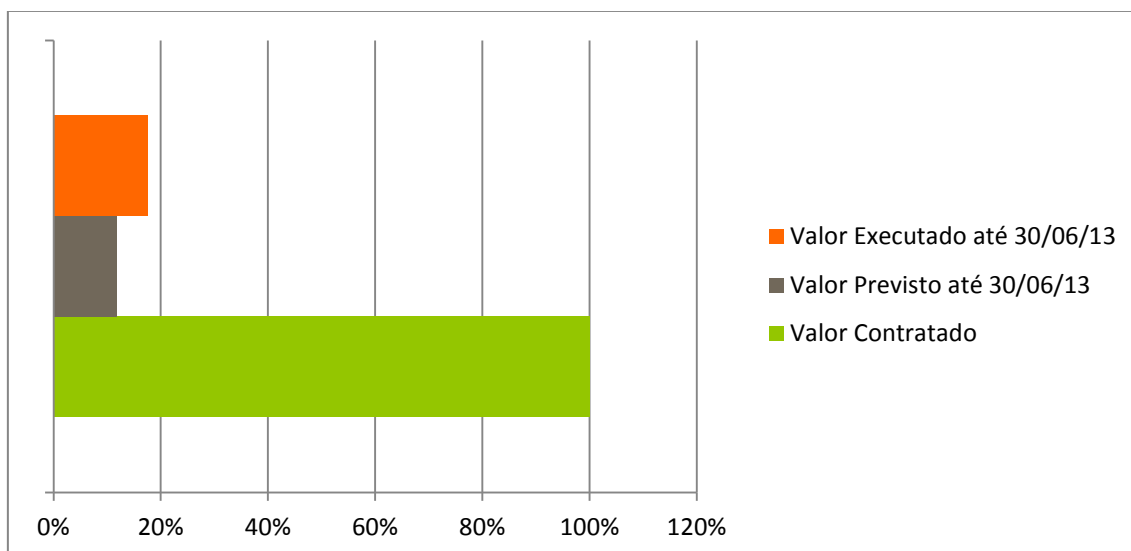

**OBRA SEM ATRASO**

2.2.19. Contrato nº 13/2013

**CONSTRUÇÃO DO CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO – COT UFMT**

Obra	Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treinamento da UFMT, no município de Cuiabá – MT, com área total construída de 5.438,06 m <sup>2</sup> , contemplando fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros serviços afins e correlatos previsto em projeto.
Contrato	13/2013
Contratada	Consórcio Campus Universitário – constituído pelas empresas : - ENEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA; - TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA;
Assinatura	01/03/13
Valor	R\$ 15.860.570,47
Prazo execução	300 (trezentos) dias consecutivos.
Prazo vigência	390 (trezentos e noventa) dias consecutivos.
Ordem Serviço	04/03/2013
Início	04/03/2013

Conclusão	29/12/13
Fiscal : Mychel Ferreira da Silva Julia Martinaitis Gonçalves	

### Tabela I

2ª Medição (período 30/04/13 a 17/07/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 15.860.570,47</b>	<b>R\$ 676.623,33</b>	<b>R\$ 15.183.947,14</b>	<b>4,27%</b>


### Tabela II

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.	Serviços Preliminares	602.482,88	322.547,13	53,54%	386.191,53	64,10%
2.	Campo de Futebol	1.218.252,82	1.230,00	0,10%	201.499,02	16,54%
3.	Pista de Atletismo	3.301.547,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.	Construção Edificação Arquibancadas	7.536.268,35	344.148,64	4,57%	1.632.355,72	21,66%
5.	Instalação Hidrosanitária da Edificação	302.350,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.	Instalação de Combate a Incêndio	93.945,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.	Instalação Elétrica da Edificação	536.774,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.	Entrada Energia e Iluminação do Campo	566.847,36	0,00	0,00%	96.647,47	17,05%
9.	Serviços Complementares	1.702.101,13	R\$ 8.697,56	0,51%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>15.860.570,47</b>	<b>R\$ 676.623,33</b>	<b>4,27%</b>	<b>2.316.693,74</b>	<b>14,61%</b>


### Tabela III

Medição	Valor (R\$)
1ª	192.254,90
2ª	484.368,43
<b>Total</b>	<b>676.623,33</b>

### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

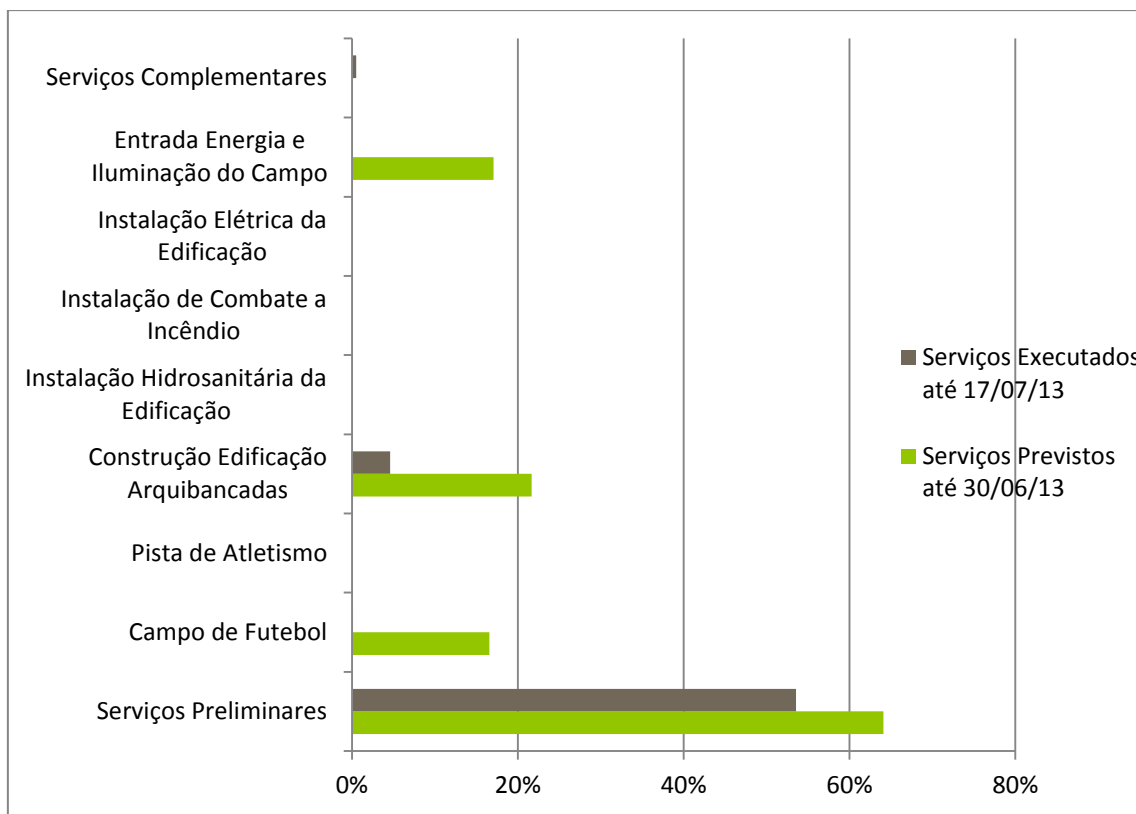

### DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (COT – UFMT).

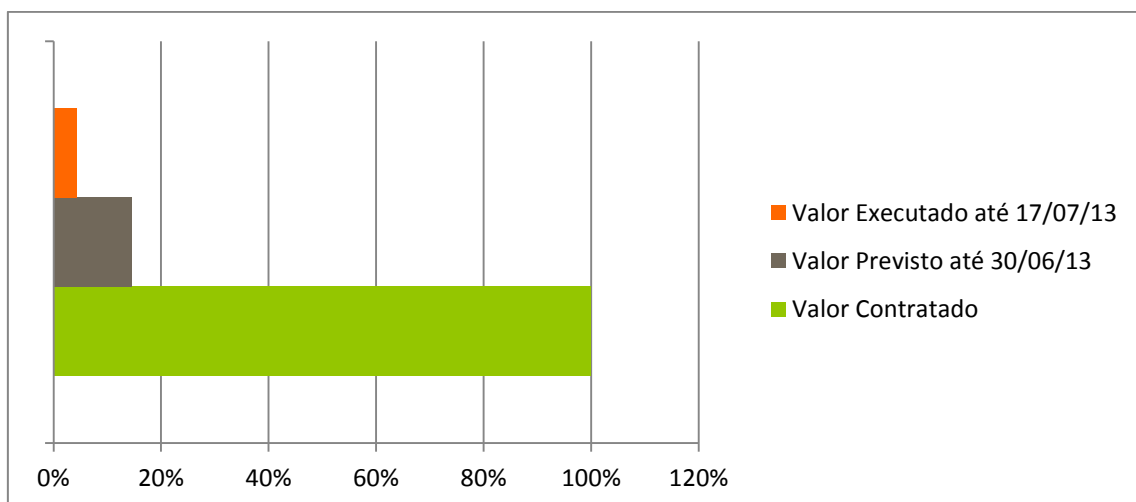

### OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL

## 2.2.20. Contrato nº 15/2013

### REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA– SECOPA

Obra	Contratação de empresa de engenharia para execução da Reforma de Quadra Poliestportiva totalizando 1.082,30 m <sup>2</sup> , localizada na Rua José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés), nº 510, SECOPA – Duque de Caxias, no Município de Cuiabá-MT.
Contrato	015/2013
Contratada	X Nova Fronteira Construções LTDA – EPP
Assinatura	09/04/13
Valor original	R\$ 147.835,64
Prazo execução	90 (noventa) dias consecutivos.
Prazo vigência	120 (cento e vinte) dias consecutivos.
Ordem Serviço	09/04/13
Início	09/04/13
Conclusão	<b>08/07/13</b>
Fiscal : Renan Contiero de Alencar.	

#### Tabela I

Medição Final (período 01/06/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 147.835,64</b>	<b>R\$ 147.835,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,00%</b>

#### Tabela II


Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Administração da Obra / Serviços preliminares	6.399,77	6.399,77	100,00%	6.399,77	100,00%
2.0	Demolições e Retiradas	5.656,31	5.656,31	100,00%	5.656,31	100,00%
3.0	Movimento de Solo – Infra Estrutura	29.694,79	29.694,79	100,00%	29.694,79	100,00%
4.0	Elemento de Vedação (Alvenaria)	3.342,84	3.342,84	100,00%	3.342,84	100,00%
5.0	Revestimento de Parede	2.342,06	2.342,06	100,00%	2.342,06	100,00%
6.0	Pintura	16.550,81	16.550,81	100,00%	16.550,81	100,00%
7.0	Instalação Elétrica	7.521,75	7.521,75	100,00%	7.521,75	100,00%

8.0	Serviços Complementares	73.652,63	73.652,63	100,00%	73.652,63	100,00%
9.0	Limpeza	2.674,68	2.674,68	100,00%	2.674,68	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>147.835,64</b>	<b>147.835,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.835,64</b>	<b>100,00%</b>


**Tabela III**

Medição	Valor (R\$)
1 <sup>a</sup>	36.675,42
2 <sup>a</sup>	80.239,22
3 <sup>a</sup>	30.921,00
<b>Total</b>	<b>147.835,64</b>

**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**

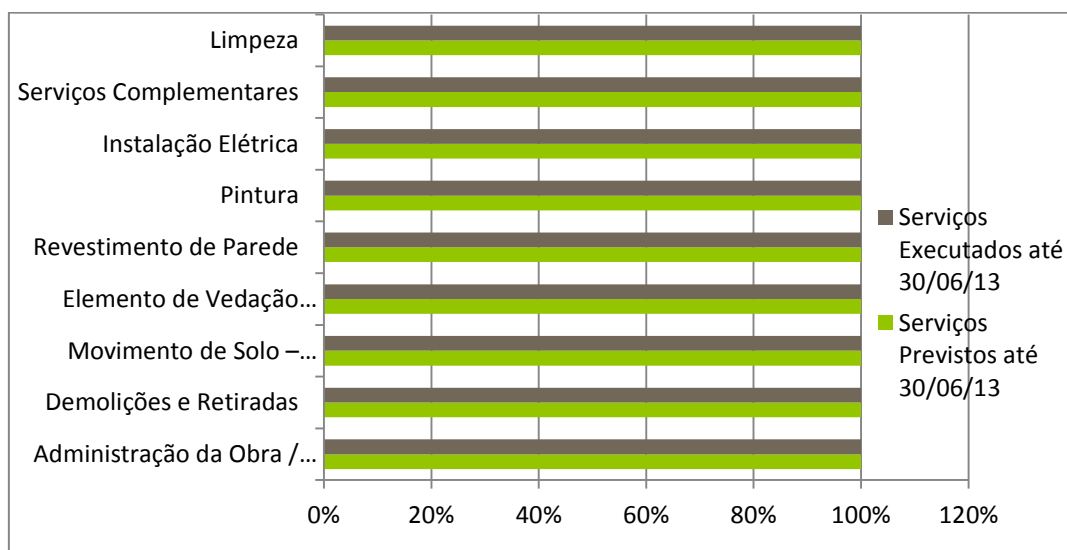

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA SECOPA.**

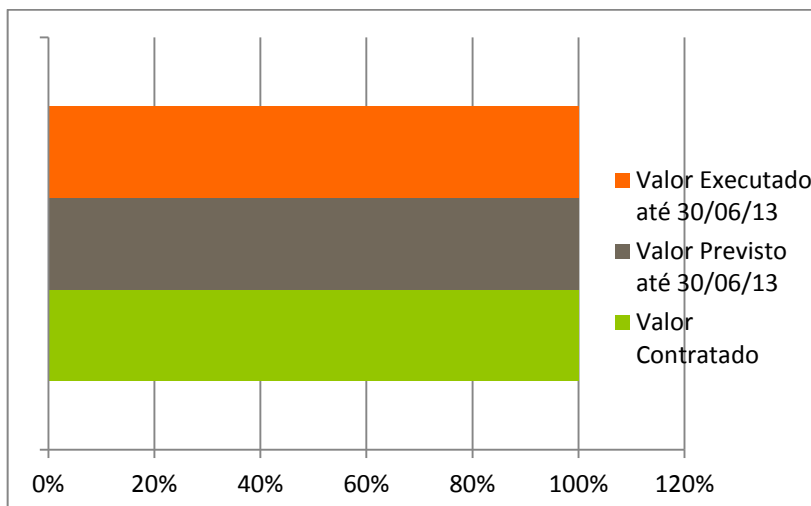

**OBRA COM MEDIÇÃO FINAL – AGUARDANDO TERMO DE RECEBIMENTO**

2.2.21. Contrato nº 17/2013

**TRINCHEIRA SANTA ROSA**

Obra	“Trincheira Santa Rosa“. Rodovia BR-163/364/070/MT; Trecho Divisa MS/MT - Divisa MT/PA; Sub-trecho Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do Pantanal – Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha); Segmento Km 331,4 – 339,20 (7,8 Km); extensão 2,48 km; Código do PNV: Código do PNV - 163BMT0710-163BMT0715 / 364BMT0795–364BMT0800 / 070BMT0470–070BMT0490;Natureza dos serviços: Obra de Arte Especial;
Contrato	017/2013
Contratada	CAMARGO CAMPOS S. A. ENGENHARIA E COMÉRCIO
Assinatura	23/04/13
Valor	R\$ 22.992.469,43
Prazo execução	240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	270 (duzentos e setenta) dias consecutivos.
Ordem Serviço	23/04/13
Início	23/04/13

Conclusão	19/12/13
Fiscal: Lauro Pepiliasco	

### Tabela I

1ª Medição (período 23/04/13 a 23/05/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 22.992.469,43</b>	<b>R\$ 2.998.534,55</b>	<b>R\$ 19.993.934,88</b>	<b>13,04%</b>


### Tabela II

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	461.095,31	100.074,02	21,70%	314.928,10	68,30%
2.0	Terraplenagem	560.040,00	61.693,44	11,02%	168.012,00	30,00%
3.0	Pavimentação	5.401.597,94	54.728,63	1,01%	810.239,69	15,00%
4.0	Drenagem	2.695.069,31	159.989,59	5,94%	539.013,86	20,00%
5.0	Sinalização	213.616,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	Obras Complementares	413.031,14	6.556,83	1,59%	47.911,61	11,60%
7.0	Obras de Artes Especiais	13.183.580,12	2.615.492,04	19,84%	4.416.499,34	33,50%
8.0	Proteção ao meio ambiente	64.438,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>22.992.469,43</b>	<b>2.998.534,55</b>	<b>13,04%</b>	<b>6.296.604,6</b>	<b>27,39%</b>


### Tabela III

Medição	Valor (R\$)
1ª	2.998.534,55
<b>Total</b>	<b>2.998.534,55</b>

**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**

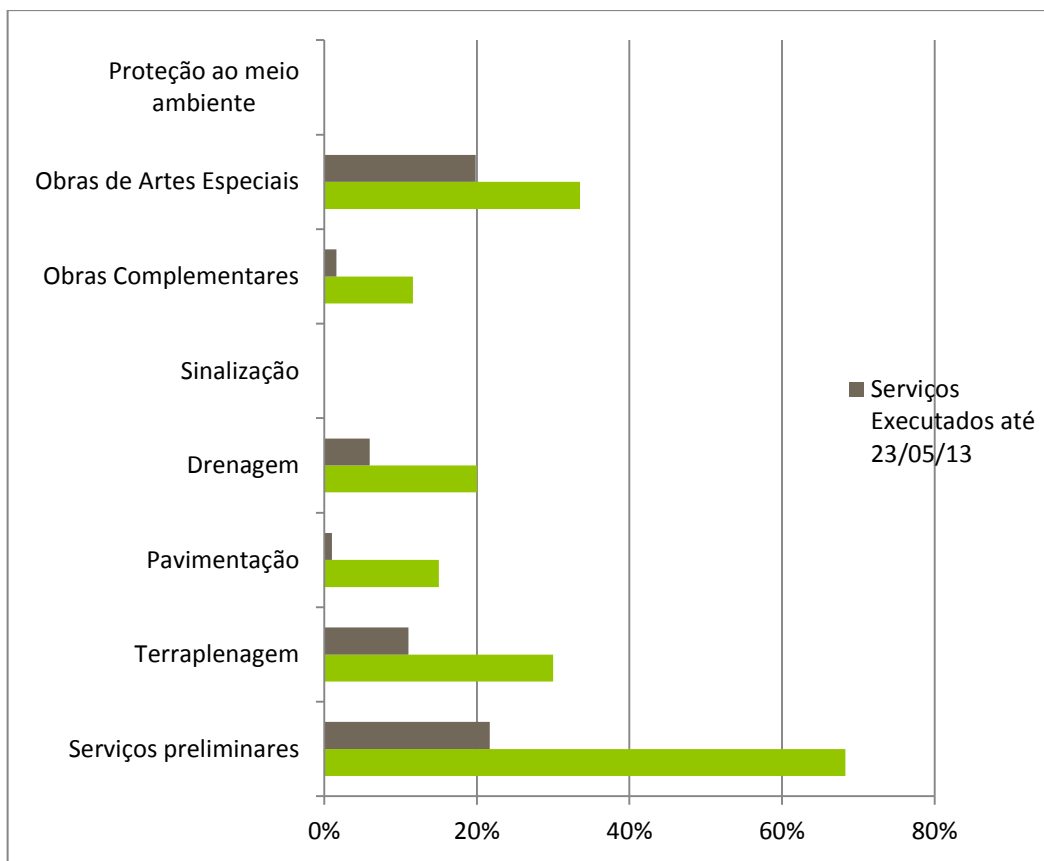

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA SANTA ROSA)**

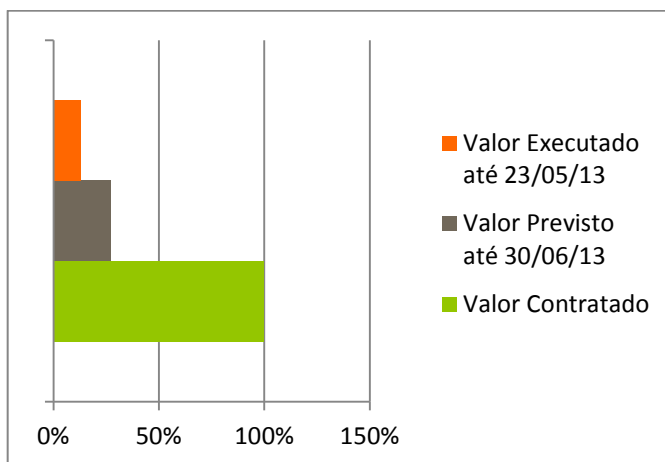

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL**

**Tribunal de Contas de Mato Grosso**

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo  
Cuiabá-MT - CEP 78049-915 – [www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)

## 2.2.22. Contrato nº 18/2013

### TRINCHEIRA SANTA ISABEL

Obra	“Trincheira Santa Isabel”. RODOVIA – BR-163/364/070/MT; TRECHO – Divisa MS/MT – Divisa MT/PA; SUBTRECHO – Av. Miguel Sutil (Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha – Entr. Rod. Mário Andreazza MT-444); SEGMENTO – (KM 331,4 – KM 3339,20 = 7,80 KM); EXTENSÃO - 2,32 km; CÓDIGO DO PNV - 163BMT0710 - 163BMT0715 / 364BMT0795–364BMT0800 / 070BMT0470 –070BMT0490; NATUREZA DOS SERVIÇOS – Obra de Arte Especial.
Contrato	018/2013
Contratada	MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA
Assinatura	24/04/13
Valor	R\$ 19.103.344,35
Prazo execução	240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.
Prazo vigência	270 (duzentos e setenta) dias consecutivos.
Ordem Serviço	24/04/13
Início	24/04/13
Conclusão	20/12/13
Fiscal: Gamaliel Cruz Soares	

#### Tabela I

2ª Medição (período 26/05/13 a 25/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 19.103.344,35</b>	<b>R\$ 2.854.615,51</b>	<b>R\$ 16.248.728,84</b>	<b>14,94%</b>


#### Tabela II

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	591.419,12	366.579,16	61,98%	539.374,24	91,20%
2.0	Terraplenagem	496.272,16	19.477,11	3,92%	247.143,54	49,80%
3.0	Pavimentação	4.831.382,49	41.899,55	0,87%	0,00	0,00%
4.0	Drenagem	3.605.675,40	1.053.667,17	29,22%	2.055.234,98	57,00%
5.0	Sinalização	221.737,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	Obras Complementares	569.370,84	5.468,53	0,96%	85.975,00	15,10%
7.0	Obras de Artes Especiais	8.717.258,79	1.367.523,99	15,69%	2.571.591,34	29,50%
8.0	Proteção ao meio ambiente	70.227,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>19.103.343,64</b>	<b>2.854.615,51</b>	<b>14,94%</b>	<b>5.499.319,1</b>	<b>28,79%</b>


**Tabela III**

Medição	Valor (R\$)
1ª	1.613.122,57
2ª	1.241.492,94
<b>Total</b>	<b>2.854.615,51</b>

**DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS**

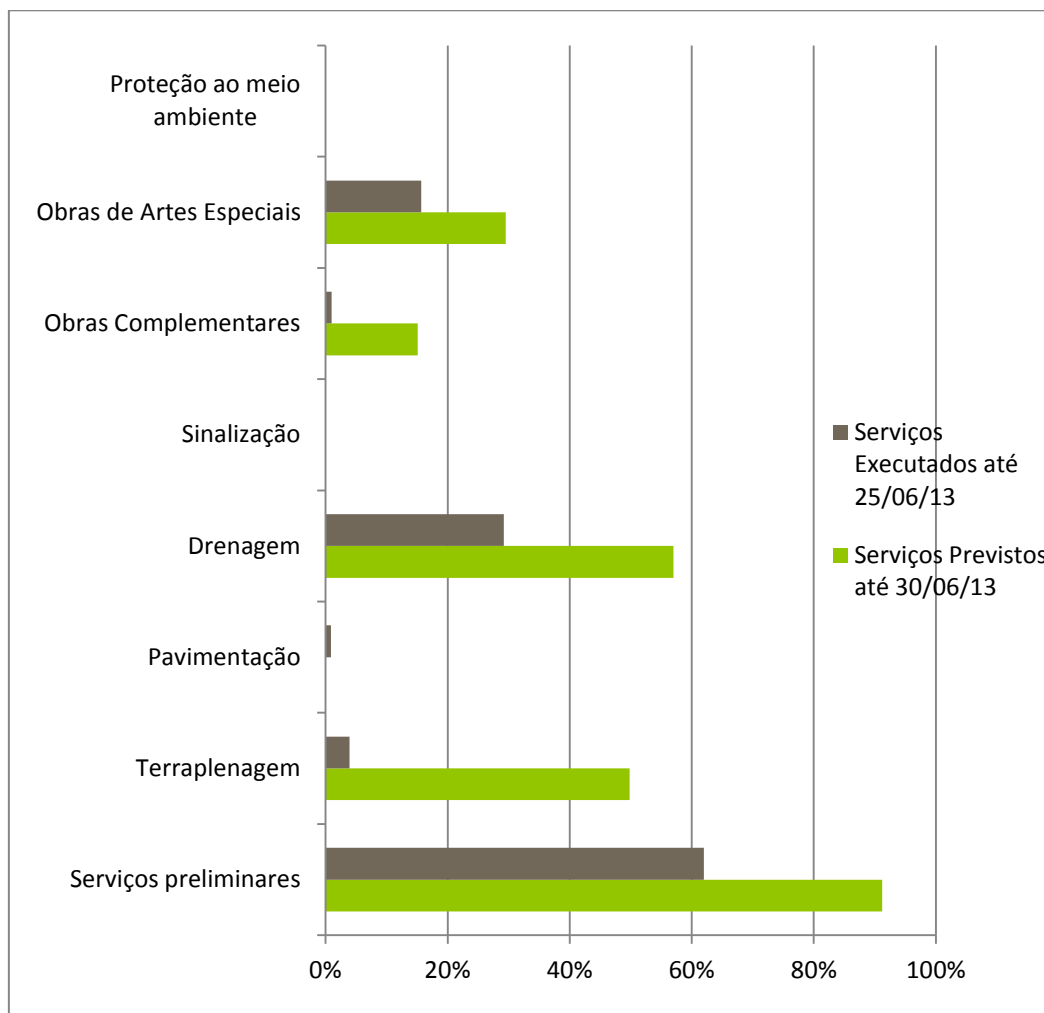

**DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA SANTA ISABEL)**

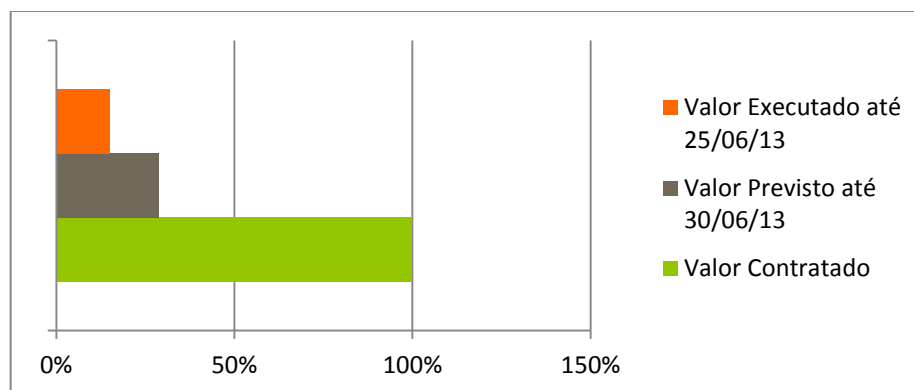

**OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL.**

2.2.24. Contrato nº 19/2013

**TRINCHEIRA MÁRIO ANDREAZZA**

Obra	“Trincheira Mário Andreezza”. RODOVIA – BR-163/364/070/MT; TRECHO – Divisa MS/MT – Divisa MT/PA; SUBTRECHO – Av. Miguel Sutil (Entr. Centro de Eventos do Pantanal – Entr. Rua Gal. Ramiro de Noronha); SEGMENTO – (KM 331,4 – KM 3339,20 = 7,80 KM); EXTENSÃO - 2,48 km; CÓDIGO DO PNV - 163BMT0710-163BMT0715 / 364BMT0795–364BMT0800 / 070BMT0470 –070BMT0490; NATUREZA DOS SERVIÇOS – Obra de Arte Especial;
Contrato	019/2013
Contratada	MÉTRICA CONSTRUÇÕES LTDA
Assinatura	24/04/13
Valor	R\$ 1.694.002,60
Prazo execução	90 (noventa) dias consecutivos.
Prazo vigência	120 (cento e vinte) dias consecutivos.
Ordem Serviço	24/04/13
Início	24/04/13
Conclusão	<b>23/07/13</b>
Fiscal	Gamaliel Cruz Soares

**Tabela I**

2ª Medição (período 26/05/13 a 30/06/13)			
Valor contratual	Valor acumulado	Saldo contratual	% executado
<b>R\$ 1.694.002,60</b>	<b>R\$ 933.524,52</b>	<b>R\$ 760.478,08</b>	<b>55,11%</b>


**Tabela II**

Item	Discriminação	Contratado (R\$)	Executado (R\$)	% executado	Previsto (R\$)	% previsto
1.0	Serviços preliminares	57.776,14	44.598,21	77,19%	57.776,14	100,00%
2.0	Terraplenagem	60.931,02	60.931,00	100,00%	60.931,02	100,00%
3.0	Pavimentação	646.253,18	110.782,53	17,14%	167.379,57	25,9%
4.0	Drenagem	126.048,59	106.798,06	84,73%	126.048,59	100,00%
5.0	Sinalização	62.980,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	Obras de Artes Especiais	702.291,31	582.507,53	82,94%	695.268,40	99,00%
7.0	Proteção ao meio ambiente	37.722,13	27.907,19	73,98%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.694.002,6</b>	<b>933.524,52</b>	<b>55,11%</b>	<b>1.107.403,72</b>	<b>65,37%</b>


**Tabela III**

Medição	Valor (R\$)
1ª	623.601,89
2ª	309.922,63
<b>Total</b>	<b>933.524,52</b>

### DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS X SERVIÇOS EXECUTADOS

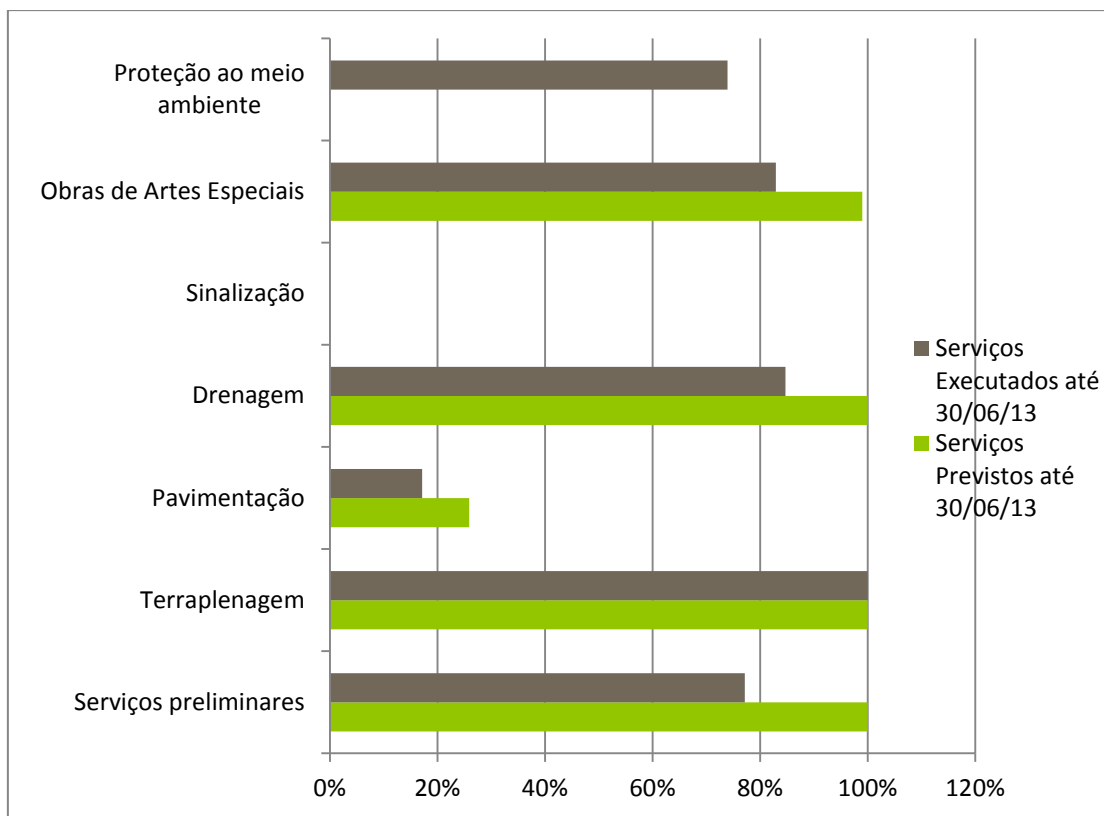

### DEMONSTRATIVO : VALOR PREVISTO X VALOR EXECUTADO (TRINCHEIRA MÁRIO ANDREAZZA)

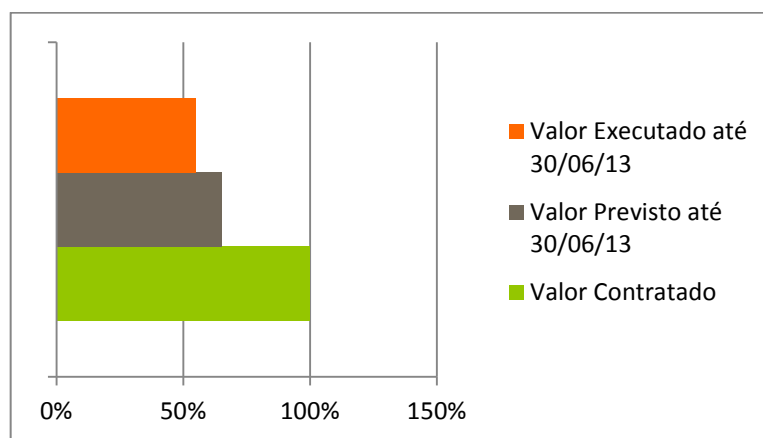

### OBRA ATRASADA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ORIGINAL

### 2.3. Obras ainda não iniciadas, em licitação e a licitar

Além dessas obras em andamento, estão previstas as seguintes obras ainda não iniciadas, com licitação em andamento ou com licitação ainda não iniciada.

	<b>Obras a licitar, com licitação em andamento ou não iniciadas</b>
1	Conclusão da Complementação da pavimentação da Av. Jurumirim e entorno (contrato anterior rescindido)
2	Construção do FIFA FanFest
4	Obras complementares na Arena Pantanal
5	Estacionamento de apoio à Arena Pantanal (Terminal Atacadista do Verdão)
6	Estacionamento remoto na Av. Miguel Sutil (Círculo Militar)
7	Iluminação pública das obras de travessia urbana de Cuiabá e Várzea Grande

### 3. Conclusões

3.1. Das 27 obras analisadas neste relatório, seis foram concluídas. Das restantes uma não apresenta atraso, nove apresentam atraso de até 60 dias, sete apresentam atrasos entre 60 e 180 dias, e quatro apresentam atraso superior a 180 dias, conforme quadro a seguir:

Situação	Quantidade de obras
Concluída*	6
Sem atraso	1

Atraso até 30 dias	4
Atraso entre 30 e 60 dias	5
Atraso ente 60 e 90 dias	2
Atraso ente 90 e 120 dias	3
Atraso entre 120 e 180 dias	2
Atraso acima de 180 dias	4
<b>Total</b>	<b>27</b>

\* Entende-se como concluída a obra com medição final emitida

3.2. O relatório anterior mostrou a situação das obras em 31/05/2013 com a execução de 51,06% das obras em andamento (excluído o VLT). No presente relatório esse percentual passou a ser de 55,19%. Observa-se que o ritmo atual de execução dos serviços precisa ser incrementado para a maioria das obras.

3.3. Observa-se que, das 27 obras acompanhadas, 16 tem atrasos superiores a 30 dias e seus cronogramas estão distantes da realidade, dificultando uma fiscalização efetiva. É Necessário que sejam estabelecidos cronogramas de recuperação de prazo para que a fiscalização das obras disponha de instrumentos para cobrar ações imediatas e efetivas por parte dos contratados.

3.4. Na tabela abaixo são apresentadas as medições dos últimos cinco meses de algumas obras que apresentam atrasos elevados. Além destas obras, foram incluídos na tabela dados referentes à Arena Pantanal.

Contrato	Valor contratual (R\$)	Valor medido nos meses de 2013 (R\$)					Atraso (dias)
		fevereiro	março	abril	maio	junho	
009/2010	420.113.185,74	13.000.945,44	19.016.511,40	29.661.699,11	31.449.500,69	31.375.518,59	30 a 60
		3,09%	4,53%	7,06%	7,49%	7,47%	
023/2012	46.673.356,27	2.237.087,34	2.043.217,98	2.349.111,79	2.493.549,35	3.670.660,70	180 a 210
		4,79%	4,38%	5,03%	5,34%	7,86%	
037/2012	1.477.617.277,15	126.498.152,60	9.570.740,71	5.990.741,56	98.438.090,07	24.620.373,57	180 a 210
		8,56%	0,65%	0,41%	6,66%	1,67%	
055/2012	25.535.184,42	324.262,28	109.567,29	237.999,63	705.469,72	1.248.067,49	210 a 240
		1,27%	0,43%	0,93%	2,76%	4,89%	
060/2012	10.168.145,03	0,00	58.431,52	304.248,55	509.528,72	423.748,95	150 a 180
		0,00%	0,57%	2,99%	5,01%	4,17%	
063/2012	19.849.814,45	0,00	255.804,71	55.063,08	221.164,01	467.655,03	150 a 180
		0,00%	1,29%	0,28%	1,11%	2,36%	

3.5. Na construção da Arena Pantanal foram medidos R\$ 31.375.518,59 no mês de junho. Se este ritmo for mantido, o que vem ocorrendo desde abril, o contrato 009/2010 estará concluído até outubro de 2013

3.6 Foi celebrado contrato (026/2013) para a execução dos serviços remanescentes da Arena pantanal (sistemas de telecomunicações, sistemas de TV, sistemas de segurança, sistema de sonorização, sistema de automação, etc.). O prazo de execução previsto no contrato é de 180 dias e a ordem de serviço foi emitida em 19/06/2013.

3.7 Referente à obra da Arena Multiuso, não foi cumprido determinado no Acórdão 4118/2011 que trata das contas anuais de gestão do exercício de 2010 da Agecopa que determinava a retificação do 4º termo aditivo e adoção de diversas medidas para corrigir pagamento indevido, que apresentou a

seguinte evolução:

Ocasão	Montante medido em desacordo com o Acórdão 4118/2011 (R\$)
Acórdão	16.614.931,02
Até 31ª medição	35.310.791,22
Até 33ª medição	25.430.892,52
Até 35ª medição	24.408.478,74
Até 36ª medição	21.712.810,41
Até 37ª medição	12.287.228,13
Até 38ª medição	7.338.471,83

Apesar de ter ocorrido redução no montante medido em desacordo com o referido Acórdão devido ao avanço na montagem da estrutura de concreto e metálica, ainda restam R\$ 7.338.471,83 referentes a peças adquiridas e ou fabricadas e ainda não montadas que só serão amortizadas quando forem concluídos os serviços de montagem da estrutura metálica.

3.8 Atenção especial deve ser dada ao COT da Barra do Pari e ao COT da UFMT para que sejam finalizadas dentro do prazo previsto.

3.9 Constataram-se divergências do valor acumulado das medições dos contratos 09/2010, 25/2012, 37/2012, 40/2012, 42/2012, 49/2012, 60/2012, 063/2012, 08/2013. Recomenda-se que a SECOPA faça as correções necessárias e adote rotinas de conferência das medições.

Recomenda-se a V. Exa. que determine que o Gestor da SECOPA informe as providências que estão sendo tomadas para compensar os atrasos constatados.

A critério de V.Exa., cópia deste relatório pode ser encaminhada para o Governador do Estado e para Assembleia Legislativa com a ressalva de que o Gestor da SECOPA deve apresentar um Plano de Providências para compensar os atrasos e para evitar outros atrasos.

É o relatório.

André Luiz Souza Ramos  
Auditor Público Externo

Waldir Marinho da Silva  
Técnico de Controle Público Externo

Yuri Garcia Silva  
Auditor Público Externo
