

Anexo XII

Processo de Pagamento da 5ª
medição P.I. e Reajustamento



NEX

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 317220/2016

Data: 01/07/2016 10:20

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA


Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: 5 (QUINTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA REFERENTE O IC 3
88/2014, DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA MT-2

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



932

16.003.535-2 44.90.51 137

25/04/17



MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Diogo Menezes Souza

Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas.
Nesta,

SUBSTITUÍDO

Assunto: 5ª (Quinta)

Ref. I.C. nº: 388/2014/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 5ª (Quinta), dos serviços de Revitalização de Rodovia Pavimentada, na Rodovia: MT - 246 - Trecho: Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres, Extensão: 45,245 Km após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato no Período: 20/junho/2016 a 30/junho/2016


5ª (Quinta)

..... Período 20/06/2016 a 30/06/2016

Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

Atenciosamente,

[Assinatura]
Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SINFRA
RNP Nº 121164774-9






• Contratos Revitalização de Rodovias

SUBSTITUÍDO

- Programa:
- Rodovia: MT - 246
- Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
- Extensão: 45,245 Km
- Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
- Instrumento Contratual: I.C. Nº : 388/2014/00/00-SETPU
- Processo Original: Nº: 511984/2013/SETPU
- Prazo Contratual: 1246 Dias Consecutivos
- Término Previsto: 27/02/2018
- Ordem de I. de Serviços: 01/10/2014
- Data da Assinatura: 23/09/2014
- Data da Publicação: 23/09/2014
- Metas – Exercício: 26,00%
- Natureza dos Serviços: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente
- Valor Empenhado: R\$ 1.599.319,80
- Valor Contratual (PI): R\$ 18.540.312,52
- Edital nº: CP 030/2014


Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO

FISCALIZAÇÃO:

Rodovia MT - 246
Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Sub-Trecho: Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres
Extensão: 45,245 Km

Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Contrato Nº: I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU

Data da Assinatura: 23/09/2014

Data de Aprovação: 23/09/2014

Ordem de Serviço Nº: SUOT/O.I.S./Nº 146/2014 de 01/10/2014

Prazo: 720 Dias Consecutivos

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA

Desempenho relativo aos serviços da

5ª (Quinta) Medição Provisória

Serviços Executados entre

20 / 06 / 2016


a

30 / 06 / 2016

A) Conceitos Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

| ITEM | CONCEITO | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Excelente (0,9 à 1,0) | Bom (0,7 à 0,89) | Razoável (0,5 à 0,69) | Fraco (0,3 à 0,49) | Péssimo (0 à 0,29) |
| 1) Equipamento | | 0,80 | | | |
| 2) Pessoal | | 0,80 | | | |
| 3) Instalações | 0,90 | | | | |
| 4) Cronograma Físico | | 0,85 | | | |
| 5) Qualidade dos Serviços | 0,90 | | | | |
| 6) Atend. À Fiscalização | 0,90 | | | | |
| 7) Administração da Obra | | 0,80 | | | |

Local/Data: Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016


Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

| ITEM | Nota N | Pesos P | Produt. NxP | DESEMP. PARCIAL = $\frac{(NxP)}{10}$ 8,55 = 0,86 10 Conceito: Bom |
|---------------------------|--------|---------|-------------|--|
| 1) Equipamento | 0,80 | 1,50 | 1,20 | |
| 2) Pessoal | 0,80 | 1,50 | 1,20 | |
| 3) Instalações | 0,90 | 0,50 | 0,45 | |
| 4) Cronograma Físico | 0,85 | 2,00 | 1,70 | |
| 5) Qualidade dos Serviços | 0,90 | 3,00 | 2,70 | |
| 6) Atend. à Fiscalização | 0,90 | 1,00 | 0,90 | |
| 7) Administração da Obra | 0,80 | 0,50 | 0,40 | |
| TOTAL | | 10,00 | | |

OBSERVAÇÕES:

Local/Data: Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

C) Visto do Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas

Engº Diogo Menezes Souza
Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas

SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE GOVERNO


SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE GOVERNO

RESUMO DA MEDIÇÃO


| Obras: | | Nº Contrato | | 388/2014/00/00-SETPU | | Prazo de Execução | | 720 Dias Consecutivos | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| Rodovia/Programa: | | Data Assinatura | | 23/09/2014 | | Vr. Contratual PI | | 82 dias | | |
| Trecho: | | Publicado | | 23/09/2014 | | Vr. Acum. Médio PI | | R\$ 18.540.312,52 | | |
| Sub-trecho: | | Processo Orig | | 511984/2013/SETPU | | Vr. Acum. Programado PI | | R\$ 5.685.333,61 | | |
| Referência: | | | | | | Vr. Programado Pré-mão PI | | R\$ 5.685.333,61 | | |
| Ordem início serviço: | | | | | | | | | | |
| Período Med: | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATADA | DATA MEDIÇÃO | MÉDIA ANTERIOR | QUANTIDADE ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR CONTRATO R\$ | VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$ | % EXE |
| Acumulados: 01/10/14 a 30/06/16 | | | | | | | | | | |
| GUARE CONSTRUTORA LTDA | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ITEM: PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ITEM: LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ITEM: CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|-----|--|---------------|------------------|----------|--------------|------------|-----------|
| 1.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | m3 | | 20.348,000 | 0,000 | 11,23 | 228.508,04 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.02.905.00 | | Remoção Mecanizada de Revestimento Betuminoso | | m3 | | 81.252,000 | 0,000 | 34,46 | 2.799.943,92 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.02.240.11 | | Recomposição Camada de Base c/ Adição de Brita | | m2 | | 406.262,000 | 0,000 | 0,26 | 105.628,12 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.02.300.00 | | Imprimação | | m2 | | 406.962,000 | 63.504.885 | 0,19 | 77.322,78 | 2.189,72 | 12.085,92 |
| 5.5.02.400.51 | | Conc. Betumin. Usinado a Quente - Capa de Rolamento - AC/BC | | t | | 48.835,000 | 8.627,018 | 71,43 | 3.488.284,05 | 199.219,55 | 15.600% |
| 5.5.09.002.91 | | Transporte de Areia para CBUQ até Usina | | tkm | | 355.571,000 | 25.363,580 | 0,39 | 138.672,69 | 4.374,80 | 17,67% |
| 5.5.09.002.91 | | Transporte de Brita para reconf. base | | tkm | | 972.429,000 | 0,000 | 0,39 | 379.437,31 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.09.002.07 | | Transporte de CBUQ da Usina até a Pista | | tkm | | 1.275.582,000 | 844.774.508 | 0,64 | 816.372,48 | 189.147,80 | 66,23% |
| 5.5.09.002.07 | | Transporte de Material Renovado | | tkm | | 305.222,000 | 0,000 | 0,64 | 195.342,08 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DO ITEM: PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 394.931,87 | | | | |
| 2.0 | | LIGANTES BETUMINOSOS | | t | | 488,000 | 0,000 | 2.341,96 | 1.142.876,48 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.02.990.03 | | Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 | | t | | 488,000 | 0,000 | 85,51 | 41.728,88 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.09.009.03 | | Transporte de Asfalto Diluído CM-30 | | t | | 209,000 | 20.792 | 1.257,31 | 255.233,93 | 5.799,69 | 12,51% |
| 5.5.02.990.04 | | Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C | | t | | 209,000 | 20.792 | 85,51 | 17.358,33 | 394,03 | 12,51% |
| 5.5.09.009.04 | | Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C | | t | | 2.686,000 | 283.163 | 1.611,51 | 4.328.515,86 | 247.194,35 | 16,25% |
| 5.5.02.990.01 | | Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20 | | t | | 159.393 | 283.163 | 85,51 | 229.679,86 | 13.116,64 | 16,25% |
| 5.5.09.009.01 | | Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20 | | t | | 2.686,000 | 486.556 | 85,51 | 229.679,86 | 13.116,64 | 16,25% |
| TOTAL DO ITEM: LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | | R\$ 6.015.393,54 | | | | |
| 3.0 | | CONSERVAÇÃO | | m3 | | 344,000 | 0,000 | 19,86 | 6.831,84 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.08.302.01 | | Limpeza de Bueiro | | ha | | 36,000 | 18,160 | 3.974,57 | 143.084,52 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.08.300.01 | | Recape de Capim Colonial | | m2 | | 59.070,000 | 0,000 | 0,49 | 28.944,30 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.08.910.00 | | Capina Manual | | h | | 147,000 | 95,000 | 192,96 | 28.365,12 | 0,00 | 0,00% |
| E006 | | Motocombinador - Catapillar - 120H - (104 kw) | | m | | 2.620,000 | 0,000 | 0,60 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.08.300.01 | | Limpeza de Sarjeta e Meio Fio | | m | | 105,630 | 0,000 | 1,21 | 127,81 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.08.301.03 | | Limpeza de Descida d'água | | und | | 55,000 | 0,000 | 0,68 | 37,40 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5.08.301.03 | | Limpeza de Entrada d'água | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ITEM: CONSERVAÇÃO | | | | | | | R\$ 208.962,99 | | | | |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | R\$ 90.509,39 | | | | |

| | |
|-------------|--|
| Local/Date: | Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016 |
| |  |
| | Sérgio Antônio Carlos Tenente |
| | Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOR/SINIPA |
| | RND nº 131164774-9 |

Local/Data: Barra do Bugres/MT, 01 de julho de 2016

Eng. Antônio Carlos Tenente
Fiscal Portaria nº 041/2016/SACB/SINRA
RNP Nº 121164774-9

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|
|  <p>SINFRA Infraestrutura de Transportes</p> | | <p>1501 601 3810/0001 / 381010003 / 381010003 RER VOZ ENL EDEGAR PIAOZO ADE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 6 - SETOR A 73040-500 - CUIABÁ - MATO GROSSO</p> | | <p>MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO WWW.MT.GOV.BR</p> | | <p>RESUMO DA MEDIÇÃO</p> | | <p>388/2014/00/00-SETPU 23/09/2014 511984/2013/SETPU</p> | | <p>Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medição PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próximo PI</p> | | <p>720 Dias Consecutivos 82 dias R\$ 18.540.312,52 R\$ 5.685.323,61 R\$ 5.685.323,61 R\$ -</p> | | | | | | | |
| <p>Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA MT - 246 Trecho: Entre BR-163/164 (Trecho de Jangada) - Barra do Bugres Sub-trecho: Ponte 4 o Rio Curupira - Barra do Bugres Referência: 5ª (Quinta) Medição Provisória Ordem Início serviço: 31/07/2014 de 01/10/2014 Período Med: 20/06/2016 a 30/06/2016 Síntese: 20/06/2016 a 30/06/2016</p> | | <p>NT Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig.</p> | | <p>QUANTIDADE CONTRATO</p> | | <p>30/06/16 NÍVEL MEDIÇÃO</p> | | <p>QUANTIDADE ACUMULADO</p> | | <p>PREÇO UNITÁRIO R\$</p> | | <p>VALOR CONTRATO R\$</p> | | <p>VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$</p> | | <p>VALOR ACUMULADO R\$</p> | | <p>% D/E</p> | |
| <p>5.0 PAVIMENTAÇÃO (RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO)</p> | | <p>UNID.</p> | | <p>MEDIÇÃO ANTERIOR</p> | | <p>QUANTIDADE ACUMULADO</p> | | <p>PREÇO UNITÁRIO R\$</p> | | <p>VALOR CONTRATO R\$</p> | | <p>VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$</p> | | <p>VALOR ACUMULADO R\$</p> | | <p>% D/E</p> | | | |
| <p>5.5 02 110 00 Regularização do subleito</p> | | <p>m²</p> | | <p>3.640.000</p> | | <p>3.640.000</p> | | <p>0,48</p> | | <p>3.203,20</p> | | <p>0,00</p> | | <p>3.203,20</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 02 200 00 Sub-base solo estabilizado granul. 4' mistura</p> | | <p>m²</p> | | <p>707.200</p> | | <p>707.200</p> | | <p>13,51</p> | | <p>9.554,27</p> | | <p>0,00</p> | | <p>9.554,27</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 02 200 01 Base solo estabilizado granul. 4' mistura</p> | | <p>m²</p> | | <p>686.400</p> | | <p>686.400</p> | | <p>13,51</p> | | <p>9.273,26</p> | | <p>0,00</p> | | <p>9.273,26</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 02 300 00 Imprimação</p> | | <p>m²</p> | | <p>3.120.000</p> | | <p>3.120.000</p> | | <p>0,26</p> | | <p>811,20</p> | | <p>0,00</p> | | <p>811,20</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 02 400 00 Pintura de ligação</p> | | <p>m²</p> | | <p>3.120.000</p> | | <p>3.120.000</p> | | <p>0,19</p> | | <p>592,80</p> | | <p>0,00</p> | | <p>592,80</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 02 540 51 Conc. betumin. usinado a quente - capa de rolamento - AC/BC</p> | | <p>t</p> | | <p>374.400</p> | | <p>374.400</p> | | <p>71,43</p> | | <p>26.743,39</p> | | <p>0,00</p> | | <p>26.743,39</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 09 000 07 Transporte local base. em rodovia pavimentada</p> | | <p>t.km</p> | | <p>82.063.913</p> | | <p>82.063.913</p> | | <p>0,64</p> | | <p>52.520,90</p> | | <p>0,00</p> | | <p>52.520,90</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 02 999 03 Fornecimento de asfalto diluído CM-30</p> | | <p>t</p> | | <p>3.744</p> | | <p>3.744</p> | | <p>2.341,96</p> | | <p>8.768,29</p> | | <p>0,00</p> | | <p>8.768,29</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 09 009 03 Transporte de asfalto diluído CM-30</p> | | <p>t</p> | | <p>3.744</p> | | <p>3.744</p> | | <p>85,51</p> | | <p>320,14</p> | | <p>0,00</p> | | <p>320,14</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 02 999 05 Fornecimento de emulsão asfáltica R6-2C</p> | | <p>t</p> | | <p>1.248</p> | | <p>1.248</p> | | <p>1.257,30</p> | | <p>1.569,11</p> | | <p>0,00</p> | | <p>1.569,11</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 09 009 05 Transporte de emulsão asfáltica R6-2C</p> | | <p>t</p> | | <p>1.248</p> | | <p>1.248</p> | | <p>85,51</p> | | <p>106,71</p> | | <p>0,00</p> | | <p>106,71</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 02 999 01 Fornecimento de cimento asfáltico CAP-50/70</p> | | <p>t</p> | | <p>22.464</p> | | <p>22.464</p> | | <p>1.611,51</p> | | <p>36.200,96</p> | | <p>0,00</p> | | <p>36.200,96</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 09 009 01 Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70</p> | | <p>t</p> | | <p>22.464</p> | | <p>22.464</p> | | <p>85,51</p> | | <p>1.920,89</p> | | <p>0,00</p> | | <p>1.920,89</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>6.0 SINALIZAÇÃO</p> | | <p>TOTAL DO ITEM: PAVIMENTAÇÃO (RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO)</p> | | <p>RS 151.585,12</p> | | <p>RS 151.585,12</p> | | <p>RS 151.585,12</p> | | <p>RS 151.585,12</p> | | <p>RS 151.585,12</p> | | <p>RS 151.585,12</p> | | <p>RS 151.585,12</p> | | <p>100,00%</p> | |
| <p>4.5 06 100 21 Pintura faixa - tinta base acrílica p/2 anos</p> | | <p>m²</p> | | <p>104.400</p> | | <p>104.400</p> | | <p>15,51</p> | | <p>1.619,24</p> | | <p>0,00</p> | | <p>1.619,24</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>4.5 06 202 11 Confeção placa sinalização tot. reflexiva</p> | | <p>m²</p> | | <p>16.000</p> | | <p>16.000</p> | | <p>304,80</p> | | <p>4.876,80</p> | | <p>0,00</p> | | <p>4.876,80</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>7.0 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</p> | | <p>TOTAL DO ITEM: SINALIZAÇÃO</p> | | <p>RS 6.496,04</p> | | <p>RS 6.496,04</p> | | <p>RS 6.496,04</p> | | <p>RS 6.496,04</p> | | <p>RS 6.496,04</p> | | <p>RS 6.496,04</p> | | <p>RS 6.496,04</p> | | <p>100,00%</p> | |
| <p>5.5 01 030 00 Conformação de pastas e empastamentos</p> | | <p>m²</p> | | <p>8.135.000</p> | | <p>8.135.000</p> | | <p>2,92</p> | | <p>23.754,20</p> | | <p>0,00</p> | | <p>23.754,20</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>5.5 05 100 00 Enlaxamento (taludes de pista)</p> | | <p>m²</p> | | <p>17.234.500</p> | | <p>17.234.500</p> | | <p>8,83</p> | | <p>152.180,63</p> | | <p>0,00</p> | | <p>152.180,63</p> | | <p>100,00%</p> | | | |
| <p>TOTAL DO ITEM: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</p> | | <p>RS 175.994,83</p> | | <p>RS 175.994,83</p> | | <p>RS 175.994,83</p> | | <p>RS 175.994,83</p> | | <p>RS 175.994,83</p> | | <p>RS 175.994,83</p> | | <p>RS 175.994,83</p> | | <p>RS 175.994,83</p> | | <p>100,00%</p> | |
| <p>TOTAL ACUMULADO RS</p> | | <p>5.685.323,61</p> | | <p>5.685.323,61</p> | | <p>5.685.323,61</p> | | <p>5.685.323,61</p> | | <p>5.685.323,61</p> | | <p>5.685.323,61</p> | | <p>5.685.323,61</p> | | <p>5.685.323,61</p> | | <p>5.685.323,61</p> | |
| <p>A REDUZIR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES RS</p> | | <p>5.021.403,01</p> | | <p>5.021.403,01</p> | | <p>5.021.403,01</p> | | <p>5.021.403,01</p> | | <p>5.021.403,01</p> | | <p>5.021.403,01</p> | | <p>5.021.403,01</p> | | <p>5.021.403,01</p> | | <p>5.021.403,01</p> | |
| <p>TOTAL DESTA MEDIÇÃO RS</p> | | <p>663.970,69</p> | | <p>663.970,69</p> | | <p>663.970,69</p> | | <p>663.970,69</p> | | <p>663.970,69</p> | | <p>663.970,69</p> | | <p>663.970,69</p> | | <p>663.970,69</p> | | <p>663.970,69</p> | |
| <p>Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 663.970,69 (seiscientos e sessenta e três mil novecentos e vinte reais e sessenta centavos).</p> | | <p>Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016</p> | | <p>Engº Antônio Carlos Tenente Fiscal Portaria nº 041/2016/SACOB/SINFRA RNP Nº 121.64774-9</p> | | <p>Local/ data:</p> | | <p>Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016</p> | | <p>Local/ data:</p> | | <p>Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016</p> | | <p>Local/ data:</p> | | <p>Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016</p> | | <p>Local/ data:</p> | |

CONTROLE FINANCEIRO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

| CONTRATO | FIRMA: | GUAXE CONSTRUTORA LTDA | | | | VALOR CONTRATUAL | | ADITAMENTO | | TOTAL | | |
|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | 388/2014/00/00-SETPU | | | | R\$ 15.098.120,17 | | R\$ 3.442.192,35 | | 18.540.312,52 | | |
| Nº DO PROCESSO | DOC. | PERÍODO DA MEDIÇÃO | PRAZO DIAS CORRIDOS | | MEDIÇÕES P.I | | SERVIÇO | | FISCAL | | TOTAL GERAL | SALDO P. INICIAIS |
| | | | 720 | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | Engº Antônio Carlos Tenuta | | | |
| | 1ª Medição | 01/10/14 | a | 31/10/14 | 31 | 689 | 455.703,31 | 455.703,31 | 44.365,68 | 44.365,68 | 500.068,99 | 18.540.312,52 |
| | Paralisação | 01/11/14 | a | 21/05/15 | 202 | 487 | - | 455.703,31 | - | 44.365,68 | 500.068,99 | 18.084.609,21 |
| | 2ª Medição | 22/05/15 | a | 31/05/15 | 10 | 477 | 3.180.788,92 | 3.636.492,23 | 374.934,08 | 419.299,76 | 3.555.723,00 | 14.903.820,29 |
| | 3ª Medição | 01/06/15 | a | 30/06/15 | 30 | 447 | 261.403,43 | 3.897.895,66 | 27.828,37 | 447.128,13 | 289.231,80 | 14.642.416,86 |
| | 4ª Medição | 01/07/15 | a | 31/07/15 | 31 | 416 | 1.123.507,35 | 5.021.403,01 | 89.832,93 | 536.961,06 | 1.213.340,28 | 13.518.909,51 |
| | Paralisação | 01/08/15 | a | 19/06/16 | 324 | 92 | - | 5.021.403,01 | - | 536.961,06 | 5.558.364,07 | 13.518.909,51 |
| | 5ª Medição | 20/06/16 | a | 30/06/16 | 11 | 81 | 663.920,60 | 5.685.323,61 | 146.822,32 | 683.783,38 | 810.742,92 | 12.854.988,91 |

Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

Engª Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

Obra

Rodovia MT - 246

| | |
|------------|---|
| Trcheo | Entr ^a BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres |
| Sub-trecho | Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres |

Referência 5ª (Quinta) Medição Provisória

Ord.Inf.c.serviço

Período: 20/06/2016 a 30/06/2016

Firma: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

I.C. N°

388/2014/00/00-SETPU

[illegible]

Local e data:
Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SACB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

SUEF II
Fls. 12
Ass. A

[illegible]

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTE

[illegible]

Local/Data: Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016


Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

Engº Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

RODOVIA MT - 246

Rodovia: MT - 246
Trecho: Entr. BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Sub-trecho: Ponte s/ o Rio Curupira - Barra do Bugres
Extensão: 45,245 Km
Referência: 5ª (Quinta) Medição Provisória

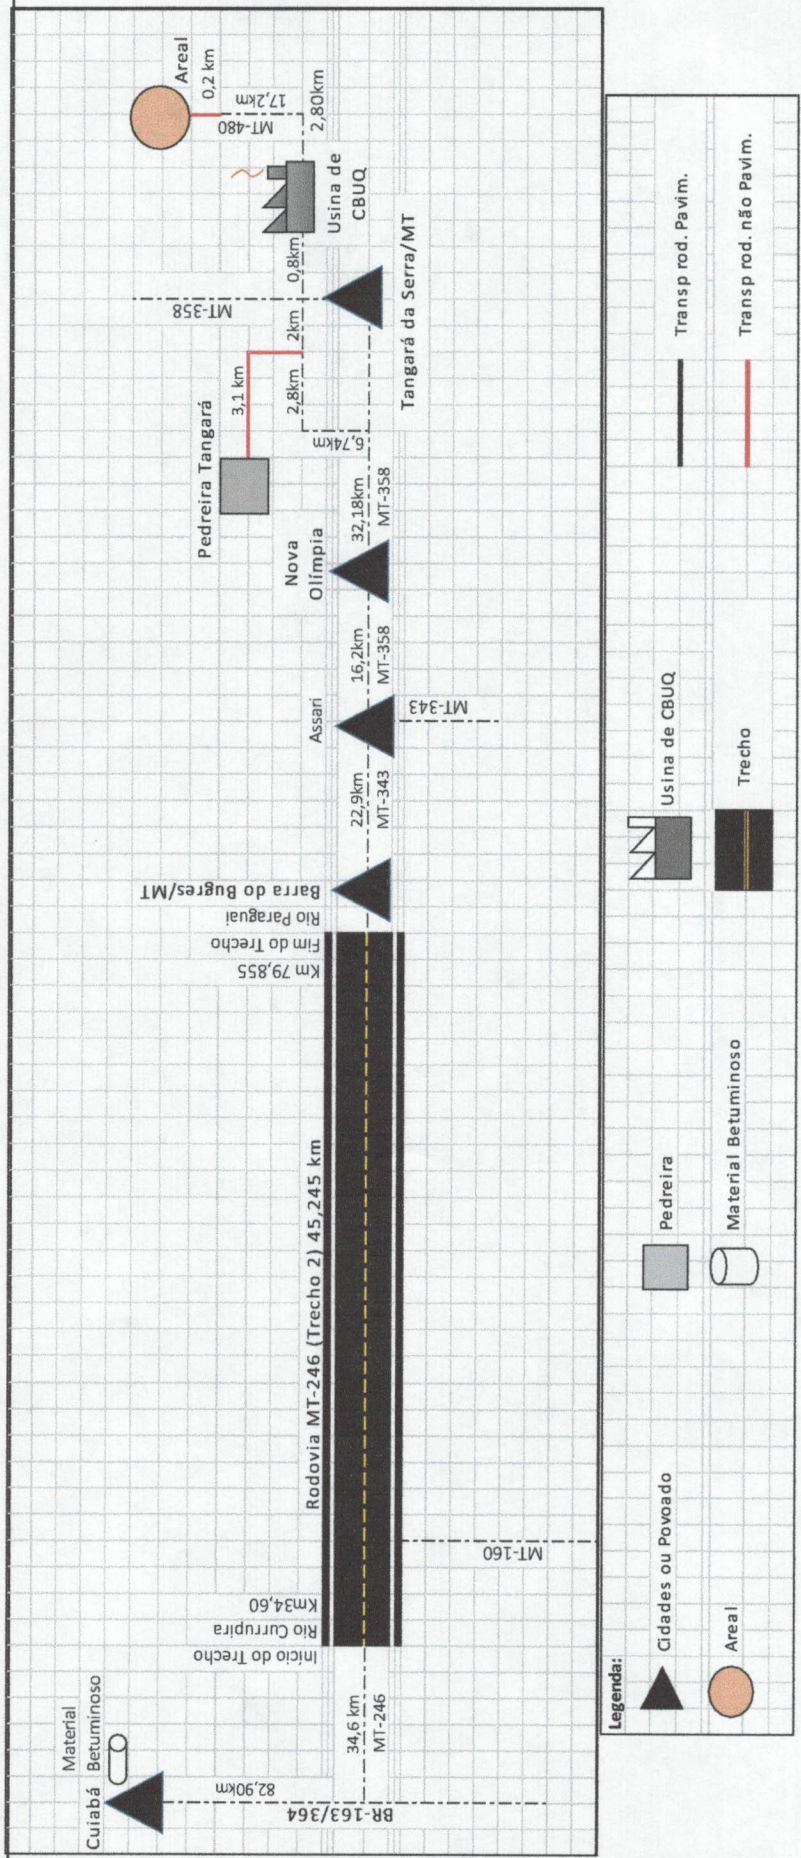

Legenda:

- Cidades ou Povoados
- Areal
- Pedreira
- Material Betuminoso
- Usina de CBUQ
- Trecho
- Transp rod. Pavim.
- Transp rod. não Pavim.

Obs: DMTs relativos ao transporte de insumos à Usina.

Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

| Brita | | | Areia | | | Solo | | | MBUQ | | |
|-----------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|--------|---|
| Comercial | Local | | Comercial | Local | | Comercial | Local | | Comercial | Local | |
| Pav | N.Pav | | Pav | N.Pav | | Pav | N.Pav | | Pav | N.Pav | |
| 2,80 | 3,10 | - | 20,00 | 0,20 | - | - | - | - | 83,620 | 83,620 | - |

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Obra: | | Contrato | Valor Contratual R\$: 15.098.120,17 | | Valor Aditivo R\$: 3.442.192,35 | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 18.540.312,52 | | Firma: GUARÉ CONSTRUTORA LTDA | |
|---|--|---|-------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---|------------|-------------------------------|------------|
| Rodovia: | | Ref.: I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU | Valor Contratual R\$: 15.098.120,17 | | Valor Aditivo R\$: 3.442.192,35 | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 18.540.312,52 | | Firma: GUARÉ CONSTRUTORA LTDA | |
| Trecho: | | Prazo de exec.: 720 Dias Consecutivos | Valor Contratual R\$: 15.098.120,17 | | Valor Aditivo R\$: 3.442.192,35 | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 18.540.312,52 | | Firma: GUARÉ CONSTRUTORA LTDA | |
| Extensão | | Prazo de vig.: 810 dias consecutivos a partir de 23/09/2014 | Valor Contratual R\$: 15.098.120,17 | | Valor Aditivo R\$: 3.442.192,35 | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 18.540.312,52 | | Firma: GUARÉ CONSTRUTORA LTDA | |
| INÍCIO: 01/10/14 | | MÊS/ANO | 01/10/2014 | 31/10/2014 | 31/11/2014 | 31/12/2014 | 31/01/2015 | 31/02/2015 | 31/03/2015 | 31/04/2015 |
| TÉRMINO PREV: 20/09/16 | | DIAS CORRIDOS | 31 / 31 | 31 / 31 | 30 / 61 | 31 / 92 | 31 / 123 | 28 / 151 | 31 / 182 | 31 / 182 |
| SERVIÇOS | | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS |
| I - PAVIMENTAÇÃO | | 2,10% | 173.047,53 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| II - LIGANTES BETUMINOSOS | | 1,50% | 89.938,41 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| III - CONSERVAÇÃO | | 43,31% | 90.509,39 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IV - DRENAGEM | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| V - SERVIÇOS DIVERSOS | | 4,17% | 2.490,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VI - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | 30,00% | 45.490,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VII - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | | 20,00% | 54.227,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| I - SERVIÇOS PRELIMINARES | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| II - DEMOLIÇÕES E DESVIOS / CAMINHOS DE SERVIÇO | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| III - TERRAPLENAGEM | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IV - DRENAGEM | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| V - PAVIMENTAÇÃO (RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO) | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VI - SINALIZAÇÃO | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VII - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) | | 2,46% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) | | 2,46% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | MED | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 | 455.703,31 |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Antônio Carlos Tenuta
Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016



GOVERNO DO
MATO GROSSO
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

455 BS 3613.6500 / 3613.6508 / 3613.6503
EDIFÍCIO ENG. EDGAP PRADO APZE - RUA J - QUADRA I - LOTE B - SETOR A
78049-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|------------------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Obra: | • Contratos Revitalização de Rodovias | | | | | | | | | | Valor Contratual R\$: | | R\$ | 15.098.120,17 | | | | |
| Rodovia: | MT - 246 | | | | | | | | | | Valor Aditivo R\$: | | R\$ | 3.442.192,35 | | | | |
| Trecho: | Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres | | | | | | | | | | Valor Contratual + Aditivo R\$: | | R\$ | 18.540.312,52 | | | | |
| Extensão | 45,245 Km | | | | | | | | | | Firma: | | GUAXE CONSTRUTORA LTDA | | | | | |
| INÍCIO: 01/10/14 | MÊS/ANO | 01/04/2015 | a | 30/04/2015 | 01/05/2015 | a | 21/05/2015 | a | 31/05/2015 | 01/06/2015 | a | 30/06/2015 | 01/07/2015 | a | 31/07/2015 | 01/08/2015 | a | 31/08/2015 |
| TÉRMINO PREV.: 20/09/16 | DIAS CORRIDOS | 30 / 212 | | 21 / 233 | | 10 / 243 | | 30 / 273 | | 31 / 304 | | 31 / 335 | | | | | | |
| SERVIÇOS | PS | VALOR R\$ | | PS | VALOR R\$ | | PS | VALOR R\$ | | PS | VALOR R\$ | | PS | VALOR R\$ | | PS | VALOR R\$ | |
| | I - PAVIMENTAÇÃO | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 7,48% | 615.236,68 | 0,00% | 0,00 | - | |
| | II - LIGANTES BETUMINOSOS | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 6,96% | 418.514,75 | 0,00% | 0,00 | - | |
| | III - CONSERVAÇÃO | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | IV - DRENAGEM | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | V - SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 4,17% | 2.490,02 | 0,00% | 0,00 | - | |
| | VI - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 20,00% | 30326,92 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | VII - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 21,00% | 56938,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 93,26% | 132.694,15 | 6,74% | 9.592,85 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II - DEMOLIÇÕES E DESVIOS / CAMINHOS DE SERVIÇO | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 578.026,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III - TERRAPLENAGEM | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 456.831,57 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV - DRENAGEM | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 97,77% | 1.996.905,58 | 2,23% | 44.125,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V - PAVIMENTAÇÃO (RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO) | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 79,58% | 120.637,15 | 20,42% | 30.947,97 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI - SINALIZAÇÃO | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 6.496,04 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VII - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3,24% | 5.694,00 | 96,76% | 170.240,83 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) | | 0,00% | | 0,00% | | 17,16% | | 1,41% | | 6,06% | | 0,00% | | 0,00% | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) | | 2,46% | | 2,46% | | 19,61% | | 21,02% | | 27,08% | | 27,08% | | 27,08% | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 455.703,31 | | 455.703,31 | | 2º | 3.180.768,92 | 3º | 261.403,43 | 1.123.507,35 | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 455.703,31 | | 455.703,31 | | MED | 3.636.492,25 | MED | 3.897.895,66 | 5.021.409,01 | | | | | | | | 5.021.409,01 |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RMP N° 121164774-9

Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

455 65 3613/6600 / 3613/6603 / 3613/6603
EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA Q - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A
78049-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO -
WWW.MT.GOV.BR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Obra: | | • Contratos Revitalização de Rodovias | | Contrato | | I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU | | Valor Contratual R\$: | | R\$ | | 15.098.120,17 | |
| Rodovia: | | MT - 246 | | Ref. : | | 5ª (Quinta) Medição Provisória | | Valor Aditivo R\$: | | R\$ | | 3.442.192,35 | |
| Trecho: | | Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres | | Prazo de exec.: | | 720 Dias Consecutivos | | Valor Contratual + Aditivo R\$: | | R\$ | | 18.540.312,52 | |
| Extensão | | 45,245 Km | | Prazo de vig.: | | 810 dias consecutivos a partir de 23/09/2014 | | Firma: | | GUAYE CONSTRUTORA LTDA | | | |
| INÍCIO: 01/10/14 | | 01/09/2015 a 30/09/2015 | | 01/10/2015 a 31/10/2015 | | 01/11/2015 a 30/11/2015 | | 01/12/2015 a 31/12/2015 | | 01/01/2016 a 31/01/2016 | | 01/02/2016 a 29/02/2016 | |
| TÉRMINO PREV.: 30/09/16 | | 30 / 365 | | 31 / 396 | | 30 / 426 | | 31 / 457 | | 31 / 488 | | 29 / 517 | |
| | | PS | | VALOR R\$ | | PS | | VALOR R\$ | | PS | | VALOR R\$ | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | - | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | - | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | - | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 0,00% | | 0,00 | | | | | | | | | |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2015/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

SUEF II

Fis. 21

Ass. 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


| Obra: | | Contrato | Valor Contratual R\$: 15.098.120,17 | | Valor Aditivo R\$: 3.442.192,35 | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 18.540.312,52 | |
|--|--|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---|------------|
| Rodovia: | | Ref.: | R\$ | | R\$ | | R\$ | |
| Trecho: | | Prazo de exec.: | R\$ | | R\$ | | R\$ | |
| Extensão: | | Prazo de vig.: | R\$ | | R\$ | | R\$ | |
| Início: 01/10/14 | | 810 dias consecutivos a partir de 23/05/2014 | Firma: | | GUAXE CONSTRUTORA LTDA | | | |
| Término Prev. 20/09/16 | | 31 / 609 | 01/05/2016 | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 31/07/2016 |
| DIAS CORRIDOS | | 31 / 548 | 01/04/2016 | 30/04/2016 | 19 / 638 | 11 / 639 | 31 / 670 | |
| SERVIÇOS | | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS |
| I - PAVIMENTAÇÃO | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 4,80% | R\$ 394.931,87 | 28,54% |
| II - LIGANTES BETUMINOSOS | | 0,00% | - | 0,00% | - | 4,43% | R\$ 266.498,71 | 29,04% |
| III - CONSERVAÇÃO | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 18,90% |
| IV - DRENAGEM | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | R\$ - | 33,33% |
| V - SERVIÇOS DIVERSOS | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | R\$ 2.490,02 | 29,17% |
| VI - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 16,67% |
| VII - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 19,67% |
| CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% |
| I - SERVIÇOS PRELIMINARES | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| II - DEMOLIÇÕES E DESVÓS / CAMINHOS DE SERVIÇO | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| III - TERRAPLENAGEM | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IV - DRENAGEM | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| V - PAVIMENTAÇÃO (RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO) | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VI - SINALIZAÇÃO | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VII - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,58% | 23,11% | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) | | 27,08% | 27,08% | 27,08% | 27,08% | 30,66% | 53,78% | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | 54 | 663.570,60 | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | 5.021.403,01 | 5.021.403,01 | 5.021.403,01 | 5.685.323,61 | 9.970.315,94 | |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP N° 121164774-9

Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016



SINFRA
SISTEMA NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
LOGÍSTICA

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

455 65-3613.6500 / 3613.6503
EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA 3 - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A
78049-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO -
WWW.MT.GOV.BR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: • Contratos Revitalização de Rodovias
Rodovia: MT - 246
Trecho: Entr 9 BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Extensão: 45,245 Km

Contrato: I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU
Ref.: 5ª (Quinta) Medição Provisória
Prazo de exec.: 720 Dias Consecutivos
Prazo de vig.: 810 dias consecutivos a partir de 23/09/2014

Valor Contratual R\$: 15.098.120,17
Valor Aditivo R\$: 3.442.192,35
Valor Contratual + Aditivo R\$: 18.540.312,52
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

| SERVIÇOS | 01/08/2016 a 31/08/2016 | | 01/09/2016 a 30/09/2016 | | VALOR R\$ |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|
| | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | |
| I - PAVIMENTAÇÃO | 28,54% | 2.348.701,80 | 28,54% | 2.348.701,79 | |
| II - LIGANTES BETUMINOSOS | 29,04% | 1.746.813,90 | 29,04% | 1.746.813,89 | |
| III - CONSERVAÇÃO | 18,90% | 39.484,53 | 18,90% | 39.484,53 | |
| IV - DRENAGEM | 33,33% | 53.969,71 | 33,33% | 53.969,71 | |
| V - SERVIÇOS DIVERSOS | 29,17% | 17.430,14 | 29,17% | 17.430,14 | |
| VI - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 16,67% | 25.272,42 | 16,67% | 25.272,42 | |
| VII - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 19,67% | 53.323,81 | 19,67% | 53.323,80 | |
| CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES | | | | | |
| I - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| II - DEMOLIÇÕES E DESVIOS / CAMINHOS DE SERVIÇO | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| III - TERRAPLENAGEM | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| IV - DRENAGEM | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| V - PAVIMENTAÇÃO (RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO) | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| VI - SINALIZAÇÃO | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| VII - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) | 23,11% | | 23,11% | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) | 76,89% | | 100,00% | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 4.284.996,30 | | 4.284.996,28 | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 14.255.316,24 | | 18.540.312,52 | |

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO


| | |
|-------------|---|
| CONTRATO: | I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU |
| RODOVIA: | MT - 246 |
| TRECHO: | Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres |
| SUB-TRECHO: | Ponte s/ o Rio Curupira - Barra do Bugres |
| EMPRESA: | GUAXE CONSTRUTORA LTDA |
| PERÍODO: | 20/06/2016 a 30/06/2016 |

MEDICÃO: 5ª (Quinta) Medição Provisória

| DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| MANHÃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| TARDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| NOITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONVENÇÃO:

| TEMPO: | LEGENDA - LETRA |
|--------------|-----------------|
| BOM | "B" |
| CHUVA | "C" |
| IMPRATICÁVEL | "I" |



Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------------------|-------|---|
| Rodovia: | MT - 246 | Contratada: | GUAXE CONSTRUTORA LTDA | | |
| Trecho | Entrº BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres | Contrato N.º | 388/2014/00/00-SETPU | | |
| Sub-trecho: | Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres | Extensão: | 45,245 Km | Lote: | 2 |




| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 15° 6'26.24"S | Estaca 3790 → KM 41,20 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57°10'37.22"W | | |

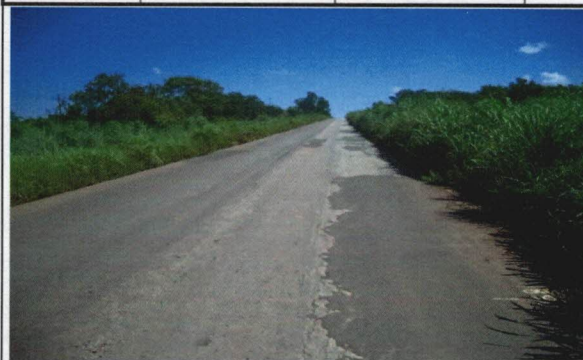

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 15° 7'6.20"S | Estaca 1890 → KM 3,20 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 56°50'2.26"W | | |




| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 15° 7'0.45"S | Estaca 3626 → KM 37,92 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57° 8'32.23"W | | |

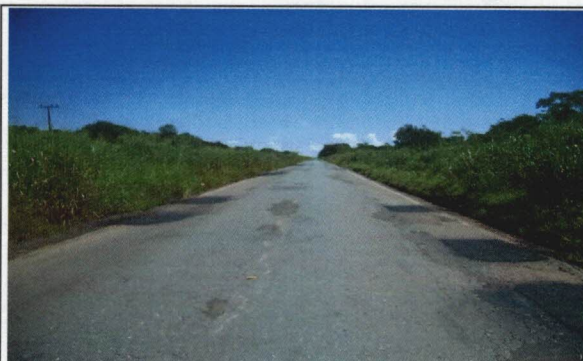

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 15° 7'0.45"S | Estaca 3629 → KM 37,98 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57° 8'32.23"W | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 15° 6'59.42"S | Estaca 3632 → KM 38,04 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57° 8'37.64"W | | |

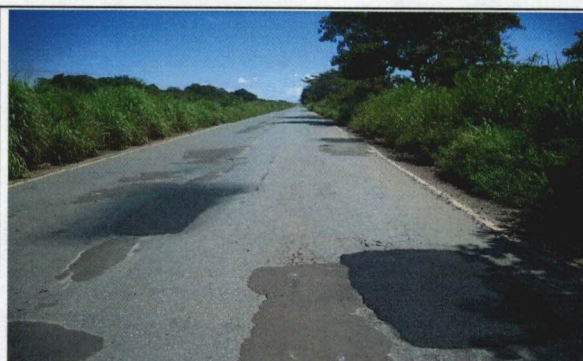



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 15° 6'57.63"S | Estaca 3649 → KM 38,38 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57° 8'43.23"W | | |



Local/Data: Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016



Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|------------------------|--------------|---|
| Rodovia: | MT - 246 | Contratada: | GUAXE CONSTRUTORA LTDA | | |
| Trecho | Entrº BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres | Contrato N.º | 388/2014/00/00-SETPU | | |
| Sub-trecho: | Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres | Extensão: | 45,245 Km | Lote: | 2 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
|  |  | | | | |
| Coordenada: 15° 6'48.09"S 57° 9'17.52"W | Localização: Estaca 3690 → KM 39,20 | Serviço: REMENDO SUPERFICIAL | Coordenada: 15° 6'41.60"S 57° 9'43.38"W | Localização: Estaca 3760 → KM 40,60 | Serviço: REMENDO SUPERFICIAL |





| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
|  |  | | | | |
| Coordenada: 15° 6'39.98"S 57° 9'47.08"W | Localização: Estaca 3767 → KM 40,74 | Serviço: REMENDO SUPERFICIAL | Coordenada: 15° 6'38.64"S 57° 9'52.57"W | Localização: Estaca 3772 → KM 40,84 | Serviço: REMENDO SUPERFICIAL |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
|  |  | | | | |
| Coordenada: 15° 6'32.16"S 57°10'13.96"W | Localização: Estaca 3784 → KM 41,08 | Serviço: REMENDO SUPERFICIAL | Coordenada: 15° 6'31.25"S 57°10'17.90"W | Localização: Estaca 3793 → KM 41,26 | Serviço: REMENDO SUPERFICIAL |

Local/Data: Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP N° 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
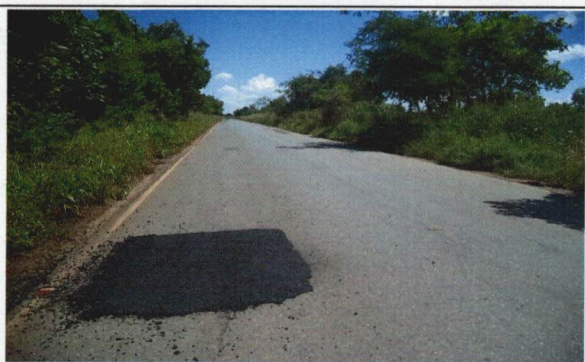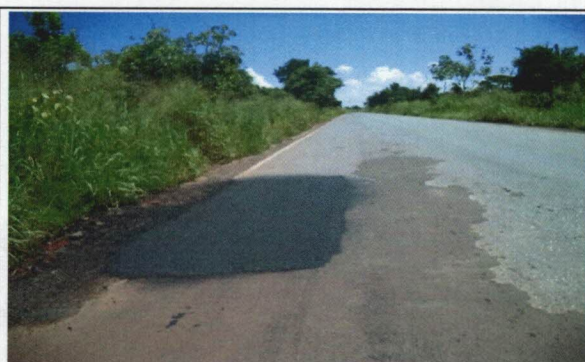
| | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Rodovia: | MT - 246 | Contratada: | GUAXE CONSTRUTORA LTDA | | |
| Trecho | Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres | Contrato N.º | 388/2014/00/00-SETPU | | |
| Sub-trecho: | Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres | Extensão: | 45,245 Km | Lote: | 2 |
|  | | | | | |
| Coordenada: | Localização: | Serviço: | | | |
| 15° 6'28.79"S | Estaca 3796 → KM 41,32 | REMENDO SUPERFICIAL | Coordenada: | Localização: | Serviço: |
| 57°10'27.66"W | | | 15° 6'28.47"S | Estaca 3797 → KM 41,34 | REMENDO SUPERFICIAL |
| | | | 57°10'28.67"W | | |
|  | | | | | |
| Coordenada: | Localização: | Serviço: | | | |
| 15° 6'28.47"S | Estaca 3800 → KM 41,40 | REMENDO SUPERFICIAL | Coordenada: | Localização: | Serviço: |
| 57°10'28.67"W | | | 15° 6'27.60"S | Estaca 3808 → KM 41,56 | REMENDO SUPERFICIAL |
| | | | 57°10'31.89"W | | |
|  | | | | | |
| Coordenada: | Localização: | Serviço: | | | |
| 15° 6'26.65"S | Estaca 3819 → KM 41,78 | REMENDO SUPERFICIAL | Coordenada: | Localização: | Serviço: |
| 57°10'35.70"W | | | 15° 6'25.97"S | Estaca 3826 → KM 41,92 | REMENDO SUPERFICIAL |
| | | | 57°10'38.44"W | | |
|  | | | | | |

Local/Data: Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016


Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------------------|-------|---|
| Rodovia: | MT - 246 | Contratada: | GUAXE CONSTRUTORA LTDA | | |
| Trecho | Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres | Contrato N.º | 388/2014/00/00-SETPU | | |
| Sub-trecho: | Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres | Extensão: | 45,245 Km | Lote: | 2 |




| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 15° 6'24.70"S | Estaca 3839 → KM 42,18 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57°10'42.61"W | | |

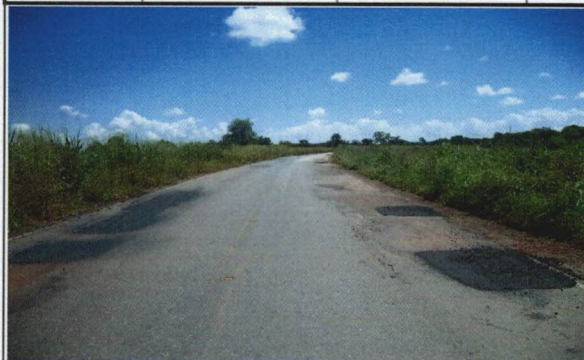

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 15° 6'23.15"S | Estaca 3854 → KM 42,48 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57°10'47.13"W | | |




| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 15° 6'15.74"S | Estaca 3862 → KM 42,64 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57°10'59.07"W | | |

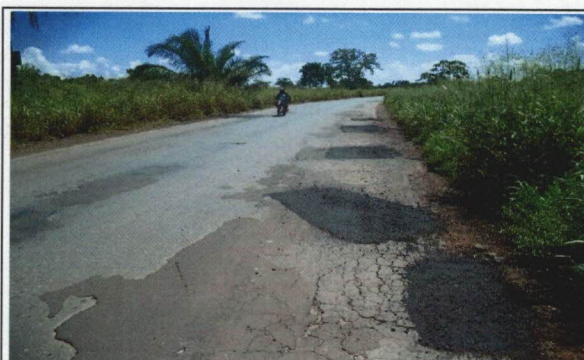

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 15° 6'14.54"S | Estaca 3863 → KM 42,66 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57°11'0.21"W | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|--------------|------------------------|---------------------|
| 15° 6'6.32"S | Estaca 3872 → KM 42,84 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 57°11'3.37"W | | |

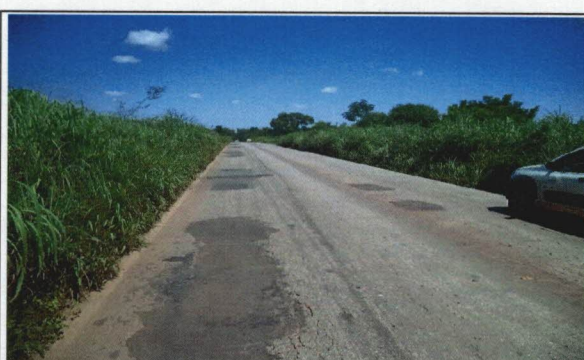

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| 15° 6'25.75"S | Estaca 2171 → KM 8,82 | REMENDO SUPERFICIAL |
| 56°53'0.28"W | | |

Local/Data: Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP N° 121164774-9



Nº. DA FOLHA

1

DATA (dd/mm/aa)

20/06/2016 a 30/06/2016

OBRA:

CONTRATO Nº.

* Contratos Revitalização de Rodovias

Rodovia: MT - 246

I.C. Nº 388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

TEMPO / CLIMA

~~SOL~~

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| RESTAURAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| SOL | | | | | |

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

| EQUIPAMENTOS | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|--------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | |

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- Todos os serviços foram executados em conformidade.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Foram executados os seguintes serviços:

* Pintura de ligação.

* Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Local/Data: Barra do Bugres/MT, 01 de Junho de 2016

Avenida J. R. Porto
Engº Residente - RNP Nº 1103587102
Guaxe Construtora Ltda

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA
RNP Nº 121164774-9



Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.
Julio Mangini Fernandes Neto
M.D. Chefe de Unidade IV – Medições e Gerenciamento.
CUIABÁ/MT

Assunto: 5ª (Quinta) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 388/2014 - SINFRA
Firma: Guaxe Construtora LTDA.

Através do presente, encaminho a V.S.^a a 5ª (Quinta) Medição Provisória após análise da efetiva aplicação dos quantitativos contratuais.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 04 a 30

Em 10 de Agosto de 2016.

Engº Diogo Menezes Souza
Superintendente de Execução e Fiscalização
SUEF I/SINFRA-MT

Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Diogo Menezes Souza

Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas.

Nesta,

Assunto: **5ª (Quinta) Medição Provisória**

Ref. I.C. nº: 388/2014/00/00-SETPU


Através do presente, encaminho a V.Sª a 5ª (Quinta) Medição Provisória, dos serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA, na Rodovia: MT - 246 - Trecho: Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres, Sub-trecho: Ponte s/ o Rio Curupira - Barra do Bugres, Extensão: 45,245 Km após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato no Período: 20/junho/2016 a 30/junho/2016

5ª (Quinta) Medição Provisória

..... **Período 20/06/2016 a 30/06/2016**

Barra do Bugres/MT, 01 de Julho de 2016

Atenciosamente,



Engº Antônio Carlos Tenuta

Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA

RNP N° 121164774-9



SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO


+55 65 3613.6600 / 3613.6608 / 3613.6603
EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A
78049-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA

- **Programa:** Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA
- **Rodovia:** MT - 246
- **Trecho:** Entrº BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
- **Extensão:** 45,245 Km
- **Firma:** GUAXE CONSTRUTORA LTDA
- **Instrumento Contratual: I.C. Nº :** 388/2014/00/00-SETPU
- **Processo Original: Nº:** 511984/2013/SETPU
- **Prazo Contratual:** 720 Dias Consecutivos
- **Término Previsto:** 20/09/2016
- **Ordem de I. de Serviços:** 01/10/2014
- **Data da Assinatura:** 23/09/2014
- **Data da Publicação:** 23/09/2014
- **Metas – Exercício:** 50,69%
- **Natureza dos Serviços:** Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA
- **Valor Empenhado:** R\$ 1.599.319,80
- **Valor Contratual (PI):** R\$ 18.540.312,52
- **Edital nº:** CP 030/2014


Engº Antônio Carlos Tenuta

Fiscal Portaria nº 041/2016/SAOB/SINFRA

RNP Nº 121164774-9



Setor: SCEO/SINFRA
Fl. N° 33
Ass.: g

Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 5º (Quinta) Medição Provisória

Ref. I.C. Nº 388/2014


Através da presente, encaminho a V.S.ª a 5º (Quinta) Medição Provisória, devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

5º (Quinta) Medição Provisória.....R\$ 663.920,60

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 32.

Em 10 de agosto de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT

Data: 16/11/2016 - 13:59:09

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018073920**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **16/11/2016**

Hora de emissão: **13:59:13**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **02.837.996/0001-10**

Nome: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspensão.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **15/12/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T2KU9TA22AM7T2A7**



Data: 16/11/2016 - 13:59:09

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018073920**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **16/11/2016**

Hora de Emissão: **13:59:13**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

- 13.200.418-6 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal**
**13.568.122-7 - CONCESSIONARIA NOVA VIA S/A - Participação em empresa com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
**13.400.945-2 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Pessoa com o mesmo radical CNPJ do requerente
com débito suspenso no sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **15/12/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **T2KU9TA22AM7T2A7**

Página **2** de **2**

[Retornar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.837.996/0001-10

Certidão nº: 67186895/2016

Expedição: 11/07/2016, às 09:22:32

Validade: 06/01/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.837.996/0001-10**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

| |
|--------------------|
| Setor: SCEO/SINFRA |
| Fl. Nº 36 |
| Página 1 de 1 |
| Ass.: J |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

13/07/16 09:05
13/07/16 09:05
Fl. N° 37
Ass.: J

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.837.996/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:04:46 do dia 13/07/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2017.

Código de controle da certidão: **0121.D0B8.C13D.B346**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

Setor: SCEO/SINFRA

Fl. N°

38

Ass.:

J

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02837996/0001-10
Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE
Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 W FUNDOS PARQUE / ZONA URBANA
/ TANGARA DA SERRA / MT / 78300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/11/2016 a 05/12/2016

Certificação Número: 2016110605032728583964

Informação obtida em 16/11/2016, às 15:03:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: AV. LIONS INTERNACIONAL, nº 2700, SETOR W-FUNDOS PARQUE EXPOSIÇÃO, CXPST 32
BAIRRO: ZONA URBANA
MUNICÍPIO: Tangará da Serra UF: MT
CEP: 78.300-000

CNPJ

02.837.996/0001-10

SÓCIOS

CPF/CNPJ

18.350.450/0001-70
687.150.306-44

NOME/RAZÃO SOCIAL

GUAXE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A
MARCIO AGUIAR DA SILVA



Cuiabá, 03/11/2016

Responsável pela Expedição

Divino Jardim

Assessor Técnico III - Mat. 103307

Procurador(a) do Estado

Dra. Olga Geny de Almeida Alves
Subprocuradora-Geral Fiscal

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: LSFOW3M3HY549N0S3Q370CCQHFNKUI

| N.º Proc. Órgão | N.º CDA | Tipo do Processo | Situação |
|-----------------|---------|------------------|----------|
|-----------------|---------|------------------|----------|



SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS
MUNICIPAIS Nº 5634/2.016

Setor: SCEO/SINFRA

Fl. Nº 40

Ass.: J

Finalidade Certidão

6.583 GUAXE CONSTRUTORA LTDA Nome Civil ou Comercial

Rua.....: AV. LIONS INTERNACIONAL 2700-W Residência ou Domicílio Tributário
Bairro.....: ZONA URBANA
Município: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300000

CPF/CGC
02.837.996-0001/10

Regularidade com a Fazenda Municipal FINALIDADE DA CERTIDÃO

NÃO RASURE

O chefe do Departamento de Tributação,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

C E R T I F I C A, para os devidos fins e efeitos, a
pedido da pessoa interessada, que revendo os arquivos do Departamento de
Tributação constatou-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS A VENCER**, estando em dia
com os pagamentos das parcelas, fica ressalvado o direito da Fazenda Pública
Municipal inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Certidão Emitida em: 21/11/2016
Certidão Válida até: 21/12/2016

TANGARA DA SERRA, 21 de Novembro de 2016.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AA89DFD3721BBF60E82E74F259876A8C



AV. BRASIL, 2351-N-JARDIM EUROPA-(65)3311-4800 - TANGARA DA SERRA - MT
*TELEFONE: (06)3311-800 * CNPJ: 03.788.239-0001/66



SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA Nº 0308/2.016

| |
|--------------------|
| Setor: SCEO/SINFRA |
| Fl. Nº: 41 |
| Ass.: J |

Finalidade Certidão

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 652.038 | Nome Civil ou Comercial |
| GUAXE CONSTRUTORA LTDA | |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Rua.....: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 | Residência ou Domicílio Tributário |
| Bairro.....: ZONA URBANA | |
| Município: TANGARA DA SERRA | UF: MT CEP: 78300000 |

| |
|--------------------|
| CPF/CGC |
| 02.837.996-0001/10 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Regularidade com a Fazenda Municipal | FINALIDADE DA CERTIDÃO |
| | |

NÃO RASURE

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Cadastro Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres Estado de Mato Grosso, constatei a **inexistência de Débitos**, fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Certidão Emitida em: 29/11/2016
Certidão Válida até: 29/12/2016

BARRA DO BUGRES, 29 de Novembro de 2016.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AA90454E06FD8426D493204CCE74B215



PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - BARRA DO BUGRES - MT
*TELEFONE: ((66)) 33-1-19 * CNPJ: 03.507.522-0001/72



GUAXE
CONSTRUTORA

| |
|--------------------|
| Setor: SCEO/SINFRA |
| Fl. Nº. 42 |
| Ass.: J |

Cuiabá-MT, 28 de Novembro de 2016.

DECLARAÇÃO

GUAXE CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ MF sob o n.º 02.837.996/0001-10, com sede na Avenida Lions Internacional, 2700-W, Vila Esmeralda, Tangará da Serra-MT, neste ato representada pelo **Sr.º Valdecir Hansen**, Diretor, vem mui respeitosamente à presença de V.S.ª **DECLARAR** que honrará com o compromisso de pagar à Prefeitura Municipal de Barra do Bugres – MT os impostos devidos às Notas Fiscais de Prestação de Serviços Nº 65 e Nº 65, referente à 5ª Medição Provisória e 5ª Reajustamento de Medição Provisória objeto do Instrumento Contratual 388/2014/00/00 – SETPU, nas datas estabelecidas em guias de recolhimento emitida pela Prefeitura Municipal daquele Município.

Atenciosamente,


Guaxe Construtora Ltda.
Valdecir Hansen



Município de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Brasil, N° 2350, Jardim Europa, Cep: 78300-000 - Tangará da Serra - MT



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **11/08/2016 11:44** Período de Competência **8/2016** Município de Prestação do Serviço **Barra do Bugres - MT**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação fora do município de Tangará da Serra**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **GUAXE CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ **02.837.996/0001-10**
Inscrição Municipal **6583** Fone/Fax **(65)3311-7800** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **JOSUE@ENCOMIND.COM.BR**
Endereço **AV LIONS INTERNACIONAL, 2700 W Bairro ZONA URBANA CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA** CPF/CNPJ **03.507.415/0022-79**
Inscrição Municipal **0** Fone/Fax E-mail
Endereço **RUA EDGAR PRADO ARZE, 05 QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A Bairro CPA CEP 78049-906 Cuiabá - MT**

Código Tributação Município: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE - CREMA - MT, NA RODOVIA MT-246, TRECHO: ENTR° BR 163/364 (TREVO JANGADA - BARRA DO BUGRES) SUB-TRECHO: PONTE SOBRE O RIO CURRUPIRA - BARRA DO BUGRES, NUMA EXTENSÃO DE 45.245 KM, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO BUGRES - JANGADA - ROSÁRIO OESTE - MT (TRECHO 02), EXECUTADOS PELA GUAXE CONSTRUTORA LTDA, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 388/2.014/00/00-SETPU.


MATERIAIS (60%)R\$: 398.352,36
SERVIÇOS (40%)R\$: 265.568,24
TOTALR\$: 663.920,60

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 9.294,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES | | | | | |
| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | |
| 663.920,60 | 398.352,36 | 0,00 | 265.568,24 | 3,00 | |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) | |
| 7.967,05 | 0,00 | 0,00 | 654.625,71 | 663.920,60 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Engº. Antônio Carlos Tenuta
RNP Nº. 121164774-9
Port. Nº. ____/____/____ SINFRA



Município de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Brasil, Nº 2350, Jardim Europa, Cep: 78300-000 - Tangará da Serra - MT

Sector: SUE/INFORM
Fl. N° 44
J



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **11/08/2016 11:44** Período de Competência **8/2016** Município de Prestação do Serviço **Barra do Bugres - MT**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação fora do município de Tangará da Serra**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **GUAXE CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ **02.837.996/0001-10**
Inscrição Municipal **6583** Fone/Fax **(65)3311-7800** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **JOSUE@ENCOMIND.COM.BR**
Endereço **AV LIONS INTERNACIONAL, 2700 W Bairro ZONA URBANA CEP 78300-000 Tangará da Serra - MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA** CPF/CNPJ **03.507.415/0022-79**
Inscrição Municipal **0** Fone/Fax E-mail
Endereço **RUA EDGAR PRADO ARZE, 05 QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A Bairro CPA CEP 78049-906 Cuiabá - MT**

Código Tributação Município: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE - CREMA - MT, NA RODOVIA MT-246, TRECHO: ENTRº BR 163/364 (TREVO JANGADA - BARRA DO BUGRES) SUB-TRECHO: PONTE SOBRE O RIO CURRUPIRA - BARRA DO BUGRES, NUMA EXTENSÃO DE 45.245 KM, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO BUGRES - JANGADA - ROSÁRIO OESTE - MT (TRECHO 02), EXECUTADOS PELA GUAXE CONSTRUTORA LTDA, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 388/2.014/00/00-SETPU.


MATERIAIS (60%)R\$: 398.352,36
SERVIÇOS (40%)R\$: 265.568,24
TOTALR\$: 663.920,60

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 9.294,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES | | | | | |
| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | |
| 663.920,60 | 398.352,36 | 0,00 | 265.568,24 | 3,00 | |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) | |
| 7.967,05 | 0,00 | 0,00 | 654.625,71 | 663.920,60 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Engº. Antônio Carlos Tenuta

RNP Nº. 121164774-9

Port. Nº. ____/____/____ SINFRA




Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - Sinfra


SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRAS

| PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS | | | | | Nº 93716 | Data: 28/11/2016 |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | FATURAMENTO | | | | |
| CREDOR | PROCESSO | I.C. | MEDIÇÃO | VALOR DO CONTRATO | PAGO ATÉ ESTA DATA | SALDO DO CONTRATO |
| Guaxe | 317220/16 | 388/14 | 5º Med. | 18.540.312,52 | 5.021.403,01 | 13.518.909,51 |
| TOTAL PROGRAMADO | | | | 663.920,60 | | |
| | | | | 663.920,60 | 137 | R\$ 12.854.988,91 |

OBS.:Ref. Aos Serv. De Revitalização Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-246, conforme IC - 388/14.

AUTORIZO:


Engº Marcos Catalano Correa
Secretario Adjunto de Obras


Engº Marciane Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica





ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 317220/2016 Contrato nº: 388/2014

Vigência: _____ Empresa Contratada: mate

Resumo do Objeto: Rf. 5ª medição

Setor: SCEO/SINFRA
 Fl. Nº. 46
 Ass.: J

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

| N. | REQUISITO | SIM | NÃO | N/A | FLS |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 01. | A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 02. | A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 03. | O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 04. | No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 05. | Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 06. | Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 07. | Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 08. | Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 09. | Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |

Cuiabá, 28 de Novembro de 2016.

Assinatura do responsável pelo preenchimento

Silvio Pereira R.
Assessor Técnico
SINFRA/MT




WWW.MT.GOV.BR
SAOB/SINFRA
Folha nº 47
Ass. [assinatura]

TRÂMITE DE PROCESSO


| | |
|--------------------|---|
| PROTOCOLO Nº | 317220 |
| EXERCÍCIO | 2016 |
| PARTE INTERESSADA | GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA |
| CONTRATO | 388/2014 |
| ASSUNTO | MEDIÇÃO DE OBRAS |
| UNIDADE DE DESTINO | CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS |
| INFORMAÇÃO | ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |

Cuiabá, 30 de novembro de 2016.


Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 388-14****COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO** <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

5 de dezembro de 2016 11:17

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Bom dia,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.01987-5**NOME DO CREDOR: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA****CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10****IC: 388/2014 - 5º Medição Provisória****5º Medição Reajustamento****SUBCONTA: 218****EMPENHO: 25101000116001535-2****PROCESSO: 317220/2016****317223/2016**

2 anexos**5º Medição reajuste.xlsx**

9915K

**5º Medição.xlsx**

9914K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 388 - Ano: 2014

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



| | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| Obra/Serviço | | Código: 29465 Inclusão: 16/10/2015 | |
| Contrato Nº/Ano-Obra: 388/2014-1 | Valor Inicial: R\$ 15.098.120,17 | Tipo do Objeto: Obra | |
| Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação | | Nº/Ano: 030/2014 | |
| BEM PÚBLICO: Conservação Restauração de Melhoramento do Meio Ambiente | | | |
| Objeto | | | |
| Quantidade: 45,245 Unidade de Medida: km - Quilômetro | | | |
| Permite registro fotográfico: Sim | | | |
| Objeto: Seleção de empresa de engenharia - área civil rodoviária, para execução dos serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA - MT, Rodovia MT- 246, nos Municípios de Barra do Bugres - Jangada - Rosário Oeste - MT., e Sub-Trecho: Ponte s/ Rio Curupira - Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 Km, Trecho 02. | | | |
| Contratada | | | |
| Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | | | |
| Detalhes | | | |
| Endereço da Obra: | | | |
| Endereço: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente | | | |
| Bairro: MT-246 | | | |
| Cidade: BARRA DO BUGRES | | | |
| CEP: 78.390-000 | | | |
| Dados Gerais: | | | |
| Tipo de Serviço: Conservação | | | |
| Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada | | | |
| Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte | | | |
| Bem Público: Conservação Restauração de Melhoramento do Meio Ambiente | | | |
| Origem de Recursos | | | |
| Origem: Próprio | | Valor Estimado: R\$ 27.263.997,93 | Inclusão: 16/10/2015 |
| Total Valor Estimado: R\$ 27.263.997,93 | | | |
| Localização | | | |
| Latitude: S 15° 06' 48,31" | | Longitude: W 57° 09' 16,15" | Inclusão: 16/10/2015 |
| Latitude: S 15° 08' 20,66" | | Longitude: W 56° 49' 14,58" | Inclusão: 16/10/2015 |
| Engenheiro de Fiscalização | | | |
| Engenheiro: ANTONIO CARLOS TENUTA | | | |
| Documentos de Engenharia Fiscalização | | | |
| Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço | | Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) | Início Atividade: 01/10/2014 |
| Nome: Antonio Carlos Tenuta.pdf | | Tamanho: 1.5 MB | Inclusão: 16/10/2015 |
| Descrição: ART | | | |
| Nome: PORTARIA IC 388-14.pdf | | Tamanho: 641.7 KB | Inclusão: 16/10/2015 |
| Descrição: Portaria | | | |
| Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço | | | |
| Data do Relatório: 05/12/2016 11:13 | | | |
| Validação: 64268636B310ADD9156DC17389D64856 | | | |
| Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | | | |



| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Engenheiro de Execução | | | | Início Atividade: 01/10/2014 | Inclusão: 16/10/2015 |
| Engenheiro: AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO | | | | | |
| Documentos de Engenheiro Execução | | | | | |
| Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço | | | | Tamanho: 1.0 MB | Inclusão: 16/10/2015 |
| Nome: ART - CONT AVELINO.pdf Descrição: ART | | | | | |
| Engenheiro: ALEXANDRE CORREA DE MELLO | | | | Início Atividade: 01/10/2014 | Inclusão: 16/10/2015 |
| Documentos de Engenheiro Execução | | | | | |
| Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço | | | | Tamanho: 1.0 MB | Inclusão: 16/10/2015 |
| Nome: ART - CONT ALEXANDRE.pdf Descrição: ART | | | | | |
| Situação da Obra/Serviço | | | | | |
| Data Situação: 22/05/2015 | | | | | Inclusão: 09/11/2015 |
| Descrição: OR | | | | Situação: Reiniciada | Publicação: Diário Oficial do Estado |
| Documentos da Situação | | | | | |
| Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço | | | | Tamanho: 423.2 KB | Inclusão: 09/11/2015 |
| Nome: 388-14 OR.pdf Descrição: OR | | | | | |
| Data Situação: 31/10/2014 | | | | | |
| Descrição: OP | | | | Situação: Paralisada | Inclusão: 09/11/2015 |
| Documentos da Situação | | | | | |
| Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço | | | | Tamanho: 282.4 KB | Inclusão: 09/11/2015 |
| Nome: 388-14 OP.pdf Descrição: OP | | | | | |
| Data Situação: 01/10/2014 | | | | | |
| Descrição: | | | | Situação: Iniciada | Inclusão: 16/10/2015 |
| Documentos da Situação | | | | | |
| Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço | | | | Tamanho: 510.3 KB | Inclusão: 16/10/2015 |
| Nome: O.I.S IC 388-14.pdf Descrição: O.I.S | | | | | |
| Medição da Obra/Serviço | | | | | |
| Nº Medição: MR / Vinc.: 65248 (Cód: 65249) | | | | | Inclusão: 16/10/2015 |
| Data da Medição: 03/08/2015 | | | | Período: 01/07/2015 a 31/07/2015 | |
| Documentos da Medição | | | | | |
| Tipo: Medição de reajuste | | | | Tamanho: 728.6 KB | Inclusão: 16/10/2015 |
| Nome: Reajustamento 4º Medição IC 388-14.xls Descrição: Reajustamento 4º Medição Provisória | | | | | |
| Nº Medição: MR / Vinc.: 76334 (Cód: 76335) | | | | | Inclusão: 05/12/2016 |
| Data da Medição: 01/07/2016 | | | | Período: 20/06/2016 a 30/06/2016 | |
| Documentos da Medição | | | | | |
| Tipo: Medição de reajuste | | | | Tamanho: 10.2 MB | Inclusão: 05/12/2016 |
| Nome: 5º Medição reajuste.xlsx Descrição: 5º Medição reajuste | | | | | |
| Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 65245) | | | | | Inclusão: 16/10/2015 |
| Data da Medição: 03/11/2014 | | | | Período: 01/10/2014 a 31/10/2014 | |
| Documentos da Medição | | | | | |
| Tipo: Medição a preços iniciais | | | | Tamanho: 708.6 KB | Inclusão: 16/10/2015 |
| Nome: 1ª Medição-Cumprira - Barra do Bugres - IC 388-2014.xls Descrição: 1º Medição Provisória | | | | | |

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 65246) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 3.180.788,92 Período: 22/05/2015 a 31/05/2015 Inclusão: 16/10/2015
Data da Medição: 01/06/2015 Observação: 2º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 2ª Medição-Curupira - Barra do Bugres - IC 388-2014.xls Tamanho: 843,8 KB Inclusão: 16/10/2015
Descrição: 2º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 65247)

Data da Medição: 01/07/2015 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 261.403,43 Período: 01/06/2015 a 30/06/2015 Inclusão: 16/10/2015
Observação: 3º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 3ª Medição-IC 388-14.xls Tamanho: 747,5 KB Inclusão: 16/10/2015
Descrição: 3º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 65248)

Data da Medição: 03/08/2015 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.123.507,35 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015 Inclusão: 16/10/2015
Observação: 4º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 4º Medição- IC 388-14.xls Tamanho: 728,6 KB Inclusão: 16/10/2015
Descrição: 4º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 76394)

Data da Medição: 01/07/2016 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 663.920,60 Período: 20/06/2016 a 30/06/2016 Inclusão: 05/12/2016
Observação: 5º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 5º Medição.xlsx Tamanho: 10,2 MB Inclusão: 05/12/2016
Descrição: 5º Medição

Aditivo da Obra/Serviço


Nº/Ano: 02/2016 Prazo Ex. Aditado (dias): 273 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 16/08/2016
Nº/Ano: 01/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): 0 Srv. Acrescidos: R\$ 3.442.192,35 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 3.442.192,35 Inclusão: 16/10/2015

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial: R\$ 15.098.120,17 Valor Total Medido: R\$ 5.685.323,61
Valor Total Aditado: R\$ 3.442.192,35 Valor Total Material: R\$ 0,00
Valor Final: R\$ 18.540.312,52 Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00
Valor Total Medido: R\$ 5.685.323,61 Valor Total Executado: R\$ 5.685.323,61
Valor Total Reajustes: R\$ 236.655,25

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 720 Quantidade de Dias em Execução: 594
Prazo Execução Total Aditado (dias): 273 Quantidade de Dias Paralisada: 203
Prazo Execução Final (dias): 993





DESPACHO

À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02837996/0001-10
Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE
Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 W FUNDOS PARQUE / ZONA URBANA
/ TANGARA DA SERRA / MT / 78300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/11/2016 a 24/12/2016

Certificação Número: 2016112504445130097861

Informação obtida em 05/12/2016, às 16:48:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROC Nº: _____ 317220/2016 _____

FLS.: _____ 53 _____ - _____ - _____

DATA.: _____ 05 _____ / _____ 12 _____ / _____ 2016 _____

À
SUOF,

Em atenção ao pedido de atualização de certidões e apresentação de ISSQN recolhido, encaminho os autos para pagamento.

CERTIDÕES

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Prefeitura Tangará da Serra | - folha 40 |
| Prefeitura Barra do Bugres | - folha 41 |
| PGE | - folha 39 |
| SEFAZ – MT | - folha 34/35 |
| Receita Federal | - folha 37 |
| Caixa Econômica | - folha 52 |
| Trabalhista | - folha 36 |


VENCIMENTO

| |
|------------|
| 21/12/2016 |
| 29/12/2016 |
| 03/02/2017 |
| 15/12/2016 |
| 09/01/2017 |
| 24/12/2016 |
| 06/01/2017 |

ISSQN

Com relação ao comprovante de ISSQN a empresa Declara que pagará o imposto na data de vencimento do boleto.

Diante do exposto AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN no processo.



Eng. Civil Marciano Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA



Processo nº **317920** / **2016**


Fls: **54** / 2016

Data: 06/12/2016





À COFIN,


Encaminhamos processo para liquidação e pagamento.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA



| | | |
|------------------------------------|------------------------|---|
| RETENÇÕES | | 317220/2016 |
| Numero da Nota Fiscal | 64 | |
| Valor da Nota Fiscal | R\$ 663.920,60 | |
| Emissão Nota Fiscal | 11/08/2016 | |
| Credor | GUAXE CONSTRUTORA LTDA | |
| Cálculo do Imposto de Renda | | |
| Valor Tributável | | |
| Percentual | 1,50% | |
| Valor da Retenção | R\$ 0,00 | |
| Cálculo do ISS / VG | | |
| Valor Tributável (Base de Cálculo) | | |
| Percentual | 5,00% | |
| Valor da Retenção | R\$ 0,00 | |
| Cálculo do INSS | | |
| Valor Tributável | 265.568,24 | |
| Percentual | 3,50% | |
| Valor da Retenção | 9.294,89 | |
| Valor líquido da NF-E | R\$ 654.625,71 | |
| C-MT | | |
| | 06/12/2016 |  |





Coordenadoria Financeira

Termo de Conformidade Documental para Pagamento

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Empresa: <u>GUAXE</u> | |
| Processo: <u>317220/16</u> | IC: <u>308/14</u> |
| Período da Despesa: | Empenho: |
| Produto/serviço: | Notas Fiscais: |

| Nº | Quesito | Sim | Não | N/A | Página |
|----|---|-----|-----|-----|--------|
| 1 | O documento fiscal está atestado pelo fiscal do contrato? (Art. 67 da Lei nº 8666/93). | X | | | |
| 2 | A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo registrada pela Gerência de Patrimônio? (Manual SIGPAT). | | | X | |
| 3 | Em caso de obras, as planilhas de Medição, Cronograma Físico Financeiro e Controle Financeiro foram apresentadas e atestadas pelo fiscal do contrato? (Art. 63, §2º, III da Lei nº 8666/93). | X | | | |
| 4 | Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, de acordo com a nota fiscal, devidamente autorizado pelo Superintendente e Secretário Adjunto da área demandante da despesa? | X | | | |
| 5 | A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006). | X | | | |
| 6 | A Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado foi apresentada e está válida? (Orientação Técnica CGE 011/2016). | X | | | |
| 7 | A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006). | X | | | |
| 8 | A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006). | X | | | |
| 9 | A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal do local de domicílio do credor foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006). | X | | | |
| 10 | O documento de arrecadação municipal e comprovante de recolhimento foi apresentado? (Lei Estadual nº 10.162/2014 e Lei Complementar Federal nº 116/2003). | | | | |
| 11 | No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação? | X | | | |
| 12 | Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a GEFIP? | | | X | |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Fransuise A. Souza, Luciana Lima. C. Campos | Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva | Data da última revisão: 19/08/2016 |
|---|--|---------------------------------------|




| Nº | Quesito | Sim | Não | N/A | Página |
|----|--|-----|-----|-----|--------|
| 13 | No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores a 2015, excetuando Restos a Pagar inscritos, a despesa foi ratificada nos termos da Portaria SINFRA nº 018/2016? | | | X | |
| 14 | Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF? | X | | | |

| Medida Judicial | |
|-----------------------------|----------------------|
| Número do processo judicial | Ação a ser executada |

| |
|--------------------|
| Observações |
| |

| Responsável pelo check-list | |
|-----------------------------|----------------|
| Data 06/12/16 | Assinatura |

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Fransuise A. Souza, Luciana Lima. C. Campos | Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva | Data da última revisão: 19/08/2016 |
|---|--|---------------------------------------|

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| LIQ | | LIQUIDAÇÃO | | 25101.0001.16.002868-1 | |
| Nº EMP: 25101.0001.16.001535-2 | | | Data do Doctº: 07/12/2016 | | |
| Nº PED: 25101.0001.16.002199-7 | | | Data de pagamento: 07/12/2016 | | |
| Nº CAD: | | Nº NOBLIST: | | Nº DOTLIST: | |
| Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | | | | |
| Unidade Gestora: 25101.0001 Geral | | | | | |
| Data de Liberação: *** ** | | | Liberador de Pagamento: *** ** | | |
| Liquidação Escritural: Não | | Regularização: Não | | Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0800.449000000.137.1.1 | |
| Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES | | | Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** | | |
| Nº NEX: *** ** | | | | | |
| Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB) | | Código Bancário: 03643.00218 | | Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042719-8 | |
| Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042719-8 | | | Valor Liquidação: *** 663.920,60 | | SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** |
| Histórico: PROCESSO 317220/2016 , IC 388/2014 , referente 5º medição do periodo 20/06/16 á 30/06/16, Conservação, Restauração e Melhoria do Meio Ambiente CREMA MT, da Rodovia: MT-246,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 53),NF 64 | | | | | |
| Código do credor: 2003.01987-5 | | Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda | | | |
| CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10 | | Município UF: Tangará da Serra - MT | | Nº Processo de Pagamento 252485/2015 | |
| Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil | | | | | |
| Banco + Agência + C/C: 001.1321.000000000007613-9 | | | | | |

DADOS DA DIÁRIA

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Nº OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** ** |
| | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

CONTRATOS E CONVÊNIOS

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Nº Contrato: 25101000000038814 | Término da vigência: *** ** |
| Nº Convênio: *** ** | |

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

| | | | |
|--|--|---|--|
| Valor total do empenho (R\$) *** 810.742,92 | Saldo a liquidar (R\$) *** 810.742,92 | Esta liquidação (R\$) *** 663.920,60 | Saldo a liquidar atual (R\$) *** 146.822,32 |
|--|--|---|--|

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|--|---|---|---|
| Valor total do empenho (R\$) *** 810.742,92 | Saldo em liquidação (R\$) *** 810.742,92 | Esta liquidação (R\$) *** 663.920,60 | Saldo em liquidação atual (R\$) *** 146.822,32 |
|--|---|---|---|



| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| LIQ | | LIQUIDAÇÃO | | 25101.0001.16.002868-1 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES | | | | | |
| IRRF (R\$): *** 0,00 | | ISS município (R\$) *** 0,00 | | Município: *** ** | |
| INSS (R\$): *** 9.294,89 | | MTPREV (R\$): *** 0,00 | | Outras consignações (R\$): *** 0,00 | |
| Observações: Indicativo de Situação da LIO: LIO Normal | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valor Líquido: *** 654.625,71 | SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** ** |
|----------------------------------|--|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO | | |
|--|--|----------------|
| Natureza Despesa | Descrição | Valor |
| 4.90.51.51.006 | Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros | *** 663.920,60 |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: | | *** 663.920,60 |
| CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR | | |
| Código | Descrição | Valor |
| 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | *** 9.294,89 |
| TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES: | | *** 9.294,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
PRAÇA ANGELO MASSON, 1000 - CENTRO - CE
C.N.P.J.: 03.507.522/0001-72
Telefone: (65) 3361-1921

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Contribuinte

652038 GUAXE CONSTRUTORA LTDA

C.P.F / C.N.P.J.: 02.837.996/0001-10

Localização do Referente

Rua: AV. LIONS INTERNACIONAL, 2700W

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: Tangará da Serra

N.º:

CEP: 78300-000

Estado: MT

| Ano | Receita | Parcela | Tributo | Vencimento | Vir. Principal | Vir. Correção | Vir. Juros | Vir. Multa | Vir. Desconto | Vir. Atualizado | Descrição dos Lançamentos: |
|------|---------|---------|---------|------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| 2016 | 1700 | 01/01 | ISSQN | 03/07/2017 | 13.278,41 | 0,00 | 1.288,01 | 265,57 | 0,00 | 14.831,99 | ISSQN 13.278,41 |
| | | | | | | | | | | | (+) Correção 0,00 |
| | | | | | | | | | | | (+) Juros 1.288,01 |
| | | | | | | | | | | | (+) Multa 265,57 |
| | | | | | | | | | | | (-) Desconto 0,00 |
| | | | | | | | | | | Total dos Lanc.: | 14.831,99 |

Informações do Referente

Referente: 5016806

Desc. de Serviço: IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Tomador: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA (03.507.415/0022-79) Decl

Inf. cebida: 64 Série: Modelo: NFS Emitida Em: 11/08/2016

Mensagem:

- R\$ 13.278,41 - ISSQN

- R\$ 1.553,58 - Multa/Juros/Correção

| Responsável | Agência / Cedente | Nosso Número | Data de Emissão | Valor Principal | (-) Desconto | (+) Correção | (+) Juros | (+) Multa | Valor Cobrado |
|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | 0804 | 5016806 | 30/06/2017 | 13.278,41 | 0,00 | 0,00 | 1.288,01 | 265,57 | 14.831,99 |

Via do Contribuinte

destaque aqui

748 81630000148 3 31990457201 7 70703000000 4 00005016806 1

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente nas agências do Sicredi

Cedente

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - ISSQN / 2016

| Data da Emissão | Responsável | Lançamento | Referente | Insc. Imobiliária | Ano | Receita | Parcela | Vencimento |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|------|---------|-------------------|------------|
| 30/06/2017 | | 212842 | 5016806 | | 2016 | 1700 | 01/01 | 03/07/2017 |
| Moeda | Carteira | ISSQN | | | | | Agência / Cedente | |
| R\$ | 18 | 13.278,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0804 | |

Tomador: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA (03.507.415/0022-79) Decl
cebidada: 64 Série: Modelo: NFS Emitida Em: 11/08/2016

Observações de Multa:

- 1 - 1% (um por cento), quando o pagamento for efetuado até (dez) dias após vencimento.
- 2 - 3% (três por cento), quando o pagamento for efetuado depois de (dez) dias e até 30 (trinta) dias do vencimento.
- 3 - 6% (seis por cento), quando o pagamento for efetuado após decorridos 30 (trinta) dias e até de 60 (sessenta) dias do vencimento.
- 4 - 10% (dez por cento), quando o pagamento for efetuado após decorridos mais de 60 (sessenta) dias do vencimento.

Observações de Juros:
Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerando mês qualquer, fração, aplicado sobre o valor atualizado

| | |
|---------------------|-----------|
| (=) Valor Principal | 13.278,41 |
| (-) Desconto | 0,00 |
| (+) Correção | 0,00 |
| (+) Juros | 1.288,01 |
| (+) Multa | 265,57 |

VALORES EXPRESSOS EM REAIS - RECEBIMENTO ATÉ O VENCIMENTO


| | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| Sacado | 652038 GUAXE CONSTRUTORA LTDA | Valor Cobrado | 14.831,99 |
| C.P.F / C.N.P.J.: | 02.837.996/0001-10 | | |

Referente Rua: AV. LIONS INTERNACIONAL, 2700W N.º: Bairro: ZONA URBANA
CEP: 78300-000 Cidade: Tangará da Serra Estado: MT

Via do Banco



Autenticação Mecânica FICHA COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.55
7138207138 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2
=====

| | | |
|-------------------|----------------------|---------------|
| Convenio | PREF MUN B BUGRES MT | |
| Codigo de Barras | 81630000148-3 | 31990457201-7 |
| | 70703000000-4 | 00005016806-1 |
| Data do pagamento | | 03/07/2017 |
| Valor Total | | 14.831,99 |


=====

DOCUMENTO: 070314
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F5.560.BB6.793.037

Transação efetuada com sucesso por: J0297786 MARCIO AGUIAR DA SILVA.

J
COFIN,

Restituo os autos ~~com~~ pois são
qu'fado, referente nota fiscal 64.



Luciana de Lima Cândido Campos
Assessora Técnica
SAADS/SINFRA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 25/11/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.002199-7

EMPENHO: 25101.0001.16.001535-2

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço

Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0800.449000000.137.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000038814

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.16.002199-7

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 810.742,92 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 810.742,92 | Total AQS: | 810.742,92 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 810.742,92 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 799.392,52 | Total Cancelado RP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 11.350,40 | | |


| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------------------|------------|------------------------|--|
| 07/12/2016 | AQS | 663.920,60 | 25101.0001.16.001201-4 | PROCESSO 317220/2016 , IC 388/2014 , referente 5ª medição do período 20/06/16 à 30/06/16, Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente CREMA MT, da Rodovia: MT-246, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 53), NF 64 |
| 07/12/2016 | AQS | 146.822,32 | 25101.0001.16.001202-2 | PROCESSO 317223/2016 , IC 388/2014 , referente 5ª medição DE REAJUSTAMENTO do período 20/06/16 à 30/06/16, Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente CREMA MT, da Rodovia: MT-246, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33), NF 65 |
| 07/12/2016 | Liquidação | 663.920,60 | 25101.0001.16.002868-1 | PROCESSO 317220/2016 , IC 388/2014 , referente 5ª medição do período 20/06/16 à 30/06/16, Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente CREMA MT, da Rodovia: MT-246, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 53), NF 64 |
| 07/12/2016 | Liquidação | 146.822,32 | 25101.0001.16.002869-1 | PROCESSO 317223/2016 , IC 388/2014 , referente 5ª medição DE REAJUSTAMENTO do período 20/06/16 à 30/06/16, Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente CREMA MT, da Rodovia: MT-246, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33), NF 65 |
| 07/12/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 2.055,51 | 25101.0001.16.005004-4 | Pagamento do Empenho 251010001160015352 e Liquidação 251010001160028691 OB fat.c/barra-GPS-Dt.pgto < dt. atual |
| 07/12/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 654.625,71 | 25101.0001.16.005009-5 | Pagamento do Empenho 251010001160015352 e Liquidação 251010001160028681 |
| 07/12/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 9.294,89 | 25101.0001.16.005011-7 | Pagamento do Empenho 251010001160015352 e Liquidação 251010001160028681 OB fat.c/barra-GPS-Dt.pgto < dt. atual |
| 07/12/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 144.766,81 | 25101.0001.16.005014-1 | Pagamento do Empenho 251010001160015352 e Liquidação 251010001160028691 |
| 12/12/2016 | NOB de Estorno | 2.055,51 | 25101.0001.16.005046-1 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 12/12/2016 | NOB de Estorno | 9.294,89 | 25101.0001.16.005050-8 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 12/12/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 2.055,51 | 25101.0001.16.005064-8 | Pagamento Emp 251010001160015352 e Liq 251010001160028691 consignações |



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA


| DATA: 25/11/2016 | | PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.002199-7 | | EMPENHO: 25101.0001.16.001535-2 |
|------------------|----------------------------------|---|------------------------|--|
| 12/12/2016 | NOB de Estorno | 2.055,51 | 25101.0001.16.005071-0 | ERRO SISTEMICO |
| 12/12/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 2.055,51 | 25101.0001.16.005079-6 | Pagamento Emp 251010001160015352 e Liq 251010001160028691 consignações |
| 16/12/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 9.294,89 | 25101.0001.16.005199-7 | Pagamento Emp 251010001160015352 e Liq 251010001160028681 consignações |
| 29/12/2016 | NOB de Estorno | 2.055,51 | 25101.0001.16.005562-3 | ERRO TRANSMISSÃO |
| 29/12/2016 | NOB de Estorno | 9.294,89 | 25101.0001.16.005564-1 | ERRO TRANSMISSÃO |



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

317220116



| | | |
|---|--|---|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | 25101.0001.16.005009-5 |
| Data de Emissão: 07/12/2016 | | |
| Nº NOBLIST: | | Nº DOTLIST: |
| Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Geral | | |
| Código Bancário: 03643.00218 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042719-8 | Regularização: Não |
| | | Nº NEX : *** |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8. | | |
| Código do Credor: 2003.01987-5 | | |
| Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda | | |
| CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10 | Município UF: Tangará da Serra MT | |
| Nº EMP: 25101.0001.16.001535-2 | Fonte de Recurso: 137 | |
| Nº LIQ: 25101.0001.16.002868-1 | Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float | |
| Nº Processo de Pagamento: 252485/2015 | | |
| NOB/Fatura Fato 54: Não | | |
| Banco + Agência + C/C: 001.1321.0000000000007613-9 | Valor da Operação (R\$): *** 654.625,71 | Valor por Extenso: SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** ***** ***** ***** |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) | AUTORIZO O PAGAMENTO 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA | |
| Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil | | |


5
4





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.17.000767-2

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 09/02/2017

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 9.294,89

Valor por Extenso:

NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

*** **

Histórico:

PROCESSO 317220/2016 , IC 388/2014 , referente 5º medição do período 20/06/16
à 30/06/16, NF-e 64. e credor 1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

| Conta Contábil | D/C | Tipo Conta Corrente | Conta Corrente Contábil |
|--------------------|-----|---------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.3.05.41.00 | C | Credor+F | 1995008500337 |
| 3.9.9.9.3.80.01.02 | D | Fonte | 337 |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | D | | |
| 8.9.7.3.1.01.01.41 | C | Credor | 029.979.036/0001-40 |
| 8.2.1.1.1.01.00.02 | D | Fonte | 337 |
| 8.2.1.1.3.00.00.03 | C | Fonte | 337 |

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:


GERENTE RESPONSÁVEL



GOVEXE - 31 7220/2016

Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

| | | |
|---|---|--|
| NOE | | 25101.0001.17.000554-4 |
| Nº LIQ: 25101.0001.16.002868-1 | Data da LIQ: 07/12/2016 | Nº NEXLIST: **** * |
| Data de Solicitação: 09/02/2017 | | Data de Pagamento: 09/02/2017 |
| Data de Cancelamento: **** * | | |
| Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Geral | | |
| Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição | | Fato Extra-Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição |
| Regularização: Não | Situação do Pagamento: Não Pago | Ordenador de Despesa: 006469 - Marciane Prevedello Curvo |
| Fonte de Recurso: 337 | Código Bancário: 03643.00218 | Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001042719-8 |
| Valor (R\$): *** 9.294,89 | Valor por Extenso: NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ***** | |
| Histórico: PROCESSO 317220/2016 , IC 388/2014 , referente 5º medição do periodo 20/06/16 á 30/06/16, NF-e 64. | | |
| Código do Credor: 1995.00850-0 | | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | | |
| Município UF: Brasília-DF | Forma Recebimento: Pagamento de Faturas | |
| Banco + Agência + C/C: **** * | | |
| Nº NLA | 25101.0000.17.000767-2 | |
| Nº EMP | **** * | |


LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Data de Liberação: **** * | Liberador de Pagamento: **** * |
|------------------------------|-----------------------------------|

AUTORIZO O PAGAMENTO

6469 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****NEX****25101.0001.17.000522-3****Data de Emissão:** 09/02/2017**Unidade Orçamentária:**

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Geral

Nº OBF:

*** **

Nº NEXLIST:

*** **

Nº NOE:

25101.0001.17.000554-4

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

Código Bancário: 03643.00218**Regularização:**

Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042719-8SOLICITAMOS AO **Banco do Brasil S/A** CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº **001.3834.000000001042719-8****Código do Credor:** 1995.00850-0**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**CPF/CNPJ:** 29.979.036/0001-40**Município UF:** Brasília DF**Nº NLA:** 25101.0000.17.000767-2**Nº EMP:** *** ****Nº NOE:** 25101.0001.17.000554-4**Fonte de Recurso:** 337**Tipo de OB:**

39-FAT S/ BARRA

Nº LIQ: 25101.0001.16.002868-1**Banco + Agência + C/C:** *** ****Dados Associados a Devolução Através de DAR****Nº GCV**

*** **

Nº BAD

*** **

Nº NOB

*** **

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -**Valor da Operação (R\$):**

*** 9.294,89

Valor por Extenso:

NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

*** **

Histórico :PROCESSO 317220/2016 , IC 388/2014 , referente 5º medição do período 20/06/16
à 30/06/16, NF-e 64.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO


006469 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA**Observações:**Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Estornada
Número do documento de estorno: 25101.0001.17.001979-8

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA



| Tipo Fatura | Subtipo Fatura | | Código de Barras | Tributo | Valor | Autenticação Bancária |
|----------------------|----------------|--|------------------|---------|----------|-----------------------|
| Sem Código de Barras | GPS | | *** | 2640 | 9.294,89 | A4EB52CCD67BCD9D |


**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

| | | |
|---|---|---|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | 25101.0001.16.005011-7 |
| Data de Emissão: 07/12/2016 | | |
| Nº NOBLIST: | | Nº DOTLIST: |
| Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Geral | | |
| Código Bancário: 03643.00218 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042719-8 | Regularização: Não |
| | | Nº NEX : *** |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8. | | |
| Código do Credor: 1995.00850-0 | | |
| Credor: Instituto Nacional do Seguro Social | | |
| CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 | | Município UF: Brasília DF |
| Nº EMP: 25101.0001.16.001535-2 | | Fonte de Recurso: 137 |
| Nº LIQ: 25101.0001.16.002868-1 | | |
| Nº Processo de Pagamento: 252485/2015 | | Tipo de OB: 39-FAT S/ BARRA |
| NOB/Fatura Fato 54: Não | | |
| Banco + Agência + C/C: | Valor da Operação (R\$): *** 9.294,89 | Valor por Extenso: NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ***** |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) | | AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA |
| Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil | | |


| DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------|-----------------|
| Tipo Fatura | Subtipo Fatura | Código de Barras | Tributo | Valor | Nº Autenticação |
| Sem Código de Barras | GPS | | 2640 | 9.294,89 | *** ** |



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2640 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2017 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 02.837.996/0001-10 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.837.996/0001-10 GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F TANGARA DA SERRA MT CEP 78300-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 9.294,89 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/03/2017 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11 - TOTAL | 9.294,89 | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2640 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2017 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 02.837.996/0001-10 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.837.996/0001-10 GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F TANGARA DA SERRA MT CEP 78300-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 9.294,89 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/03/2017 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11 - TOTAL | 9.294,89 | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



| | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | 25101.0001.17.001805-3 |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|

Data de Emissão: 25/04/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

03643.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001042719-8

Regularização:

Sim

Nº NEX :

25101.0001.17.000522-3

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8.

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº EMP: 25101.0001.16.001535-2

Fonte de Recurso: 137

Nº LIQ: 25101.0001.16.002868-1

Nº Processo de Pagamento: 252485/2015

Tipo de OB:

39-FAT S/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R\$):

*** 9.294,89

Valor por Extenso:

NOVE MIL E DUZENTOS E
NOVENTA E QUATRO REAIS
E OITENTA E NOVE
CENTAVOS *****

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006141 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento de regularização

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

| Tipo Fatura | Subtipo Fatura | Código de Barras | Tributo | Valor | Nº Autenticação |
|----------------------|----------------|------------------|---------|----------|-----------------|
| Sem Código de Barras | GPS | | 2640 | 9.294,89 | ***** |

**TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA**

| VIRIFICAÇÃO | SIM | NÃO | N/A |
|---|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais? | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Todos os documentos estão devidamente assinados? | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, LIQ e NOB)? | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005) | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005) | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)? | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo? | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| O processo está corretamente paginado? | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| A capa do processo está em boas condições para arquivo? | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONC.

Observações:

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 17 / 07 / 17.

Nome: Cyrene Costa


Assinatura: Cyrene Costa



Cuiabá, 17 de Julho de 2017.

À CCONT,

Encaminho processo para arquivo, com pagamento efetuado.



JANAINA CRISTINA DA SILVA
Coordenadora Financeira em substituição
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

