

Anexo XXIX

Processo de Pagamento da 24^a
medição P.I. e Reajustamento

Anexo XXIX - A

Processo nº 247602/2020

Pagamento da 24ª medição e
reajustamento



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 247602/2020 Data: 09/07/2020 08:45
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: 321.3 MANUTENÇÃO DE VIAS (CRONOGRAMA)
Resumo: ENCAMINHA A 24 (VIGÉSIMA QUARTA) MEDIÇÃO PROV
ISÓRIA, DO CONTRATO N 388/2014/SETPU, DOS SERVIÇOS DE

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: COQR - COORD. CONTROLE E QUALI. OBRAS RO

Volume: 1 de 1\$pre 1





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,

Assunto: **24ª (Vigésima quarta) medição provisória**
Ref. I.C. nº: 388/2014/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 24ª (Vigésima quarta) medição provisória, dos serviços de Revitalização de Rodovia Pavimentada, na Rodovia: MT - 246 - Trecho: Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres, Sub-trecho: Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres, Extensão: 45,245 Km após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato no Período: 01/04/2.020 a 30/04/2.020

24ª (Vigésima quarta) medição provisória..... Período 01/04/2.020 a 30/04/2.020

Cuiabá (MT), 04 de maio de 2.020

Atenciosamente,

Eng.º Alair Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077



PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 03
Ass: [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra :..... Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente
Rodovia :..... MT - 246
Trecho :..... Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Sub-trecho :..... Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres
Referência :..... 24ª (Vigésima quarta) medição provisória
Ordem de Início de Serviço :..... SUOT/O.I.S./nº 146/2.014 de 01/10/2.014
Ordem de Paralisação :..... SUEF I/O.P.S./nº 006/2.017 de 30/08/2.017
Ordem de Reinício de Serviço :.. SUEF I/O.R.S./nº 002/2.018 de 11/04/2.018


DADOS DO CONTRATO

Rodovia :..... MT - 246
Trecho :..... Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Extensão :..... 45,245km
Empresa :..... Guaxe Construtora Ltda
Instrumento Contratual :..... 388/2014/00/00-SETPU
Processo Original :..... 511984/2013 - SETPU
Data da Assinatura :..... 23/09/2.014
Data da Publicação :..... 23/09/2.014
Natureza dos Serviços :..... Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente
Prazo Contratual :..... 2.256 dias consecutivos
Término Previsto :..... 04/12/2020
Ordem de Início de Serviço :..... SUOT/O.I.S./nº 146/2.014 de 01/10/2.014
Prazo Decorrido do Contrato :..... 2039 dias consecutivos
Valor Contratual (PI) :..... R\$ 15.098.120,17
Valor Termo Aditivo :..... R\$ 6.100.070,92
Valor Contratual + T. Aditivo :..... R\$ 21.198.191,09

Cuiabá (MT), 04 de maio de 2.020

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,


Engº Alaor Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFR
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

RESUMO DE MEDIÇÃO


Obra:	Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente	Contrato número:	388/2014/00/00-SETPU	Prazo de Execução:	2.256 dias consecutivos					
Rodovia:	MT - 246	Data assinatura:	23/09/2014	Prazo Restante:	217 dias corridos					
Trecho:	Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres	Publicação:	23/09/2014	Valor Contratual (PI):	R\$ 15.098.120,17					
Sub-Trecho:	Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres	Processo Orig.:	511984/2013 - SETPU	Valor acum. medido (PI):	R\$ 16.128.952,46					
Referência:	24º (Vigésima quarta) medição provisória	Edital:	C.P. 030/2.014 - Lote 2	Valor Termo Aditivo:	R\$ 6.100.070,92					
Ordem Início Serviço:	SUOT/O.I.S./nº 146/2014 de 01/10/2014	Termo Aditivo:	-*-	Vr. Contratual + T. Aditivo:	R\$ 21.198.191,09					
Período desta medição:	01/04/2.020 à 30/04/2.020	Período acumulado:	01/10/2.014 à 30/04/2.020	Empresa:	Guaxe Construtora Ltda.					
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário R\$	Valor desta medição R\$	Valor acumulado R\$	% exec.
			contrato	nesta medição	medição anterior	medida acumulada				
1.0	PAVIMENTAÇÃO									
5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	5.058,000		3.001,691	3.001,691	11,23	-	33.708,98	59,35%
5 S 02 240 11	Recomposição camada de base com adição de brita	m³	20.232,000		12.006,766	12.006,766	22,56	-	270.872,63	59,35%
5 S 02 300 00	Imprimação	m²	339.160,000		289.675,820	289.675,820	0,26	-	75.315,71	85,41%
5 S 02 310 01	Areia paleada (areia lavada = 3,0kg/m2 - sem mat betuminoso)	m²	238.000,000		237.999,990	237.999,990	0,44	-	104.719,99	100,00%
5 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	402.664,885		350.362,715	350.362,715	0,19	-	66.568,90	87,01%
5 S 02 540 51	Conc. Betumin. Usinado a Quente - Capa de Rolamento - AC/BC	t	49.326,218		34.323,436	34.323,436	71,43	-	2.451.722,98	69,58%
5 S 09 002 91	Transporte de areia para CBUQ até Usina. Comercial pavimentada	t.km	480.287,736		53.377,698	53.377,698	0,39	-	20.817,30	11,11%
5 S 09 001 91	Transporte de areia para CBUQ até Usina. Comercial não pavimentada	t.km	39.889,284		-	-	0,56	-	-	0,00%
5 S 09 002 91	Transporte de brita para CBUQ até Usina. Comercial pavimentada	t.km	3.029.058,243		2.698.594,429	2.698.594,429	0,39	-	1.052.451,79	89,09%
5 S 09 001 91	Transporte de brita para CBUQ até Usina. Comercial não pavimentada	t.km	95.510,845		85.620,432	85.620,432	0,56	-	47.947,39	89,64%
5 S 09 002 91	Transporte de brita para reconf. base. Comercial pavimentada	t.km	979.147,872		406.796,771	406.796,771	0,39	-	158.650,73	41,55%
5 S 09 002 07	Transporte de brita para reconf. base. Local pavimentada	t.km	199.534,458		133.964,704	133.964,704	0,64	-	85.737,40	67,14%
5 S 09 001 91	Transporte de brita para reconf. base. Comercial não pavimentada	t.km	30.874,032		13.233,842	13.233,842	0,56	-	7.410,94	42,86%
5 S 09 001 07	Transporte de brita para reconf. base. Local não pavimentada	t.km	30.874,032		219,033	219,033	0,79	-	173,03	0,71%
5 S 09 002 07	Transporte de CBUQ da Usina até a Pista. Local pavimentada	t.km	1.765.390,412		1.249.520,137	1.249.520,137	0,64	-	799.692,85	70,78%
5 S 09 001 07	Transporte de CBUQ da Usina até a Pista. Local não pavimentada	t.km	142.447,200		1.541,775	1.541,775	0,79	-	1.217,94	1,08%
5 S 09 002 07	Transporte de material removido	t.km	75.870,000		72.040,584	72.040,584	0,64	-	46.105,97	94,95%
S/C	Recicl. c/ 1,5% de cimento e incorp. rev. asf. à base - esp. rev. entre 5 e 10 cm	m³	47.600,000		47.600,000	47.600,000	61,01	-	2.904.075,99	100,00%
2 S 09 001 40	Transporte local com carroceria em rodovia não pav. (cimento)	t.km	5.447,820		93,384	93,384	0,76	-	70,94	1,71%
2 S 09 002 40	Transporte local com carroceria em rodov. pavim. (cimento)	t.km	35.208,482		21.190,293	21.190,293	0,60	-	12.714,15	60,19%
5 S 09 001 90	Transporte comercial com carroc. rodov. não pav. (cimento)	t.km	5.447,820		5.447,790	5.447,790	0,53	-	2.887,30	100,00%
5 S 09 002 90	Transporte comercial com carroceria rodov. pav. (cimento)	t.km	247.984,766		227.171,463	227.171,463	0,37	-	84.053,41	91,61%
5 S 09 001 91	Transporte comercial com base. 10m³ rodov. não pav. (areia paleada)	t.km	2.891,700		2.891,690	2.891,690	0,56	-	1.619,31	100,00%
5 S 09 002 91	Transporte comercial com base. 10m³ rodov. pav. (areia paleada)	t.km	32.165,700		32.165,649	32.165,649	0,39	-	12.544,56	100,00%
5 S 09 001 07	Transporte local com base. em rodov. não pavim. (areia paleada)	t.km	2.499,000		49,200	49,200	0,79	-	38,83	1,97%
5 S 09 002 07	Transporte local com base. em rodov. pavim. (areia paleada)	t.km	16.150,680		13.843,248	13.843,248	0,64	-	8.859,63	85,71%
Sub-total de Pavimentação								-	8.249.978,65	77,51%

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alvaro Alveolus Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFR
RNP Nº 1201344077


Cássio Munio Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67546/D

PROTÓCOLO
SINFR
FIS: 04
Ass: [assinatura]

		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO							
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente		Contrato número: 388/2014/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 2.256 dias consecutivos							
Rodovia: MT - 246		Data assinatura: 23/09/2014		Prazo Restante: 217 dias corridos							
Trecho: Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Publicação: 23/09/2014		Valor Contratual (PI): R\$ 15.098.120,17							
Sub-Trecho: Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres		Processo Orig.: 511984/2013 - SETPU		Valor acum. medido (PI): R\$ 16.128.952,46							
Referência: 24ª (Vigésima quarta) medição provisória		Edital: C.P. 030/2.014 - Lote 2		Valor Termo Aditivo: R\$ 6.100.070,92							
Ordem Início Serviço: SUOT/O.I.S./nº 146/2014 de 01/10/2014		Termo Aditivo: -*-		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 21.198.191,09							
Período desta medição: 01/04/2.020 à 30/04/2.020		Período acumulado: 01/10/2.014 à 30/04/2.020		Empresa: Guaxe Construtora Ltda.							
Código	Descrição	Unid.	Quantidades				Preço unitário R\$	Valor desta medição R\$	Valor acumulado R\$	% exec.	
			contrato	nesta medição	medição anterior	medida acumulada					
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS										
5 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t	406,992		406,992	406,992	2.341,96	-	953.158,94	100,00%	
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	406,992		406,992	406,992	80,44	-	32.805,69	100,00%	
5 S 02 999 04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	194,980		154,633	154,633	1.257,31	-	194.421,57	79,31%	
5 S 09 009 04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	194,980		154,633	154,633	80,44	-	12.618,16	80,45%	
5 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20	t	2.675,012		1.669,975	1.669,975	1.611,51	-	2.691.181,37	62,43%	
5 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	t	2.675,012		1.669,975	1.669,975	80,44	-	137.312,79	63,81%	
3.0	CONSERVAÇÃO										
3 S 08 302 01	Limpeza de Bueiro	m³	344,000		-	-	19,86	-	-	0,00%	
3 S 08 900 01	Roçada de Capim Colômbio	ha	36,000		18,160	18,160	3.974,57	-	72.178,19	50,44%	
3 S 08 910 00	Capina Manual	m²	59.070,000		43.890,000	43.890,000	0,49	-	22.290,10	77,01%	
E006	Motoniveladora - Caterpillar - 120H - (104 Kw)	h	147,000		147,000	147,000	192,96	-	28.365,12	100,00%	
3 S 08 300 01	Limpeza de Sarjeta e Meio Fio	m	2.620,000		980,000	980,000	0,60	-	588,00	37,40%	
3 S 08 301 03	Limpeza de Descida d'água	m	105,630		-	-	1,21	-	-	0,00%	
	Limpeza de Entrada d'água	un	55,000		-	-	0,68	-	-	0,00%	
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM										
2 S 04 900 53	Sarjeta Triangular de Concreto - STC 03 - AC/BC	m	400,000		-	-	41,64	-	-	0,00%	
2 S 04 910 53	Meio Fio de Concreto - MFC 03 - AC/BC	m	9.130,000		-	-	34,00	-	-	0,00%	
2 S 04 910 55	Meio Fio de Concreto - MFC 05 - AC/BC	m	800,000		-	-	34,32	-	-	0,00%	
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	56,000		-	-	49,36	-	-	0,00%	
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	14,000		-	-	59,09	-	-	0,00%	
2 S 04 950 71	Dissipador de Energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	27,000		-	-	303,62	-	-	0,00%	
2 S 04 940 02	Descida d'água Tipo Rápido - Canal Retang.- DAR 02	m	33,590		-	-	96,26	-	-	0,00%	
2 S 03 324 50	Conc.Estr.Fck=15 Mpa-Controle Razoável Uso Ger.Conf.e Lanç AC/BC	m³	115,240		-	-	392,94	-	-	0,00%	
S/C	Dreno PEAD long. prof. p/ corte em solo - DPS 13 AC/BC	m	1.080,000		-	-	112,52	-	-	0,00%	
S/C	Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC	un	4,000		-	-	155,99	-	-	0,00%	
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	810,000		-	-	6,29	-	-	0,00%	
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav. (cimento)	t.km	612,028		-	-	0,76	-	-	0,00%	
2 S 09 002 40	Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim. (cimento)	t.km	3.955,456		-	-	0,60	-	-	0,00%	
5 S 09 001 90	Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. (cimento)	t.km	612,028		-	-	0,83	-	-	0,00%	
5 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	t.km	27.859,594		-	-	0,37	-	-	0,00%	
5 S 09 001 07	Transporte local c/ base. em rodov. não pavim. (brita/areia)	t.km	12.288,988		-	-	0,79	-	-	0,00%	
5 S 09 002 07	Transporte local c/ base. em rodov. pavim. (brita/areia)	t.km	79.422,012		-	-	0,64	-	-	0,00%	
5 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. (brita/areia)	t.km	12.806,439		-	-	0,56	-	-	0,00%	

Ass:  Engenheiro LTDA

Engº Alvaro Alveolais Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Ass:  Cassio Muniz Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67546/D





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFR
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra:	Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente	Contrato número:	388/2014/00/00-SETPU	Prazo de Execução:	2.256 dias consecutivos					
Rodovia:	MT - 246	Data assinatura:	23/09/2014	Prazo Restante:	217 dias corridos					
Trecho:	Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres	Publicação:	23/09/2014	Valor Contratual (PI):	R\$ 15.098.120,17					
Sub-Trecho:	Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres	Processo Orig.:	511984/2013 - SETPU	Valor acum. medido (PI):	R\$ 16.128.952,46					
Referência:	24ª (Vigésima quarta) medição provisória	Edital:	C.P. 030/2.014 - Lote 2	Valor Termo Aditivo:	R\$ 6.100.070,92					
Ordem Início Serviço:	SUOT/O.I.S./nº 146/2014 de 01/10/2014	Termo Aditivo:	-*-	Vr. Contratual + T. Aditivo:	R\$ 21.198.191,09					
Período desta medição:	01/04/2.020 à 30/04/2.020	Período acumulado:	01/10/2.014 à 30/04/2.020	Empresa:	Guaxe Construtora Ltda.					
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário R\$	Valor desta medição R\$	Valor acumulado R\$	% exec.
			contrato	nesta medição	medição anterior	medido acumulado				
5 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pav. (brita/areia)	t.km	327.689,708		-	-	0,39	-	-	0,00%
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS				Sub-total de Serviços de drenagem			-	-	0,00
2 5 09 010 01	Aluguel de Veículo Leve - Tipo Sedan até 70 Hp	mês	24,000		18,000	18,000	2.490,02	-	47.310,38	79,17%
6.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				Sub-total de Serviços diversos			-	47.310,38	79,17%
2 5 00 000 20	Mobilização e desmobilização	vb	1,000		0,500	0,500	151.634,56	-	75.817,28	50,00%
7.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO				Sub-total de Mobilização e desmobilização			-	75.817,28	50,00%
2 5 00 000 20	Instalação de Canteiro	vb	1,000		1,000	1,000	271.138,00	-	271.138,00	100,00%
	BUEIROS CELULARES DE CONCRETO				Sub-total de Instalação de canteiro			-	271.138,00	100,00%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				-	-				
2.0	DEMOLIÇÕES E DESVIOS / CAMINHOS DE SERVIÇO				Sub-total de Serviços preliminares				142.287,00	100,00%
3.0	TERRAPLENAGEM				Sub-total de Demolições, desvios e caminhos de serviço				515.519,61	100,00%
4.0	DRENAGEM				Sub-total de Terraplenagem				439.970,36	100,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO (RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO)				Sub-total de Drenagem				1.915.010,37	100,00%
6.0	SINALIZAÇÃO				Sub-total de Pavimentação				150.695,68	100,00%
7.0	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				Sub-total de Sinalização				6.272,87	100,00%
					Sub-total de Proteção ao meio ambiente				170.032,33	100,00%
Total acumulado desta medição									16.128.952,46	90,32%
À deduzir da medição medição anterior									16.128.952,46	
Total desta medição									0,00	
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em :			R\$ 0,00							

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Cássio Munio Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67546/D

PROTOCOLO
SINFRA
Fis: 06
Ass: X



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS


CONTROLE FINANCEIRO

Contrato: 388/2014/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda				Valor contratual: R\$ 15.098.120,17		Aditamento: R\$ 6.100.070,92		Total: R\$ 21.198.191,09	
Rodovia: MT-246	Trecho: Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres				Serviço: Conserv/restauração/melhor. meio amb.		Fiscal: Engº Alaoir Alveolos Zeferino de Paula		O. l. Serviço: SUOT/O.I.S./nº 146/2.014		
Número do processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos)	Medição (P.I.)		Medição (R.)		Total da medição	Total geral acumulado	Saldo à P.I.	
				2.256	Período:	Acumulado:	Período:				Acumulado:
701357/2014	1ª Medição	01/10/14 a 31/10/14	31	2.225	455.703,31	455.703,31	44.365,68	44.365,68	500.068,99	500.068,99	20.742.487,78
	Paralisação	01/11/14 a 21/05/15	202	2.023	-	455.703,31	-	44.365,68	-	500.068,99	20.742.487,78
328389/2015	2ª Medição	22/05/15 a 31/05/15	10	2.013	3.180.788,92	3.636.492,23	374.934,08	419.299,76	3.555.723,00	4.055.791,99	17.561.698,86
382448/2015	3ª Medição	01/06/15 a 30/06/15	30	1.983	261.403,43	3.897.895,66	27.828,37	447.128,13	289.231,80	4.345.023,79	17.300.295,43
444717/2015	4ª Medição	01/07/15 a 31/07/15	31	1.952	1.123.507,35	5.021.403,01	89.832,93	536.961,06	1.213.340,28	5.558.364,07	16.176.788,08
	Paralisação	01/08/15 a 19/06/16	324	1.628	-	5.021.403,01	-	536.961,06	-	5.558.364,07	16.176.788,08
317220/2016	5ª Medição	20/06/16 a 30/06/16	11	1.617	663.920,60	5.685.323,61	146.822,32	683.783,38	810.742,92	6.369.106,99	15.512.867,48
	Paralisação	01/07/16 a 16/05/17	320	1.297	-	5.685.323,61	-	683.783,38	-	6.369.106,99	15.512.867,48
293729/2018	6ª Medição	17/05/17 a 30/08/17	106	1191	-	5.685.323,61	-	683.783,38	-	6.369.106,99	15.512.867,48
	Paralisação	31/08/17 a 10/04/18	223	968	-	5.685.323,61	-	683.783,38	-	6.369.106,99	15.512.867,48
293737/2018	7ª Medição	11/04/18 a 30/04/18	20	948	333.041,66	6.018.365,27	122.407,62	806.191,00	455.449,28	6.824.556,27	15.179.825,82
462525/2018	8ª Medição	01/05/18 a 31/07/18	92	856	366.738,59	6.385.103,86	148.385,66	954.576,66	515.124,25	7.339.680,52	14.813.087,23
505264/2018	9ª Medição	01/08/18 a 31/08/18	31	825	16.704,90	6.401.808,76	8.881,39	963.458,05	25.586,29	7.365.266,81	14.796.382,33
545163/2018	10ª Medição	01/09/18 a 30/09/18	30	795	1.693.226,71	8.095.035,47	980.776,62	1.944.234,67	2.674.003,33	10.039.270,14	13.103.155,62
620154/2018	11ª Medição	01/10/18 a 31/10/18	31	764	660.947,03	8.755.982,50	388.049,82	2.332.284,49	1.048.996,85	11.088.266,99	12.442.208,59
635348/2018	12ª Medição	01/11/18 a 30/11/18	30	734	369.064,47	9.125.046,97	253.074,20	2.585.358,69	622.138,67	11.710.405,66	12.073.144,12
338439/2.019	13ª Medição	01/12/18 a 31/05/19	182	552	-	9.125.046,97	-	2.585.358,69	-	11.710.405,66	12.073.144,12
338522/2.019	14ª Medição	01/06/19 a 30/06/19	30	522	942.328,99	10.067.375,96	452.556,12	3.037.914,81	1.394.885,11	13.105.290,77	11.130.815,13
388179/2.019	15ª Medição	01/07/19 a 31/07/19	31	491	1.234.168,98	11.301.544,94	756.331,28	3.794.246,09	1.990.500,26	15.095.791,03	9.896.646,15
446811/2019	16ª Medição	01/08/19 a 31/08/19	31	460	1.011.432,31	12.312.977,25	612.405,89	4.406.651,98	1.623.838,20	16.719.629,23	8.885.213,84
500716/2019	17ª Medição	01/09/19 a 30/09/19	30	430	1.822.356,58	14.135.333,83	1.633.753,15	6.040.405,13	3.456.109,73	20.175.738,96	7.062.857,26
560473/2019	18ª Medição	01/10/19 a 31/10/19	31	399	1.211.494,42	15.346.828,25	917.143,94	6.957.549,07	2.128.638,36	22.304.377,32	5.851.362,84
606356/2019	19ª Medição	01/11/19 a 30/11/19	30	369	749.874,03	16.096.702,28	550.878,82	7.508.427,89	1.300.752,85	23.605.130,17	5.101.488,81
44510/2020	20ª Medição	01/12/19 a 31/12/19	31	338	18.268,02	16.114.970,30	6.384,17	7.514.812,06	24.652,19	23.629.782,36	5.083.220,79
83791/2020	21ª Medição	01/01/20 a 31/01/20	31	307	3.274,02	16.118.244,32	1.451,14	7.516.263,20	4.725,16	23.634.507,52	5.079.946,77
130009/2020	22ª Medição	01/02/20 a 29/02/20	29	278	7.826,12	16.126.070,44	2.948,78	7.519.211,98	10.774,90	23.645.282,42	5.072.120,65
168445/2020	23ª Medição	01/03/20 a 31/03/20	31	247	2.882,02	16.128.952,46	1.322,17	7.520.534,15	4.204,19	23.649.486,61	5.069.238,63
	24ª Medição	01/04/20 a 30/04/20	30	217	-	16.128.952,46	-	7.520.534,15	-	23.649.486,61	5.069.238,63
Cuiabá (MT), 04 de maio de 2.020											

Cuiabá (MT), 04 de maio de 2.020

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alaoir Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINPRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT-246

Trecho: Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres


Sub-Trecho: Ponte Rio Curupira - Barra do Bugres

Extensão: 45,245km

MT - 246 - posição em: 30/04/2.020

LEGENDA

- Pavimentação
- Conservação
- Serviços de drenagem
- Bueiros celulares



Atacado

Concluído

Quilometragem - - - - -


Estaqueamento - - - - -

Pavimentação - - - - -

Conservação - - - - -

Serviços de drenagem - - - - -

Bueiros celulares - - - - -



Atacado (%)	Concluído (%)
77,51%	77,51%
59,06%	59,06%
0,00	0,00
100,00%	100,00%

Cuiabá (MT), 04 de maio de 2.020
Fiscalização

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolo Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077

PROTOCOLO
SINFRA
Fis: 08
Ass: 1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Revitalização de Rodovias	Contrato:	I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU	Valor Contratual R\$:	R\$ 15.098.120,17
Rodovia:	MT - 246	Ref.:	248 (Vigésima quarta) medição provisória	Valor Aditivo R\$:	R\$ 6.100.070,92
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres	Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos	Valor Contratual + Aditivo R\$:	R\$ 21.198.191,09
Extensão	45,245 Km	Prazo de vig.:	2.354 dias consecutivos	Firma:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Início: 01/10/14	Mês/ano	01/10/2014 a 01/10/2014	01/11/2014 a 31/05/2015	22/05/2015 a 31/05/2015	01/06/2015 a 30/06/2015	01/07/2015 a 31/07/2015	01/08/2015 a 19/08/2016		
Término prov.: 04/12/20	Dias corridos	31 / 31	202 / 235	10 / 243	30 / 273	31 / 304	324 / 628		
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
I - Pavimentação	1,63%	173.047,58				5,78%	615.236,68		
II - Ligantes betuminosos	1,56%	89.938,41				7,25%	418.514,73		
III - Conservação	43,31%	90.509,39				-			
IV - Drenagem									
V - Serviços diversos	4,17%	2.490,02				4,17%	2.490,02		
VI - Mobilização e desmobilização	30,00%	45.490,36				20,00%	30.326,92		
VII - Instalação de canteiro	20,00%	54.227,60				21,00%	56.938,98		
Construção de bueiros celulares									
I - Serviços preliminares				93,26%	132.694,15	6,74%	9.592,85		
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço				102,43%	528.026,47				
III - Terraplenagem				103,83%	456.831,57				
IV - Drenagem				101,14%	1.996.905,58	2,30%	44.125,74		
V - Pavimentação (restauração do pavimento)				80,05%	120.637,15	20,54%	30.547,97		
VI - Sinalização						103,56%	6.496,04		
VII - Proteção ao meio ambiente				3,35%	5.694,00	100,12%	170.240,83		
Percentual global simples (PGS)	Realizado	2,15%		15,01%		1,23%		5,30%	
Percentual global acumulado (PGA)		2,15%	2,15%	17,15%		18,39%		23,69%	
Faturamento simples	1ª	455.709,31	-	2ª	3.180.786,92	3ª	261.403,43	4ª	1.123.507,35
Faturamento acumulado	med	455.709,31	-	med	3.636.492,23	med	3.897.895,66	med	5.021.403,01
Percentual global simples (PGS)	Previsão	2,15%		15,01%		1,23%		5,30%	
Percentual global acumulado (PGA)		2,15%	2,15%	17,15%		18,39%		23,69%	
Faturamento simples		455.709,31	-		3.180.786,92		261.403,43		1.123.507,35
Faturamento acumulado		455.709,31	455.709,31		3.636.492,23		3.897.895,66		5.021.403,01

Culabé (MT), 04 de maio de 2020

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alencar Zetterino de Paula

Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA

RFP Nº 1201344077

Cássio Murilo Cardoso Santos

Engº Residente - CREA Nº MG67548/D

Guaxe Construtora Ltda





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Revitalização de Rodovias	Contrato:	I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU	Valor Contratual R\$:	R\$ 15.098.120,17
Rodovia:	MT - 246	Ref.:	24ª (Vigésima quarta) medição provisória	Valor Aditivo R\$:	R\$ 6.100.070,92
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Berra do Bugres	Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos	Valor Contratual + Aditivo R\$:	R\$ 21.198.191,09
Extensão:	45,245 Km	Prazo de vig.:	2.354 dias consecutivos	Firma:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Início: 01/10/14	Mês/ano	20/06/2016 a 30/06/2016	01/07/2016 a 16/06/2017	17/05/2017 a 30/06/2017	01/08/2017 a 10/04/2018	11/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
Término prev.: 04/12/20	Dias corridos	11 / 639	320 / 959	106 / 1065	223 / 1.288	20 / 1.508	31 / 1.539		
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
I - Pavimentação	3,71%	394.931,87				0,76%	81.059,93		
II - Ligantes betuminosos	4,62%	266.498,71				1,55%	89.520,29		
III - Conservação									
IV - Drenagem									
V - Serviços diversos	4,17%	R\$ 2.490,02				1,17%	2.490,02		
VI - Mobilização e desmobilização						39,00%	159.971,42		
VII - Instalação de canteiro									
Construção de bueiros celulares									
I - Serviços preliminares									
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço									
III - Terraplenagem									
IV - Drenagem									
V - Pavimentação (restauração do pavimento)									
VI - Sinalização									
VII - Proteção ao meio ambiente									
Percentual global simples (PGS)		3,13%				1,57%			
Percentual global acumulado (PGA)		26,82%		26,82%		26,39%		29,39%	
Faturamento simples		5ª	663.920,60	6ª	-	7ª	333.041,66	8ª	-
Faturamento acumulado		med	5.685.323,61	med	5.685.323,61	med	6.018.365,27	med	6.018.365,27
Percentual global simples (PGS)		3,13%				1,57%			
Percentual global acumulado (PGA)		26,82%		26,82%		26,39%		29,39%	
Faturamento simples			663.920,60		-		333.041,66		-
Faturamento acumulado			5.685.323,61		5.685.323,61		6.018.365,27		6.018.365,27

Culabá (MT), 04 de maio de 2020

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Alvaro Alves dos Reis
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFR
RMP Nº 120/344077

Cássio Murilo Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67546/D
Guaxe Construtora Ltda

PROTOCOLO
SINFR
FIS: 18
Ass: 18



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Revitalização de Rodovias	Contrato:	I.C Nº 385/2014/00-SETPL	Valor Contratual R\$:	R\$ 15.098.120,17
Rodovia:	MT - 245	Ref.:	24ª (Vigésima quarta) medição provisória	Valor Aditivo R\$:	R\$ 6.100.070,92
Trecho:	Entr# BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres	Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos	Valor Contratual + Aditivo R\$:	R\$ 21.198.191,09
Extensão:	45,245 Km	Prazo de vig.:	2.354 dias consecutivos	Firma:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Início:	01/10/2014	Mês/ano	01/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018	01/09/2018 a 30/09/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	01/11/2018 a 30/11/2018
Término prev.:	04/12/20	Dias corridos	30 / 1.369	31 / 1.400	31 / 1.431	30 / 1.461	31 / 1.492	30 / 1.522
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I - Pavimentação			1,64%	174.415,65	0,01%	1.164,80	12,51%	1.381.608,43
II - Ligantes betuminosos			3,29%	189.832,92	0,23%	13.050,08	7,81%	450.910,47
III - Conservação						5,08%	10.621,92	
IV - Drenagem								
V - Serviços diversos			4,17%	2.490,02	4,17%	2.490,02	4,17%	2.490,02
VI - Mobilização e desmobilização								
VII - Instalação de canteiro								
Construção de bueiros celulares								
I - Serviços preliminares								
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço						-2,43%	-12.306,86	
III - Terraplenagem						-3,83%	-16.861,21	
IV - Drenagem						-3,45%	-66.020,95	
V - Pavimentação (restauração do pavimento)						-0,59%	-889,44	
VI - Sinalização						-3,56%	-223,17	
VII - Proteção ao meio ambiente						-3,47%	-5.902,50	
Percentual global simples (PGS)			1,73%		0,08%	7,99%	3,12%	1,74%
Percentual global acumulado (PGA)	Realizado	28,39%	30,12%		30,20%	38,19%	41,31%	43,05%
Faturamento simples		8ª	8ª	366.738,59	9ª	16.704,89	10ª	1.693.226,71
Faturamento acumulado		med	med	6.385.103,86	Med	6.401.808,75	Med	8.095.035,47
Percentual global simples (PGS)			1,73%		0,08%	7,99%	3,12%	1,74%
Percentual global acumulado (PGA)	Previsão	28,39%	30,12%		30,20%	38,19%	41,31%	43,05%
Faturamento simples				366.738,59		16.704,89		1.693.226,71
Faturamento acumulado				6.385.103,86		6.401.808,75		8.095.035,46


Culebá (MT), 04 de maio de 2020

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

ASTEC Engenharia LTDA
Engº Alair Aníbalos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Cassio Múlio Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67548/D
Guaxe Construtora Ltda





Obra:	Revitalização de Rodovias	Contrato	I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU	Valor Contratual R\$:	R\$ 15.098.120,17
Rodovia:	MT - 246	Ref.:	248 (Vigésima quarta) medição provisória	Valor Aditivo R\$:	R\$ 6.100.070,32
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres	Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos	Valor Contratual + Aditivo R\$:	R\$ 21.198.191,09
Extensão	45,245 Km	Prazo de vig.:	2.354 dias consecutivos	Assinatura:	GUAYE CONSTRUTORA LTDA

Culabá (MT), 04 de maio de 2.020

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Alair Alveios Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Cássio Murilo Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67548/D
Guayá Construtora Ltda

Fls: 12
Ass: 1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Revitalização de Rodovias	Contrato:	I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU	Valor Contratual R\$:	R\$ 15.098.120,17								
Rodovia:	MT - 246	Ref.:	24ª (Vigésima quarta) medição provisória	Valor Aditivo R\$:	R\$ 6.100.070,92								
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres	Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos	Valor Contratual + Aditivo R\$:	R\$ 21.198.191,09								
Extensão	45,245 Km	Prazo de vig.:	2.354 dias consecutivos	Firma:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA								
Início: 01/10/14	Mês/ano	01/11/2019 a 30/11/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/01/2020	01/02/2020 a 29/02/2020	01/03/2020 a 31/03/2020	01/04/2020 a 30/04/2020						
Término prev.: 04/12/20	Dias corridos	30 / 1.896	31 / 1.917	31 / 1.948	29 / 1.977	31 / 2.008	30 / 2038						
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
I - Pavimentação	5,26%	559.644,43											
II - Ligantes betuminosos	3,25%	167.739,56											
III - Conservação			7,55%	15.778,00	0,38%	784,00	2,55%	5.336,10					
IV - Drenagem							0,19%	392,00					
V - Serviços diversos	4,17%	2.490,02	4,17%	2.490,02	4,17%	2.490,02	4,17%	2.490,02					
VI - Mobilização e desmobilização													
VII - Instalação de canteiro													
Construção de bueiros celulares													
I - Serviços preliminares													
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço													
III - Terraplenagem													
IV - Drenagem													
V - Pavimentação (restauração do pavimento)													
VI - Sinalização													
VII - Proteção ao meio ambiente													
Percentual global simples (PGS)	Realizado	3,54%		0,09%		0,02%		0,04%		0,01%			
Percentual global acumulado (PGA)		75,93%		76,02%		76,04%		76,07%		76,09%	76,09%		
Faturamento simples		19ª	749.874,03	20ª	18.268,02	21ª	3.274,02	22ª	7.826,12	23ª	2.882,02	24ª	-
Faturamento acumulado		med	16.096.702,28	med	16.114.970,30	med	16.118.244,32	med	16.126.070,44	med	16.128.952,46	med	16.128.952,46
Percentual global simples (PGS)	Previsão	3,54%		0,08%		0,04%		0,05%		0,12%		0,12%	
Percentual global acumulado (PGA)		75,93%		76,01%		76,06%		76,11%		76,23%		76,35%	
Faturamento simples			749.874,03		16.888,66		8.985,87		10.853,49		25.874,63		25.874,63
Faturamento acumulado			16.096.702,28		16.113.590,94		16.122.576,81		16.139.430,40		16.158.305,03		16.185.176,66
Culabá (MT), 04 de maio de 2020													
<div>NOTAS</div> <div>01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global</div> <div>02) PGS - Será a soma do PS</div> <div>03) PGA - Será a soma acumulada do PGS</div> <div>Engº Alaco Aguiar Zeferino de Paula</div> <div>Fiscal Barreira Nº 024/2019/SAOR/SINFRA</div> <div>RNP Nº 1201344077</div> <div>Cássio Muniz Cardoso Santos</div> <div>Engº Residente - CREA Nº MG67548/D</div> <div>Guaxe Construtora Ltda</div>													

ASZEC Engenharia LTDA

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 13
Ass: J



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Revisitação de Rodovias	Contrato:	I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU	Valor Contratual R\$:	R\$ 15.098.120,17
Rodovia:	MT - 245	Ref.:	24ª (Vigésima quarta) medição provisória	Valor Aditivo R\$:	R\$ 6.100.070,92
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres	Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos	Valor Contratual + Aditivo R\$:	R\$ 21.198.191,09
Extensão	45,245 Km	Prazo de vig.:	2.354 dias consecutivos	Firma:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Início: 01/10/14	Mês/ano	01/05/2020 a 31/05/2020	01/06/2020 a 30/06/2020	01/07/2020 a 31/07/2020	01/08/2020 a 31/08/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	
Término prev.: 04/12/20	Dias corridos	31 / 2.069	30 / 2.099	31 / 2.130	31 / 2.161	30 / 2.191	31 / 2222	
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I - Pavimentação	1,19%	126.235,02	2,52%	268.156,23	3,46%	368.156,24	2,41%	256.842,87
II - Ligantes betuminosos	2,86%	165.235,10	5,17%	298.563,58	7,15%	412.568,46	6,38%	368.246,45
III - Conservação							11,90%	686.966,38
IV - Drenagem	7,97%	59.852,02	6,69%	65.235,85			7,34%	15.342,28
V - Serviços diversos	3,03%	1.810,92	3,03%	1.810,92	3,03%	1.810,92	14,37%	107.903,40
VI - Mobilização e desmobilização							21,55%	161.855,11
VII - Instalação de canteiro							3,03%	1.810,92
Construção de bueiros celulares							2,65%	1.584,59
I - Serviços preliminares								
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço								
III - Terraplenagem								
IV - Drenagem								
V - Pavimentação (restauração do pavimento)								
VI - Sinalização								
VII - Proteção ao meio ambiente								
Percentual global simples (PGS)	Realizado	1,67%	2,99%	3,69%	3,72%	3,47%	5,39%	
Percentual global acumulado (PGA)		77,75%	80,74%	84,43%	88,15%	91,62%	97,01%	
Faturamento simples		353.133,06	633.766,58	782.535,62	788.755,35	734.803,63	1.142.591,07	
Faturamento acumulado		16.482.083,52	17.115.852,10	17.898.387,72	18.687.143,07	19.421.946,70	20.564.537,77	
Percentual global simples (PGS)	Previsão	0,05%	1,87%	6,04%	7,30%	7,03%	0,55%	
Percentual global acumulado (PGA)		76,40%	78,28%	84,31%	91,61%	98,64%	99,19%	
Faturamento simples		10.853,49	396.897,67	1.279.516,39	1.547.644,19	1.489.468,20	116.001,49	
Faturamento acumulado		16.196.093,15	16.592.930,82	17.872.447,21	19.420.091,40	20.909.559,60	21.023.561,09	

Culabá (MT), 04 de maio de 2020

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveiro Zeferino de Paula

Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA

RNP Nº 120/344077

Cássio Murilo Cardoso Santos

Engº Residente - CREA Nº MSE7546/D

Guaxe Construtora Ltda

PROTÓCOLO
SINFRA
Fis: 14
Ass: 14



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINPRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Revitalização de Rodovias	Contrato:	I.C Nº 388/2014/00-SETPU	Valor Contratual R\$:	R\$ 15.098.120,17
Rodovia:	MT - 246	Ref.:	24ª (Vigésima quarta) medição provisória	Valor Aditivo R\$:	R\$ 6.100.070,92
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres	Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos	Valor Contratual + Aditivo R\$:	R\$ 21.198.191,09
Extensão:	45,245 Km	Prazo de vig.:	2.354 dias consecutivos	Firma:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Início: 01/10/14	Mês/ano	01/11/2020 a 30/11/2020	01/12/2020 a 04/12/2020						
Término prev.: 04/12/20	Dias corridos	30 / 2.252	4 / 2.256						
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)					
I - Pavimentação	1,19%	126.235,03							
II - Ligantes betuminosos	2,86%	165.235,12							
III - Conservação	19,09%	39.900,56	14,50%	30.298,74					
IV - Drenagem	25,88%	194.355,68							
V - Serviços diversos	3,03%	1.810,92							
VI - Mobilização e desmobilização	50,00%	75.817,28							
VII - Instalação de canteiro									
Construção de bueiros celulares									
I - Serviços preliminares									
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço									
III - Terraplenagem									
IV - Drenagem									
V - Pavimentação (restauração do pavimento)									
VI - Sinalização									
VII - Proteção ao meio ambiente									
Percentual global simples (PGS)	Realizado	2,85%		0,14%					
Percentual global acumulado (PGA)		99,86%		100,00%					
Faturamento simples			603.354,56		30.298,74				
Faturamento acumulado			21.167.892,35		21.198.191,09				
Percentual global simples (PGS)	Previsto	0,69%		0,12%					
Percentual global acumulado (PGA)		99,88%		100,00%					
Faturamento simples			146.613,03		26.016,95				
Faturamento acumulado			21.172.174,14		21.198.191,09				

Culabá (MT), 04 de maio de 2.020

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Mesquita Zeferino de Paula
Piscar Porteira nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 120/1344077


Cássio Murilo Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67546/D
Guaxe Construtora Ltda

GRÁFICO DE CONTROLE PLUVIOMÉTRICO

RODOVIA MT-246

(Lote 02)

PERÍODO: abril 2020

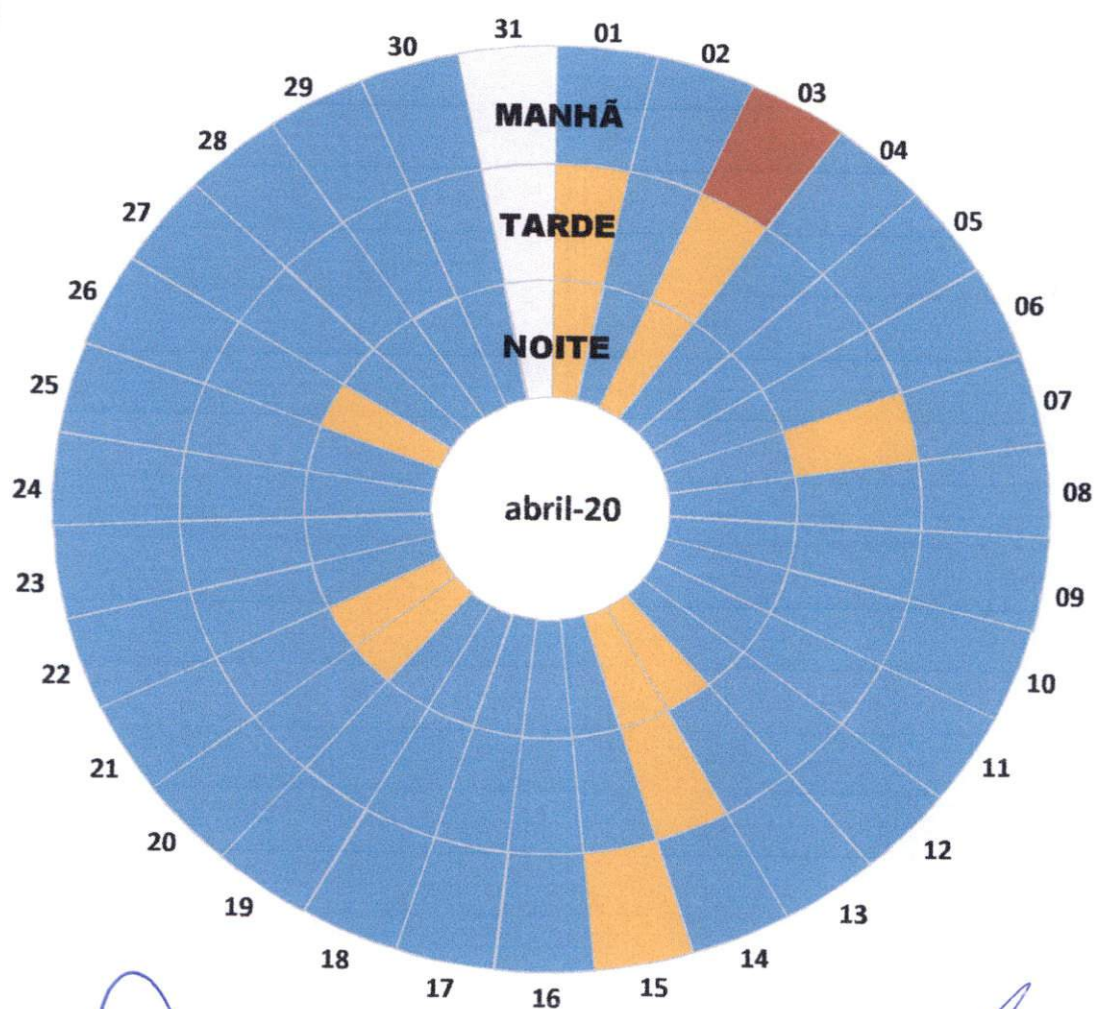

[assinatura]
ASTEC Engenharia LTDA

-  - TEMPO BOM
 -  - TEMPO CHUVOSO
 -  - TEMPO IMPRATICÁVEL
- [assinatura]*

GOVERNO DO MATO GROSSO ESTADO DE TRANSPORTAÇÃO		Nº. DA FOLHA <div style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div>	
MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSPORTAÇÃO WWW.MT.GOV.BR		DATA (dd/mm/aa) 01/04/2020 a 30/04/2020	
OBRA:			
• Contratos Revitalização de Rodovias		CONTRATO Nº. Rodovia: MT - 246 I.C. Nº 388/2014/00/00-SETPU	
CONSTRUTORA GUAXE CONSTRUTORA LTDA			
TEMPO / CLIMA <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL </div>			
1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO			
RESTAURAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES
XXXX			
2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO			
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO
3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA *****			
4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO *****			
5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA Não houveram trabalhos no período devido a ausência de dotação orçamentária.			
Local/Data: Cuiabá, 04 de maio de 2020.			
Cássio Murilo Cardoso Santos Engº Res - CREA Nº MG67546/D Guaxe Construtora Ltda		Engº Everson Temponi Supervisão Astec CREA/SP 5063002523	
		Engº Alaor Alveiros Zeferino de Paula Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA RNP Nº 1201344077	



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

À Superintendência de Execução e fiscalização de Obras I – SUEF I

CUIABÁ/MT

Referência: IC-388/2014/00/00 - SETPU

Assunto: **Justificativa sobre a 24ª medição provisória de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente – CREMA e Pavimentação.**

Considerando o instrumento contratual em epígrafe e o Processo de Medição encaminhado à esta Secretaria com período de 01/04/2020 a 30/04/2020 em que não foram executados serviços. Fora decidido por esta fiscalização e em comum acordo com a contratada, a não execução de serviços e consequente medição devido a falta de dotação orçamentária até o período supra citado, a dotação orçamentária é oriunda de recursos advindo do BNDES, programa PRDESTUR, e até o presente momento não fora repassado ao estado a dotação deste financiamento.

Atenciosamente,

Eng.º Alaor Alvéolos Zeferino de Paula

Fiscal Port. Nº 024/2019/SAOR/SINFRA



GUAXE
CONSTRUTORA

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: <u>19</u>
Ass: <u>[assinatura]</u>

Ofício n.º 101/2020

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2020.

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Rua J, Quadra 1 – Lote 5, Edifício Eng. Edgar Prado Arze, Setor A – CPA

CEP: 78.049-906 – Cuiabá -MT

At: Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I

Referência: IC-388/2014/00/00 - SETPU

Assunto: Justificativa sobre a 24ª medição provisória de serviços de pavimentação.

Prezado Superintendente,

A Empresa Guaxe Construtora Ltda. detentora do Instrumento Contratual descrito acima, firmados entre esta Empresa e a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo Eng.º Cássio Murilo Cardoso Santos, Eng.º Responsável, vem mui respeitosamente através desta se **Justificar** acerca do Processo de Medição Supra citado.

Considerando o instrumento contratual em epígrafe e o Processo de Medição encaminhado à esta Secretaria com período de 01/04/2020 a 30/04/2020 com valor zero. Esta empresa juntamente com o Eng.º Fiscal de contrato, Eng.º Alaor Alvéolos Zeferino de Paula, decidiu pela não execução de serviços neste período, devido à ausência de dotação orçamentária até o mês referência desta medição.

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,


Eng.º Cássio Murilo Cardoso Santos
Guaxe Construtora Ltda.




PROTOCOLO SINFRA
Fis: <u>23</u>
Ass: <u>[assinatura]</u>

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



DESPACHO DO PROTOCOLO

Protocolo nº 247602 / 2020.

Encaminhamos o presente processo ao setor: Cofp /SINFRA.

Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 21.

Por ser verdade, confirmo e assino.

Larissa Aparecida da Silva Pacheco
Gerente de Protocolo
SINFRA/MT

Cuiabá-MT, 13 / 07 / 2020.



SUEFI
Fis. 22
Ass. Mar

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Encaminhamento de Medição Provisória

À Coordenadoria de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias. (COQR).
CUIABÁ/MT

Assunto: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 388/2014/00/00 – SINFRA

Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

Atraves do presente, encaminho a V.S.ª a 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória, após análise técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 02 a 21.

Em 14 de julho de 2020.


Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Encaminhamento de Medição

ILMO SR.

ENG.º Nilton de Britto

M.D. SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS - SAOR

CUIABÁ/MT

Assunto: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória

Ref. I.C. Nº 388/2014

Considerando a manifestação da Empresa contratada na folha 19; em atenção à manifestação do fiscal na folha 18.

Encaminhamos ao Senhor Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias; para conhecimento e providencias que entender pertinentes.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 22.

Em 21 de agosto de 2020.

Katiane Alves da Silva
Katiane Alves da Silva

Coordenadora de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias
COQR/SUCEO/SAOR /SINFRA-MT
