



Protocolo/SETPU
Folha Nº 01
Ass.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

Protocolo n.: 451338/2013 Data: 20/08/2013 12:52

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENSERCON ENGENHARIA LTDA/IC 022/13/ASJU
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 3 MEDIÇÃO NO VALOR R\$ 2.008.099,70
DO IC 022/13-ASJU, DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENT
36136600 36136600

Sector Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Sector Destino: SUOT

Volume: 1 de 1

39 Medição



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COOT	20.08.13	



Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº
Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADE



Cuiabá, 2 de agosto de 2013.

Ao Ilmo Sr.
Eng.º. TÉRCIO LACERDA DE ALMEIDA
M.D. Superintendente de Obras de Transportes
Nesta

Sr. ,Secretário

Pelo presente expediente, encaminho-vos a **3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO** dos Serviços de Execução da obra de AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT, objeto do Instrumento Contratual Nº 022/2013/00/00-ASJU

2.008.099.70

Atenciosamente

Engº Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. Nº 497/2.013 - SETPU



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DO ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES
CORDENADORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

CONTRATO

-Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Local: Rondonópolis - MT

-Capa de rolamento C.B.U.Q.: 56.271,216 T

-Extensão do drenagem: 3.103,00 m

-Firma: ENSERCON ENGENHARIA LTDA

-Edital: C.P. n.º 015/2012

-Instrumento Contratual: 022/2013/00/00-ASJU

-Processo Original: 561314/2012 -SETPU

-Prazo Contratual: 720 DIAS (SETECENTOS E VINTE)

-Dias Decorridos: 78 DIAS

-Saldo de Prazo: 641 DIAS

-Termino Previsto: 02/05/2015

-Ordem de Inicio de Serviço: 13 DE MAIO DE 2013

-Data da Assinatura: 14/03/2013

-Data da Publicação: 14/03/2013

-Metas - Exercício: 2013/2014

-Natureza de Serviço: EXEC. DA OBRA DE AMPL. E PAV. DO AEROPORTO

Valor Contratual (PI): R\$ 20.892.913,14

-Valor Empenhado: R\$ -

-Valores Medidos (PI) R\$ 5.015.412,05

-Valores Reajustes: R\$ -

-Valores pagos pela Sinfra R\$ -

-Valores PI + Reaj. R\$ -

-Saldo Empenhado: R\$ 15.877.501,09

-Valor Aditivo:

-Termo Aditivo com Reflexo Financeiro

-Processo Aditivo:

-Termo Aditivo de Prazo:

Cuiabá, 2 de agosto de 2013.


Engº Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. N° 197/2.013 - SETPU

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	RESUMO DE MEDIÇÃO										SETPU
	Nº Contrato	022/2013/00/00-ASJU	Prazo de Execução	720 dias	Prazo Restante	642 dias	Prazo de Execução	720 dias	Prazo Restante	642 dias	
OBRA:	Data Assinatura	14/03/13	Publicação	18/03/13	Vr. Contratual PI	R\$ 20.892.913,14	Vr. Acum. Medido PI		Vr. Acum. Programado PI		
-Capa (C.B.U.Q.):	Processo Orig.	561314/2012 - SETPU	Data de Paralisação:		Vr. Programado Próximo mês PI						
-Drenagem:	Data de Reinício:										
Período:	Período acumulado:	14/05/2013 à 31/07/2013									
ITEM	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA			
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT											
1.0											
1.1	vb	1,000	-	1,000	1,000	49.755,05	178.437,41	100,00%			
1.2	vb	1,000	-	0,500	0,500	4.959,70	49.755,05	50,00%			
1.3	vb	1,000	-	0,500	0,500	12.710,51	2.479,85	50,00%			
1.4	vb	1,000	-	0,500	0,500	7.412,21	6.355,25	50,00%			
1.5	vb	1,000	-	1,000	1,000	853,65	3.706,10	50,00%			
1.6	mês	12,000	1,000	2,000	3,000	7.508,69	22.526,07	100,00%			
1.7	mês	12,000	1,000	2,000	3,000	27.918,32	83.754,96	25,00%			
1.8	m²	42,000	-	42,000	42,000	214,44	9.006,48	100,00%			
1.9	und	1,000	-	-	-	1.805,98	-	0,00%			
2.0											
2.1	m²	20.850,000	-	20.850,000	20.850,000	1,65	2.268.852,76	100,00%			
2.2	m³	107.587,281	19.759,468	87.827,812	107.587,280	14,50	1.560.015,56	100,00%			
2.3	m³	129.450,039	54.405,792	75.044,247	129.450,039	5,21	674.434,70	100,00%			
3.0											
3.1	m²	109.164,800	20.488,490	77.282,950	97.771,440	0,76	792.484,20	6,28%			
3.2	m³	25.220,637	7.800,347	17.420,290	25.220,637	12,86	324.337,39	89,56%			
3.3	m³	21.046,480	3.229,440	-	3.229,440	88,50	285.805,44	100,00%			
3.4	m²	109.164,800	-	-	-	1,39	-	15,34%			
3.5	ton	56.271,216	-	-	-	62,15	-	0,00%			
3.6	ton	130,997	-	-	-	2.337,57	-	0,00%			
3.7	ton	2.813,560	-	-	-	1.642,10	-	0,00%			
3.8	ton	43,665	-	-	-	1.155,80	-	0,00%			
3.9	ton x km	1.406.780,400	-	-	-	0,51	-	0,00%			
3.10	ton	130,997	-	-	-	75,98	-	0,00%			
3.11	ton	43,665	-	-	-	75,98	-	0,00%			

Protocolo/SETPU
Folha Nº 04
Ass.

Eng. Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. N° 197/12 013 - SETPU

Local e data: Curitiba, 2 de agosto de 2013
Comissão de Fiscalização

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		RESUMO DE MEDIÇÃO						SETPU	
	Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data de Paralisação: Data de Reinício:		022/2013/00/00-ASJU 14/03/13 18/03/13 561314/2012 - SETPU 56271.216 T 3.103,00 m 3ª Medição 1/07/2013 a 31/07/2013						Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado próx. mês PI	
	Período acumulado:		14/05/2013 a 31/07/2013						Empresa: ENSERCON ENGENHARIA LTDA.	
ITEM	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA		
3.12	ton	2.813,560			-	75,98	-	0,00%		
3.13	ton x km	39.356,320	12.172,291	27.184,028	39.356,319	0,53	20.858,84	100,00%		
3.14	ton x km	59.471,773	18.393,685	41.078,087	59.471,772	0,66	39.251,36	100,00%		
3.15	ton x km	589.301,440	90.424,320	-	90.424,320	0,53	47.924,88	15,34%		
3.16	ton x km	754.597,006		-	-	0,53	-	0,00%		
4.0										
4.1	und	3.000		-	-	38,69	512.602,74	48,57%		
4.2	und	2.000		-	-	229,24	-	0,00%		
4.3	und	1.000		-	-	2.816,44	-	0,00%		
4.4	m	235.000		-	-	114,36	-	0,00%		
4.5	m	2.835.000	600.500	817.000	1.417.500	319,03	452.225,02	50,00%		
4.6	m	288.000	74.000	60.000	134.000	450,58	60.377,72	50,00%		
5.0										
5.1	m	60.000		-	-	2.304,91	-	0,00%		
5.2	und	2.000		-	-	10.638,48	-	0,00%		
6.0										
6.1	m²	134.375,480		-	-	1,27	1.266.597,07	70,32%		
6.2	m²	20.000,000		-	-	7,45	-	0,00%		
6.3	m	7.285,710	4.095,710	3.190,000	7.285,710	172,38	1.255.910,68	100,00%		
6.4	und	1.000		-	-	2.500,00	-	0,00%		
6.5	m²	7.038,010		-	-	15,56	-	0,00%		
6.6	m²	1.263,060		-	-	22,17	-	0,00%		
6.7	und	24.000	1.000	2.000	3.000	3.562,13	10.686,39	12,50%		
Local e data: Cuiabá, 2 de agosto de 2013 Comissão de Fiscalização										Protocolo/SETPU Folha Nº 05 Ass. 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	0,00%
7.0	OBRAS CIVIS									
7.1	Construção de Casa de Força com 20m² com 3m de Altura em Alvenaria de Tijolos Furados de Uma Vez com Laje e Cobertura em Telhas de Fibro Cimento, uma Porta Metálica de 0,90 x 2,10m, Portão Metálico com Duas Folhas com Ventilação Tipo Xicara de 1,50 x 2,10m um Vitraux de 1,00 x 0,60m com Piso em Concreto Desempenado para Carga de até 800 kgf.	m²	16.000				1.545,45		0,00%	
8.0	SINALIZAÇÃO LUMINOSA									
8.1	Escavação Manual e Reat. Compact. Mat. 1ª Categoria	m³	1.980.000				11,67		0,00%	
8.2	Reaterro e Compactação com Placa Vibratória	m³	1.210.000				26,25		0,00%	
8.3	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	m	186.000				10,50		0,00%	
8.4	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=38mm	m	100.000				8,64		0,00%	
8.5	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	m	1.800.000				14,15		0,00%	
8.6	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=75mm	m	11.750.000				15,00		0,00%	
8.7	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=100mm	m	550.000				19,20		0,00%	
8.8	Recomposição do Terreno	m³	30.000				12,65		0,00%	
8.9	Caixas de Concreto das Bases das Luminárias	und	40.000				405,00		0,00%	
8.10	Macoço de Concreto	und	218.000				405,94		0,00%	
8.11	Caixa de Passagem Tipo 1 - Com Tampa Fofo	und	4.000				865,00		0,00%	
8.12	Caixa de Passagem Tipo 2	und	12.000				451,00		0,00%	
8.13	Caixas de Inspeção de Linhas de Dutos	und	230.000				337,00		0,00%	
8.14	Poços de Aterramento	und	56.000				475,00		0,00%	
8.15	Lançamento de Condutor de Aterramento e Ligações	m	15.300.000				8,20		0,00%	
8.16	Regularização da Casa de Força com 20mf Substação e Acessórios	cj	1.000				68.560,00		0,00%	
8.17	BALIZAMENTO									
8.18	Lançamento de Cabos dos Circuitos	m	14.000.000				24,85		0,00%	
8.19	Instalação de Unidades de Luz	und	250.000				923,00		0,00%	
8.20	Lançamento de Cabos de Controle	m	50.000				39,84		0,00%	
	Sinalização Vertical	cj	3.000				81.327,99		0,00%	

Local e data: Curitiba, 2 de agosto de 2013.
Comissão de Fiscalização

Engº Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. Nº 197/12.013 - SETPU





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU


OBRA: -Capa (C.B.U.Q.): -Drenagem: Referência: Período:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT 56 271,216 T 3.103,00 m 3ª Medição 1/07/2013 a 31/07/2013	Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data de Paralisação: Data de Reinício: Período acumulado:	022/2013/00/00-ASJU 14/03/13 18/03/13 561314/2012 -SETPU	Prazo de Execução 720 dias 642 dias R\$ 20.892.913,14	Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx. mês PI	Empresa: ENSERCON ENGENHARIA LTDA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO			
8.21	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA								
	Quadro de Proteção e Comando 150 Kw, 02 RCC 10Kx, Controles de Farol, Biruta e Acessórios	cj	1,000				149.231,99	-	0,00%
8.22	Grupo Gerador Trifásico, 220V, 150 Kva	cj	1,000				83.631,00	-	0,00%
8.23	Entrada e Medição de Energia em Baixa Tensão 45 Kva	cj	1,000				7.859,99	-	0,00%
8.24	Instalação de Poste e Montagem do Farol do Aeródromo, Inclusive fornec. Materiais	cj	1,000				75.656,00	-	0,00%
8.25	Instalação de Biruta Iluminada, Inclusive Fornecimento Materiais	cj	1,000				26.295,99	-	0,00%
8.26	Iluminação do Pátio de Aeronaves Conforme Projeto	cj	9,000				24.403,00	-	0,00%
8.27	Indicador de Rampa de Ponto PAPI	cj	1,000				390.000,01	-	0,00%
Total Acumulado Executado Com BDI (R\$)								5.018.974,18	
Valor a Deduzir (Medição Anterior)								3.010.874,48	
Valor Líquido Desta Medição								R\$ 2.008.099,70	
#NOME?									

Local e data: Cuiabá, 2 de agosto de 2013


Fiscalização

Engº Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. N° 191/2013 - SETPU



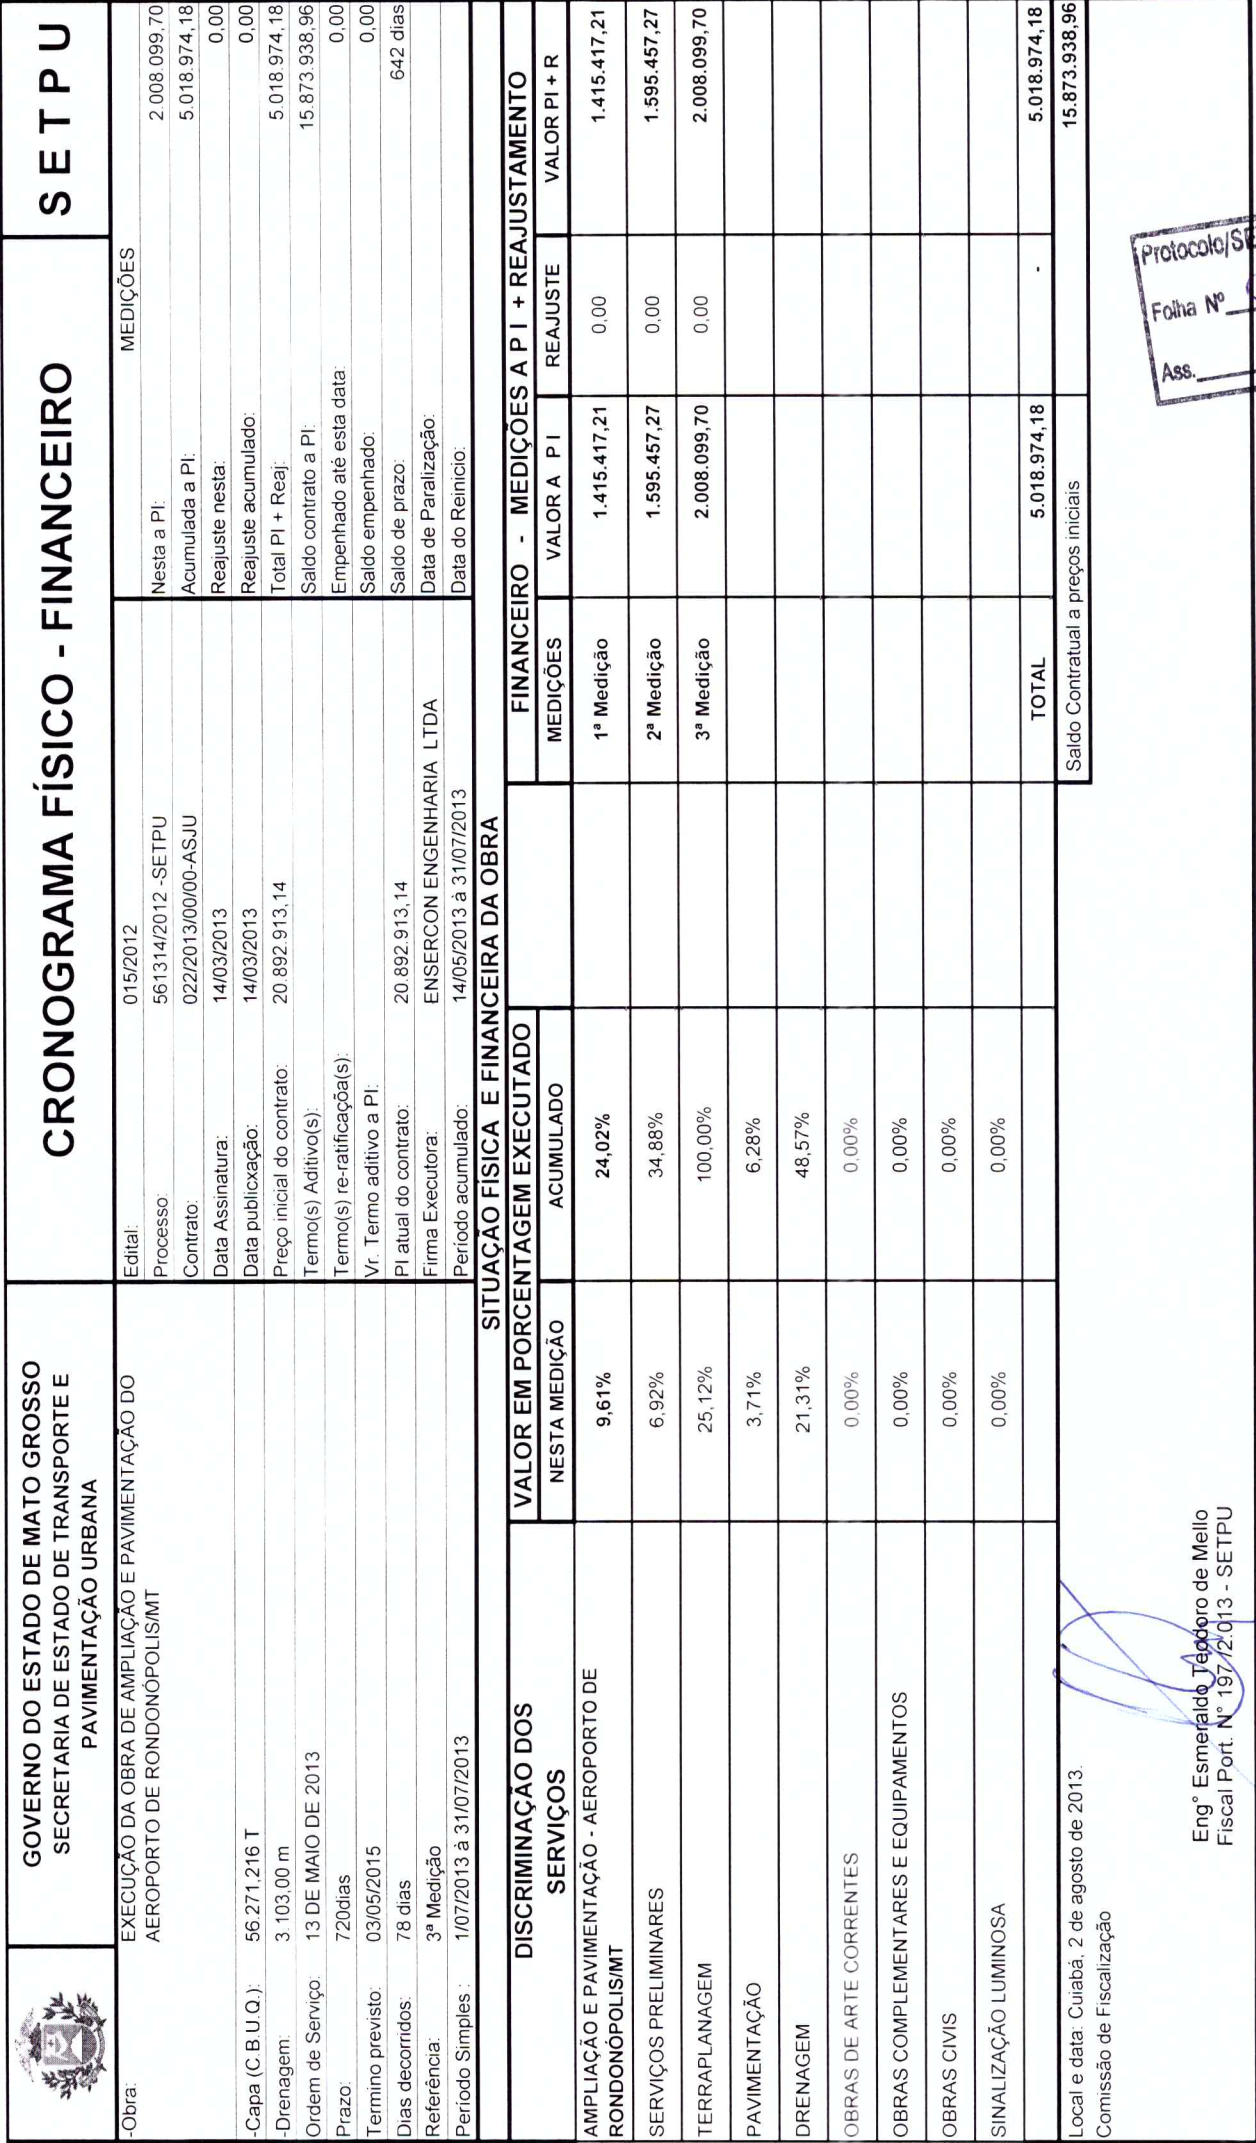

o de 2013.



Desm. Dest. Limpeza Áreas
c/ Arv. Diam. Até 0,15m e
Transporte do Material até
1000m


Firma: **ENSERCON ENGENHARIA LTDA**

OBSERVAÇÃO	COMPRIMENTO O (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
ALONGAMENTO DE PISTA	417,00	50,00	20.850,00
TOTAL EXECUTADO			20.850,00
MEDIDO ANTERIORMENTE			20.850,00
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			

Cuiabá, 2 de agosto de 2013.

Engº Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. N° 197 /2.013 - SETPU





ENSERCON ENGENHARIA LTDA

TOTAL EXECUTADO	107.587,280
MEDIDO ANTERIORMENTE	87.827,812
TOTAL DESTA MEDIÇÃO	19.759,468

Cuiabá, 2 de agosto de 2013.

Engº Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port N° 197 /2.013 - SETPU





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.): 56.271,216 T

-Drenagem: 3.103,00 m

Referência: 3ª Medição

Período: 1/07/2013 à 31/07/2013

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

Compactação de Aterro a 95% do
Proctor Modificado

ESTACAS		ÁREAS PARCIAIS (m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		D/2 (m)	VOLUMES ACUMUL. (m³)	
EST.	FRAC.	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO
0	+ 0,00							
118	+ 4,43					PARCIAL	18.833,002 18.833,002	38.521,278 38.521,278
	+ 7,00							
149	+ 7,00					PARCIAL	35.392,266 35.392,266	90.928,761 90.928,761
						PARCIAL		
				TOTAL EXECUTADO			54.225,268	129.450,039
				MEDIDO ANTERIORMENTE			29.182,312	75.044,247
				TOTAL DESTA MEDIÇÃO			25.042,956	54.405,792

Local e data:

Cuiabá, 2 de agosto de 2013.

Engº Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. N° 197/2013 - SETPU





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

3ª Medição

Período:

1/07/2013 à 31/07/2013

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

Regularização do Sub-Leito com 95%
do Proctor Modificado

ESTACAS			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FRAC.	INICIAL				
35	+	118	+	4,43		
36	+	18,31	+	18,31		
-	+	-	+	18,31		
110	+	10,00	+	7,00		
				25,90	43.108,84	Regularização - Pista de taxi
				80,00	15.200,00	Regularização - Pátio de Estacionamento Novo
				25,90	17.568,30	Regularização - Pista de taxi
				45,90	21.894,30	Regularização - Pista prolongamento

TOTAL EXECUTADO
MEDIDO ANTERIORMENTE
TOTAL DESTA MEDIÇÃO

97.771,44
77.282,95
20.488,49

TOTAL

Local e data:

Cuiabá, 2 de agosto de 2013.

Engº Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. N° 197 / 2.013 - SETPU

Protocolo SETPU
Folha Nº 13
Ass.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

3ª Medição

Período:

1/07/2013 à 31/07/2013

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

Sub-Base de Solo Estabilizado Granul.
s/ Mistura - CBR DIRENG Conforme
Especificação

ESTACAS			EXTENSÃO (m)	Área da Seção (m²)	VOLUME (m³)	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FRAC.	INICIAL				
(1) +	-	38 +	780,00	4,91	3.831,750	SUB-BASE - Pista de taxi
36 +	18,31	45 +	190,00	20,00	3.800,000	SUB-BASE - Pátio de Estacionamento Novo
45 +	19,00	119 +	1.461,00	4,91	7.177,162	SUB-BASE - Pista de taxi
110 +	1,00	131 +	426,00	11,41	4.861,725	SUB-BASE - Prolongamento Pista
12 +	10,00	105 +	1.850,00	3,00	5.550,000	
TOTAL					25.220,637	
					17.420,290	
					7.800,347	

Local e data:

Cuiabá, 2 de agosto de 2013.

TOTAL EXECUTADO
MEDIDO ANTERIORMENTE
TOTAL DESTA MEDIÇÃO

Engº Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. N° 197 /2013 - SETPU





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

3ª Medição

Período:

1/07/2013 à 31/07/2013

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

ESTACAS

INICIAL	FRAC.	INICIAL	FRAC.
45	+	19,00	

88

+

-

EXTENSÃO
(m)

841,00

Área da Seção
(m²)

3,84

VOLUME
(m³)

3.229,440

OBSERVAÇÃO

SUB-BASE - Pista de taxi

TOTAL

Cuiabá, 2 de agosto de 2013.

TOTAL EXECUTADO
MEDIDO ANTERIORMENTE
TOTAL DESTA MEDIÇÃO

3.229,440

3.229,440

Eng.º Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. N.º 197/2.013 - SETPU





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



PROC. Nº: 45338/13

FLS.: 17

DATA: 20 / 08 / 2013

A SEDTUR
em 28/08/13

Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU


Encaminhamos o presente processo ao setor
COOT /SETPU.

Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas 24 a 17

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 20 / 08 / 2013

Dayana Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento	Pág. Nº 03 SEC. EXECUTIVA Proc. Nº 01 Visto
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	

Ensercon Engenharia Ltda
Ensercon Engenharia

Avenida Aclimação, 445 - Qdra 41 - Jardim Aclimação
 CEP 78050-040 - Fone (65) 3642-5959 - Cuiabá - MT
 nubiaredez@hotmail.com
 Inscrição Municipal 16396 - CPF/CNPJ 15.361.439/0001-17

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município		4/9/2013 11:44:10	DA 6E 8D	214
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.507.415/0025-11	62536	Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Rua Voluntarios da Patria			Centro	
Cidade / UF	Telefone	e-mail		
78005-180	Cuiabá / MT			

Descrição dos Serviços

Referente 3ª (Terceira) Medição dos Serviços de Execução da obra de AMPLIACAO E PAVIMENTACAO - AEROPORTO DE RONDONOPOLIS - MT.
 Instrumento Contratual Nº 022/2013/00/00-ASJU.

- Valor Material/Equipamento: R\$ 1.807.289,73
 - Valor Mão-de-Obra: R\$ 200.809,97

CEI Nº 51.220.95037/78

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
4.3600 - Terraplenagem e Outras Movimentações de Terra	5,00	7	4299599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 2.008.099,70	R\$ 0,00	R\$ 1.807.289,73	R\$ 200.809,97	R\$ 10.040,50	Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00


Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 2.008.099,70
Informações Complementares

• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em www.notacuiabana.com.br Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

s serviços descritos nes.
Nota Fiscal foram executados


Eng.º Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. Nº 197/13



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>

NOTA
CUIABÁ

Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Pág. Nº 1
 SEC. EXECUTIVA
 Proc. Nº
 Visão

Ensercon Engenharia Ltda
Ensercon Engenharia

Avenida Aclimação, 445 - Qd. 41 - Jardim Aclimação
 CEP 78050-040 - Fone (65) 3642-5959 - Cuiabá - MT
 nubiaredez@hotmail.com
 Inscrição Municipal 16396 - CPF/CNPJ 15.361.439/0001-17

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Emissão da NFS-e 4/9/2013 11:44:10	Código de Verificação de Autenticidade DA 6E 8D	Número da Nota Fiscal 214
Numero do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0025-11	Inscrição Municipal 62536	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado
Endereço Rua Voluntarios da Patria	Número	Complemento
78005-180	Cidade / UF Cuiabá / MT	Bairro Centro
	Telefone	e-mail

Descrição dos Serviços

Referente 3ª (Terceira) Medição dos Serviços de Execução da obra de AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS - MT.
 Instrumento Contratual Nº 022/2013/00/00-ASJU.

- Valor Material/Equipamento: R\$ 1.807.289,73
 - Valor Mão-de-Obra: R\$ 200.809,97

CEI Nº 51.220.95037/78

CÓPIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 45.13600 - Terraplenagem e Outras Movimentações de Terra	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 4299599
Valor Total dos Serviços R\$ 2.008.099,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.807.289,73	Base de Cálculo R\$ 200.809,97
		Total do ISSQN R\$ 10.040,50	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 2.008.099,70

Informações Complementares

• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em www.notacuiabana.com.br Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

s serviços descritos nes.
Nota Fiscal foram executados


Eng.º Esmeraldo Teodoro de Mello
Fiscal Port. Nº 117/13

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 19/08/2013 - 09:24:50

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010057234**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**

Data de Emissão: **19/08/2013**

Hora de Emissão: **09:24:50**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO , 445 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT

CNAE : Construção de edifícios

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **15.361.439/0001-17**

Razão Social : **ENSERCON ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **18/09/2013** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2229AT22B7U9U2MB**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

23
fury

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

147533/2013

172438

PROCESSO

2013

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

152034

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 52175



06062013153614390001170010051414753330595913172438

NOME

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

15.361.439/0001-17

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. ACLIMAÇÃO (BOSQUE DA SAUDE), 445 - QD. 41

BAIRRO

BOSQUE DA SAUDE

FINALIDADE

Concorrência

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

PARA CONSTAR EU, MARCELY MIRANDA CORREA PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 90 DIAS.

quarta-feira, 04 de setembro de 2013



Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 06 de Junho de 2013.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ENSERCON ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **15.361.439/0001-17**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < <http://www.receita.fazenda.gov.br> > ou < <http://www.pgfn.fazenda.gov.br> >.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 18:11:58 do dia 02/05/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2013.

Código de controle da certidão: **BA7F.0965.1A36.FD79**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

24
fey

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000652013-10001439

Nome: ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 15.361.439/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 13/03/2013.
Válida até 09/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

IMPRIMIR

VOLTAR

25
reg**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15361439/0001-17, 15361439/0001-17
Razão Social: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENSERCON ENGENHARIA
Endereço: AV ACLIMACAO 445 / BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT /
78050-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/08/2013 a 13/09/2013

Certificação Número: 2013081509421351807799

Informação obtida em 15/08/2013, às 09:42:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

Certidão de Existência de Ações de Processos de 1ª e 2ª Instâncias

CERTIDÃO NÚMERO: 0030830/2013

Certifica-se que, até a presente data, a vista dos dados constantes no sistema informatizado deste Egrégio Tribunal, TRAMITA(M) nesta Justiça Especializada AÇÕES TRABALHISTAS contra ENSERCON ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 15.361.439/0001-17.

Certidão emitida em 19/08/2013, às 09:35:49 hs a requerimento do(a) Sr(a) NUBIA CARVALHO REDEZ MONTEIRO SALLES, CPF: 514.035.791-72.

PROCESSO	PARTE(CPF/CNPJ)
0001452-32.2011.5.23.0022	ENSERCON ENGENHARIA LTDA(15.361.439/0001-17)
ÚLTIMO MOVIMENTO: AGUARD. MANIFESTAÇÃO RECLAMADO-ESTIMADO	
0000574-42.2013.5.23.0021	ENSERCON ENGENHARIA LTDA(15.361.439/0001-17)
ÚLTIMO MOVIMENTO: Movimento disponível apenas no PJE	

Observações:

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão;
Firmado por assinatura digital em 19/08/2013 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira;
A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada no endereço <http://www4.trt23.jus.br/Certidao>, sendo do interessado a responsabilidade de verificação da mesma;
Certidão gratuita, de âmbito nacional, válida por 30 dias após sua emissão.
Assinatura eletrônica: 91683f83-96a5-37d6-a989-c8fd1c47fd84.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2013 - 14:26:3427
Fey

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.738,32	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34,76
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 347601801305 807559200011 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2013 - 14:26:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.738,32	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34,76
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 347601801305 807559200011 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	6106
4 COMPETÊNCIA	07/2013
5 IDENTIFICADOR	15.361.439/0001-17
6 VALOR DO INSS	R\$ 5.487,90
8	
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 ATM, MULTA E JUROS	
11 TOTAL	R\$ 5.487,90

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA
AV. ACLIMAÇÃO, 445, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ-MT
CEP 78.050-040
FONE: (65)3642-5959

2 VENCIMENTO
(Uso do INSS)

31/07/2013

PARCELA 18/60 - DEBCAD 36718608-0, 36718609-8, 39270715-2 E 39270716-0 -
VALOR CONSOLIDADO R\$ 64.336,75 (REF. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO
PROCURADORIA) (EMPRESA+SEGURADOS)

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

comprovante

Emissão de comprovantes

31/07/2013 14:57:38 000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.35
0046900046 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 94.653-2

CODIGO DO PAGAMENTO 6106
COMPETENCIA 07/2013
IDENTIFICADOR 15361439000117
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2013
VALOR DO INSS 5.487,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.487,90

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB: E.22D.CB9.AF7.08C.A4D

***** VIA EMPREGADOR *****



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2013 - 14:26:3428
fey

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 126.407,49	06-QTDE TRABALHADORES 95	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.112,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.112,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001015 125901801307 807559200810 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2013 - 14:26:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 126.407,49	06-QTDE TRABALHADORES 95	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.112,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.112,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001015 125901801307 807559200810 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Outros convênios

07/08/2013 15:46:44

30
Raf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.12
0046900046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 46-9 CONTA: 94.653-2
EFETUADO POR: MARCILIO F KERCHE
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000101-5 12590180130-7
	80755920081-0 53614390001-6
Data do pagamento	07/08/2013
CNPJ/CEI	15361439/0001-17
COMPETENCIA	07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/08/2013
VALOR DEPOSITO	10.112,59
Valor Total	10.112,59

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB:
C.77E.47D.8C4.7B5.97E

Transação efetuada com sucesso por: J0895632 MARCILIO FERREIRA KERCHE.



Outros convênios

07/08/2013 15:48:45

31

mg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.24
0046900046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 46-9 CONTA: 94.653-2
EFETUADO POR: MARCILIO F KERCHE
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000000-3	34760180130-5
	80755920001-1	53614390001-6
Data do pagamento	07/08/2013	
CNPJ/CEI	15361439/0001-17	
COMPETENCIA	07/2013	
CODIGO RECOLHIMENTO	155	
VENCIMENTO	07/08/2013	
VALOR DEPOSITO	34,76	
Valor Total	34,76	

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB:
B.5E2.433.E5F.64B.519

Transação efetuada com sucesso por: J0895632 MARCILIO FERREIRA KERCHE.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/08/2013

HORA: 14:26:34

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA

INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17

COMPETÊNCIA: 07/2013

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

95

5

REMUNERAÇÃO

126.407,49

1.738,32

DEPÓSITO

10.112,59

34,76

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

10.112,59

34,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

32
Fug

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/08/2013
HORA: 14:26:34
PÁG: 0001/0028

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001015 125901801307 807559200810 536143900016
858000000003 347601801305 807559200011 536143900016

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA		COMP: 07/2013 COD REC:155		COD GPS: 2100		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1		RAT: 3,0		INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17		FAP: 1,38		RAT AJUSTADO: 4,14	
TOMADOR/OBRA: ENSERCON ENGENHARIA		PIS/PASEP/CI		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEFÓSITO		CBO		JAM	
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL													
ABDENEGO DA CONCEICAO PESSOA		833,73		0,00		133.02598.40-7		01/04/2009		01		01				07170		0,00	
ADAO SOUZA DE OLIVEIRA		1.047,21		0,00		128.93631.40-3		21/08/2008		01		01				07241		0,00	
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA MENDES		1.563,19		0,00		132.65478.40-7		08/07/2013		01		01				07151		0,00	
ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS		1.306,23		0,00		100.90157.50-5		03/05/2007		01		01				06201		0,00	
APARECIDO DONIZETE DE ARAUJO		1.065,12		0,00		123.55879.58-5		11/06/2013		01		01		14/07/2013		06201		0,00	
CARLOS ANDRE CAVALCANTE ZACARIAS		895,71		0,00		130.03549.29-3		13/06/2013		01		01				07170		0,00	
CELIO FRANCISCO PEREIRA		1.047,35		0,00		165.88427.22-1		14/01/2008		01		01				07241		0,00	
CILBENE ALMEIDA XAVIER		1.000,00		0,00		130.16373.40-7		03/10/2005		01		01				04221		0,00	
CLAUDIO JOSE BATISTA PEREIRA		782,71		0,00		124.40132.34-0		15/01/2008		01		01				07170		0,00	
DENIVAL PEREIRA DA COSTA		768,68		0,00		121.71829.80-1		11/07/2013		01		01				07241		0,00	
DIEGO MOREIRA DE SOUSA PEREIRA		751,03		0,00		132.99603.40-9		03/06/2013		01		01				07170		0,00	
EDNELSON FRANCA DE RESENDE		784,91		0,00		130.29912.40-9		01/04/2009		01		01				07241		0,00	
EDUARDO DE QUEIROZ ARAUJO		1.858,00		0,00		120.43510.45-4		01/03/2006		01		01				07102		0,00	
EUJAN DE OLIVEIRA DIAS		1.100,00		0,00		124.16195.71-0		01/11/2012		01		01				04110		0,00	
FERNANDES GOMES TEODORO		1.233,43		0,00		105.56844.95-2		01/04/2009		01		01				07102		0,00	
								98,67										98,68	

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001015 125901801307 807559200810 536143900016
858000000003 347601801305 807559200011 536143900016

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA				INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17			
COMP: 07/2013 COD REC:155				FAP: 1.38 RAT AJUSTADO: 4.14			
TOMADOR/OBRA: ENSERCON ENGENHARIA				INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO
		BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			203.88805.82-4	01/02/2013	01	01	66,74
834,30	0,00		0,00	66,74			0,00
GILSON NEI PINHO GOMES			130.53292.40-7	06/05/2009	01	01	
738,31	0,00		0,00	59,06			59,06
GLORIA FRANCISCA DOS SANTOS			125.07139.71-6	01/07/2006	01		
2.149,00	0,00		0,00	236,39			171,92
HAMILTON JOAQUIM DOS SANTOS			106.68677.28-4	07/08/2012	01	01	
4.000,00	0,00		0,00	440,00			320,01
JAIME RODRIGUES DE SOUZA			108.84495.28-8	01/03/2010	01	01	
1.150,25	0,00		0,00	92,02			92,03
JHONATAN FERREIRA DA SILVA			132.34494.40-0	01/04/2009	01	01	
1.163,75	0,00		0,00	93,10			93,10
JOAO BATISTA ELIAS DA COSTA			106.15685.35-5	01/04/2009	01	01	
709,54	0,00		0,00	56,76			56,77
JOAO RODRIGUES DA SILVA			162.83458.64-6	13/06/2013	01	01	
1.126,74	0,00		0,00	90,13			90,13
JOSE ALVES MOREIRA			105.82584.62-8	01/12/2006	01	01	
3.141,42	0,00		0,00	345,55			251,32
JOSE BATISTA			102.25079.74-4	02/02/2009	01	01	
1.839,14	0,00		0,00	165,52			147,14
JOSE DANTAS DA SILVA FILHO			107.47267.59-3	02/08/2010	01	01	
2.432,94	0,00		0,00	267,62			194,64
JOSE JESUS DE CASTRO			126.43390.40-9	08/05/2009	01	01	
1.190,98	0,00		0,00	95,27			95,27
JOSE MARIA SILVA ROCHA			129.17949.40-8	08/04/2009	01	01	
1.928,50	0,00		0,00	173,56			154,28
JOSENA AMBROSIO DE FIGUEIREDO			120.56064.25-3	01/07/2000	01		
1.458,97	0,00		0,00	131,30			116,72
JUVERCINO INACIO DA SILVA			107.78180.79-1	01/04/2009	01	01	
810,00	0,00		0,00	64,80			64,81
							0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001015 125901801307 807559200810 536143900016
858000000003 347601801305 807559200011 536143900016

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA															INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17														
COMP: 07/2013 COD REC:155															FAP: 1.38 RAT AJUSTADO: 4.14														
TOMADOR/OBRA: ENSERCON ENGENHARIA															INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17														
NOME TRABALHADOR															CBO JAM														
REM SEM 13° SAL															DEPÓSITO														
REM 13° SAL															DATA/COD MOVIMENTAÇÃO														
PIS/PASEP/CI															OCOR														
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC															CAT														
CONTRIB SEG DEVIDA															ADMISSÃO														
BASE CÁL PREV SOCIAL															SEG DEVIDA														
OUTRAS ENT: 0079															SIMPLES: 1														
FPAS: 507															RAT: 3.0														
COD GPS: 2100															INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17														
LOURIVALDO FERNANDES DA CRUZ															07241														
638,54															0,00														
LUIS CARLOS GOMES DA COSTA															51,08														
786,95															0,00														
MANOEL ARISTEU DE ALMEIDA															01														
863,57															04/06/2012														
MANOEL MOREIRA DOS SANTOS															62,95														
1.119,09															0,00														
MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA															02/07/2012														
755,44															01														
MARCIO RAMOS DA SILVA															69,08														
1.087,88															0,00														
MARIO DONIZETTI FRANCHI															06/02/2009														
1.386,39															01														
MOACIR REIS RIBEIRO															89,52														
990,40															20/03/2013														
NELCINO TOMAS SILVA															01														
929,00															60,44														
NUBIA CARVALHO REDEZ MONTEIRO SALLES															01														
2.555,00															01/07/2013														
ODAIR ROGERIO DE SENE															87,03														
0,00															01														
REINALDO FREITAS SANTOS BARRETO															110,92														
615,64															01														
1.839,00															0,00														
SEBASTIAO DE OLIVEIRA BARBOSA															07823														
718,11															0,00														
VALDENICE FERREIRA LIMA															49,25														
937,28															01														
															147,12														
															0,00														
															57,45														
															0,00														
															04110														
															0,00														
															74,98														
															0,00														
