



Protocolo/SETPU
Folha Nº 01
Ass.: T

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SEPTU

Protocolo n.: 404669/2014 Data: 24/07/2014 11:18
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENSERCON ENGENHARIA LTDA/IC 022/2013/ASJ
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 6 MEDIÇÃO NO VALOR R\$ 995.620,19 DO
IC 022/13 DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1

6ª Medição




ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

TIPO	DATA	OBSERVAÇÕES
OT	24.07.2014	

Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº
Eduar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600


R\$ 995.620,19



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADE

Cuiabá, 1 de julho de 2014.

Ao Ilmo Sr.
Eng.º. TÉRCIO LACERDA DE ALMEIDA
M.D. Superintendente de Obras de Transportes
Nesta



Sr. Superintendente

Diego Pereira Marcondes
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU

Pelo presente expediente, encaminho-vos a 6ª (sexta) **MEDICÃO** dos Serviços de Execução da obra de AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT, objeto do Instrumento Contratual Nº 022/2013/00/00-ASJU

995.620,19

Atenciosamente

Pedro Mauricio Mazzaro
Engº Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. Nº 273 /2.014 - SETPU
RNP 2..607.675.528.6

Protocolo n.º: 404669/2014 Data: 24/07/2014 11:18
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENSERCON ENGENHARIA LTDA/IC 022/2013/ASJ
Assunto: MEDICÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 6 MEDICÃO NO VALOR R\$ 995.620,19 DO
IC 022/13 DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DO ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES
CORDENADORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

CONTRATO

-Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Local: Rondonópolis - MT

-Capa de rolamento C.B.U.Q.: 56.271,216 T

-Extensão do drenagem: 3.103,00 m

-Firma: ENSERCON ENGENHARIA LTDA

-Edital: C.P. n.º 015/2012

-Instrumento Contratual: 022/2013/00/00-ASJU

-Processo Original: 561314/2012 -SETPU

-Prazo Contratual: 720 DIAS (SETECENTOS E VINTE)

-Dias Decorridos: 140 DIAS

-Saldo de Prazo: 580 DIAS

-Termino Previsto: 02/05/2015

-Ordem de Início de Serviço: 13 DE MAIO DE 2013

-Data da Assinatura: 14/03/2013

-Data da Publicação: 14/03/2013

-Metas - Exercício: 2013/2014

-Natureza de Serviço: EXEC. DA OBRA DE AMPL. E PAV. DO AEROPORTO

Valor Contratual (PI): R\$ 20.892.913,14

-Valor Empenhado: R\$ -

-Valores Medidos (PI) R\$ 11.607.793,61

-Valores Reajustes: R\$ -

-Valores pagos pela Sinfra R\$ -

-Valores PI + Reaj. R\$ -

-Saldo Empenhado: R\$ 9.285.119,53


-Valor Aditivo:

-Termo Aditivo com Reflexo Financeiro

-Processo Aditivo:

-Termo Aditivo de Prazo:

Cuiabá, 1 de julho de 2014.


Engº Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. N° 273 /2.014 - SETPU
RNP 2.607.675.528.6

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA										RESUMO DE MEDIÇÃO				SETPU				
OBRA: -Capa (C.B.U.Q.): -Drenagem: Referência: Período: 56.271,216 T 3.103,00 m 6ª Medição 1/06/2014 à 30/06/2014										Nº Contrato		022/2013/00/00-ASJU		Prazo de Execução		720 dias		ENSONCON ENGENHARIA LTDA.
										Data Assinatura		14/03/13		Prazo Restante		549 dias		
										Publicação		18/03/13		Vr. Contratual PI		R\$ 20.892.913,14		
										Processo Orig.		561314/2012 -SETPU		Vr. Acum. Medido PI				
										Data de Paralisação:		30/08/2013		Vr. Programado Prox.mês PI				
Data de Reinício:		01/05/2014																
Período acumulado: 14/05/2013 à 30/06/2014										Empresa:								
ITEM	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA										
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT																		
SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.0	vb	1.000	-	1.000	1.000	49.755,05	284.718,44	100,00%										
1.1	vb	1.000	-	0.500	0.500	4.959,70	2.479,85	50,00%										
1.2	vb	1.000	-	0.500	0.500	12.710,51	6.355,25	50,00%										
1.3	vb	1.000	-	0.500	0.500	7.412,21	3.706,10	50,00%										
1.4	vb	1.000	-	1.000	1.000	853,65	853,65	100,00%										
1.5	mês	12.000	1.000	5.000	6.000	7.508,69	45.052,14	50,00%										
1.6	mês	12.000	1.000	5.000	6.000	27.918,32	167.509,92	50,00%										
1.7	m²	42.000	-	42.000	42.000	214,44	9.006,48	100,00%										
1.8	und	1.000	-	-	-	1.805,98	-	0,00%										
1.9																		
TERRAPLANAGEM																		
2.0	m²	20.850.000	-	20.850.000	20.850.000	1,65	34.402,50	100,00%										
2.1	m³	107.587.281	-	107.587.280	107.587.280	14,50	1.560.015,56	100,00%										
2.2	m³	129.450.039	-	129.450.039	129.450.039	5,21	674.434,70	100,00%										
2.3																		
PAVIMENTAÇÃO																		
3.0	m²	109.164.800	-	109.164.800	109.164.800	0,76	6.498.481,14	51,52%										
3.1	m³	25.220.637	-	25.220.637	25.220.637	12,86	324.337,39	100,00%										
3.2	m³	21.046.480	-	21.046.480	21.046.480	88,50	1.862.613,48	100,00%										
3.3	m²	109.164.800	-	109.164.800	109.164.800	1,39	151.739,07	100,00%										
3.4	ton	56.271.216	5.652.864	14.372.736	20.025.600	62,15	1.244.591,04	35,59%										
3.5	ton	130.997	-	130.997	130.997	2.337,57	306.214,65	100,00%										
3.6	ton	2.813.560	282.643	718.637	1.001.280	1.642,10	1.644.201,88	35,59%										
3.7	ton	43.665	5.677	15.182	20.859	1.155,80	24.108,83	47,77%										
3.8	ton x km	1.406.780.400	141.321.600	359.318.400	500.640.000	0,51	255.326,40	35,59%										
3.9	ton	130.997	-	130.997	130.997	75,98	9.953,15	100,00%										
3.10	ton	43.665	5.677	15.182	20.859	75,98	1.584,86	47,77%										
3.11																		

Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014.

Comissão de Fiscalização

Calculos FORAM CONFERIDOS!

Eng.º Pedro Maurício Mazzaro

Fiscal Port. Nº 273/2.014 - SETPU

RNP 2.607.675.528.6

Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014.

Comissão de Fiscalização

Eng.º Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. Nº 273/2014 - SETPU
RNP 2.607.675.528.6

OS CÁLCULOS FORAM CONFIRMADOS
Eng.º CIVIL Acácio Roberto da Silva
CREAM-MS/11190
RNP 2.607.675.528.6

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			RESUMO DE MEDIÇÃO						SETPU		
OBRA: -Capa (C.B.U.Q.): -Drenagem: Referência: Período:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT			Nº Contrato	022/2013/0000-ASJU			Prazo de Execução	720 dias 549 dias R\$ 20.892.913,14 Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx.mês PI		
	56.271,216 T			Data Assinatura	14/03/13			Prazo Restante			
	3.103,00 m			Publicação	18/03/13			Vr. Contratual PI			
	6ª Medição			Processo Orig.	561314/2012 -SETPU			Vr. Acum. Medido PI			
	1/06/2014 à 30/06/2014			Data de Paralisação:	30/08/2013			Vr. Acum. Programado PI			
				Data de Reinício:	01/05/2014			Vr. Programado Próx.mês PI			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO			UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA
3.12	Transporte de Cimento Asfáltico			ton	2.813,560	282,643	718,637	1.001,280	75,98	76.077,25	35,59%
3.13	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Sub-Base)			ton x km	39.356,320	-	39.356,319	39.356,319	0,53	20.858,84	100,00%
3.14	Transporte Local em Rodov. Não Pavimentada (Const. Sub-Base)			ton x km	59.471,773	-	59.471,772	59.471,772	0,66	39.251,36	100,00%
3.15	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para Base)			ton x km	589.301,440	-	589.301,440	589.301,440	0,53	312.329,76	100,00%
3.16	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para Base)			ton x km	754.597,006	75.804,906	192.738,389	268.543,295	0,53	142.327,94	35,59%
4.0	DRENAGEM									799.228,40	75,72%
4.1	Entrada D'água - EDA 01			und	3,000	-	3,000	3,000	38,69	116,07	100,00%
4.2	Dissipador de Energia - p/ Descida D'água			und	2,000	2,000	2,000	4,000	229,24	916,96	200,00%
4.3	Dissipador de Energia			und	1,000	-	1,000	1,000	2.816,44	2.816,44	100,00%
4.4	Descida D'água Aterros em Degraus - DAD 01-AG/BC			m	235,000	-	235,000	235,000	114,36	26.874,60	100,00%
4.5	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 0,70m)			m	2.835,000	-	2.125,000	2.125,000	319,03	677.938,75	74,96%
4.6	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 1,00m)			m	268,000	-	201,000	201,000	450,58	90.566,58	75,00%
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES									159.571,56	100,00%
5.1	Corpo de BSCC 1,5 x 1,5m Alt. 7,5 a 10,0m AC/BC			m	60,000	-	60,000	60,000	2.304,91	138.294,60	100,00%
5.2	Boca de BSCC 1,5 x 1,5m - Normal			und	2,000	-	2,000	2,000	10.638,48	21.276,96	100,00%
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS									1.596.940,31	88,67%
6.1	Hidrosemeadura			m²	134.375,480	-	134.375,480	134.375,480	1,27	170.656,85	100,00%
6.2	Enlameamento			m²	20.000,000	-	20.000,000	20.000,000	7,45	149.000,00	100,00%
6.3	Cerca de Alambreado - Conforme Projeto			m	7.285,710	-	7.285,710	7.285,710	172,38	1.255.910,68	100,00%
6.4	Fornecimento de Portão de Correr de Tubo de Ferro Galvanizado 2,5" com Tela de Arame Galvanizado Sold. 150x50 fio 12. Altura de Tela 2,0m com Porta, Cadeado e Pintado com Fundo e Esmalte Sintético de Acabamento			und	1,000	-	-	-	2.500,00	-	0,00%
6.5	Pintura de Faixa - Tinta Durabilidade 2 Anos			m²	7.038,010	-	-	-	15,56	-	0,00%
6.6	Pintura de Setas e Zebrados - 2 Anos			m²	1.263,060	-	-	-	22,17	-	0,00%
6.7	Aluguel de Veículo p/ Transporte de Pessoal - Adm. Local			und	24,000	1,000	5,000	6,000	3.562,13	21.372,78	25,00%
Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014.											
Comissão de Fiscalização											
Eng.º Pedro Mauricio Mazzaro Fiscal/Port. Nº 273/12.014 - SETPU RNP 2.607.675.528,6											

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		RESUMO DE MEDIÇÃO							SETPU
OBRA:		Nº Contrato	022/2013/00/00-ASJU				Prazo de Execução	720 dias	
-Capa (C.B.U.Q.):		Data Assinatura	14/03/13				Prazo Restante	549 dias	
-Drenagem:		Publicação	18/03/13				Vr. Contratual PI	R\$ 20.892.913,14	
Referência:		Processo Orig.	561314/2012 -SETPU				Vr.Acum.Medido PI		
Período:		Data de Paralisação:	30/08/2013				Vr. Acum. Programado PI		
		Data de Reinício:	01/05/2014				Vr.Programado Próx.mês PI		
		Período acumulado:	14/05/2013 à 30/06/2014				Empresa:	ENSERCON ENGENHARIA LTDA.	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA
7.0	OBRAS CIVIS								0,00%
7.1	Construção de Casa de Força com 20m² com 3m de Altura em Alvenaria de Tijolos Furados de Uma Vez com Laje e Cobertura em Telhas de Fibro Cimento, uma Porta Metálica de 0,90 x 2,10m, Portão Metálico com Duas Folhas com Ventilação Tipo Xicara de 1,50 x 2,10m um Vitraux de 1,00 x 0,60m com Piso em Concreto Desempenado para Carga de até 800 kgf.	m²	16,000		-	-	1.545,45	-	0,00%
8.0	SINALIZAÇÃO LUMINOSA								0,00%
8.1	Escavação Manual e Real. Compact. Mat. 1ª Categoria	m³	1.980,000		-	-	11,67	-	0,00%
8.2	Reaterro e Compactação com Placa Vibratória	m³	1.210,000		-	-	26,25	-	0,00%
8.3	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	m	186,000		-	-	10,50	-	0,00%
8.4	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=38mm	m	100,000		-	-	8,64	-	0,00%
8.5	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	m	1.800,000		-	-	14,15	-	0,00%
8.6	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=75mm	m	11.750,000		-	-	15,00	-	0,00%
8.7	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=100mm	m	550,000		-	-	19,20	-	0,00%
8.8	Recomposição do Terreno	m³	30,000		-	-	12,65	-	0,00%
8.9	Caixas de Concreto das Bases das Luminárias	und	40,000		-	-	405,00	-	0,00%
8.10	Maciço de Concreto	und	218,000		-	-	405,94	-	0,00%
8.11	Caixa de Passagem Tipo 1 - Com Tampa FoFo	und	4,000		-	-	865,00	-	0,00%
8.12	Caixa de Passagem Tipo 2	und	12,000		-	-	451,00	-	0,00%
8.13	Caixas de Inspeção de Linhas de Dutos	und	230,000		-	-	337,00	-	0,00%
8.14	Poços de Aterramento	und	56,000		-	-	475,00	-	0,00%
8.15	Lançamento de Condutor de Aterramento e Ligações	m	15.300,000		-	-	8,20	-	0,00%
8.16	Regularização da Casa de Força com 20m² Substituição e Acessórios	cj	1,000		-	-	68.560,00	-	0,00%
8.17	BALIZAMENTO				-	-		-	0,00%
8.18	Lançamento de Cabos dos Circuitos	m	14.000,000		-	-	24,85	-	0,00%
8.19	Instalação de Unidades de Luz	und	250,000		-	-	923,00	-	0,00%
8.20	Lançamento de Cabos de Controle	m	50,000		-	-	39,84	-	0,00%
	Sinalização Vertical	cj	3,000		-	-	81.327,99	-	0,00%

Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014.

Comissão de Fiscalização


Eng.º Pedro Maurício Mazzaro

Fiscal Port. Nº 273/2014 - SETPU

RNP 2.607.675-528 6

Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014.
Comissão de Fiscalização


Eng. Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. Nº 273/2.014 - SETPU
RNP 2.607.675.528.6

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		RESUMO DE MEDIÇÃO						SETPU	
OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT 56.271,216 T 3.103,00 m 6ª Medição 1/06/2014 à 30/06/2014		Nº Contrato 022/2013/00/00-ASJU Data Assinatura 14/03/13 Publicação 18/03/13 Processo Orig. 561314/2012 - SETPU Data de Paralisação: 30/08/2013 Data de Reinício: 01/05/2014		Prazo de Execução 720 dias Prazo Restante 549 dias Vr. Contratual PI R\$ 20.892.913,14 Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx. mês PI		Empresa: ENSERCON ENGENHARIA LTDA.			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA
8.21	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA								
8.22	Quadro de Proteção e Comando 150 Kw, 02 RCC 10Kx, Controles de Farol, Biruta e Acessórios	cj	1,000				149.231,99	-	0,00%
8.23	Grupo Gerador Trifásico, 220V, 150 Kva	cj	1,000				83.631,00	-	0,00%
8.24	Entrada e Medição de Energia em Baixa Tensão 45 Kva	cj	1,000				7.859,99	-	0,00%
8.25	Instalação de Poste e Montagem do Farol do Aeródromo, Inclusive fornec. Materiais	cj	1,000				75.656,00	-	0,00%
8.26	Instalação de Biruta Iluminada, Inclusive Fornecimento Materiais	cj	1,000				26.295,99	-	0,00%
8.27	Iluminação do Pátio de Aeronaves Conforme Projeto	cj	9,000				24.403,00	-	0,00%
	Indicador de Rampa de Planalto PAP	cj	1,000				390.000,01	-	0,00%
Total Acumulado Executado Com BDI (R\$)								11.607.793,61	
Valor a Deduzir (Medição Anterior)								10.612.173,42	
Valor Líquido Desta Medição								R\$ 995.620,19	
Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014. Fiscalização:  Eng.º Pedro Maurício Mazzaro Fisica - Port. N.º 273/2.014 - SETPU RNP 2.607.675-528.6									



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SETPU

-Obra:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT		015/2012	MEDIDAS	
	-Capa (C.B.U.Q.):	56.271,216 T	Processo:	Nesta a PI:	995.620,19
-Drenagem:	3.103,00 m		Contrato:	Acumulada a PI:	11.607.793,61
Ordem de Serviço:	13 DE MAIO DE 2013		Data Assinatura:	Reajuste nesta:	0,00
Prazo:	720 dias		Data publicação:	Reajuste acumulado:	0,00
Termo previsto:	03/05/2015		Preço inicial do contrato:	Total PI + Reaj:	11.607.793,61
Dias decorridos:	171 dias		Termo(s) Aditivo(s):	Saldo contrato a PI:	9.285.119,53
Referência:	6ª Medição		Termo(s) re-ratificação(s):	Empenhado até esta data:	0,00
Período Simples:	1/06/2014 à 30/06/2014		Vr. Termo aditivo a PI:	Saldo empenhado:	0,00
			PI atual do contrato:	Saldo de prazo:	549 dias
			Firma Executora:	Data de Paralisação:	30/08/2013
			Período acumulado:	Data do Reinício:	01/05/2014

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM EXECUTADO		FINANCEIRO - MEDIDAS A PI + REAJUSTAMENTO			
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO	MEDIDAS	VALOR A PI	REAJUSTE	VALOR PI + R
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT	4,77%	55,56%	1ª Medição	1.415.417,21	0,00	1.415.417,21
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,92%	55,65%	2ª Medição	1.595.457,27	0,00	1.595.457,27
TERRAPLANAGEM	0,00%	100,00%	3ª Medição	2.008.099,70	0,00	2.008.099,70
PAVIMENTAÇÃO	7,58%	51,52%	4ª Medição	3.600.224,34	0,00	3.600.224,34
DRENAGEM	0,04%	75,72%	5ª Medição	1.992.974,90	0,00	1.992.974,90
OBRAS DE ARTE CORRENTES	0,00%	100,00%	6ª Medição	995.620,19	0,00	995.620,19
OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%				
OBRAS CIVIS	0,00%	0,00%				
SINALIZAÇÃO LUMINOSA	0,00%	0,00%				
TOTAL				11.607.793,61	-	11.607.793,61
			Saldo Contratual a preços iniciais			
			9.285.119,53			

Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014.
Comissão de Fiscalização

Edo Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. N° 273 /2.014 - SETPU
RNP 2.607.675.528.6


SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CONTROLE FINANCEIRO

[illegible]

Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014.

Eng.º Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. Nº 273 /2.014 - SETPU
RNP 2.607.675.528.6

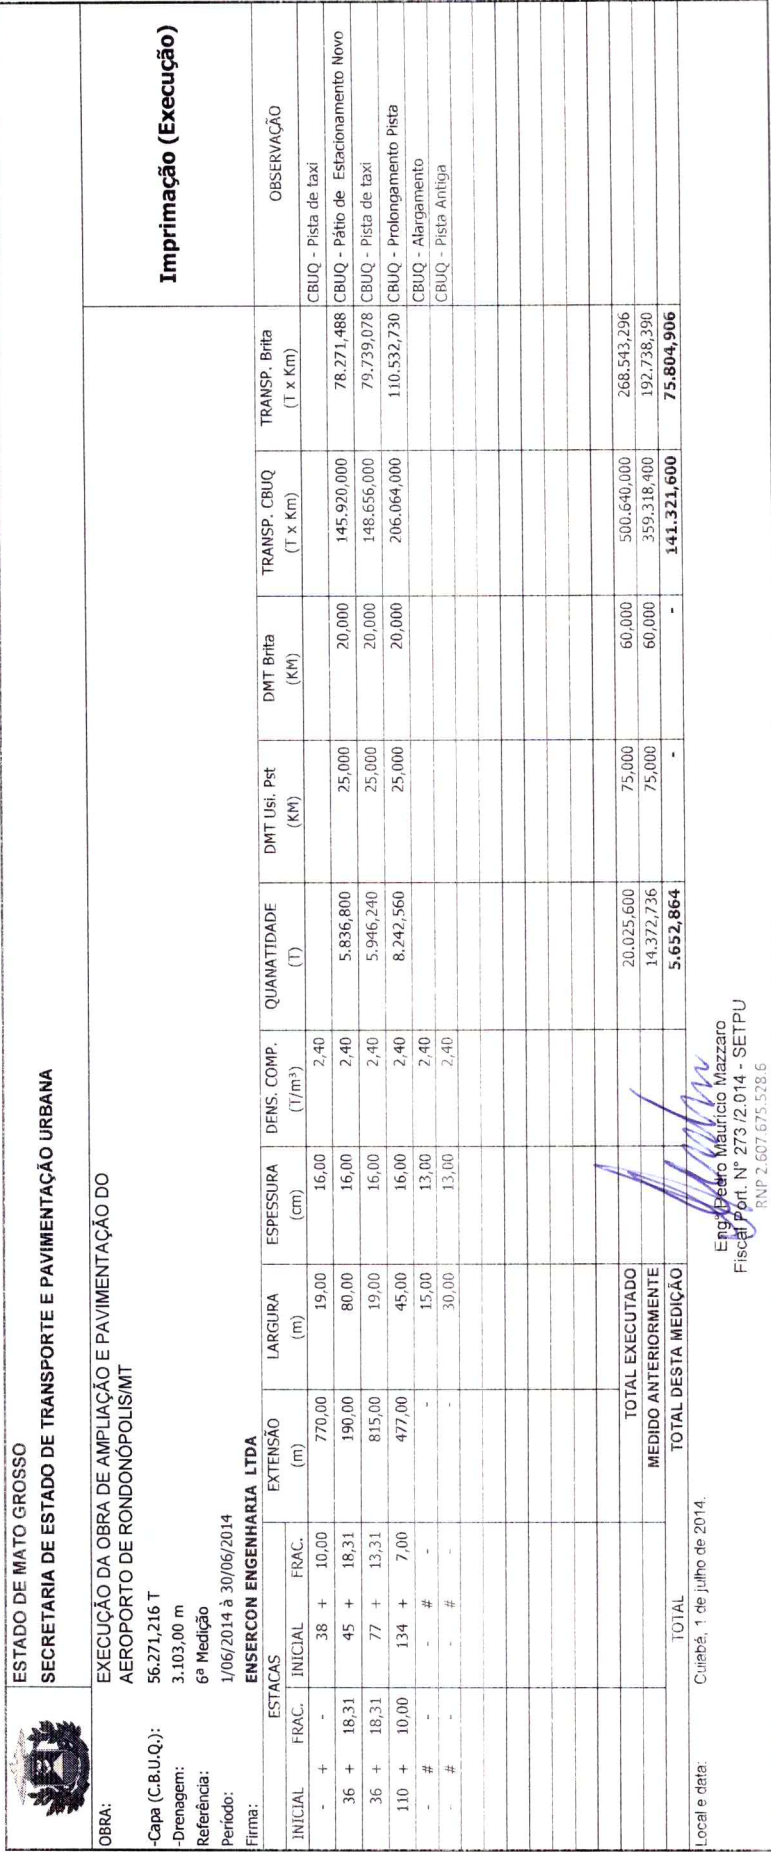

Eng.º Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Part. N.º 273 /2.014 - SETPU
RND 2.607.675.528.6



ESTADO DE MATO GROSSO


SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO
-Capa (C.B.U.Q.): 56.271,216 T
-Drenagem: 3.103,00 m
Referência: 6ª Medição
Período: 1/06/2014 à 30/06/2014
Firma: ENSERCON ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO




Execução de imprimação

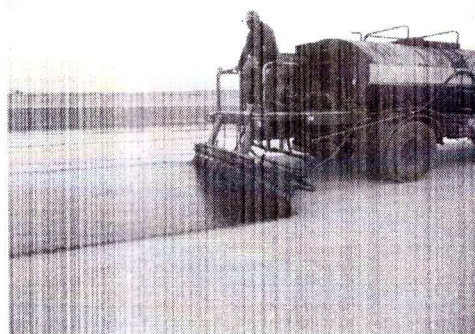

Execução de imprimação




Execução de C.B.U.Q.

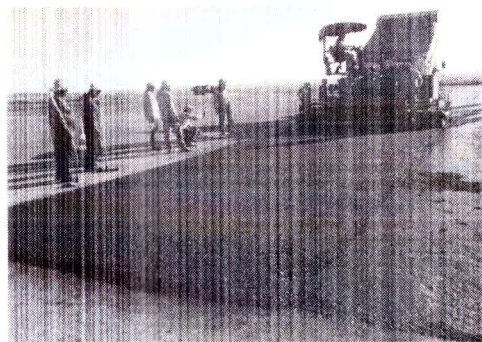

Execução de C.B.U.Q.



Execução de C.B.U.Q.

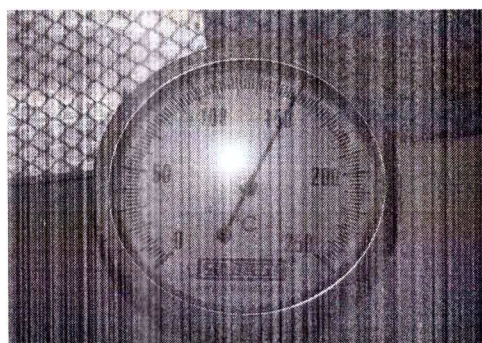

Temperatura de aplicação

Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014.

Eng. Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. N° 273 /2.014 - SETPU
RNP 2.607.675.528.6




ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO
-Capa (C.B.U.Q.): 56.271,216 T
-Drenagem: 3.103,00 m
Referência: 6ª Medição
Período: 1/06/2014 à 30/06/2014
Firma: **ENSERCON ENGENHARIA LTDA**

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

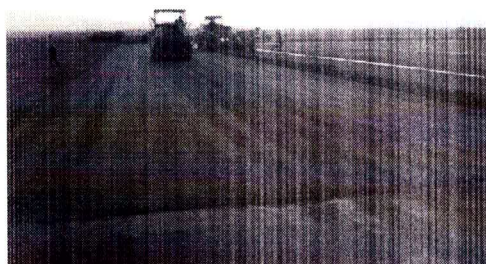


Compactação de C.B.U.Q




Compactação de C.B.U.Q




Pintura de Ligação

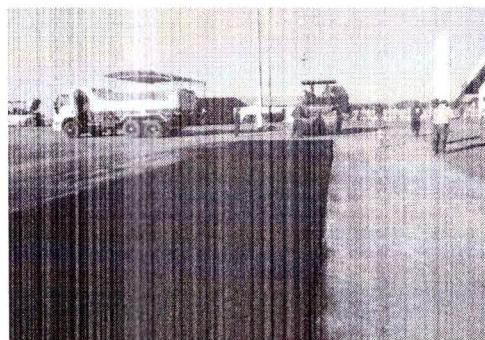

Execução de C.B.U.Q.

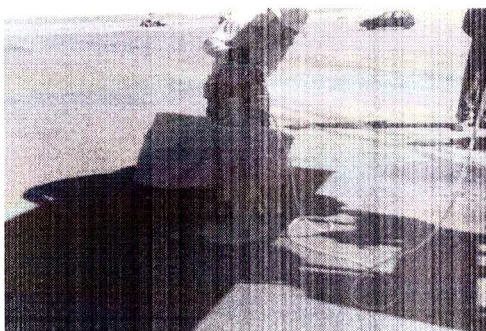

Extração de Coprpo de prova de C.B.U.Q

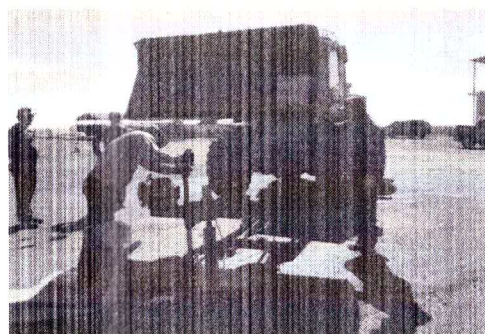

Extração de Coprpo de prova de C.B.U.Q

Local e data: Cuiabá, 1 de julho de 2014.

Engº Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. Nº 273 /2.014 - SETPU
RNP 2.607.675.528.6



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



PROC. Nº: 404669/14

FLS.: 13

DATA: 24 / 07 / 14

Encaminhamos o presente processo ao setor COOT /SETPU.
Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas 01 a 13.
Por ser verdade, confirmo e assino.
Cuiabá, 24 / 07 / 14
Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

A V. S.ª,
após conferência.

em 28/07/2014

Eng.º Civil Ricardo Marques da Guia
CREA/MT 02711/VD
RNP 1204056374
Matrícula: 81447

A Setpu
medição apta para pagamento.

Eng.º Tércio Loredo de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Ensercon Engenharia Ltda
Ensercon Engenharia

Avenida Aclimação, 445 - Qdra 41 - Jardim Aclimação
 CEP 78050-040 - Fone (65) 3642-5959 - Cuiabá - MT
 nubiaredez@hotmail.com
 Inscrição Municipal 16396 - CPF/CNPJ 15.361.439/0001-17

Folha nº 14
 Setor: CGOT/SETRU
 Ass.: _____

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Emissão da NFS-e 22/7/2014 17:48:56	Código de Verificação de Autenticidade BC CA BC	Número da Nota Fiscal 262
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0025-11	Inscrição Municipal 62536	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Rua Voluntarios da Patria	Número 118	Complemento	Bairro Centro
70005-180	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail acalbuquerque2@gmail.com

Descrição dos Serviços

Referente 6ª (Sexta) Medição dos Serviços de Execução da obra de AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS - MT.
 Instrumento Contratual Nº 022/2013/00/00-ASJU.

- Valor Material/Equipamento: R\$ 896.058,18
 - Valor Mão-de-Obra: R\$ 99.562,01

CEI Nº 51.220.95037/78

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4513600 - Terraplenagem e Outras Movimentações de Terra	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 4299599
Valor Total dos Serviços R\$ 995.620,19	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 896.058,18	Base de Cálculo R\$ 99.562,01
		Total do ISSQN R\$ 4.978,10	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 995.620,19

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Engº Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. N° 273 /2 014 - SETPU



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Ensercon Engenharia Ltda
Ensercon Engenharia

Avenida Aclimação, 445 - Qdra 41 - Jardim Aclimação
 CEP 78050-040 - Fone (65) 3642-5959 - Cuiabá - MT
 nubiaredez@hotmail.com

Inscrição Municipal 16396 - CPF/CNPJ 15.361.439/0001-17



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Emissão da NFS-e 22/7/2014 17:48:56	Código de Verificação de Autenticidade BC CA BC	Número da Nota Fiscal 262
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0025-11	Inscrição Municipal 62536	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço Rua Voluntarios da Patria		Número 118	Complemento	Bairro Centro
Cidade / UF Cuiabá / MT		Telefone		e-mail acalbuquerque2@gmail.com

Descrição dos Serviços

Referente 6ª (Sexta) Medição dos Serviços de Execução da obra de AMPLIACAO E PAVIMENTACAO - AEROPORTO DE RONDONOPOLIS - MT.
 Instrumento Contratual N° 022/2013/00/00-ASJU.
 - Valor Material/Equipamento: R\$ 896.058,18
 - Valor Mão-de-Obra: R\$ 99.562,01
 CEI N° 51.220.95037/78

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4000 - Terraplenagem e Outras Movimentações de Terra		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 4299599
Valor Total dos Serviços R\$ 995.620,19	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 896.058,18	Base de Cálculo R\$ 99.562,01	Total do ISSQN R\$ 4.978,10
			ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 995.620,19

Informações Complementares

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 35-3613-8500

Os Serviços
prestados
executados



Eng.º Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. N.º 273 /2 014 - SETPU

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 21/07/2014 - 11:10:14

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012277326**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **21/07/2014**

Hora de Emissão: **11:10:16**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 445 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT

CNAE : Construção de edifícios

Certidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.005.524-7**

Razão Social : **ENSERCON ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **20/08/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T99T9TL2LTMAT2M2**

OK

Página 1 de 2

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 177648/2014

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDERECO: AV. ACLIMAÇÃO Nº 445-PROX HOSPITAL S. MATEUS

BAIRRO: BOSQUE DA SAÚDE

MUNICIPIO: CUIABÁ

UE:MT

CNPJ

15.361.439/0001-17

INSC. ESTADUAL

13005524-7

CPF

#####

RG

#####

SÓCIOS

CPE/CNPJ

912.351.118-49

063.944.261-72

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDMAR ALVES BOTELHO

MARCILIO FERREIRA KERCHÉ

FINALIDADE

CONCORRENCIA PÚBLICAS



Divino Jardini

Assessor Técnico III - Mat. 103370

Responsável pela Expedição

Cuiabá MT, 10/07/2014

Romes Jullio Tomaz
Procurador-Geral Fiscal

Subprocurador-Geral Fiscal
PGE/MT

Ana Cristina Costa de Almeida B. Teixeira

Procuradora do Estado

QAB/MT 5735

OBSERVAÇÕES

1 – Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 5136713309

2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Folha nº 18
Setor: COOT/SETPU
Ass.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

167653/2014

194271

PROCESSO

2014

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

152034

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 52175



16052014153614390001170010180516765336384914194271

NOME

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

15.361.439/0001-17

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. ACLIMAÇÃO (BOSQUE DA SAUDE), 445 - QD. 41

BAIRRO

BOSQUE DA SAUDE

FINALIDADE

Licitação

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Steffanny Fidelis Cardoso
PARA CONSTAR EU, STEFFANNY FIDELIS CARDOSO PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 90 DIAS

quinta-feira, 14 de agosto de 2014




Cezar Fabiano Martins de Campos
Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2014.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15361439/0001-17
Razão Social: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENSERCON ENGENHARIA
Endereço: AV ACLIMACAO 445 / BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78050-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014

OK

Certificação Número: 2014072102541275357500

Informação obtida em 22/07/2014, às 15:17:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Folha nº <u>20</u>
Sector: COOT/SETPU
Ass.: _____

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 088632014-88888439

Nome: ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 15.361.439/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 26/03/2014

Válida até 22/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Folha nº 21
Origem: COOT/SETPL
Ass.: _____

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 15.361.439/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 11:26:44 do dia 12/03/2014 <hora e data de Brasília>.


Válida até 08/09/2014.

Código de controle da certidão: **E36B.9964.202B.ECBC**


Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OK



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENSERCON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.361.439/0001-17

Certidão nº: 49064560/2014

Expedição: 10/06/2014, às 09:46:40

Validade: 06/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENSERCON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.361.439/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2014 - 10:13:49

Folha nº 23
Setor: COOT/SETPU
Ass.: _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 140.706,56	06-QTDE TRABALHADORES 91	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.256,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.256,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100001125 565201801406 707570200816 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2014 - 10:13:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 140.706,56	06-QTDE TRABALHADORES 91	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.256,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.256,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100001125 565201801406 707570200816 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

08/07/2014 09:50:39

Folha nº 24
Setor: COOT/SETPU
Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.14
0046900046 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 94.653-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000112-5 56520180140-6
	70757020081-6 53614390001-6
Data do pagamento	07/07/2014
CNPJ/CEI	15361439/0001-17
COMPETENCIA	06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/07/2014
VALOR DEPOSITO	11.256,52
Valor Total	11.256,52

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: 0.C7C.823.5DA.3C6.8D5

Transação efetuada com sucesso por: J0895632 MARCILIO FERREIRA KERCHE.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.140,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,80
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 228001801409 707570200018 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.140,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,80
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 228001801409 707570200018 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

08/07/2014 09:49:59

Folha nº 26

Sector: COOT/SETPU

Ass.:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.07
0046900046 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENSERCON ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 94.653-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000000-8 22800180140-9
70757020001-8 53614390001-6

Data do pagamento 07/07/2014

CNPJ/CEI 15361439/0001-17

COMPETENCIA 06/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 155

VENCIMENTO 07/07/2014

VALOR DEPOSITO 22,80

Valor Total 22,80

DOCUMENTO: 070704

AUTENTICACAO SISBB: 3.44B.A0D.FA9.7CD.625

Transação efetuada com sucesso por: J0895632 MARCILIO FERREIRA KERCHÉ.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 07/07/2014
HORA: 10:13:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: 06/2014

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

91

3

REMUNERAÇÃO

140.706,56

1.140,00

DEPÓSITO

11.256,52

22,80

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.256,52

22,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(s) GRF(s), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Folha nº 27
Setor: COOT/SETP
Ass.: _____

DATA: 07/07/2014
HORA: 10:13:49
PÁG: 0001/0028

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001125 565201801406 707570200816 536143900016
858800000008 228001801409 707570200018 536143900016

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA											
COMP: 06/2014		COD REC:155		COD GPS: 2100		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1	
RAT: 3,0		INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17		FAP: 1,38		RAT AJUSTADO: 4,14		INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17		CBO	
TOMADOR/OBRA: ENSERCON ENGENHARIA											
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		REM 13°SAL		BASE CÁL 13°SAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	
REM SEM 13° SAL						BASE CÁL PREV SOCIAL				ADMISSÃO	
										CAT	
										OCOR	
										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
										DEPÓSITO	
ABDENEGO DA CONCEICAO PESSOA		901,98		0,00		133.02598.40-7		01/04/2009		01	
						0,00		72,15		01	
ADAO SOUZA DE OLIVEIRA		1.383,59		0,00		128.93631.40-3		21/08/2008		01	
						0,00		124,52		01	
ADDO FORGIARINI RACHID JAUDY		723,04		0,00		115.74404.70-3		09/06/2014		01	
						0,00		57,84		01	
ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS		1.209,94		0,00		100.90157.50-5		03/05/2007		01	
						0,00		96,79		01	
ALINE CANDIDA RESENDE CARVALHO		855,09		0,00		132.18882.51-5		03/02/2014		01	
						0,00		68,40		01	
AMAURI SOUSA SANTOS		1.335,69		0,00		129.03506.40-1		02/06/2014		01	
						0,00		120,21		01	
APARECIDO DONIZETE DE ARAUJO		1.169,57		0,00		123.55879.58-5		11/06/2013		01	
						0,00		93,56		01	
CELIO FRANCISCO PEREIRA		1.190,86		0,00		165.88427.22-1		14/01/2008		01	
						0,00		95,26		01	
CILBENE ALMEIDA XAVIER		1.085,00		0,00		130.16373.40-7		03/10/2005		01	
						0,00		86,80		01	
CLAUDIO JOSE BATISTA PEREIRA		901,51		0,00		124.40132.34-0		15/01/2008		01	
						0,00		72,12		01	
DENIVAL PEREIRA DA COSTA		1.647,77		0,00		121.71829.80-1		11/07/2013		01	
						0,00		148,29		01	
EDUARDO DE QUEIROZ ARAUJO		2.016,00		0,00		120.43510.45-4		01/03/2006		01	
						0,00		181,44		01	
EUJAN DE OLIVEIRA DIAS		1.194,00		0,00		124.16195.71-0		01/11/2012		01	
						0,00		95,52		01	
EVERSON LIMA MARINHO		2.036,66		0,00		200.77946.26-4		02/05/2014		01	
						0,00		183,29		01	
FERNANDES GOMES TEODORO		1.317,68		0,00		105.56844.95-2		01/04/2009		01	
						0,00		118,59		01	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/07/2014
HORA: 10:13:49
PÁG: 0002/0028

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001125 565201801406 707570200816 536143900016
858800000008 228001801409 707570200018 536143900016

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA		COMP: 06/2014 COD REC: 155		COD GPS: 2100		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1		RAT: 3.0		INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17		FAP: 1.38 RAT AJUSTADO: 4.14	
TOMADOR/OBRA: ENSERCON ENGENHARIA																	
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL						BASE CÁL PREV SOCIAL										DEPÓSITO	
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		0,00		203.88805.82-4		01/02/2013		01		01		01		01		78,89	
GILSON NEI PINHO GOMES		0,00		130.53292.40-7		06/05/2009		01		01		01		01		75,68	
GLORIA FRANCISCA DOS SANTOS		0,00		125.07139.71-6		01/07/2006		01		01		01		01		246,67	
GUSTAVO ALVES COUTINHO		0,00		207.59148.19-2		02/12/2013		01		01		01		01		69,50	
JAIME RODRIGUES DE SOUZA		0,00		108.84495.28-8		01/03/2010		01		01		01		01		104,57	
JHONATAN FERREIRA DA SILVA		0,00		132.34494.40-0		01/04/2009		01		01		01		01		123,11	
JOAO BATISTA DA COSTA		0,00		108.48179.36-3		04/11/2013		01		01		01		01		113,59	
JOAO BATISTA ELIAS DA COSTA		0,00		106.15685.35-5		01/04/2009		01		01		01		01		65,87	
JOSE ALVES MOREIRA		0,00		105.82584.62-8		01/12/2006		01		01		01		01		265,98	
JOSE BATISTA		0,00		102.25079.74-4		02/02/2009		01		01		01		01		167,96	
JOSE DANTAS DA SILVA FILHO		0,00		107.47267.59-3		02/08/2010		01		01		01		01		200,73	
JOSE JESUS DE CASTRO		0,00		126.43390.40-9		08/05/2009		01		01		01		01		96,45	
JOSE SIMAO DE MORAIS		0,00		129.07967.16-0		02/06/2014		01		01		01		01		74,00	
JUVERCINO INACIO DA SILVA		0,00		107.78180.79-1		01/04/2009		01		01		01		01		95,21	
MANOEL ARISTEU DE ALMEIDA		0,00		170.05825.92-4		02/07/2012		01		01		01		01		69,09	
