

ANEXO 07

**Termo Aditivo de Prazo – Processo CGE
n.º 700845/2014**



1933

Protocolo/SETPU
Folha Nº <u>01</u>
Ass.: <u>[assinatura]</u>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

Protocolo n.: 700845/2014

Data: 22/12/2014 10:52

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 137/13/SETPU

Assunto: TERMO ADITIVO DE PRAZO

Resumo: SOLICITA ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 540 DIAS AO IC 137/13/SETPU PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA RODOVIA MT-36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO


Volume: 1 de 1




ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
Suot	22. 12. 14	



Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600



Ofício n.º 306/2014

Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU
ATT. CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ MF sob o n.º 14.915.029/0001-08, e Inscrição Estadual n.º 13.109.829-2, com sede na Rodovia Arquiteto Helder Cândia, km 3,5 – Vale dos Lírios - em Cuiabá-MT, neste ato representada pelo **Sr.º Alexandre Correa de Mello**, Diretor, vem mui respeitosamente à presença de V.S.ª solicitar:

ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL ao Instrumento contratual n.º 137/2013/00/00-SETPU, com fulcro no Art. 57, § 1º da Lei 8.666 de 21 de junho de 2013, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.

No dia 09 de julho de 2013 foi assinado o Instrumento contratual n.º 137/2013/00/00-SETPU com prazo de execução e conclusão de 540 (quinhentos e quarenta) dias e posteriormente foi emitida a Ordem de Início de Serviço, no dia 12 de julho de 2013 conforme Processo 661205/2012-SETPU e com base nestas informações o contrato deveria estar concluído até o dia **03 de janeiro de 2015**.

Notadamente, a própria Lei de Licitações prevê hipóteses em que, não havendo culpa do executor nos atrasos provocados no cronograma das obras, este será prorrogado, o que pleiteamos no presente.

CONT/SINFRA
1935
Ass: [assinatura]
Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass: [assinatura]

Entendemos que para a conclusão dos serviços será necessário à prorrogação do prazo de prazo de **execução** em mais **540** (quinhentos e quarenta) dias, bem como seu prazo de vigência devido ao período chuvoso que ocorrerá durante a execução do contrato retardando a execução.

O reconhecimento da dilação do prazo contratual também poderá ser elaborado de ofício sem que haja a necessidade de provocação, visto que existem duas partes em comum entendimento a Administração Pública e a Contratada.

Sabemos que as dilatações de prazos são precedidas de motivos inicialmente não conhecidos e os atrasos só ocorrem devidos essas situações minudentemente imprevistas como a situação desse contrato.

Por não emanar de culpa exclusiva da contratada, a providência necessária é ampliar o prazo contratual para o tempestivo adimplemento da avença.

Certo que vosso entendimento se inclina no mesmo sentido que o nosso, subscrevemos com nosso agradecimento, na certeza do deferimento do pedido.


Encomind Engenharia Ltda.
Alexandre Correa de Mello



GUAXE
ENCOMIND

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Rod. Arquileto Heider Candia, km 3,5 - Vale dos Lirios
Cuiabá - MT - CEP : 78.005-970 - CXP : 15 - Fone/Fax : (65) 3848-3300
CNPJ : 14.915.029/0001-08 - Insc. Est. : 13.109.829-2

Rodovia: MT - 100
 Contrato: 137/2013/00/00-SETPU
 Processo n.º 661205/2012-SETPU
 Concorrência Pública nº 024/2012
 Trecho: BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra das Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)
 Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho
 Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Período em dias Simples		19	31	30	31
Período em dias Acumulado		19	50	80	111
Período de execução		12/07/2013 à 31/07/2013	01/08/2013 à 31/08/2013	01/09/2013 à 30/09/2013	01/10/2013 à 31/10/2013
Situação da Obra		1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição
		Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)
1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	320.025,63	44,82%	0,00	0,00%
2	Administ. Local e manutenção de canteiro	146.423,35	5,56%	146.423,35	5,56%
3	terraplenagem	1.033.591,25	7,63%	1.613.377,69	11,91%
4	Pavimentação	0,00	0,00%	241.228,15	2,24%
5	Aquisição de material betuminoso	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Obras de arte correntes	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Drenagem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Obras complementares	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	Sinalização	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	Serviços de recuperação ambiental	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GERAL		42.900.068,93	100,00%		

PERÍODO SIMPLES	PERÍODO ACUMULADO
1.500.040,22	2.001.029,18
1.500.040,22	3.501.069,41
3,50%	4,66%
3,50%	8,16%
1.021.181,49	4.522.250,90
2,38%	10,54%
262.888,48	4.785.139,38
0,61%	11,15%

GOVERNADORIA
 1936
 Ass: [Assinatura]

Protocolo/SETPU
 Folha Nº [Assinatura]
 Ass: [Assinatura]

[Assinatura]
 Excomind Engenharia Ltda.
 CNPJ: 14.915.029/0001-08

[Assinatura]
 Eng.º Zenildo P. de C. Filho
 Fiscal - Port. nº [Assinatura]

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS
 Eng.º Civil Ricardo Marques do Guio
 CREA-MT 02711/VU
 RNP 1704056374



ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Rod. Aquilino Heider Candia, km 3,5 - Vale dos Lirios
Cuiabá - MT - CEP : 78.005-970 - CXP : 15 - Fone/Fax : (65) 3648-3300
CNPJ : 14.915.029/0001-08 - Insc. Est. : 13.109.829-2

Rodovia: MT - 100

Contrato: 137/2013/00/00-SETPU

Processo n.º 661205/2012-SETPU

Concorrência Pública nº 024/2012


Trecho: BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Período em dias Simples		30	31		31		28		31				
Período em dias Acumulado		141	172		203		231		262				
Período de execução		01/11/2013 à 30/11/2013		01/12/2013 à 31/12/2013		01/01/2014 à 31/01/2014		01/02/2014 à 28/02/2014		01/03/2014 à 31/03/2014			
Situação da Obra		5ª Medição		6ª Medição		7ª Medição		8ª Medição		9ª Medição			
		Valor (R\$)	à	Peso (%)	Valor (R\$)	à	Peso (%)	Valor (R\$)	à	Peso (%)	Valor (R\$)	à	Peso (%)
1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	714.024,16	1,66%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	Administ. Local e manutenção de canteiro	2.633.513,40	6,14%	5,56%	146.423,35	146.423,35	5,56%	146.423,35	146.423,35	5,56%	146.423,35	146.423,35	5,56%
3	terraplenagem	13.546.412,17	31,58%	1,27%	257.381,83	139.528,05	1,03%	112.435,22	112.435,22	0,83%	908.964,26	908.964,26	6,71%
4	Pavimentação	10.769.113,78	25,10%	0,07%	8.615,29	4.307,65	0,04%	3.230,73	3.230,73	0,03%	31.230,43	31.230,43	0,29%
5	Aquisição de material betuminoso	5.973.272,88	13,92%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6	Obras de arte correntes	371.345,95	0,87%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	Drenagem	4.461.053,00	10,40%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8	Obras complementares	983.230,09	2,29%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9	Sinalização	1.235.288,24	2,88%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10	Serviços de recuperação ambiental	2.212.815,26	5,16%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL		42.900.068,93	100,00%										

PERÍODO SIMPLES	326.001,16	0,76%	412.420,47	0,96%	290.259,04	0,68%	262.089,30	0,61%	1.086.618,03	2,53%
PERÍODO ACUMULADO	5.111.140,54	11,91%	5.523.561,80	12,88%	5.813.820,04	13,55%	6.075.909,34	14,16%	7.162.527,37	16,70%



Eng.º Danilo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº 1

Excomind Engenharia Ltda.
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Protocolo/SETPU
Folha Nº 08
Ass.:

COPIA PARA
Folha Nº 1937
Ass.

GUAXE
ENCOMIND
ENGENHARIA LTDA
Rod. Arquêlo Helder Candia, km 3,5 - Vale dos Lirios
Cuiabá - MT - CEP : 78.005-970 - CXP : 15 - Fone/Fax : (65) 3848-3300
CNPJ : 14.915.029/0001-08 - Insc. Est. : 13.109.829-2

Rodovia: MT - 100

Contrato: 137/2013/00/00-SETPU

Processo n.º 661205/2012-SETPU

Concorrência Pública nº 024/2012

Trecho: BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Período em dias Simples		30		31		30		31		31		31	
Período em dias Acumulado		292		323		353		384		415			
Período de execução		01/04/2014 a 30/04/2014		01/05/2014 a 31/05/2014		01/06/2014 a 30/06/2014		01/07/2014 a 31/07/2014		01/08/2014 a 31/08/2014			
Situação da Obra		10ª Medição		11ª Medição		12ª Medição		13ª Medição		14ª Medição			
		Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)		
1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	714.024,16	1,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
2	Administ. Local e manutenção de canteiro	2.633.513,40	6,14%	146.423,35	5,56%	146.423,35	5,56%	146.423,35	5,56%	146.423,35	5,56%		
3	terraplenagem	13.546.412,17	31,58%	600.106,06	4,43%	667.838,12	4,93%	933.347,80	6,89%	636.681,37	4,70%		
4	Pavimentação	10.769.113,78	25,10%	187.382,58	1,74%	1.074.757,56	9,98%	0,00	0,00%	551.378,63	5,12%		
5	Aquisição de material betuminoso	5.973.272,88	13,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.753,66	1,67%		
6	Obras de arte correntes	371.345,95	0,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
7	Drenagem	4.461.053,00	10,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
8	Obras complementares	983.230,09	2,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
9	Sinalização	1.235.288,24	2,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
10	Serviços de recuperação ambiental	2.212.815,26	5,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
TOTAL GERAL		42.900.068,93	100,00%										

PERÍODO SIMPLES	933.911,98	2,18%	154.551,19	0,36%	1.889.019,02	4,40%	1.075.771,14	2,52%	1.434.237,00	3,34%
PERÍODO ACUMULADO	8.096.439,36	18,87%	8.250.990,55	19,23%	10.140.009,57	23,64%	11.219.780,71	26,15%	12.654.017,71	29,50%

OS CALCULOS FORAM CONFERIDOS
Eng.º Civil Ricardo Marques da Silva
CREA/MT 02711/V-LI
RNP 1204056374

Eng.º Genivaldo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº. 1 -

Encomind Engenharia Ltda.
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Protocolo/SETPU
Folha Nº. 2
Ass.:

COPIA VERBA
Folha nº. 1938
Ass.:



ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Rod. Arquímio Heider Candia, km 3,5 - Vale dos Lírios
Cuiabá - MT - CEP : 78.005-970 - CXP : 15 - Fone/Fax : (65) 3648-3300
CNPJ : 14.915.029/0001-08 - Insc. Est. : 13.109.829-2

Rodovia: MT - 100

Contrato: 137/2013/00/00-SETPU

Processo n.º 661205/2012-SETPU

Concorrência Pública nº 024/2012

Trecho: BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Período em dias Simples		30		31		30		31		31	
		Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)
Período em dias Acumulado		445		476		506		537		568	
Período de execução		01/09/2014 à 30/09/2014		01/10/2014 à 31/10/2014		01/11/2014 à 30/11/2014		01/12/2014 à 31/12/2014		01/01/2015 à 31/01/2015	
Situação da Obra		15ª Medição		16ª Medição							
1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	281.896,74	39,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	Administ. Local e manutenção de canteiro	146.423,35	5,56%	146.423,35	5,56%	13.167,57	0,50%	14.484,32	0,55%	14.484,32	0,55%
3	terraplenagem	750.471,23	5,54%	904.900,33	6,68%	406.392,37	3,00%	270.928,24	2,00%	135.464,12	1,00%
4	Pavimentação	516.917,46	4,80%	1.658.443,52	15,40%	215.382,28	2,00%	215.382,28	2,00%	215.382,28	2,00%
5	Aquisição de material betuminoso	304.636,92	5,10%	795.639,95	13,32%	597.327,29	10,00%	597.327,29	10,00%	597.327,29	10,00%
6	Obras de arte correntes	192.245,80	0,87%	0,00	0,00%	11.140,38	3,00%	11.140,38	3,00%	11.140,38	3,00%
7	Drenagem	1.302.181,37	29,19%	0,00	0,00%	482.239,83	10,81%	892.210,60	20,00%	892.210,60	20,00%
8	Obras complementares	606.358,00	61,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	Sinalização	1.235.288,24	2,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	Serviços de recuperação ambiental	2.212.815,26	5,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GERAL		42.900.068,93		100,00%							

PERÍODO SIMPLES	4.101.130,86	9,56%	3.595.407,15	8,17%	1.725.649,70	4,02%	2.001.473,11	4,67%	1.866.008,99	4,35%
PERÍODO ACUMULADO	16.755.148,57	39,06%	20.260.555,72	47,23%	21.986.205,43	51,25%	23.987.678,53	55,92%	25.853.687,52	60,26%

OS CALCULOS FORAM CONFERIDOS
Eng.º Civil Ricardo Marques de Oliveira
CREA/MG 071111 V D
CNPJ 1704056874

Eng.º Zenildo de C. Filho
Fiscal - Pot. nº. 1

Encomind Engenharia Ltda.
CNPJ: 14.915.029/0001-08

PROTÓCOLO/SETPU
Folha Nº 2
Ass.:

CONTINUA
1939
Ass.:



ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Rod. Aquilino Heider Candia, km 3,5 - Vale dos Lirios
Cuiabá - MT - CEP : 78.005-970 - CXP : 15 - Fone/Fax : (65) 3848-3300
CNPJ : 14.915.029/0001-08 - Insc. Est. : 13.109.829-2

Rodovia: MT - 100

Contrato: 137/2013/00/00-SETPU

Processo n.º 661205/2012-SETPU

Concorrência Pública nº 024/2012

Trecho: BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Período em dias Simples		28	31	30	31	30				
Período em dias Acumulado		596	627	657	688	718				
Período de execução		01/02/2015 à 28/02/2015	01/03/2015 à 31/03/2015	01/04/2015 à 30/04/2015	01/05/2015 à 31/05/2015	01/06/2015 à 30/06/2015				
Situação da Obra										
		Valor (R\$)	à	Peso (%)	Valor (R\$)	à	Peso (%)	Valor (R\$)	à	Peso (%)
1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	714.024,16	1,66%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
2	Administ. Local e manutenção de canteiro	2.633.513,40	6,14%	0,55%	14.484,32	0,55%	0,55%	14.484,32	0,55%	0,55%
3	terraplenagem	13.546.412,17	31,58%	1,00%	135.464,12	1,00%	15,00%	895.417,84	6,61%	0,00%
4	Pavimentação	10.769.113,78	25,10%	2,00%	215.382,28	2,00%	2,00%	215.382,28	2,00%	6,00%
5	Aquisição de material betuminoso	5.973.272,88	13,92%	2,91%	119.465,46	2,00%	2,00%	119.465,46	2,00%	6,00%
6	Obras de arte correntes	371.345,95	0,87%	3,00%	11.140,38	3,00%	3,00%	11.140,38	3,00%	3,00%
7	Drenagem	4.461.053,00	10,40%	20,00%	892.210,60	20,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Obras complementares	983.230,09	2,29%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Sinalização	1.235.288,24	2,88%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Serviços de recuperação ambiental	2.212.815,26	5,16%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL		42.900.068,93	100,00%							

PERÍODO SIMPLES	1.442.503,94	3,36%	2.392.434,56	5,58%	1.255.890,28	2,93%	1.030.167,90	2,40%	1.030.167,90	2,40%
PERÍODO ACUMULADO	27.296.191,46	63,63%	29.688.625,72	69,20%	30.944.516,00	72,13%	31.974.683,90	74,53%	33.004.851,81	76,93%

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS
Eng.º Civil Ricardo Marques da Silva
CREA/MT 02711/V-D
RNP 4204056374

Eng.º Benedito P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº _____

Protocolo/SETPU
Folha nº _____
Ass.: _____

CONTINUA
Folha nº 1940
Ass.: _____



ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Rod. Arquiteo Helder Candia, km 3,5 - Vale dos Lirios
Cuiabá - MT - CEP : 78.005-970 - CXP : 15 - Fone/Fax : (65) 3648-3300
CNPJ : 14.915.029/0001-08 - Insc. Est. : 13.109.829-2

Rodovia: MT - 100

Contrato: 137/2013/00/00-SETPU

Processo n.º 661205/2012-SETPU

Concorrência Pública nº 024/2012

Trecho: BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Período em dias Simples		31		30		31		30		
Período em dias Acumulado		749		779		810		871		
Período de execução		01/07/2015 à 31/07/2015		01/08/2015 à 30/08/2015		31/08/2015 à 30/09/2015		01/10/2015 à 31/10/2015		
Situação da Obra										
		Valor (R\$)	à	Peso (%)	Valor (R\$)	à	Peso (%)	Valor (R\$)	à	Peso (%)
1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	714.024,16	1,66%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
2	Administ. Local e manutenção de canteiro	2.633.513,40	6,14%	0,55%	14.484,32	0,55%	0,55%	14.484,32	0,55%	0,55%
3	terraplenagem	13.546.412,17	31,58%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	Pavimentação	10.769.113,78	25,10%	6,00%	646.146,83	6,00%	6,00%	646.146,83	6,00%	6,00%
5	Aquisição de material betuminoso	5.973.272,88	13,92%	6,00%	358.396,37	6,00%	6,00%	358.396,37	6,00%	6,00%
6	Obras de arte correntes	371.345,95	0,87%	3,00%	11.140,38	3,00%	3,00%	11.140,38	3,00%	3,00%
7	Drenagem	4.461.053,00	10,40%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
8	Obras complementares	983.230,09	2,29%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19.664,60	2,00%	2,00%
9	Sinalização	1.235.288,24	2,88%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
10	Serviços de recuperação ambiental	2.212.815,26	5,16%	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	221.281,53	10,00%	10,00%
TOTAL GERAL		42.900.068,93	100,00%					221.281,53		

PERÍODO SIMPLES	1.030.167,90	2,40%	1.030.167,90	2,40%	1.251.449,43	2,92%	1.271.114,03	2,96%	1.271.114,03	2,96%
PERÍODO ACUMULADO	34.035.019,71	79,34%	35.065.187,61	81,74%	36.316.637,04	84,65%	37.587.751,07	87,62%	38.859.865,10	90,58%

OS CALCULOS FORAM CONFERIDOS
Eng.º Civil Ricardo Marques de Gama
CREA/MT 02711/ND
RNP 1704056374

Eng.º Zénilo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº _____

Encomind Engenharia Ltda.
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass.: _____

ENCOMIND ENGENHARIA
Folha Nº 1941
Ass.: _____

Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2014.

GUAXE ENCOMIND
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Rod. Arquileto Helder Candia, km 3,5 - Vale dos Lírios
Cuiabá - MT - CEP : 78.005-970 - CXP : 15 - Fone/Fax : (65) 3648-3300
CNPJ : 14.915.029/0001-08 - Insc. Est : 13.109.829-2

Rodovia: MT - 100

Contrato: 137/2013/00/00-SETPU

Processo n.º 661205/2012-SETPU

Concorrência Pública nº 024/2012

Trecho: BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Período em dias Simples			31		30		29		32		30	
			902		932		961		993		1.023	
Período em dias Acumulado			01/12/2015 à 31/12/2015		01/01/2016 à 30/01/2016		31/01/2016 à 28/02/2016		29/02/2016 à 31/03/2016		01/04/2016 à 30/04/2016	
			Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)
Situação da Obra	1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	714.024,16	1,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	Administ. Local e manutenção de canteiro	2.633.513,40	6,14%	14.484,32	0,55%	14.484,32	0,55%	14.484,32	0,55%	14.484,32	0,55%
	3	terraplenagem	13.546.412,17	31,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4	Pavimentação	10.769.113,78	25,10%	609.531,84	5,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5	Aquisição de material betuminoso	5.973.272,88	13,92%	59.732,73	1,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6	Obras de arte correntes	371.345,95	0,87%	11.140,38	3,00%	11.994,47	3,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7	Drenagem	4.461.053,00	10,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	8	Obras complementares	983.230,09	2,29%	19.664,60	2,00%	19.664,60	2,00%	91.735,37	9,33%	78.658,41	8,00%
	9	Sinalização	1.235.288,24	2,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.764,41	5,00%	185.293,24	15,00%
	10	Serviços de recuperação ambiental	2.212.815,26	5,16%	221.281,53	10,00%	221.281,53	10,00%	221.281,53	10,00%	221.281,53	10,00%
TOTAL GERAL			42.900.068,93	100,00%								

PERÍODO SIMPLES	935.835,40	2,18%	266.570,83	0,62%	267.424,93	0,62%	389.265,63	0,91%	499.717,49	1,16%
PERÍODO ACUMULADO	39.794.700,50	92,76%	40.061.271,33	93,38%	40.328.696,25	94,01%	40.717.961,88	94,91%	41.217.679,37	95,08%

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS
Eng.º Civil Ricardo Marques da Gama
CREA/MT 02111/V.D
RNP 1204056374

Eng.º Lenildo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº 1

Encomind Engenharia Ltda.
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Protocolo/SETPU
Folha Nº 10
Ass.:

GOVERNADORIA
1942/8
Ass.:



ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Rod. Arquiteo Heider Candia, km 3,5 - Vale dos Lírios
Cuiabá - MT - CEP : 78.005-970 - CXP : 15 - Fone/Fax : (65) 3648-3300
CNPJ : 14.915.029/0001-08 - Insc. Est. : 13.109.826-2

Rodovia: MT - 100

Contrato: 137/2013/00/00-SETPU

Processo n.º 661205/2012-SETPU

Concorrência Pública nº 024/2012

Trecho: BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Período em dias Simples		31	26		
Período em dias Acumulado		1.054	1.080		
Período de execução		01/05/2016 à 31/05/2016	01/06/2016 à 26/06/2016		
Situação da Obra					
		Valor (R\$)	Peso (%)	Valor (R\$)	Peso (%)
1	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização	714.024,16	1,66%	112.101,79	15,70%
2	Administ. Local e manutenção de canteiro	2.633.513,40	6,14%	15.801,08	0,60%
3	terraplenagem	13.546.412,17	31,58%	0,00	0,00%
4	Pavimentação	10.769.113,78	25,10%	0,00	0,00%
5	Aquisição de material betuminoso	5.973.272,88	13,92%	0,00	0,00%
6	Obras de arte correntes	371.345,95	0,87%	0,00	0,00%
7	Drenagem	4.461.053,00	10,40%	0,00	0,00%
8	Obras complementares	983.230,09	2,29%	49.161,50	5,00%
9	Sinalização	1.235.288,24	2,88%	494.115,30	40,00%
10	Serviços de recuperação ambiental	2.212.815,26	5,16%	221.281,53	10,00%
TOTAL GERAL		42.900.068,93	100,00%		

PERÍODO SIMPLES	789.928,36	1,84%	892.461,20	2,08%
PERÍODO ACUMULADO	42.007.607,73	97,92%	42.900.068,93	100,00%

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS
Eng.º Civil Ricardo Mendes da Guia
CREAMT/02711/V/D
RNP 1204056374

Eng.º Danilo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº. _____

Protocolo/SETPU
Folha Nº 1
Ass.:

GOVERNADORIA
Folha nº 1943
Ass. J
8/8

CONTRATO Nº
137/2013

Ass.: _____

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS

[Assinatura]

Eng.º Civil Ricardo Marques da Guia


CREAMT 02/111/VD

CNPJ 1204056374



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



PROC. Nº: 700845/14

FLS.: 13

DATA: 22 / 12 / 14

Encaminhamos o presente processo ao setor
508 /SETPU

Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas 01 a 13

Por ser verdadeiro, confirmo e assino.

Cuiabá, 22 / 12 / 14

Dayana Rosa

Gerente de Protocolo/SETPU

À Eng.º Ricardo M. da Guia.
Para análise.


Em: 22 / 12 / 14

[Signature]
Eng.º Tércio L. de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SUOT
após conferência.

22.12.14

[Signature]
Eng.º Civil Ricardo Marques da Guia
CREA/MT 02741-VD
RNP 1204056374
Matrícula: 81447



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Processo n.º	700845/2014
IC n.º	137/2013/00/00 SETPU
Interessados	Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda
Referência	Obra de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT-100, Trecho: BR364(B)/MT-299 – Ent. BR070 (Barra do Garças) – Ent. MT-336 (Araguaiana), Segmentos: Alto Araguaia – Ponte Branca – Ribeirãozinho, Lote Const. 01.2 (Ponte Branca-Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 km, nos municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho-MT.
Nota Técnica	053/2015

1. Trata a presente NOTA TÉCNICA da prorrogação dos prazos de vigência, e prazo de execução da obra referente ao Contrato 137/2013/00/00 SETPU, cujo objeto de a Obra de Implantação e pavimentação da Rodovia MT-100, Trecho: BR364(B)/MT-299 – Ent. BR070 (Barra do Garças) – Ent. MT-336 (Araguaiana), Segmentos: Alto Araguaia – Ponte Branca – Ribeirãozinho, Lote Const. 01.2 (Ponte Branca-Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 km, nos municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho-MT, celebrado com a firma Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda.
2. O prazo de vigência previsto em contrato e de 630 dias consecutivos contados a partir da data da assinatura do contrato e a prorrogação solicitada e de 540 dias consecutivos, passando o prazo total para 1170 dias consecutivos, com término previsto para 24/09/2016. *25/09/16*
3. O prazo de execução das obras previsto em contrato e de 540 dias consecutivos contados a partir da data da ordem de início dos serviços, e a prorrogação solicitada e de 540 dias consecutivos, passando o prazo total para 1080 dias consecutivos, com término previsto para 26/06/2016.
4. O cronograma de execução das obras encontra-se anexo. *26/06/16*

Em 25 /02/2015

Jose Carlos Ferreira da Silva
ENG. JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E TRANSPORTES



**SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso


SINFRA
1947
L

Processo. Nº _____

Folhas: _____

49

Data: _____

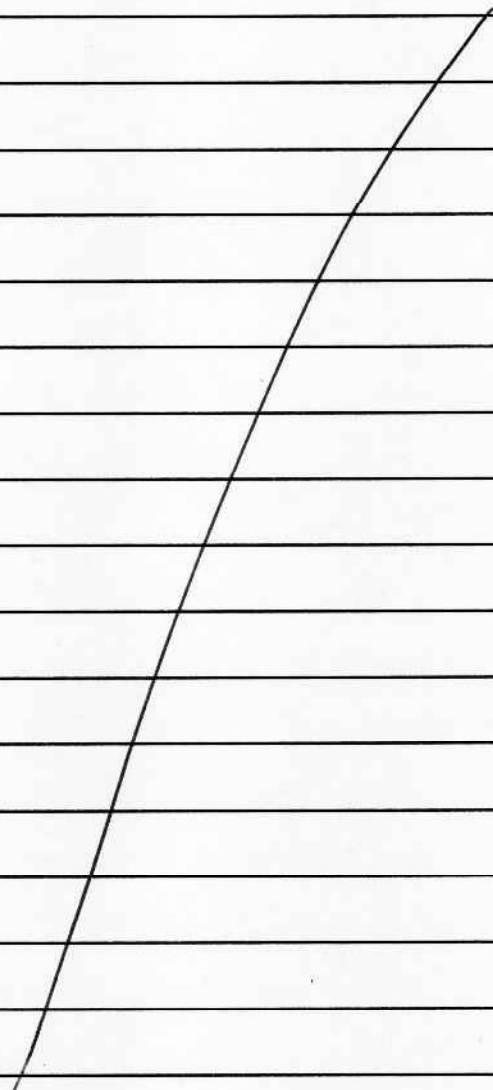

CONTINUA
Folha nº 1948
L



SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso


Processo. Nº 7008 45/14


Folhas: 50

Data:

Ao
Gab,

Para assinatura do Senhor Secretário
rio.


Mariângela Toff Vilela



TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL 137/2013/001/ 002 - SINFRA


SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2013 CELEBRADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PELA EEMPRESA ENCOMIND ENGENHARIA , COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO a execução de obras/serviços de pavimentação de rodovia, na MT-100, trecho: BR-364 (B), MT-299, Entr.º BR-070 (Barra do Garças); Entr.º MT -366 (Araguaiana), segmentos : Ito Araguaia - Ponte Branca- Ribeirãozinho, com extensão de 45,538 Km, nos municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho.

1. PARTES :

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, neste ato, representada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Senhor MARCELO DUARTE MONTEIRO, inscrito no RG 899 659 SSP/MT e CPF 654212051-34.

CONTRATADA: ENCOMIND ENGENHARIA , COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.915.029/0001-08, inscrição estadual nº 13.109.829-2, sediada na Rodovia Arquiteto Helder Cândia, km 3,5 - Vale dos Lírios ,na cidade de Cuiabá/MT, designada CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor MÁRCIO AGUIAR DA SILVA, portador do CPF (MF) n.º 687.150.305/44.

2



2. FUNDAMENTOS DO TERMOS:

Este termo decorre de autorização do Senhor Secretário de Estado da Secretaria de Infraestrutura e Logística, em face dos motivos e justificativas constantes no Processo Administrativo n.º **700845/2014-SINFRA**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em **09/07/2013**, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo aditivo, o prazo contratual fica prorrogado, na forma abaixo, nos termos do estatuído no parágrafo 1º do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Adicionar 540 (Quinhentos e Quarenta) dias ao prazo de vigência, totalizando 1.170 (um mil cento e setenta dias), expirando em 21/09/2016.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Adita-se ao Instrumento Contratual n.º 137/2013, 540 (Quinhentos e Quarenta), com término previsto para o dia 26/06/2016, perfazendo um total de 1.080 (hum mil e oitenta) dias para a completa execução da obra.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Este termo terá validade a partir da data de sua assinatura e eficácia após sua publicação no Diário Oficial do Estado.

E por estarem de pleno acordo, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2015.


MARCELO DUARTE MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA


MARCIO AGUIAR DA SILVA
ENCOMIND ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA


TESTEMUNHA
124.952.498-92


TESTEMUNHA
015.883.430-57



Governo do Estado de Mato Grosso

Secretaria de Infraestrutura e Logística

Obra: Pavimentação de rodovia

Rodovia: MT-100

Contrato: 137/2013/00/00-SEPTU

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho

Valor: R\$ 42.900.068,93

Extensão: 45,538 km

Prazo atual: 1.080 dias

Data: 25/05/15

Cronograma físico-financeiro - 1º Termo aditivo de prazo

Item	Etapa	Medição nº: Data inicial Data final Dias acumul.	32ª		33ª		34ª		35ª		36ª		37ª	
			01/07/16 31/07/16 946		01/09/16 30/09/16 976		01/10/16 31/10/16 1.007		01/11/16 30/11/16 1.037		01/12/16 31/12/16 1.068		01/01/17 12/01/17 1.080	
1.0	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização													
2.0	Administração local e manutenção de canteiro		0,16%		0,16%		0,16%		0,15%		0,14%		7,85%	
			4.201,36		4.201,36		4.201,36		3.826,45		3.604,61		56.053,80	
3.0	Terraplenagem		2,07%		1,85%		1,71%							
			280.421,24		250.421,24		231.148,29							
4.0	Pavimentação		2,99%		2,89%		2,73%		1,58%					
			322.204,40		311.093,40		294.224,14		169.905,99					
5.0	Aquisição de material betuminoso		4,64%		3,20%		2,88%		1,61%					
			277.212,42		191.101,37		171.823,77		96.010,74					
6.0	Obras de arte correntes													
7.0	Drenagem		0,64%											
			28.592,26											
8.0	Obras complementares								4,29%		2,27%			
									42.155,00		22.362,82			
9.0	Sinalização						33,40%		41,84%		21,92%		2,84%	
							412.563,66		516.787,64		270.812,94		35.124,00	
10.0	Serviços de recuperação ambiental						11,53%		15,62%		15,18%		4,44%	
							255.036,00		345.680,00		335.970,74		98.212,00	
	Total mensal		912.631,68		1.102.497,37		1.368.997,22		1.174.365,82		688.804,91		189.389,87	
	Total acumulado		38.376.013,81		39.478.511,18		40.847.508,40		42.021.874,22		42.710.679,13		42.900.069,00	

Folha 05/05

COOR. FISCAL


Assinatura: 1952

Assinatura: J

	Governo do Estado de Mato Grosso		Obra: Pavimentação de rodovia		Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)	
	Secretaria de Infraestrutura e Logística		Rodovia: MT-100		Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho	
			Contrato: 137/2013/00/00-SEPTU		Valor: R\$ 42.900.068,93	
					Prazo atual: 1.080 dias	
						Data: 25/05/15

Cronograma físico-financeiro - 1º Termo aditivo de prazo

Item	Etapas	Medição nº: Data inicial Data final Dias acumul.	1ª 12/07/13 31/07/13 20	2ª 01/08/13 31/08/13 51	3ª 01/09/13 30/09/13 81	4ª 01/10/13 31/10/13 112	5ª 01/11/13 30/11/13 142	6ª 01/12/13 31/12/13 173	7ª 01/01/14 31/01/14 204	8ª 01/02/14 28/02/14 232
1.0	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização		44,82% 320.041,09							
2.0	Administração local e manutenção de canteiro		5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30
3.0	Terraplenagem		7,63% 1.034.028,38	11,91% 1.613.146,89	6,06% 820.408,73	0,82% 110.626,39	1,27% 171.635,57	1,90% 257.649,98	1,03% 139.440,52	0,83% 112.406,14
4.0	Pavimentação			2,24% 240.859,27	0,50% 53.540,90	0,05% 5.256,00	0,07% 7.778,88	0,08% 8.619,84	0,04% 4.204,80	0,03% 3.574,08
5.0	Aquisição de material betuminoso									
6.0	Obras de arte correntes									
7.0	Drenagem									
8.0	Obras complementares									
9.0	Sinalização									
10.0	Serviços de recuperação ambiental									
Total mensal			1.500.375,77	2.000.312,46	1.020.255,93	262.188,69	325.720,75	412.576,12	289.951,62	262.286,52
Total acumulado			1.500.375,77	3.500.688,23	4.520.944,16	4.783.132,85	5.108.853,60	5.521.429,72	5.811.381,34	6.073.667,86

Folha 01/05
 Ass: 
 1953
 CCNT/3M/FRA

Rodovia: MT-100

Contrato: 137/2013/00/00-SEPTU

Trecho: BR-364(B)/MT-29

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho

Valor: R\$ 42.900,068,93

Contr. MT-336 (Araguaiana)

Extensão: 45,538 km

Data: 25/05/15

Cronograma físico-financeiro - 1º Termo aditivo de prazo


Item	Etapas	Medição nº: Data inicial Data final Dias acumul.	9ª 01/03/14 31/03/14 263	10ª 01/04/14 30/04/14 293	11ª 01/05/14 31/05/14 324	12ª 01/06/14 30/06/14 354	13ª 01/07/14 31/07/14 385	14ª 01/08/14 31/08/14 416	15ª 01/09/14 31/09/14 446	16ª 01/10/14 31/10/14 477
1.0	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização								0,39	
									281.875,47	
2.0	Administração local e manutenção de canteiro		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30
3.0	Terraplenagem		6,71%	4,43%	0,06%	4,93%	6,89%	4,70%	5,54%	6,88%
			908.624,96	600.090,15	8.700,00	668.192,14	933.356,73	636.114,89	750.256,58	931.426,75
4.0	Pavimentação		0,29%	1,74%		9,86%		5,12%	4,80%	15,40%
			31.115,52	187.090,02		1.061.299,55		551.708,61	516.452,23	1.658.966,61
5.0	Aquisição de material betuminoso							1,67%	5,10%	13,32%
								99.917,55	304.414,14	795.794,61
6.0	Obras de arte correntes								51,77%	
									192.239,88	
7.0	Drenagem								29,19%	
									1.302.134,48	
8.0	Obras complementares								61,67%	
									606.356,27	
9.0	Sinalização									
10.0	Serviços de recuperação ambiental									
	Total mensal		1.086.046,78	933.486,47	155.006,30	1.875.797,99	1.079.663,03	1.434.047,35	4.100.035,35	3.532.494,27
	Total acumulado		7.159.714,64	8.093.201,11	8.248.207,41	10.124.005,40	11.203.668,43	12.637.715,78	16.737.751,13	20.270.245,40

 Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Infraestrutura e Logística	Obra: Pavimentação de rodovia Rodovia: MT-100 Contrato: 137/2013/00/00-SEPTU	Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho Extensão: 45,538 km Valor: R\$ 42.900.068,93 Prazo atual: 1.080 dias	Data: 25/05/15
--	---	---	-----------------------

Cronograma físico-financeiro - 1º Termo aditivo de prazo

Item	Etapas	Medição nº: Data inicial Data final Dias acumul.	17ª 01/11/14 30/11/14 507	18ª 01/12/14 12/12/14 519	19ª 01/06/15 30/06/15 549	20ª 01/07/15 31/07/15 580	21ª 01/08/15 31/08/15 611	22ª 01/09/15 30/09/15 641	23ª 01/10/15 31/10/15 672
1.0	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização								
2.0	Administração local e manutenção de canteiro		5,56%	2,78%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%
			146.306,30	73.153,12	4.201,36	4.201,36	4.201,36	4.201,36	3.826,45
3.0	Terraplenagem			4,61%	1,70%	2,02%	2,17%	1,94%	
				624.409,99	230.421,24	273.042,40	294.304,12	263.021,45	
4.0	Pavimentação		11,92%	7,31%	2,71%	3,18%	3,18%	3,18%	1,35%
			1.283.902,79	787.051,15	292.204,40	342.204,40	342.204,40	342.204,40	145.213,00
5.0	Aquisição de material betuminoso		17,69%	9,15%	3,13%	4,83%	4,83%	4,83%	3,01%
			1.056.709,50	546.642,70	186.712,42	288.212,42	288.212,42	288.212,42	179.867,15
6.0	Obras de arte correntes					9,85%	9,85%	7,16%	
						36.581,33	36.581,33	26.581,33	
7.0	Drenagem				3,99%	5,31%	7,20%	6,83%	4,16%
					178.125,00	236.781,00	321.301,00	304.559,00	185.600,00
8.0	Obras complementares			31,77%					
				312.356,00					
9.0	Sinalização		33,40%	-33,40%					
			412.563,66	-412.563,66					
10.0	Serviços de recuperação ambiental		34,47%	3,14%					
			762.743,27	69.493,25					
Total mensal			3.662.225,52	2.000.542,55	891.664,42	1.181.022,91	1.286.804,63	1.228.779,96	514.506,60
Total acumulado			23.932.470,92	25.933.013,47	26.824.677,89	28.005.700,80	29.292.505,43	30.521.285,39	31.035.791,99

Paralisação



Cronograma físico-financeiro - 1º Termo aditivo de prazo

Item	Etapas	Medição nº: Data inicial Data final Dias acumul.	24ª 01/11/15 30/11/15 702	25ª 01/12/15 31/12/15 733	26ª 01/01/16 31/01/16 764	27ª 01/02/16 29/02/16 793	28ª 01/03/16 31/03/16 824	29ª 01/04/16 30/04/16 854	30ª 01/05/16 31/05/16 885	31ª 01/06/16 30/06/16 915
1.0	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização									
2.0	Administração local e manutenção de canteiro		0,15%	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
			3.826,45	3.826,45	3.826,45	4.201,36	4.201,36	4.201,36	4.201,36	4.201,36
3.0	Terraplenagem					2,07%	2,07%	2,07%	2,08%	2,07%
						280.421,24	280.421,24	280.421,24	281.432,44	280.421,24
4.0	Pavimentação				1,35%	2,71%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%
					145.213,00	292.204,40	342.204,40	342.204,40	342.204,40	342.204,40
5.0	Aquisição de material betuminoso				1,34%	2,84%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%
					79.867,15	169.712,42	238.212,42	238.212,42	238.212,42	238.212,42
6.0	Obras de arte correntes							7,06%	7,16%	7,16%
								26.199,52	26.581,33	26.581,23
7.0	Drenagem		1,48%	1,70%	3,17%	5,50%	5,50%	7,31%	8,48%	9,54%
			65.884,00	75.687,00	141.581,00	245.263,00	245.263,00	326.199,79	378.391,75	425.690,72
8.0	Obras complementares									
9.0	Sinalização									
10.0	Serviços de recuperação ambiental									
	Total mensal		69.710,45	79.513,45	370.487,60	991.802,42	1.110.302,42	1.217.438,73	1.271.023,70	1.317.311,37
	Total acumulado		31.105.502,44	31.185.015,89	31.555.503,49	32.547.305,91	33.657.608,33	34.875.047,06	36.146.070,76	37.463.382,13

Quarta-Feira, 20 de Maio de 2015

Diário Oficial

Nº 26538

Página 17

Extrato do Termo Aditivo nº 013/2013/01/03 - SETPU

Processo nº 90750/2015- SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-320, Trecho: Entrº MT- 208 - Entrº BR-163/MT - Entrº MT - 423, Sub-trecho: Entrº BR-163/MT - Marcelândia, com extensão de 69,30 KM.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em 06/03/2013 nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência 275 (duzentos e setenta e cinco) dias e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços 180 (cento e oitenta dias) dias.

Partes: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Republica-se por ter sido publicado incorretamente

Extrato do Termo Aditivo nº 025/2013/01/03 - SINFRA

Processo nº 218708/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-413, Trecho: Entrº BR-158/MT (Portal do Amazônia) - MT 432 - Santa Terezinha, Sub-Trecho: Entrº BR-158/MT (Portal do Amazônia - Santa Terezinha), com extensão de 94,61 KM.

Objeto do Termo: Prorrogação do contrato firmado entre as partes em 22/02/2013, nos termos do Título III- 3.5 - Vigência - 291 (Duzentos e noventa e um) dias e 3.4- Para a Conclusão dos Serviços - 244 (Duzentos e quarenta e quatro) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA.

Extrato do Termo Aditivo nº 110/2009/01/02 - SETPU

Processo nº 724430/2008-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação na Rodovia MT-020, trecho: Paranatinga - Canarana, subtrecho km 202,50 - km 236,25, extensão 33,75 km (lote 03) do Edital.

Objeto do Termo: Prorrogação do contrato firmado entre as partes em 16/04/2009, nos termos do Título III itens: 3.4 - Para conclusão dos serviços - 185 (cento e oitenta e cinco dias) - 3.5 - Vigência - 185 (cento e oitenta e cinco dias)

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA e a RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

Extrato do Termo Aditivo nº 112/2012/01/04 - SETPU

Processo nº 865055/2011-SETPU

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-020, Trecho: Paranatinga - Canarana, Subtrecho: km 236,25 - km 270, extensão 33,75 km (lote 04 do Edital)

Objeto do Termo: Prorrogação. Nos termos do contrato assinado em 14/06/2012, Título III itens: 3.4 - Para conclusão dos serviços - 204 (duzentos e Quatro) dias - 3.5 - Vigência - 204 (duzentos e Quatro) dias

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA e a RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

Extrato do Termo Aditivo nº 135/2013/001/003 - SINFRA

Processo nº 706481/2015- SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-100, Trecho BR-364 (B) MT-229 - Ent. BR-070 (Barra do Garças) - Ent. MT-336 (Araguaiana), subtrecho: Ent.MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho - Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/ Barra do garças) Acesso (B) ao município de Ribeirãozinho e acesso ao município de Torixoréu, lote 02, nos municípios de Barra do Garças Pontal do Araguaia e Torixoréu/ numa extensão de 52,640 km

Objeto do Termo: Adicionar ao Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013 nos termos do Título III - Prazo, itens 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços 301 (trezentos e Um) dias e 3.5 - Da Vigência - 304 (trezentos e quatro) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

Republica-se por ter sido publicado incorretamente.

Extrato do Termo Aditivo nº 136/2013/01/03 - SINFRA

Processo nº 5178/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-100, Trecho: BR-364 (B) MT-299 - Entº BR - 070 (Barra do Garças) - Entº MT -366 (Araguaiana), Sub-Trecho: Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) - Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do

Garças) Acesso (B) ao município de Ribeirãozinho e acesso ao município de Torixoréu, Lote 02 segmento 01, nos Municípios de Ribeirãozinho/ Pontal do Araguaia/ Barra do Garças/ Torixoréu-MT, numa Extensão de 51,545 KM. Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013 nos termos do Título III - 3.4 - Prazo Para a Conclusão dos Serviços - 265 (duzentos e sessenta e cinco dias), item 3.5 - Da Vigência - 355 (trezentos e cinquenta e cinco) e a EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

Extrato do Termo Aditivo nº 137/2013/01/02 - SINFRA

Processo nº 700845/2014-SINFRA

Objeto do Contrato: A execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-100, Trecho: BR-364 (B)/ MT - 299 - Entº BR - 070 (Barra do Garças) - Entº MT - 366 (Araguaiana), Segmentos: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote Const. 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 KM, nos Municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho - MT.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO no prazo de vigência de execução do Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência - 540 (quinhentos e quarenta) dias.

Partes: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA e a EMPRESA ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

Republica-se por ter publicado incorretamente

Extrato do Termo Aditivo nº 139/2013/01/02 - SETPU

Processo nº 41779/2015 - SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação na Rodovia MT-100, trecho: BR-364 (B)/229 - Ent. BR-070 (Barra do Garças) - Ent. MT - 336 (Araguaiana), subtrecho Ent. BR-070/158 (Barra do Garças) - Ent. MT-336 (Araguaiana, lote 03, nos municípios de Barra do garças e Araguaiana-MT, com extensão de 51,80 km.

Objeto do Termo: Prorrogação do contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III itens: 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços - 180 (cento e oitenta) dias - 3.5 - Vigência - 180 (cento e oitenta) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Republica-se por publicação anterior incorreta

Extrato do Termo Aditivo nº 140/2013/01/01 - SINFRA

Processo nº 148270/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação na Rodovia MT - 336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste - Entº MT - 130, numa extensão de 51,05 KM.

Objeto do Termo: Prorrogação do contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III- 3.5 - Vigência - 363 (trezentos e sessenta e três) dias e 3.4- Para a Conclusão dos Serviços - 360 (trezentos e sessenta) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA.

Republica-se, por publicação anterior incorreta

Extrato do Termo Aditivo nº 170/2013/01/02 - SINFRA

Processo nº 41733/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-235, Trecho: Nova Mutum - Santa Rita do Trivelato, Sub-Trecho: Acesso Projeto Ranchão - Entrº MT - 485, Com Extensão de 38,82 KM, Nos Municípios de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato - MT.

Objeto do Termo: 3.4 - Para a Adicionar ao Contrato firmado entre as partes em 12/07/2013 nos termos do Título III - Prazo, itens 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços 360 (trezentos e Sessenta) dias e 3.5 - Da Vigência - 366 (trezentos e oitenta e seis) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Republica-se por ter sido publicado incorretamente.

Extrato do Termo Aditivo nº 172/2013/01/03 - SINFRA

Processo nº 80288/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação na Rodovia MT-423, trecho: União do Sul - Cláudia, subtrecho Rio Tartaruga - Cláudia, numa extensão de 23,462 km, lote 02, nos municípios de União do Sul - Cláudia/MT
