

Processo de Pagamento

20^a, 21^a e 24^a medições

42



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ES

Protocolo n.: 649868/2015 Data: 09/12/2015 09:41

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: 20 MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO IC 140/2013, REFEREN
TE OS SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA E DOCUMENTOS EM A

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



IC 140-13

15.000.194-9 151

sem liquidar

ex 300

28/04/16



MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

Ao Ilmo Sr.


Eng.º José Carlos Ferreira da Silva

M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

Nesta

Assunto: 20ª (Vigésima) Medição Provisória

Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU



Venho, pelo presente encaminhar a 20ª (Vigésima) Medição Provisória de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/11/2015 a 30/11/2015, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato

20ª (Vigésima) Medição Provisória

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Atenciosamente

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
Sub-Trecho:
Referência: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Ordem de Paralisação: 01/12/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 29/04/2015


DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
Extensão: 51,05 KM
Firma: Construtora Tripolo LTDA
Instrumento Contratual: 140/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 45226/2013-SETPU
Data da Assinatura: 09/07/2013
Data da Publicação: 09/07/2013
Naturaza dos Serviços: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Término Previsto: 29/12/2015
Ordem de Início de Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Prazo Decorrido do Contrato: 872 Dias
Valor Contratual (PI): R\$ 38.017.467,91
Valor Termo Aditivo: R\$ 9.189.220,88
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 47.206.688,79
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 31.339.811,81
Saldo Contratual (PI) : R\$ 15.866.876,98
Valor Empenhado no Exercício:

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

Atenciosamente


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN




ATESTADO

Atesto que a 20ª (vigésima) Medição Provisória dos serviços de Implantação Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT – 336, Trecho: FIM DO TRECHO PAV. – Divisa Santo Antonio do Leste, PVA – Entrº - MT – 130, com extensão de 51,05 km – objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00- SETPU, referente ao período 01/11/2015 a 30/11/2015, foi analisada segundo Parâmetros Técnicos, não apresentando inconformidades.

Cuiabá, 25 de janeiro 2016

Atenciosamente,


Engº Jose Carlos Ferreira da Silva
Secretário de Obras.





BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA FISCALIZAÇÃO: Rodovia: MT - 336 Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTRº MT-130 Extensão: 51,05 Km	Firma: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA Contrato: 140/2013/00/00 - SETPU Data Assinatura: 09/07/2013 Data de Aprovação: 09/07/2013 Ordem de Serviço : 12/07/2013-087/2013 Prazo: 540 (Quinhentos e Quarenta) dias Obra: Pavimentação Asfáltica de Rodovia Termo Aditivo: Data de Publicação:
Desempenho relativo aos serviços da Pavimentação Asfáltica Serviços Executados entre: 01/11/2015 a 30/11/2015	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,9				
2) Pessoal	0,9				
3) Instalações	0,8				
4) Cronograma Físico	0,9				
5) Qualidade dos Serviços	0,9				
6) Atend. À Fiscalização	0,9				
7) Administração da Obra	0,9				
Local e Data: Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.	Eng. José Teodoro Neto - Fiscal SETPU- 505/2013 RNP- 120776286-5				

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transportes

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	
1) Equipamento	0,9	1,50	1,35	DESEMP. PARCIAL = $\frac{(NxP)}{10}$ 8,85 = 0,89 Conceito: Excelente
2) Pessoal	0,9	1,50	1,35	
3) Instalações	0,9	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,9	2,00	1,7	
5) Qualidade dos Serviços	0,9	3,00	2,7	
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,85	
7) Administração da Obra	0,9	0,50	0,45	
TOTAL	6,2	10,00	8,85	
OBSERVAÇÕES:				
LOCAL E DATA Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.	_____ Coordenador de Obras de Transportes			

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

_____ Superintendente de Obras de Transportes
--




DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT - 336

Trecho: Fim do trecho pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTR° MT-130

Sub-Trecho:

Extensão: 51,05 km

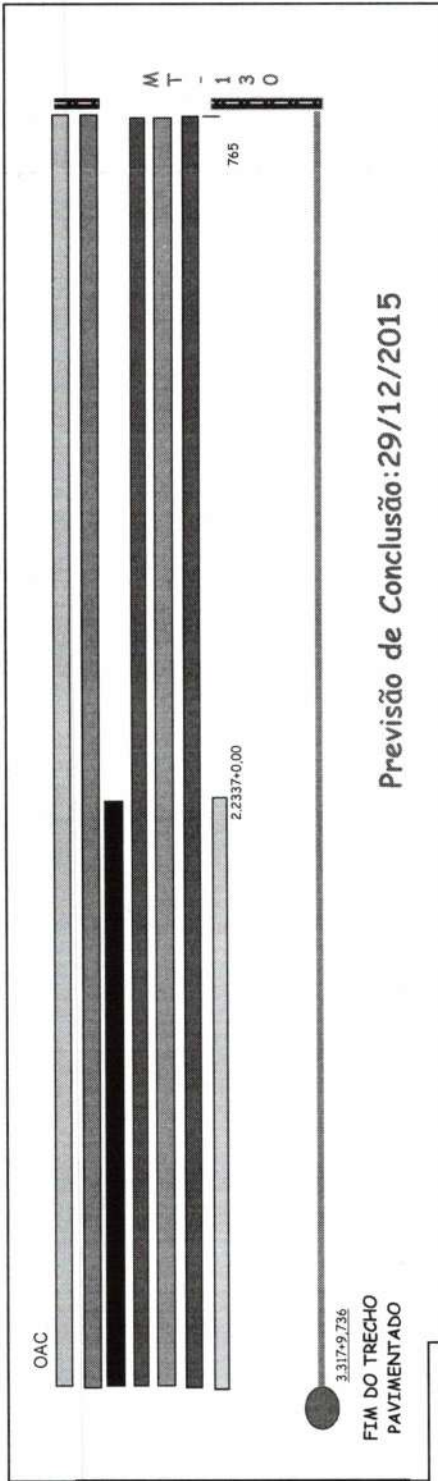

Previsão de Conclusão: 29/12/2015

FIM DO TRECHO PAVIMENTADO

ITEM	ATACADO	CONCLUÍDO	Atacado (%)	Concluído (%)
QUILOMETRAGEM	51.05	2.2337	100,00	100,00
ESTAQUEAMENTO	51.05	2.2337	100,00	100,00
TERRAPLENAGEM	51.05	2.2337	100,00	100,00
SUB-BASE	51.05	2.2337	100,00	100,00
BASE	51.05	2.2337	100,00	100,00
IMPRIMAÇÃO	51.05	2.2337	41,00	41,00
REVESTIMENTO - (CBUQ)	51.05	2.2337	41,00	41,00
OBRAS DE ARTES CORRENTE	51.05	2.2337	100,00	100,00
DRENAGEM	51.05	2.2337	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARES	51.05	2.2337	57,52	46,80
SINALIZAÇÃO	51.05	2.2337	0,00	0,00

S. Teodoro
Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 140/2013/00/00	RODOVIA MT-336	Nº DO PROCESSO	FIRMA:		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL 47.206.688,79	
			Construtora Tripolo LTDA		38.017.467,91		9.189.220,88			
			TRECHO: Fim do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTRº MT-130	PAVIMENTAÇÃO	Engº José Teodoro Neto		FISCAL			O. I. SERVIÇO 12/07/2013
DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DIAS CORRIDOS	PERÍODO	MEDIÇÕES P. I	PERÍODO	MEDIÇÕES REAJUST.	TOTAL MEDIÇÃO	TOTAL GERAL	TOTAL SALDO P. INICIAIS	
REFERENCIA	01/11/2015 a 30/11/2015	900	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
1ª medição	12/07/13 à 31/07/13	20	1.994.507,70	1.994.507,70	-	-	1.994.507,70	1.994.507,70	1.994.507,70	45.212.181,09
2ª medição	01/08/13 à 31/08/13	31	2.249.916,62	4.244.424,32	-	-	2.249.916,62	4.244.424,32	4.244.424,32	42.962.264,47
3ª medição	01/09/13 à 30/09/13	30	2.710.835,28	6.955.259,60	-	-	2.710.835,28	6.955.259,60	6.955.259,60	40.251.429,19
4ª medição	01/10/13 à 31/10/13	31	1.711.665,11	8.666.924,71	-	-	1.711.665,11	8.666.924,71	8.666.924,71	38.539.764,08
5ª medição	01/11/13 à 30/11/13	30	1.884.584,53	10.551.509,24	-	-	1.884.584,53	10.551.509,24	10.551.509,24	36.655.179,55
6ª medição	01/12/13 à 31/12/13	31	3.517.421,51	14.068.930,75	-	-	3.517.421,51	14.068.930,75	14.068.930,75	33.137.758,04
7ª medição	01/01/14 à 31/01/14	31	3.724.065,49	17.792.996,24	-	-	3.724.065,49	17.792.996,24	17.792.996,24	29.413.692,55
8ª medição	01/02/14 à 28/02/14	28	1.258.983,43	19.051.979,67	-	-	1.258.983,43	19.051.979,67	19.051.979,67	28.154.709,12
9ª medição	01/03/14 à 31/03/14	31	923.152,96	19.975.132,63	-	-	923.152,96	19.975.132,63	19.975.132,63	27.231.556,16
10ª medição	01/04/14 à 30/04/14	30	725.878,83	20.701.011,46	-	-	725.878,83	20.701.011,46	20.701.011,46	26.505.677,33
11ª medição	01/05/14 à 31/05/14	31	581.707,87	21.282.719,33	-	-	581.707,87	21.282.719,33	21.282.719,33	25.923.969,46
12ª medição	01/06/14 à 30/06/14	30	3.028.908,53	24.311.627,86	-	-	3.028.908,53	24.311.627,86	24.311.627,86	22.895.060,93
13ª medição	01/07/14 à 31/07/14	31	4.068.597,85	28.380.225,71	-	-	4.068.597,85	28.380.225,71	28.380.225,71	18.826.463,08
14ª medição	29/04/15 à 31/05/15	33	-	28.380.225,71	-	-	-	28.380.225,71	28.380.225,71	18.826.463,08
15ª medição	01/06/15 à 30/06/15	30	-	28.380.225,71	-	-	-	28.380.225,71	28.380.225,71	18.826.463,08
16ª medição	01/07/15 à 31/07/15	31	-	28.380.225,71	-	-	-	28.380.225,71	28.380.225,71	18.826.463,08
17ª medição	01/08/15 à 30/08/15	30	2.385.647,67	30.765.873,38	-	-	2.385.647,67	30.765.873,38	30.765.873,38	16.440.815,41
18ª medição	01/09/15 à 30/09/15	30	-	30.765.873,38	-	-	-	30.765.873,38	30.765.873,38	16.440.815,41
19ª medição	01/10/15 à 31/10/15	31	-	30.765.873,38	-	-	-	30.765.873,38	30.765.873,38	16.440.815,41
20ª medição	01/11/15 à 30/11/15	30	860.397,06	31.626.270,44	-	-	860.397,06	31.626.270,44	31.626.270,44	15.580.418,35
Prazo decorridos e saldo		872								
Local e data:										

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Valor Contratual R\$:** 38.017.467,91
Rodovia: MT- 336 **Valor Aditivo R\$:** 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130 **Valor Contratual + Aditivo R\$:** 47.206.688,79
Extensão: 51,05 KM **Firma:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

MÊS/ANO	12/07/2013 a 31/07/2013		01/08/2013 a 31/08/2013		01/09/2013 a 30/09/2013		01/10/2013 a 31/10/2013		01/11/2013 a 30/11/2013			
	20 / 20	31 / 51	30 / 81	31 / 112	30 / 142	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
TÉRMINO: 29/12/2015	DIAS CORRIDOS											
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	85,73%	581.068,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	8,87%	283.369,85	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM	12,62%	1.130.069,58	23,21%	2.078.800,63	9,37%	839.531,21	14,01%	1.255.032,85	0,07%	6.510,00	0,07%	6.510,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	1,51%	204.845,76	0,00%	-	0,60%	80.740,80	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	15,83%	1.353.834,83	0,00%	-	4,25%	363.422,86	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	17,41%	141.507,50	35,13%	285.516,28	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	63,39%	75.206,01	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	41,83%	1.187.588,88	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,23%		4,77%		5,74%		3,63%		3,99%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	4,23%		8,99%		14,73%		18,36%		22,35%			
FATURAMENTO SIMPLES	1ª	1.994.507,69	2ª	2.249.916,61	3ª	2.710.835,28	4ª	1.711.665,11	5ª	1.884.584,53		
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	1.994.507,69	MED	4.244.424,30	MED	6.955.259,58	MED	8.666.924,69	MED	10.551.509,22		

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU** Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
 Rodovia: MT - 336 Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130 Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79
 Extensão: 51,05 KM **Firma: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

INÍCIO: 04/11/2013	MÊS/ANO	01/12/2013 a 31/12/2013		01/01/2014 a 31/01/2014		01/02/2014 a 28/02/2014		01/03/2014 a 31/03/2014		01/04/2014 a 30/04/2014	
		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
	TÉRMINO: 29/12/2015	31 / 173		31 / 204		28 / 232		31 / 263		30 / 293	
	DIAS CORRIDOS										
	SERVIÇO										
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	5,36%	171.115,97	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
	TERRAPLENAGEM	-1,74%	-	29,41%	2.633.650,60	12,15%	1.087.867,45	0,00%	-	0,00%	-
	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	4,28%	580.410,72	3,98%	540.412,70	0,00%	-	0,28%	38.102,40	0,59%	80.132,20
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	34,16%	2.921.325,26	0,16%	13.403,68	0,00%	-	8,35%	713.934,58	5,55%	474.630,65
	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	43,13%	350.566,53	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,53%	14.916,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	7,45%		7,89%		2,67%		1,96%		1,54%	
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	29,80%		37,69%		40,36%		42,31%		43,85%	
	FATURAMENTO SIMPLES	6ª	3.517.421,51	7ª	3.724.065,49	8ª	1.258.983,43	9ª	923.152,96	10ª	725.878,83
	FATURAMENTO ACUMULADO	MED	14.068.930,73	MED	17.792.996,22	MED	19.051.979,65	MED	19.975.132,61	MED	20.701.011,44

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº JOSÉ TEODORO NETO
 CREA RNP-120776286-5
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Valor Contratual R\$:** 38.017.467,91
Rodovia: MT - 336 **Valor Aditivo R\$:** 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTRª MT-130 **Valor Contratual + Aditivo R\$:** 47.206.688,79
Extensão 51,05 KM **Firma:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

INÍCIO: 04/11/2013	MÊS/ANO	01/05/2014 a 31/05/2014		01/06/2014 a 30/06/2014		01/07/2014 a 31/07/2014		01/12/2014 a 29/04/2015		29/04/2015 a 31/05/2015	
		31 / 324	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
TÉRMINO: 29/12/2015	DIAS CORRIDOS	31 / 324		30 / 354		31 / 385		150 / 535		33 / 568	
	SERVIÇO										
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	0,00%	-	0,00%	-
	TERRAPLENAGEM	0,00%	-	-6,79%	- 607.967,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,56%	76.326,91	3,12%	422.793,01	17,81%	2.414.802,94	0,00%	-	0,00%	-
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	20,93%	1.346.913,96	0,00%	-	0,00%	-
	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	4,25%	363.162,21	19,69%	1.683.298,87	1,59%	135.764,97	0,00%	-	0,00%	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	OBRAS DE ARTE CORRENTE	-3,56%	- 28.897,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	47,89%	1.359.668,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-

OBRA PARALIZADA

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	1,23%	6,47%	8,62%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	45,08%	51,50%	60,12%	60,12%	60,12%
FATURAMENTO SIMPLES	11ª	581.707,87	3.028.908,53	4.068.597,85	-
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	21.282.719,31	24.311.627,84	28.380.225,69	28.380.225,69

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº JOSE TEODORO NETO
 CREA RNP-120776286-5
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Valor Contratual R\$:** 38.017.467,91
Rodovia: MT - 336 **Valor Aditivo R\$:** 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTRªMT-130 **Valor Contratual + Aditivo R\$:** 47.206.688,79
Extensão: 51,05 KM **Firma:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

MÊS/ANO	01/06/2015 a 30/06/2015		01/07/2015 a 31/07/2015		01/08/2015 a 31/08/2015		01/09/2015 a 30/09/2015		01/10/2015 a 31/10/2015		
	30 / 598	31 / 629	31 / 660	30 / 690	31 / 721	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
DIAS CORRIDOS											
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	11,29%	1.531.446,72	0,00%	-	0,00%	-	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	13,27%	854.200,95	0,00%	-	0,00%	-	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	0,00%		0,00%		5,05%		0,00%		0,00%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	60,12%		65,17%		65,17%		65,17%		65,17%		
FATURAMENTO SIMPLES	15ª		16ª		17ª		18ª		19ª		
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	28.380.225,69	MED	28.380.225,69	MED	2.385.647,67	MED	30.765.873,36	MED	30.765.873,36	30.765.873,36

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS


Engº JOSÉ TEODORO NETO
 CREA RNP-120776286-5
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica
 Rodovia: MT - 336
 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRªMT-130
 Extensão: 51,05 KM

CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU

Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
 Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

Firma: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

MÊS/ANO	01/11/2015 a 30/11/2015		01/12/2015 a 29/12/2015		VALOR R\$
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
TÉRMINO: 29/12/2015		30 / 751		29 / 780	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	14,27%	96.709,91	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	26,85%	857.855,29	
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	7,67%	687.293,67	
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,54%	208.872,96	54,44%	7.383.069,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	7,04%	453.097,90	58,75%	3.780.744,04	
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	6,18%	528.230,86	
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	100,00%	1.463.126,77	
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	7,88%	64.083,00	
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	36,61%	43.437,14	
SINALIZAÇÃO	33,22%	198.426,20	66,78%	398.894,50	
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	9,76%	276.974,19	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	1,82%		33,00%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	67,00%		100,00%		
FATURAMENTO SIMPLES	20ª	860.397,06		15.580.418,37	
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	31.626.270,42		47.206.688,79	

Engº JOSE TEODORO NETO
 CREA RNP-120776286-5
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIFRA

CRONOGRAMA FISICO

SINIFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT-336
Programa:
Trecho: Fim do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Oeste/ Primavera do Leste-ENTR° MT-130
Início : 12/07/2013
Prazo: 780 (Setecentos e oitenta) dias
Termo previsto: 12/01/2015
Dias decorridos: 872 DIAS
Extensão : 51,05 km
Referência: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Período Med. Simples: 01/11/2015 a 30/11/2015

Edital: Concorrência Pública 023/2009
Processo: 45226/2013
Contrato: 140/2013/00/00-SETPU
Data Assinatura: 09/07/2013
Data publicação: 09/07/2013
Preço do contrato: 38.017.467,91
Termo(s) Aditivo(s):
Data de Publicação
Vr. Termo aditivo a PI: 9.189.220,88
PI atual do contrato: 47.206.688,79
Firma Executora: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA
Período Acum: 12/07/2013 a 30/11/2015

Nesta a PI: R\$ 860.397,06
Acumulada a PI: R\$ 31.626.270,44
Reajuste nesta: R\$ -
Reajuste acumulado: R\$ -
Total PI + Reaj: R\$ 31.626.270,44
Saldo contrato a PI: R\$ 15.580.418,35
Empenhado até esta data: R\$ 15.580.418,35
Saldo de prazo(Dias): 28
Preço inicial do contrato: R\$ 38.017.467,91
Termo de Re-Ratificação: 140/2013/03/01-SETPU

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA

SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM		VALOR A PI + REAJUSTAMENTO	
	NESTA MEDIÇÃO	EXECUTADO	MEDIÇÕES	VALOR A PI + REAJUSTAMENTO
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	85,73%	1ª	R\$ 1.994.507,70
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ -	73,15%	2ª	R\$ 2.249.916,62
TERRAPLENAGEM	R\$ -	99,98%	3ª	R\$ 2.710.835,28
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 208.872,96	45,56%	4ª	R\$ 1.711.665,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 453.097,90	41,25%	5ª	R\$ 1.884.584,53
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	93,82%	6ª	R\$ 3.517.421,51
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	R\$ -	0,00%	7ª	R\$ 3.724.065,49
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ -	92,27%	8ª	R\$ 1.258.983,43
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 198.426,20	63,39%	9ª	R\$ 923.152,96
SINALIZAÇÃO	R\$ -	33,22%	10ª	R\$ 725.878,83
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ -	90,24%	11ª	R\$ 581.707,87
			12ª	R\$ 3.028.908,53
			13ª	R\$ 4.068.597,85
			14ª	R\$ -
			15ª	R\$ -
			16ª	R\$ -
			17ª	R\$ 2.385.647,67
			18ª	R\$ -
			19ª	R\$ -
			20ª	R\$ 860.397,06
			TOTAL	R\$ 31.626.270,44

Local e data: Curitiba, 03 de dezembro de 2015.
Comissão de Fiscalização

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
RNP-120776286-5





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Nº Contrato 140/2013/00/00-SETPU Data Assinatura 09/07/2013 Publicação 09/07/2013 Processo Orig. 45226/2013-SETPU Termo Aditivo N: - Termo Re-Ratificação 140/2013/03/01-SETPU Período Acum.: 12/07/2013 a 30/11/2015 FIRMAR: Construtora Tripelo LTDA									
1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO									
2.5.00.000.10	Instalação de Camisero e Acampamento	q	1,000	-	1,000	1,000	484.358,35	484.358,35	100,00%
2.5.00.000.20	Mobilização e Desmobilização de Pescoço	q	1,000	-	0,500	0,500	15.980,96	7.990,48	50,00%
2.5.00.000.22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	q	1,000	-	1,000	1,000	22.147,75	22.147,75	100,00%
2.5.00.000.24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,67	66.571,67	100,00%
	Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,68	66.571,68	100,00%
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES						581.068,25		85,73%
1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO									
2.5.00.001.01	Administração local de Obra - Despesas Fixas	q	1,00	-	1,000	1,000	105.799,86	105.799,86	100,00%
2.5.00.001.02	Administração local de Obra - Despesas Variáveis	mês	18,00	-	13,000	13,000	5.488,17	70.826,21	72,22%
	Materiais e Serviços de Consumo	mês	18,00	-	13,000	13,000	19.829,98	257.789,74	72,22%
	Alimentação Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	19.721,08	256.374,04	72,22%
	Aluguel de Veículo para Deslocamento Local do Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	7.852,65	102.084,45	72,22%
	Locação de Equipamentos para Controle Tecnológico	mês	18,00	-	13,000	13,000	4.101,13	53.314,69	72,22%
	Desaparelho para Dabanda do Pescoço	mês	18,00	-	13,000	13,000	104.267,12	1.355.472,56	72,22%
2.5.00.001.03	Administração local de Obra - Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	9.895,85	128.646,05	72,22%
	Administração e Gestão Ambiental	m²	25,00	-	25,000	25,000	258,16	6.454,00	100,00%
74209/001	Plata de Obra	und	1,000	-	-	-	2.275,39	-	0,00%
2.5.00.000.30	Muro de Concreto de Identificação da Obra						2.336.761,60		73,15%
2.0 TERRAPLENAGEM									
2.5.01.000.00	Desm. Dest. Limpeza, áreas com árvores diâmetro até 0,15 M	m²	1.123.042,500	-	1.123.042,500	1.123.042,500	0,31	348.143,17	100,00%
2.5.01.010.00	Deslocamento de árvores diâmetro 0,15 m a 0,30 m	und	50,000	-	-	-	30,51	-	0,00%
2.5.01.100.01	Esc. Carga e Transp. Mat. de 1ª Cat. DMT até 50 M	m³	48.126,418	-	48.126,318	48.126,318	1,58	76.031,59	100,00%
2.5.01.100.23	Esc. Carga e Transp. Mat. de 1ª Cat. DMT de 200 a 400 M c/e	m³	509.156,235	-	509.155,292	509.155,292	6,29	3.202.586,78	100,00%
2.5.01.100.24	Esc. Carga e Transp. Mat. de 1ª Cat. DMT de 400 a 600 M c/e	m³	275.875,198	-	275.874,205	275.874,205	6,99	1.928.360,69	100,00%
2.5.01.100.25	Esc. Carga e Transp. Mat. de 1ª Cat. DMT de 600 a 800 M c. esc.	m³	23.567,294	-	23.567,294	23.567,294	7,39	174.162,30	100,00%
2.5.01.100.26	Esc. Carga e Transp. Mat. de 1ª Cat. DMT de 800 a 1000 M c. esc.	m³	19.672,287	-	19.672,299	19.672,299	7,83	153.838,41	99,87%
2.5.01.100.27	Esc. Carga e Transp. Mat. de 1ª Cat. DMT de 1000 a 1200 M c. Carregadeira	m³	7.419,850	-	7.419,850	7.419,850	18,14	134.596,07	100,00%
2.5.01.300.03	Esc. Carga Transp. Solos moles DMT 400 a 600 M	m³	291.650,703	-	291.650,785	291.650,785	2,36	688.295,85	100,00%
2.5.01.310.00	Compactação de Aterros a 95,00 % de Proctor Normal	m³	592.139,278	-	592.139,472	592.139,472	2,36	1.397.449,15	100,00%
s/ código	Compactação de Aterros a 100,00 % de Proctor Intermediário							8.268.064,01	99,98%
SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM									
Eng. José Teodoro Neto Fiscal SETPU-Port. 505/2013 RNP-120776286-5									





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obras:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		Nº Contrato		140/2013/00/005-SETPU		Prazo de Execução		780	
Rodovia:		MT, 316		Data Assinatura		09/07/2013		Prazo Resizante		28	
Trecho:		FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SAMITO ANTÔNIO DO LESTE / PMA-ENTR-MT-130		Publicação		09/07/2013		Vr. Contratual PI		R\$ 47.206.688,79	
Extensão:		51,05 KM		Processo Orig		452/26/2013-SETPU		Vr. Acum Medido PI		R\$ 31.626.270,44	
Referencial:		20º (Vigésima) Medição Provisória		Termo Aditivo N:				Vr. Acum. Programado PI			
Ordem Início Serviço:		12/07/2013 - 08/7/2013		Termo Re-Ratificação		140/2013/03/001-SETPU		Vr. Programado Prox. mês PI			
Período Med. Simples:		01/11/2015 a 30/11/2015		Período Acum.:		12/07/2013 a 30/11/2015		FIRMA:		Construtora Trípolo LTDA	
COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE		
3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
2.5.02.110.00	Regularização do Sub Leito	m²	655.788,930	-	655.788,930	655.788,930	0,72	472.166,02	100,00%		
2.5.02.200.00	Sub- Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	128.019,534	49.796,400	128.019,512	78.229,112	12,12	948.136,83	61,11%		
2.5.02.200.01	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	121.743,030	8.564,400	41.605,200	50.189,600	12,12	608.055,55	41,21%		
2.5.02.300.00	Imprimação (execução)	m²	519.798,020	36.600,000	177.800,000	214.400,000	0,26	55.744,00	41,25%		
2.5.02.400.00	Pinura de Ligação (execução)	m²	519.798,020	36.600,000	177.800,000	214.400,000	0,17	36.448,00	41,25%		
2.5.02.540.51	Conc. Betuminoso usado a quente - capa rolamento AC/BC	t	62.375,762	4.392,000	21.336,000	25.728,000	157,74	4.058.334,72	41,25%		
SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								6.178.887,12	45,56%		
4.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO											
2.5.02.999.01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	263,520	1.280,160	1.543,680	1.310,31	2.022.699,34	41,25%		
2.5.02.999.03	Fornecimento de Aditivo Diluído CM-30	t	623,758	43,920	213,360	257,280	2.048,06	526.924,87	41,25%		
2.5.02.999.04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	207,919	14,640	71,120	85,760	1.219,55	104.588,60	41,25%		
SUB-TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								2.654.212,81	41,25%		
5.0 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO											
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De sub-base	bkm	6.137.127,880	-	6.120.769,279	6.120.769,279	0,66	4.039.707,72	99,73%		
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De base	bkm	5.836.181,152	-	5.829.250,330	5.829.250,330	0,66	3.847.305,21	99,88%		
2.5.09.009.01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	263,520	783,360	783,360	141,80	111.089,44	20,93%		
2.5.09.009.03	Transporte de Aditivo Diluído CM 30	t	623,758	43,920	130,560	130,560	141,80	18.513,40	20,93%		
2.5.09.009.04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR 1C	t	207,919	14,640	43,520	43,520	141,80	6.174,13	20,93%		
SUB-TOTAL DE TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO								8.022.777,90	93,82%		
6.0 DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA											
2.5.04.900.52	Sarjeta triangular de concreto - S1C 02 - AC/BC	m	490,000	-	-	-	42,59	-	0,00%		
2.5.04.900.71	Sarjeta cantoneira de concreto - SCC 01 - AC/BC	m	442,000	-	-	-	35,55	-	0,00%		
2.5.04.910.51	Melo fio de concreto - MFC 01 - AC/BC - tipo B - (1/sarjeta de 50,0 cm)	m	1.517,000	-	-	-	66,15	-	0,00%		
2.5.04.910.53	Melo fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	20.590,000	-	-	-	32,09	-	0,00%		
2.5.04.910.55	Melo fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	993,000	-	-	-	32,24	-	0,00%		
2.5.04.940.52	Decúcia d'água tipo rígido - canal retang. - DAR 02 - AC/BC	m	671,250	-	-	-	87,88	-	0,00%		
2.5.04.942.51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	unid.	402,000	-	-	-	46,60	-	0,00%		
2.5.04.942.52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	unid.	13,000	-	-	-	55,69	-	0,00%		
2.5.04.950.62	Dispositivo de energia - DES 02 - AC/PC	unid.	2,000	-	-	-	289,78	-	0,00%		
2.5.04.950.61	Dispositivo de energia - DES 01 - AC/BC/PC	unid.	408,000	-	-	-	281,04	-	0,00%		
2.5.09.001.91	Transporte comercial C/basc. 10m3 em rodov. Não pav. - AC/BC/PC	bkm	128.506,619	-	-	-	0,52	-	0,00%		
2.5.09.002.91	Transporte comercial C/basc. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	bkm	1.109.571,877	-	-	-	0,33	-	0,00%		
SUB-TOTAL DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA								-	0,00%		
7.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE											
2.5.04.001.00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³	811,612	-	811,418	811,418	5,950	4.827,93	99,98%		
2.5.04.040.01	Relevo e compactação	m³	600,221	-	600,220	600,220	31,970	19.189,03	100,00%		
2.5.04.100.51	Corpo BSTC D=0,60m - CA-4, inclusive beiró e dentes - AC/BC/PC	m	13,000	-	-	-	439,020	-	0,00%		
2.5.04.100.52	Corpo BSTC D=0,80m - CA-4, inclusive beiró e dentes - AC/BC/PC	m	44,000	-	-	-	619,140	-	0,00%		
2.5.04.100.53	Corpo BSTC D=1,00m - CA-4, inclusive beiró e dentes - AC/BC/PC	m	128,000	-	128,000	128,000	869,760	111.329,28	100,00%		
2.5.04.100.54	Corpo BSTC D=1,20m - CA-4, inclusive beiró e dentes - AC/BC/PC	m	15,000	-	15,000	15,000	1.165,630	17.484,45	100,00%		
2.5.04.101.52	Boca BSTC D=0,80m normal - AC/BC/PC	unid.	4,000	-	-	-	1.599,150	-	0,00%		
2.5.04.101.53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	unid.	14,000	-	14,000	14,000	2.429,570	34.013,98	100,00%		
2.5.04.101.54	Boca BSTC D=1,20m normal - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	3.498,700	6.917,40	100,00%		

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

15



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Cód. SINFRA 780
Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Projeto: MTC-336
Tronco: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTR/MT-130
Extensão: 51,05 KM
Referência: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Ordem Início Serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013
Período Med. Simples: 01/11/2015 a 30/11/2015
Período Acum.: 12/07/2013 a 30/11/2015
Termo Re-Ratificação: 140/2013/03/01-SETPU
Processo Orig.: 45286/2013-SETPU
Data Assinatura Publicação: 09/07/2013
Nº Contrato: 140/2013/00/00-SETPU
Prazo de Execução Restante: 28
Vr. Contratual PI: R\$ 47.206.688,79
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 31.626.270,44
Vr. Acum. Programado PI:
Vr. Programado Próxim. PI:
FIRMA: Construtora Tripello LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
2.5 04 101 56	Boca BSTD D=0,60m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.029,850	-	0,00%
2.5 04 101 58	Boca BSTD D=1,00 m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	2.546,520	5.093,04	100,00%
2.5 04 101 62	Boca BSTD D=0,80 m - esc.=30 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.870,750	-	0,00%
2.5 04 110 53	Corpo B01C D=1,50m - CA-4, inclusive beirto e dentes - 1,000 AC/BC/PC	m	68,000	-	65,000	65,000	3.564,150	231.669,75	95,59%
2.5 04 111 53	Boca B01C D=1,50m normal - AC/BC/PC	unid.	8,000	-	8,000	8,000	8.288,870	66.310,96	100,00%
2.5 04 210 57	Corpo B0CC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	m	20,000	-	20,000	20,000	5.711,120	114.222,40	100,00%
2.5 04 211 53	Boca B0CC 2,50 x 2,50 m normal - AC/BC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	27.876,780	55.757,56	100,00%
2.5 04 230 51	Caixa coleira de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.732,600	-	0,00%
2.5 04 230 52	Caixa coleira de sarjeta - CCS 02 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.696,160	-	0,00%
2.5 04 230 53	Caixa coleira de sarjeta - CCS 03 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	187,460	-	0,00%
2.5 04 291 51	Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	unid.	2,000	-	-	-	22.177,730	-	0,00%
2.5 09 001 91	Transporte comercial C/ base. 10m3 rodov. não pav.	takm	23.373,977	-	22.177,730	22.177,730	0,520	11.532,41	94,88%
2.5 09 002 91	Transporte comercial C/ base. 10m3 rodov. Pavimentada	takm	211.139,460	-	194.984,300	194.984,300	0,330	64.344,81	92,35%
5.5 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	79,000	-	79,000	79,000	75,950	6.000,05	100,00%
SUB-TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTE									91,27%
8.0 OBRAS COMPLEMENTARES									
2.5 06 410 00	Cerca de Arame Fagado com Suporte de Madeira	m	3.441,400	-	3.451,400	3.451,400	21,79	75.206,00	100,39%
4.5 06 010 01	Defensa Semi-Hallowel Simples (lombamento e implantação)	m	128,000	-	-	-	219,80	-	0,00%
4.5 06 010 02	Arcoçelagem de defesa semi-mobavel simples (bom/limp)	m	64,000	-	-	-	242,51	-	0,00%
SUB-TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES									61,39%
9.0 SINALIZAÇÃO									
2.5 06 100 21	Pintura fria - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	20.694,950	7.166,100	-	7.166,100	14,56	104.338,42	34,63%
4.5 06 100 22	Pintura seix e zaborado - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	174,920	-	-	-	20,62	-	0,00%
4.5 06 121 01	Form. E colocação de lacha reflet. Bidimensional	unid.	16.047,000	6.406,000	-	6.406,000	13,30	85.199,80	39,92%
4.5 06 121 11	Formec. E colocação de lachão refletivo bidimensional	unid.	305,000	-	-	-	39,82	-	0,00%
4.5 06 200 02	Formec. E Implantação placa Sinalizatória Totalmente refletiva	m²	179,860	23,922	-	23,922	371,54	8.887,98	13,30%
SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO									31,22%
10.0 CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
2.5 05 100 00	Enlaxamento	m²	10.036,370	-	10.036,370	10.036,370	7,72	77.480,77	100,00%
2.5 05 102 00	Hydrosemeadura	m²	1.287.186,577	-	1.128.915,610	1.128.915,610	1,75	1.975.602,31	87,70%
3.5 01 930 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (passadas e emprensimo)	m²	826.086,370	-	826.086,370	826.086,370	0,22	181.739,00	100,00%
Sinap# 73967/003	Planto de árvores e arbustos	unid.	11.402,000	-	11.402,000	11.402,000	28,71	327.351,42	100,00%
SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									90,24%
TOTAL GERAL							31.626.270,44	67,99%	
A DEDUZIR MEDIÇÕES ANTERIORES							30.765.873,38	1,85%	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO							860.397,06		

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.
Fiscalização:

Importa o valor a ser pago de R\$

860.397,06

OITOCENTOS E SSESSENTA MIL, TREZENTOS NOVENTA E SEIS CENTAVOS





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE VOLUME DE SUB-BASE E TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO
17
P

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 Rodovia: MT- 336
 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
 Referência : 20ª (Vigésima) Medição Provisória
 Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013
 Período acumulado: 12/07/2013 a 30/11/2015
 Firma: Construtora Tripolo LTDA
 Período Simples: 01/11/2015 a 30/11/2015
 IC 140/2013/00/00-SETPU

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA FIXA (Km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARG. MÉDIA (m)	ESP. (m)	FATOR EMPOL. (m³/m³)	VOLUME (m³)	DMT (Km)	MOMENTO TRANSPORTE (tonxkm)			
	INICIAL	FRAC.		INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.										
				765	+	0,00	1777	+	0,00	20.240,00	12,30	0,20	1,84	49.790,400			
J-1	1.370	+	0,00	5,345	765	+	0,00	1777	+	0,00	20.240,00	12,30	0,20	1,84	24.009,600	10,60	970.992,464
	EXECUÇÃO DA SUB-BASE			1777	+	0,00	2265	+	0,00	9.760,00	12,30	0,20	1,84	24.009,600			
J-1	1.370	+	0,00	5,345	1777	+	0,00	2265	+	0,00	9.760,00	12,30	0,20	1,84	13.038,000	18,37	811.322,799
	EXECUÇÃO DA SUB-BASE			2265	+	0,00	2530	+	0,00	5.300,00	12,30	0,20	1,84	13.038,000			
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2265	+	0,00	2530	+	0,00	5.300,00	12,30	0,20	1,84	2.447,700	45,95	1.102.336,824
	EXECUÇÃO DA SUB-BASE			2530	+	0,00	2579	+	15,00	995,00	12,30	0,20	1,84	2.447,700			
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2530	+	0,00	2579	+	15,00	995,00	12,30	0,20	1,84	3.849,900	49,09	221.089,971
	EXECUÇÃO DA SUB-BASE			2581	+	15,00	2660	+	0,00	1.565,00	12,30	0,20	1,84	3.849,900			
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2581	+	15,00	2660	+	0,00	1.565,00	12,30	0,20	1,84	19.188,000	50,41	357.095,164
	EXECUÇÃO DA SUB-BASE			2660	+	0,00	3050	+	0,00	7.800,00	12,30	0,20	1,84	19.188,000			
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2660	+	0,00	3050	+	0,00	7.800,00	12,30	0,20	1,84	12.988,800	55,10	1.945.356,192
	EXECUÇÃO DA SUB-BASE			3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00	12,30	0,20	1,84	12.988,800			
J-5	2.433	+	0,00	9,200	3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00	12,30	0,20	1,84	2.707,112	24,18	577.887,298
	EXECUÇÃO DA SUB-BASE				INTERSEÇÃO 01				587,43	23,04	0,20	1,84	2.707,112				
5	2.433	+	0,00	9,200	INTERSEÇÃO 01				587,43					27,04	134.688,567		
TOTAL ACUMULADO											78.229,112		6.120.769,279				
A ADUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES											128.019,512		6.120.769,279				
DESTA MEDIÇÃO											(49.790,400)		-				

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.
Comissão de Fiscalização

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Referência : 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013
Período acumulado: 12/07/2013 a 30/11/2015
Firma: Construtora Tripolo LTDA

Período Simples: 01/11/2015 a 30/11/2015
IC 140/2013/00/00-SETPU

PLANILHA PARA CÁLCULO DE VOLUME DE BASE E
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA FIXA (Km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARG. MÉDIA (m)	ESP. (m)	FATOR EMPOL. (m³/m³)	VOLUME (m³)	DMT (Km)	MOMENTO TRANSPORTE (km³xton)			
	INICIAL	FRAC.		INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.										
J-1	1.370	+	0,00	5,345	765	+	0,00	2265	+	0,00	30.000,00	11,70	0,20	1,84	70.200,000	13,13	1.695.373,056
					765	+	0,00	2265	+	0,00	30.000,00						
					2265	+	0,00	3050	+	0,00	15.700,00						
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2265	+	0,00	3050	+	0,00	15.700,00	11,70	0,20	1,84	36.738,000	51,15	3.457.633,608
					3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00						
J-5	2.433	+	0,00	9,200	3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00	11,70	0,20	1,84	12.355,200	24,18	549.697,674
					interseção 01				587,43	21,649	0,20						
J-5	2.433	+	0,00	9,200	interseção 01				587,43						27,04	126.545,992	

EXECUÇÃO DA BASE

EXECUÇÃO DA BASE					2770	+	0,00	3314	+	0,00	10.880,00	11,70	0,20	1,84	25.459,200		
EXECUÇÃO DA BASE					2583	+	0,00	2770	+	0,00	3.740,00	11,70	0,20	1,84	8.751,600		
EXECUÇÃO DA BASE					2420	+	0,00	2578	+	0,00	3.160,00	11,70	0,20	1,84	7.394,400		
EXECUÇÃO DA BASE					2337	+	0,00	2420	+	0,00	1.660,00	11,70	0,20	1,84	3.884,400		
EXECUÇÃO DA BASE					2237	+	0,00	2337	+	0,00	2.000,00	11,70	0,20	1,84	4.680,000		

TOTAL ACUMULADO															50.169,600		5.829.250,330
À DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES															41.605,200		5.829.250,330
TOTAL DESTA MEDIÇÃO															8.564,400		-

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.
Comissão de Fiscalização

Engº José Teodoro Neto
Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

FOLHA Nº 01/01

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MT- 336

FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130

20ª (Vigésima) Medição Provisória

12/07/2013 - 08/7/2013

12/07/2013 a 30/11/2015

Período Simples: 01/11/2015 a 30/11/2015

Firma: **Construtora Tripolo LTDA**

PLANILHA PARA CÁLCULO
 DE ÁREA DE IMPRIMAÇÃO, FORNECIMENTO
 E TRANSPORTE DE CM-30

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	PESO DO LIGANTE (kg/m²)	PESO LIGANTE (ton)	OBSERVAÇÕES
	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	FRAC.	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.						
					2770	+	0,00	3314	+	0,00	10.880,00	1,2000	130,560	
					2583	+	0,00	2770	+	0,00	3.740,00	1,2000	44,880	
					2420	+	0,00	2578	+	0,00	3.160,00	1,2000	37,920	
					2337	+	0,00	2420	+	0,00	1.660,00	1,2000	19,920	
					2237	+	0,00	2337	+	0,00	2.000,00	1,2000	24,000	
TOTAL ACUMULADO												257,280		
Á DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES												213,360		
TOTAL ACUMULADO												43,920		

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.
 Comissão de Fiscalização

Teodoro Neto
 Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN





**GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**

FOLHA Nº 01/01

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rodovia: MT- 336

Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130

Referência : 20ª (Vigésima) Medição Provisória

Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013

Período acumulado: 12/07/2013 a 30/11/2015

Período Simples: 01/11/2015 a 30/11/2015

PLANILHA PARA CÁLCULO
DE ÁREA DE CBUQ, FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DE CAP 50/70 E RR-1C

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA FIXA (Km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA PINTURA LIGAÇÃO RR-1C	VOLUME CBUQ(m3) ESP.(5,00cm)	IC				
	INICIAL	FRAC.		INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.					PESO CBUQ (ton)	PESO(ton) CAP - 50/70	PESO(ton) 1C	RR-	
				2770	+ 0,00	3314	+ 0,00	10.880,00	10,00	108.800,00	5.440,00	13.056,00	783,36		43,52	
				2583	+ 0,00	2770	+ 0,00	3.740,00	10,00	37.400,00	1.870,00	4.488,00	269,28		14,96	
				2420	+ 0,00	2578	+ 0,00	3.160,00	10,00	31.600,00	1.580,00	3.792,00	227,52		12,64	
				2337	+ 0,00	2420	+ 0,00	1.660,00	10,00	16.600,00	830,00	1.992,00	119,52		6,64	
				2237	+ 0,00	2337	+ 0,00	2.000,00	10,00	20.000,00	1.000,00	2.400,00	144,00		8,00	
TOTAL ACUMULADO											25.728,000	1.543,680	85,760			
Á DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES											21.336,000	1.280,160	71,120			
TOTAL ACUMULADO											4.392,000	263,520	14,640			

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.
Comissão de Fiscalização

Teodoro
Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN





GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
Referencia: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Período simples: 01/11/2015 a 30/11/2015
Período acumulado: 12/07/2013 a 30/11/2015
Firma: Construtora Tripolo LTDA


PLANILHA PARA CÁLCULO DE
ÁREA DE SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL

I.C.: 140/2013/00/00-SETPU

EIXO

LOCALIZAÇÃO (EST.)					OBS.	LADO	COMP. (M)	ESPE. (M)	AREA (M²)	TIPO
INÍCIO	FINAL			PINTURA						
2410	0,00	2436	12,00		LE	532,00	0,15	79,80	contínua	
2436	12,00	2444	4,00		EX	76,00	0,15	11,40	4x4	
2444	4,00	2530	16,00		EX	433,00	0,15	64,95	4x12	
2530	16,00	2538	8,00		EX	76,00	0,15	11,40	4x4	
2538	8,00	2555	0,00		LD	332,00	0,15	49,80	contínua	
2555	0,00	2558	12,00		LD	36,00	0,15	5,40	4x4	
2538	8,00	2542	0,00		LE	36,00	0,15	5,40	4x4	
2542	0,00	2558	12,00		LE	332,00	0,15	49,80	contínua	
2558	12,00	2572	0,00		EX	134,00	0,15	20,10	4x4	
2572	0,00	2623	0,00		LD	1.020,00	0,15	153,00	contínua	
2623	0,00	2626	12,00		LD	36,00	0,15	5,40	4x4	
2572	0,00	2575	12,00		LE	36,00	0,15	5,40	4x4	
2575	12,00	2626	12,00		LE	1.020,00	0,15	153,00	contínua	
2626	12,00	2634	4,00		EX	76,00	0,15	11,40	4x4	
2634	4,00	2697	16,00		EX	318,00	0,15	47,70	4x12	
2697	16,00	2705	8,00		EX	76,00	0,15	11,40	4x4	
2705	8,00	2733	0,00		LD	552,00	0,15	82,80	contínua	
2733	0,00	2736	12,00		LD	36,00	0,15	5,40	4x4	
2705	8,00	2709	0,00		LE	36,00	0,15	5,40	4x4	
2709	0,00	2736	12,00		LE	552,00	0,15	82,80	contínua	
2736	12,00	2744	4,00		EX	76,00	0,15	11,40	4x4	
2744	4,00	2924	16,00		EX	903,00	0,15	135,45	4x12	
2924	16,00	2932	8,00		EX	76,00	0,15	11,40	4x4	
2932	8,00	2950	0,00		LD	352,00	0,15	52,80	contínua	
2950	0,00	2953	12,00		LD	36,00	0,15	5,40	4x4	
2932	8,00	2936	0,00		LE	36,00	0,15	5,40	4x4	
2936	0,00	2953	12,00		LE	352,00	0,15	52,80	contínua	
2953	12,00	2961	4,00		EX	76,00	0,15	11,40	4x4	
2961	4,00	3232	16,00		EX	1.358,00	0,15	203,70	4x12	
3232	16,00	3240	8,00		EX	76,00	0,15	11,40	4x4	
3240	8,00	3314	10,00		LD	1.482,00	0,15	222,30	contínua	
3240	8,00	3244	0,00		LE	36,00	0,15	5,40	4x4	
3244	0,00	3314	10,00		LE	1.410,00	0,15	211,50	contínua	
2420	0,00	3314	0,00		LE	17.880,00	0,15	2.682,00	contínua	
2420	0,00	3314	0,00		LD	17.880,00	0,15	2.682,00	contínua	
Acumulado total									7.166,100	
A deduzir de medições anteriores									-	
Saldo a medir									7.166,100	

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Referencia: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Período simples: 01/11/2015 a 30/11/2015
Período acumulado: 12/07/2013 a 30/11/2015
Firma: Construtora Tripolo LTDA

IC:140/2013/00/00-SETPU

PLANILHA PARA CÁLCULO
DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL


TIPO	LOCALIZAÇÃO	LADO	DIMENSÃO	ÁREA	OBS
R-7	2538+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2572+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2705+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2932+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	3240+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2436+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2558+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2626+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2736+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2953+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	3307+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.4	3277+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.6	3273+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2675+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	3175+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2760+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	3285+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-24B	3314+12	EX	Ø=1,00	0,7854	
R-28	3313+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
A-2A	2440+0	LE	L=1,00	1	
A-2A	2740+0	LE	L=1,00	1	
A-2A	3237+0	LD	L=1,00	1	
A-2A	2562+0	LE	L=1,00	1	
A-2A	2957+0	LE	L=1,00	1	
A-2B	2702+0	LD	L=1,00	1	
A-2B	3275+0	LE	L=1,00	1	
A-2B	2535+0	LD	L=1,00	1	
A-2B	2929+0	LD	L=1,00	1	

ACUMULADO TOTAL 23,92

A DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES -

SALDO A MEDIR 23,92

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 Rodovia: MT- 336
 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR"MT-130
 Referência: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
 Período simples: 01/11/2015 a 30/11/2015
 Período acumulado: 12/07/2013 a 30/11/2015
 Firma: Construtora Tripolo LTDA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE
QUANTIDADE DE TAXAS
REFLETIVAS

IC:140/2013/00/00-SETPU

BORDO ESQUERDO										EIXO										BORDO DIREITO									
INÍCIO	FIM	QTDE	PROJETO TIPO	ESPAÇO	INÍCIO	FIM	QTDE	PROJETO TIPO	ESPAÇO	INÍCIO	FIM	QTDE	PROJETO TIPO	ESPAÇO															
2420	+ 10,00	2439	+ 0,00	46	TACHA	8,00	2420	+ 10,00	2439	+ 0,00	92	TACHA	4,00	2420	+ 10,00	2439	+ 0,00	46	TACHA	8,00									
2439	+ 0,00	2540	+ 0,00	126	TACHA	16,00	2439	+ 0,00	2540	+ 0,00	252	TACHA	8,00	2439	+ 0,00	2540	+ 0,00	126	TACHA	16,00									
2540	+ 0,00	2556	+ 0,00	40	TACHA	8,00	2540	+ 0,00	2556	+ 0,00	80	TACHA	4,00	2540	+ 0,00	2556	+ 0,00	40	TACHA	8,00									
2556	+ 0,00	2585	+ 15,00	37	TACHA	16,00	2556	+ 0,00	2585	+ 15,00	74	TACHA	8,00	2556	+ 0,00	2585	+ 15,00	37	TACHA	16,00									
2585	+ 15,00	2626	+ 10,00	101	TACHA	8,00	2585	+ 15,00	2626	+ 10,00	203	TACHA	4,00	2585	+ 15,00	2626	+ 10,00	101	TACHA	8,00									
2626	+ 10,00	2705	+ 15,00	99	TACHA	16,00	2626	+ 10,00	2705	+ 15,00	198	TACHA	8,00	2626	+ 10,00	2705	+ 15,00	99	TACHA	16,00									
2705	+ 15,00	2735	+ 10,00	74	TACHA	8,00	2705	+ 15,00	2735	+ 10,00	148	TACHA	4,00	2705	+ 15,00	2735	+ 10,00	74	TACHA	8,00									
2735	+ 10,00	2935	+ 0,00	249	TACHA	16,00	2735	+ 10,00	2935	+ 0,00	498	TACHA	8,00	2735	+ 10,00	2935	+ 0,00	249	TACHA	16,00									
2935	+ 0,00	2951	+ 0,00	40	TACHA	8,00	2935	+ 0,00	2951	+ 0,00	80	TACHA	4,00	2935	+ 0,00	2951	+ 0,00	40	TACHA	8,00									
2951	+ 0,00	3243	+ 0,00	365	TACHA	16,00	2951	+ 0,00	3243	+ 0,00	730	TACHA	8,00	2951	+ 0,00	3243	+ 0,00	365	TACHA	16,00									
3243	+ 0,00	3271	+ 0,00	70	TACHA	8,00	3243	+ 0,00	3271	+ 0,00	140	TACHA	4,00	3243	+ 0,00	3271	+ 0,00	70	TACHA	8,00									
3271	+ 0,00	3317	+ 9.736	666	TACHA	16,00	3271	+ 0,00	3317	+ 9.736	85	TACHA	8,00	3271	+ 0,00	3317	+ 9.736	666	TACHA	16,00									
							3299	+ 0,00	3314	+ 10	155	TACHA	2																
																					1.913,00								
																					2.580,00								
																					6.406,00								

ACUMULADO TOTAL 1.913,00

A DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES 6.406,00

SALDO A MEDIR 6.406,00

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

UNIVERSIDADE
 21
 P

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-EN
Referencia: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Período Simples: 12/07/2013 - 087/2013
Período Acum: 12/07/2013 a 30/11/2015
Firma: Construtora Tripolo LTDA

RELATÓRIO
 FOTOGRÁFICO



Serviço	COORDENADAS	
EXECUÇÃO CAPA DE ROLAMENTO	N	8.341.900
	E	187.500

Jose T. Teodoro


Engº José Teodoro neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA - RN 120776286-5

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA




Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-EN
Referencia: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Período Simples: 12/07/2013 - 087/2013
Período Acum: 12/07/2013 a 30/11/2015
Firma: Construtora Tripolo LTDA

RELATÓRIO
FOTOGRAFICO

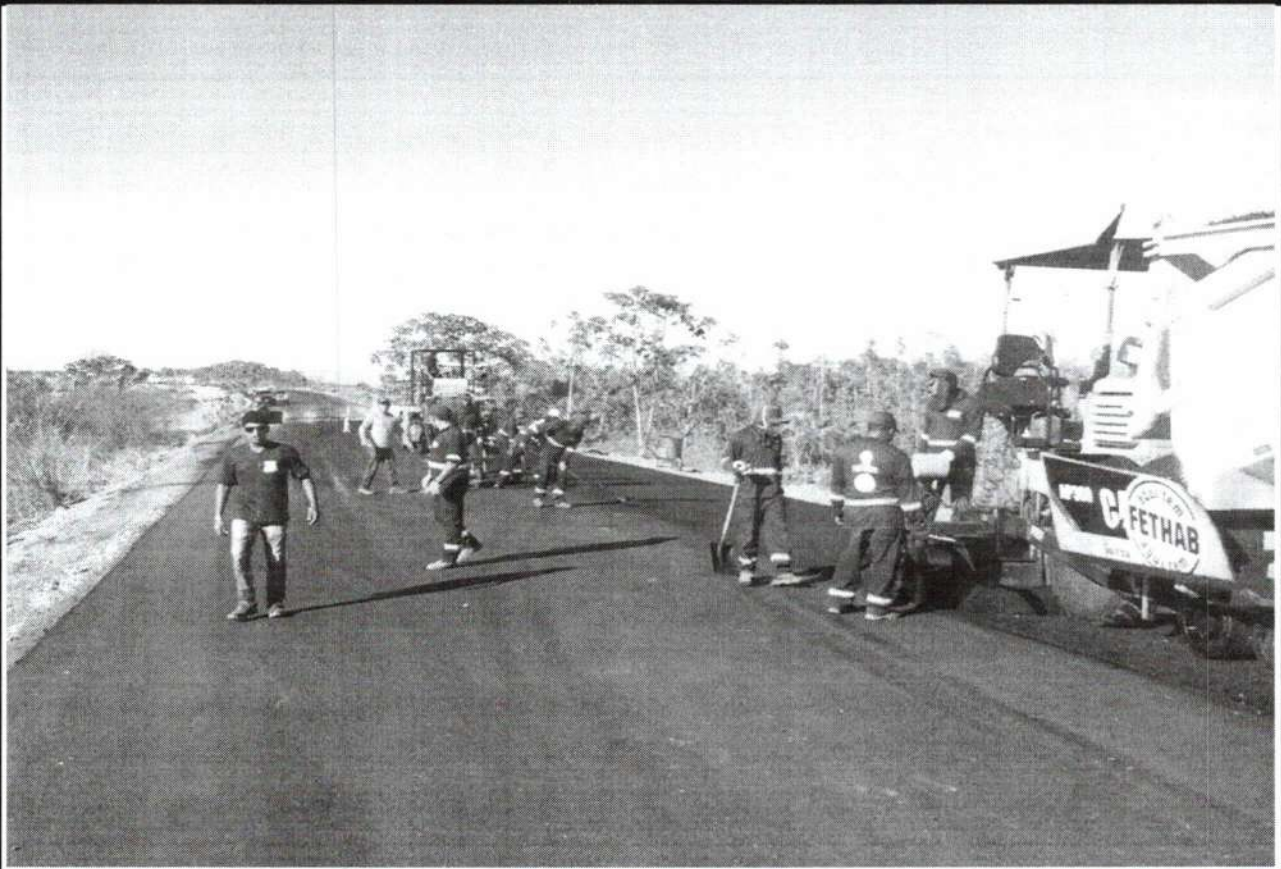

Serviço	COORDENADAS	
EXECUÇÃO CAPA DE ROLAMENTO	N	8.341.900
	E	187.500

Handwritten signature

Engº José Teodoro neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA - RN 120776286-5

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º José Carlos Ferreira da Silva
M.D. Superintendente de Obras de Transportes - SUOT
CUIABÁ/MT

Assunto : 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 140/2013

Através da presente , encaminho a V.Sª. a 20ª (Vigésima) Medição Provisória , devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

20ª (Vigésima) Medição ProvisóriaR\$ 860.397,06.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 05 a 25.

Em 25 de Janeiro de 2016.

Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Servidor/Colaborador
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT

Por ordem

Engª. Paula Janayna Fenerich
Assessora Especial III
CREA-RN: 121267520-7





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 173/16	Data: 26/01/2016									
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO										
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
TRIPOLO	649868/15	140/13	20º Med.	47.206.688,79	30.765.873,38	16.440.815,41	860.397,06	15.000.194-9	44.90.51	151	15.580.418,35	
TOTAL PROGRAMADO							860.397,06					

OBS.: Ref. Aos Serv. De Pavimentação asfáltica Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-336, conforme IC - 140/13

Elaborada em: 26/01/16

AUTORIZO:


Engº José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras


Engº Marcos Catalano Correa
Secretario Adjunto de Obras.


Engª Marciane Prevedello Curvo
Secretário Adjunta de Administração Sistêmica





PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Folha nº 28
Setor: COOT/SETPU
Ass.:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo , informando o código de verificação.	Código de verificação E15E.6EA4.3359	Data/Hora da emissão 22/01/2016 - 16:23:32
	Natureza da operação Recolhimento Fora	Número da Nota 510

Prestador de Serviços

	CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495. CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06		Inscrição Municipal 1438108
	Email contabilidade@construtoratripolo.com.br		Inscrição Estadual 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA		
CPF/CNPJ	03.507.415/0022-79		
Endereço	RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A		
Bairro	CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .		
Cep	78049-906		
Cidade	CUIABÁ - MT - BRASIL	Inscrição Municipal	
Email	silviopereirarosa@hotmail.com	Inscrição Estadual	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviço ref. a 20ª medição provisória de serviços da pavimentação asfáltica da rodovia MT 336. Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE/PVA-, ENTR. MT 130 com extensão de 51.05KM-objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, do período 01/11/2015 a 30/11/2015.

Serviço:	7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
860.397,06	1,00	0,00	851.104,77	9.292,29	0,00	0,00	860.397,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860.397,06

Retenções

INSS(R\$)	PIs(R\$)	Cofinst(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	860.397,06	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: **SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT**
 - NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
 - Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
 - Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



Os
Serviço FORAM EXECUTADOS
Eng. JOEL TEODORO NETO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo , informando o código de verificação.	Código de verificação E15E.6EA4.3359	Data/Hora da emissão 22/01/2016 - 16:23:32
	Natureza da operação Recolhimento Fora	Número da Nota 510

Prestador de Serviços

	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495. CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06		Inscrição Municipal 1438108 Inscrição Estadual 132063425
	Email contabilidade@construtoratripolo.com.br		

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA CPF/CNPJ 03.507.415/0022-79 Endereço RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A Bairro CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: . Cep 78049-906 Cidade CUIABÁ - MT - BRASIL Email silviopereirarosa@hotmail.com	Inscrição Municipal Inscrição Estadual
---	---

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviço ref. a 20ª medição provisória de serviços da pavimentação asfáltica da rodovia MT 336. Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE/PVA-, ENTR. MT 130 com extensão de 51.05KM-objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, do período 01/11/2015 a 30/11/2015.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço (R\$)</th> <th>Qtd.</th> <th>Desconto(R\$)</th> <th>Dedução(R\$)</th> <th>Base de Cálculo(R\$)</th> <th>Alíquota(%)</th> <th>Valor do ISS(R\$)</th> <th>Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>860.397,06</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>851.104,77</td> <td>9.292,29</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>860.397,06</td> </tr> </tbody> </table>	Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	860.397,06	1,00	0,00	851.104,77	9.292,29	0,00	0,00	860.397,06
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)									
860.397,06	1,00	0,00	851.104,77	9.292,29	0,00	0,00	860.397,06									

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860.397,06

Retenções

INSS(R\$)	PI(S)(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	860.397,06	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
 - NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
 - Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
 - Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



Q

Servicio Metall Form EXE CUDADOS
Joel Teodoro Niles

Eng

IMPRIMIR

VOLTAR

Folha nº 30
Setor: COOT/SETPU
Ass: _____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04879275/0001-06
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Endereço: R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800 SALA B / JD B
HORIZONTE / RONDONOPOLIS / MT / 78705-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2016 a 22/02/2016

Certificação Número: 2016012409024853922664

Informação obtida em 26/01/2016, às 11:27:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 31
Selo: COOT/SETPU
Ass.: _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.879.275/0001-06
Certidão nº: 161002081/2015
Expedição: 29/09/2015, às 16:33:46
Validade: 26/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.879.275/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

Folha nº 32
Setor: COOT/SETPU
Ass.: _____

Data: 26/11/2015
Hora: 19:48
Usu: S_GREICHENBACH

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: AV- TIRADENTES, nº 100
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT
CEP: 78.700-000

CNPJ

04.879.275/0001-06

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
712.937.281-87	FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
365.443.291-34	FRANCISCO MARINO FERNANDES
569.585.101-78	SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES
01.149.137/0001-75	CONSTRUTORA DETERRA LTDA EPP



Cuiabá, 26/11/2015

[Handwritten Signature]
Responsável pela Expedição

[Handwritten Signature]
Procurador(a) do Estado
Olga Geni Almeida Alves
Procuradora do Estado
OAB-2606

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: AVNINT7TI8IEHO9MFKNJT5EX1LZBO

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 14/12/2015 - 14:06:28

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0015723348****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **14/12/2015**Hora de emissão: **14:06:33**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **12/01/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TMU2BTA2KB9AA2AL**

Página 1 de 2



**Secretaria de Estado
de Fazenda**

**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 14/12/2015 - 14:06:28

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0015723348**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **14/12/2015**Hora de Emissão: **14:06:33**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com parcelamento de débitos
regular(em dia) no Sistema de Conta Corrente Fiscal
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal
13.132.510-8 - CONSTRUTORA DETERRA LTDA EPP - sócio com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **12/01/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **TMU2BTA2KB9AA2AL**

Página **2** de **2**

Retornar

© Copyright 2001-2015 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND 12467/2015

FINALIDADE **TRIBUTOS MUNICIPAIS (PESSOA) E DIVIDA ATIVA**

CONTRIBUINTE **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA** C.N.P.J./C.P.F.
04879275000106

LOGRADOURO / NÚMERO / COMPLEMENTO
RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA N° 3800
SALA B

BAIRRO **JD. BELO HORIZONTE** CEP **78705-600** CIDADE **RONDONOPOLIS**

DATA EXPEDIÇÃO 30/12/2015	VALIDADE 28/02/2016	NÚMERO PROTOCOLO 59120/2015	DATA PROTOCOLO 29/12/2015
------------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------

CERTIFICA, atendendo o pedido constante do requerimento protocolado, e de conformidade com as informações prestadas pelo Departamento de Lançamento e Arrecadação de Tributos, que encontra-se quite com os cofres municipais até a presente data, com referência aos TRIBUTOS MUNICIPAIS, inclusive DÍVIDA ATIVA. Ressalvando-se porém, o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar na forma da Lei, qualquer débito em atraso constatado posteriormente.

Valdecir Feltrin

VALDECIR FELTRIN
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA

Ronaldo Mota de Moraes

RONALDO MOTA DE MORAES
 GERENTE DEPTO LÇNTO E ARRECAÇÃO


Cleomar de Lima Carvalho

CLEOMAR DE LIMA CARVALHO
 Servidor Responsável

OBSERVAÇÕES:

Documento válido somente com Autenticação do Caixa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
CND VALIDA
 TAXA RECOLHIDA



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

ADM. 2013 / 2016

Folha nº 36
Setor: COOT/SETPU
Ass.: _____


CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS 003/2016

CERTIFICO, para os devidos fins e para que produza efeitos legais que o contribuinte **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**, inscrito no CNPJ: 04.879.275/0001-06, que em busca realizada ate esta data em nossos arquivos, não foram constatados nenhum debito nesta coordenadoria de arrecadação e tributos. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS: Validade por 30 dias a partir da data de emissão deste documento.

Por ser a expressão da verdade assino a presente certidão.

Santo Antonio do Leste - MT, 26 de Janeiro de 2016.


Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos

Coordenadoria de Arrecadação e Tributos

e-mail: prefeitura@santoantoniодоleste.mt.gov.br

Rua A - Nº 367 - Jardim Santa Inês - Fone: (66) 3488-1080 - CEP 78628-000 - Santo Antônio do Leste/MT



MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
WWW.MT.GOV.BR

Processo nº: 649868/15 Contrato nº: 1340/13 Folha nº 37
 Vigência: _____ Empresa Contratada: T. B. Polo Setor: COOT/SETPU
 Resumo do Objeto: Ref. 20ª Medição provisória Ass.: _____

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 28 de Janeiro de 2016
(local)

_____ de _____ de _____
(local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

J. C. Ferreira da Silva

José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras
SINFRA/MT



DESPACHO

SAOB/SINFRA
Fls. 38
Rub. 18

PROTOCOLO Nº	649868/2015
PARTE INTERESSADA	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.
CONTRATO	IC 140/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 27 de janeiro de 2016.


Eng.º Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB



EM BRANCO



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 140-13**

1 mensagem


COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br> 28 de janeiro de 2016 11:23
Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA <fransuisesouza@sinfra.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, cgfo@sefaz.mt.gov.br
Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Bom dia,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos. Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.04888-3**NOME DO CREDOR: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA****CPF/CNPJ : 04.879.275/0001-06****IC : 140/2013 - 20º MEDIÇÃO PROVISÓRIA****SUBCONTA: 218****EMPENHO: 25101000115000194-9****PROCESSO: 649868/2015**

 **20ª MEDIÇÃO MT-336.xls**
8074K



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.15.000194-9
------------	------------------------	-------------------------------

Nº PED: 25101.0001.15.000251-1		Data de Emissão: 29/04/2015	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 5148 - Pavimentação de Ligações e Vias de Acessos Rodoviários Municipais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 59185/2014
Conta Bancária (IRP): 02846 - SETPU-MT INTEGRADO			

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.04888-3	Nome: Construtora Tripolo Ltda		
Endereço: Ave Tiradentes, 100	CEP: 78.700-000		
Bairro: Centro	Município: Rondonópolis	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 04.879.275/0001-06	Insc. Estadual: 132063425	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1		Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.000.000,00	Valor por Extenso: DEZ MILHÕES DE REAIS *** **		
Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000251-1 Valor empenhado ref ao IC nº 140/2013			
Data de Autorização da Despesa: 29/04/2015		Ordenador de Despesa: Marcelo Duarte Monteiro	

Coordenador de Planejamento_____
Marcelo Duarte Monteiro
Ordenador de Despesa**Observações:**
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA
Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 140 - Ano: 2013

Obra

Contrato Nº/Ano-Obra: 140/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 40.597.659,23
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação
BEM PÚBLICO: AOS serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Objeto

Quantidade: 51,05 Unidade de Medida: km - Quilômetro
Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-336. Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/ Primavera do Leste - Entrº MT-130, com extensão de 51,05 Km.

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: MT - 336
Bairro: Trecho: Fim do trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entrº MT - 130
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
CEP: 78.850-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica
Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada
Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte
Bem Público: AOS serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Origem de Recursos

Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52 Nº/Ano do Convênio: 20-00011-1/2012 Órgão Concedente: BNDS-BANCO DO BRASIL
Total Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52 Inclusão: 07/03/2013

Localização

Latitude: S 14° 58' 03,22" Longitude: W 54° 03' 47,12" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim
Latitude: S 14° 54' 04,00" Longitude: W 53° 41' 08,55" Descrição do ponto Geo-referenciado: Inicio
Inclusão: 12/11/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: JOSÉ TEODORO NETO Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Eletivo(a) Início Atividade: 12/07/2013

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço Nome: ART FISC (2).pdf Tamanho: 593.4 KB
Descrição: ART FISC 2
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço Nome: ART FISC (1).pdf Tamanho: 905.4 KB
Descrição: ART FISC 1
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: Portaria 140 13 NOVO 1.pdf Tamanho: 105.6 KB
Descrição: Portaria


GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Código: 25361 Inclusão: 12/11/2013

Nº/Ano: 001/2013



Engenheiro de Execução

Engenheiro: EVERSON TOMOYOSHI OGAWA

Início Atividade: 12/07/2013

Inclusão: 12/11/2013

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT .pdf
Descrição: ART CONT

Tamanho: 388.7 KB

Inclusão: 12/11/2013

Situação da Obra

Situação: Reiniciada

Data Publicação: 10/08/2015

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OR

Tamanho: 412.2 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 01/12/2014

Situação: Paralisada

Data Publicação: 17/12/2014

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OP

Tamanho: 377.5 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Situação: Iniciada

Data Publicação: 02/08/2013

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 12/11/2013

Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS 140 2.013.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 9.6 KB

Inclusão: 12/11/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 52737 (Cód.: 59521)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 209.879,88

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 6º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.6 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 56207 (Cód.: 59531)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 166.181,27

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 12a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 12º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54939 (Cód.: 59528)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 45.897,55

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 10a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 10º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54663 (Cód.: 59522)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 265.905,51

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 19/12/2014

Medição da Obra

Documentos da Medição	Nome: 7a Medição reajuste_OK.xlsx Descrição: 7º Medição de Reajustamento	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 19/12/2014
Tipo: Medição de reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 56662 (Cód.: 59533)	Valor: R\$ 188.184,27	Período: 01/07/2014 a 31/07/2014	Inclusão: 19/12/2014
Data da Medição: 17/11/2014			
Documentos da Medição	Nome: 13a Medição reajuste_OK.xlsx Descrição: 13º Medição de Reajustamento	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 19/12/2014
Tipo: Medição de reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 52296 (Cód.: 59520)	Valor: R\$ 107.985,00	Período: 01/11/2013 a 30/11/2013	Inclusão: 19/12/2014
Data da Medição: 17/11/2014			
Documentos da Medição	Nome: 5a Medição reajuste_OK.xlsx Descrição: Reajustamento 5º Medição	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 19/12/2014
Tipo: Medição de reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 54917 (Cód.: 59525)	Valor: R\$ 94.423,74	Período: 01/02/2014 a 28/02/2014	Inclusão: 19/12/2014
Data da Medição: 17/11/2014			
Documentos da Medição	Nome: 8a Medição reajuste_OK.xlsx Descrição: 8º Medição de Reajustamento	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 19/12/2014
Tipo: Medição de reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 54918 (Cód.: 59526)	Valor: R\$ 57.655,09	Período: 01/03/2014 a 31/03/2014	Inclusão: 19/12/2014
Data da Medição: 17/11/2014			
Documentos da Medição	Nome: 9a Medição reajuste_OK.xlsx Descrição: 9º Medição de Reajustamento	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 19/12/2014
Tipo: Medição de reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 54940 (Cód.: 59529)	Valor: R\$ 37.235,62	Período: 01/05/2014 a 31/05/2014	Inclusão: 19/12/2014
Data da Medição: 17/11/2014			
Documentos da Medição	Nome: 11a Medição reajuste_OK.xlsx Descrição: 11º Medição de Reajustamento	Tamanho: 1.7 MB	Inclusão: 19/12/2014
Tipo: Medição de reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 50132 (Cód.: 59513)	Valor: R\$ 124.663,13	Período: 01/10/2013 a 31/10/2013	Inclusão: 19/12/2014
Data da Medição: 17/11/2014			
Documentos da Medição	Nome: 4a Medição reajuste_OK.xlsx Descrição: MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO	Tamanho: 1.4 MB	Inclusão: 19/12/2014
Tipo: Medição de reajuste			
Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 49794)	Valor: R\$ 1.994.507,70	Período: 12/07/2013 a 31/07/2013	Inclusão: 12/11/2013
Data da Medição: 02/08/2013			
Documentos da Medição	Nome: 1ª MEDIÇÃO MT-336 (1).xls Descrição: MPI	Tamanho: 2.8 MB	Inclusão: 12/11/2013
Tipo: Medição a preços iniciais			
Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49795)	Valor: R\$ 2.249.916,62	Período: 01/08/2013 a 31/08/2013	Inclusão: 12/11/2013
Data da Medição: 02/09/2013			



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 12/11/2013

Nome: 2ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: MPI

Tamanho: 3.0 MB

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50131)

Data da Medição: 02/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 3ª MEDIÇÃO

Valor: R\$ 2.710.835,28

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 29/11/2013

Nome: 3ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 3.5 MB

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 50132)

Data da Medição: 02/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 4ª MEDIÇÃO

Valor: R\$ 1.711.665,11

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 29/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 29/11/2013

Nome: 4ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 4ª MEDIÇÃO

Tamanho: 3.4 MB

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 52296)

Data da Medição: 02/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 5ª Medição

Valor: R\$ 1.884.584,53

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 19/03/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 19/03/2014

Nome: 5ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.5 MB

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 52737)

Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 6ª medição

Valor: R\$ 3.517.421,51

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 04/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 04/04/2014

Nome: 6ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 6ª medição

Tamanho: 2.6 MB

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54663)

Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 7ª Medição

Valor: R\$ 3.724.065,49

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 25/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 25/06/2014

Nome: 7ª MEDIÇÃO MT-336_CORRIGIDA.xls

Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 7.6 MB

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54917)

Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 8ª medição

Valor: R\$ 1.258.983,43

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 04/07/2014

Nome: 8ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 8ª medição

Tamanho: 8.3 MB

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54918)

Data da Medição: 03/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 9ª medição

Valor: R\$ 923.152,96

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 04/07/2014

Nome: 9ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 9ª medição

Tamanho: 8.1 MB

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54939)

Data da Medição: 03/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 10ª medição

Valor: R\$ 725.878,83

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 03/07/2014



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 07/07/2014

Nome: 10Aª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 10ª medição**Nº Medição:** MPI / 11 (Cód: 54940)

Data da Medição: 03/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª medição

Valor: R\$ 581.707,87

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.1 MB

Inclusão: 07/07/2014

Nome: 11Aª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 11ª medição**Nº Medição:** MPI / 12 (Cód: 56207)

Data da Medição: 03/07/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 3.028.908,53

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 22/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.0 MB

Inclusão: 22/08/2014

Nome: 12ª Medição.xls
Descrição: 12ª Medição Provisória**Nº Medição:** MPI / 13 (Cód: 56662)

Data da Medição: 03/08/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição

Valor: R\$ 4.068.597,85

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 11/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.5 MB

Inclusão: 11/09/2014

Nome: 13ª Medição.xls
Descrição: 13ª Medição**Nº Medição:** MPI / 14 (Cód: 64625)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 29/04/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nome: 14ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 14ª Medição Provisória**Nº Medição:** MPI / 15 (Cód: 64626)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nome: 15ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 15ª Medição Provisória**Nº Medição:** MPI / 16 (Cód: 64627)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nome: 16ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 16ª Medição Provisória**Nº Medição:** MPI / 17 (Cód: 64629)

Data da Medição: 03/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 2.385.647,67

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 9.5 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nome: 17ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 17ª Medição Provisória**Nº Medição:** MPI / 18 (Cód: 67891)

Data da Medição: 16/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 16/09/2015



Medição da Obra

Documentos da Medição

Inclusão: 28/01/2016

Tamanho: 9.7 MB

Nome: 18ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 18ª Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 19 (Cod: 67692)
Data da Medição: 09/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 19ª Medição Provisória

Tamanho: 9.7 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cod: 67693)
Data da Medição: 03/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória
Valor: R\$ 860.397,06
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 20ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 20ª Medição Provisória

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 28/01/2016

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 01/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): 360 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 17/06/2015


Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra: R\$ 40.597.659,23 Valor Total Medido: R\$ 31.626.270,44
Valor Total Aditado Obra: R\$ 0,00 Valor Total Material: R\$ 0,00
Valor Final Obra: R\$ 40.597.659,23 Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00
Valor Total Medido: R\$ 31.626.270,44 Valor Total Executado Obra: R\$ 31.626.270,44
Valor Total Reajuste: R\$ 1.298.011,06

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 540 Quantidade de Dias em Execução: 782
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias): 360 Quantidade de Dias Paralisada: 149
Prazo Execução Final Obra (dias): 900



DESPACHO

À SAADS

Sr^a Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Sr^a Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Grezielle Ferreira de Oliveira
Coordenadora do Setor de Geobras
SINFRA/MT

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



**Secretaria de Estado
de Fazenda**

**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 28/01/2016 - 10:37:56

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0015999916**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **28/01/2016**

Hora de emissão: **10:37:59**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**

Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspensão.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **26/02/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T7UATT72L277U27M**

Página **1** de **2**

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 28/01/2016 - 10:37:56

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0015999916**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **28/01/2016**

Hora de Emissão: **10:37:59**

- RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
- 13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com parcelamento de débitos regular(em dia) no Sistema de Conta Corrente Fiscal
 - 13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal
 - 13.132.510-8 - CONSTRUTORA DETERRA LTDA - sócio com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **26/02/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **T7UATT72L277U27M**

Página **2** de **2**

[Retornar](#)

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

PROC Nº: 649868/2015


FLS.: 50 - _____ - _____

DATA.: 28 / 01 / 2016

À
SUOF,

Segue processo para pagamento.


Eng.ª Civil Marciana Provedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica SINFRA





Processo nº 649868/2015


Fls.: 51/2016

Data 28/01/2016

À COFIN,

Encaminhamos o processo para liquidação e pagamento.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS/SINFRA





Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa: <u>Construtora Tripolo Ltda</u>	
Processo: <u>649868/2015</u>	IC: <u>140/2013</u>
Período da Despesa: <u>01/11/15 a 30/11/15</u>	Empenho: <u>15.000 194-9</u>
Produto/serviço: <u>serv. reparação med. Trov Rod. RHT-336</u>	Notas Fiscais: <u>510</u>

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)		X		
8	A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida?	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?				
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?				
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?	X			
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?		X		

Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	


Cuiabá, 29 de 01 de 2015. 2016

Check-list elaborado por:


Denise

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600			6 - VALOR DO INSS	12.045,56	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			19/02/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	12.045,56	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600			6 - VALOR DO INSS	12.045,56	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			19/02/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	12.045,56	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.16.000130-3

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 04/02/2016

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 848.351,50

Valor por Extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Histórico:

Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 e credor 2003048883 - Construtora Tripolo Ltda

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.1.05.42.00	C	Credor+F	2003048883351
3.9.9.9.1.80.01.02	D		
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.42	C	Credor	004.879.275/0001-06

Observações:

NLA Normal

ESTORNADO

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL

EST

EST



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.16.000082-6	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *** **	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 04/02/2016		Data de Vencimento: 04/02/2016	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006141 - Marciane Prevedello Curvo	
Fonte de Recurso: 351	Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001042530-6	
Valor (RS): *** 848.351,50	Valor por Extenso: OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****		
Histórico: Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015			
Código do Credor: 2003.04888-3			
Credor: Construtora Tripolo Ltda			
Município UF: Rondonópolis-MT		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Banco + Agência + C/C: 001.04205.000000000024397-3			
Nº NLA		25101.0000.16.000130-3	
Nº EMP		25101.0001.15.000194-9	

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
------------------------------------	---

AUTORIZO O PAGAMENTO

6141 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

(Handwritten signature)
Eng.º Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração
Sistema SIA/SEFAZ

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.16.000069-6

Data de Emissão: 04/02/2016

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Geral

Nº OBF:

*** **

Nº NEXLIST:

*** **

Nº NOE:

25101.0001.16.000082-6

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 02846.00218

Regularização:

Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6

Código do Credor: 2003.04888-3

Credor: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Município UF: Rondonópolis MT

Nº NLA: 25101.0000.16.000130-3

Nº EMP: 25101.0001.15.000194-9

Nº NOE: 25101.0001.16.000082-6

Fonte de Recurso: 351

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Nº LIQ: *** **

Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3

Valor da Operação (RS):

Valor por Extenso:

*** 848.351,50

OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **

Histórico :

Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006141 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

ESTORNADO



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.16.000144-3

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 05/02/2016

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 12.045,56

Valor por Extenso:

DOZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *

Histórico:

Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 e credor 1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.3.05.42.00	C	Credor+F	1995008500351
3.9.9.9.3.80.01.02	D	Fonte	351
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.42	C	Credor	029.979.036/0001-40

Observações:

NLA Normal

ESTORNADO

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL

ESTORNADO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.16.000085-0	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 05/02/2016		Data de Vencimento: 05/02/2016	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006141 - Marciane Prevedello Curvo	
Fonte de Recurso: 351	Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001042530-6	
Valor (R\$): *** 12.045,56	Valor por Extenso: DOZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ***** *****		
Histórico: Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015			
Código do Credor: 1995.00850-0			
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social			
Município UF: Brasília-DF		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *****			
Nº NLA		25101.0000.16.000144-3	
Nº EMP		25101.0001.15.000194-9	

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
------------------------------------	---

AUTORIZO O PAGAMENTO


 6141 - Marciane Prevedello Curvo
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal

Eng.ª Civil Marciane Prevedello Curvo
 Secretária Adjunta de Administração
 Sitemica/SINPRA



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.16.000071-8

Data de Emissão: 05/02/2016

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Geral

Nº OBF:

*** ** *

Nº NEXLIST:

*** ** *

Nº NOE:

25101.0001.16.000085-0

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 02846.00218

Regularização:

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº NLA: 25101.0000.16.000144-3

Nº EMP: 25101.0001.15.000194-9

Nº NOE: 25101.0001.16.000085-0

Fonte de Recurso: 351

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Nº LIQ: *** ** *

Banco + Agência + C/C: *** ** *

Valor da Operação (R\$):

*** 12.045,56

Valor por Extenso:

DOZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *

Histórico :

Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

006141 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Autenticação Bancária
Sem Código de Barras	GPS	***	2100	12.045,56	2D8DE2EDC924778D





LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.000521-5	
Nº EMP: 25101.0001.15.000194-9			Data do Doctº: 27/04/2016		
Nº PED: 25101.0001.15.000251-1			Data de vencimento: 27/04/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX:25101.0001.16.000069-6					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6			Valor Liquidação: *** 860.397,06		OITOCENTOS E SESSENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS *** ** *****
Histórico: PROC 649868/2015 IC 140/13 DA 20ª MEDIÇÃO NF 540 NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015.					
Código do credor: 2003.04888-3		Credor: Construtora Tripolo Ltda			
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Município UF: Rondonópolis - MT		Nº Processo de Pagamento 59185/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: 25101000000014013	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 10.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 860.397,06	Esta liquidação (R\$) *** 860.397,06	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 10.000.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 860.397,06	Esta liquidação (R\$) *** 860.397,06	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000521-5
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 12.045,56	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 848.351,50	OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***** ***
---	--



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 860.397,06
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 860.397,06
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 12.045,56
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 12.045,56



649868/15

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.000815-3
Data de Emissão: 28/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6	Regularização: Sim
		Nº NEX : 25101.0001.16.000069-6
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 2003.04888-3		
Credor: Construtora Tripolo Ltda		
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Município UF: Rondonópolis MT
EMP: 25101.0001.15.000194-9		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.16.000521-5		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3	Valor da Operação (R\$): *** 848.351,50	Valor por Extenso: OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 006141 - Marciano Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.000812-9
Data de Emissão: 28/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6	Regularização: Sim
		Nº NEX : 25101.0001.16.000071-8
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF	
EMP: 25101.0001.15.000194-9	Fonte de Recurso: 151	
Nº LIQ: 25101.0001.16.000521-5		
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014	Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 12.045,56	Valor por Extenso: DOZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



Detalhado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SI

Protocolo n.º: 649862/2015 Data: 09/12/2015 09:40

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 140/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICÕES E GERENCIAMENTO

Volume: 1 de 1



IC.940/2013

16.000.370-2 44.90.51 131 313

20/5/16

ex: 309

20/5/16





MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

Ao Ilmo Sr.

Eng.º José Carlos Ferreira da Silva

M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

Nesta

Assunto: 20ª (Vigésima) Medição Provisória de Reajustamento
Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU

Venho, pelo presente encaminhar a 20ª (Vigésima) Medição Provisória de Reajustamento de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/11/2015 a 30/11/2015, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato

20ª (Vigésima) Medição Provisória de Reajustamento
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Atenciosamente

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

Ed. Edgar Prado Arze Centro Político Administrativo - CPA - S/N , CEP 78049-906 - Cuiabá - MT - Fone (065) 3613 - 6600

GEO-OBRAS
12 / 05 / 2016
LANÇADO
Resp.: Fabio



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-1
Sub-Trecho:
Referência: 20ª (Vigésima) Medição Provisória de Reajustamento
Ordem de Início Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Ordem de Paralisação: 01/12/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 29/04/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Extensão: 51,05 KM
Firma: Construtora Tripolo LTDA
Instrumento Contratual: 140/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 45226/2013-SETPU
Data da Assinatura: 09/07/2013
Data da Publicação: 09/07/2013
Naturaza dos Serviços: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Prazo Contratual: 900
Término Previsto: 29/12/2015
Ordem de Início de Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Prazo Decorrido do Contrato: 872 Dias
Valor Contratual (PI): R\$ 38.017.467,91
Valor Termo Aditivo: R\$ 9.189.220,88
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 47.206.688,79
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 31.339.811,81
Saldo Contratual (PI) : R\$ 15.866.876,98
Valor Empenhado no Exercício:

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

Atenciosamente

[Assinatura]
Eng° José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN




ATESTADO

Atesto que o Reajustamento da 20ª (vigésima) Medição Provisória dos serviços de Implantação Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336, Trecho: FIM DO TRECHO PAV. – Divisa Santo Antonio do Leste, PVA – Entrº - MT – 130, com extensão de 51,05 km – objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao período 01/11/2015 a 30/11/2015, foi analisada segundo Parâmetros Técnicos, não apresentando inconformidades.

Cuiabá, 25 de janeiro 2016

Atenciosamente,


Engº Jose Carlos Ferreira da Silva
Secretário de Obras.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 140/2013/000/00 RODOVIA MT-336	FIRMA: Construtora Tripolo LTDA		VALOR CONTRATUAL 38.017.467,91		ADITAMENTO 9.189.270,88		TOTAL 47.206.688,79		
	TRECHO: Fim do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Oeste/Primavera do Leste-ENTR° MT-130		SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO		FISCAL Eng° José Teodoro Neto		O. I. SERVIÇO 12/07/2013		
	Nº DO PROCESSO	DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO		MEDIÇÕES P.I		MEDIÇÕES REAJUST.	TOTAL MEDICÃO	TOTAL GERAL
PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/11/2015 a 30/11/2015			PRAZO DIAS CORRIDOS 900	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO			
1ª medição	12/07/13	à 31/07/13	20	1.994.507,70	1.994.507,70	-	1.994.507,70	1.994.507,70	45.212.191,09
2ª medição	01/08/13	à 31/08/13	31	2.249.916,62	4.244.424,32	-	2.249.916,62	4.244.424,32	42.962.264,47
3ª medição	01/09/13	à 30/09/13	30	2.710.835,28	6.955.259,60	-	2.710.835,28	6.955.259,60	40.251.429,19
4ª medição	01/10/13	à 31/10/13	31	1.711.665,11	8.666.924,71	-	1.711.665,11	8.666.924,71	38.539.764,08
5ª medição	01/11/13	à 30/11/13	30	1.884.584,53	10.551.509,24	-	1.884.584,53	10.551.509,24	36.655.179,55
6ª medição	01/12/13	à 31/12/13	31	3.517.421,51	14.068.930,75	-	3.517.421,51	14.068.930,75	33.137.758,04
7ª medição	01/01/14	à 31/01/14	31	3.724.065,49	17.792.996,24	-	3.724.065,49	17.792.996,24	29.413.692,55
8ª medição	01/02/14	à 28/02/14	28	1.258.983,43	19.051.979,67	-	1.258.983,43	19.051.979,67	28.154.709,12
9ª medição	01/03/14	à 31/03/14	31	923.152,96	19.975.132,63	-	923.152,96	19.975.132,63	27.231.556,16
10ª medição	01/04/14	à 30/04/14	30	725.878,83	20.701.011,46	-	725.878,83	20.701.011,46	26.505.677,33
11ª medição	01/05/14	à 31/05/14	31	581.707,87	21.282.719,33	-	581.707,87	21.282.719,33	25.923.969,46
12ª medição	01/06/14	à 30/06/14	30	3.028.908,53	24.311.627,86	-	3.028.908,53	24.311.627,86	22.895.060,93
13ª medição	01/07/14	à 31/07/14	31	4.068.597,85	28.380.225,71	-	4.068.597,85	28.380.225,71	18.826.463,08
14ª medição	29/04/15	à 31/05/15	33	-	28.380.225,71	-	-	28.380.225,71	18.826.463,08
15ª medição	01/06/15	à 30/06/15	30	-	28.380.225,71	-	-	28.380.225,71	18.826.463,08
16ª medição	01/07/15	à 31/07/15	31	-	28.380.225,71	-	-	28.380.225,71	18.826.463,08
17ª medição	01/08/15	à 30/08/15	30	2.385.647,67	30.765.873,38	-	2.385.647,67	30.765.873,38	16.440.815,41
18ª medição	01/09/15	à 30/09/15	30	-	30.765.873,38	-	-	30.765.873,38	16.440.815,41
19ª medição	01/10/15	à 31/10/15	31	-	30.765.873,38	-	-	30.765.873,38	16.440.815,41
20ª medição	01/11/15	à 30/11/15	30	860.397,06	31.626.270,44	-	860.397,06	31.626.270,44	15.580.418,35
Prazo decorridos e saldo			872						

Eng° José Teodoro Neto
 Eng° José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

Local e data:

SINFRA

CRONOGRAMA FISICO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Edital: Concorrência Pública 023/2009
 Processo: 45226/2013
 Contrato: 140/2013/0000-SETPU
 Data Assinatura: 09/07/2013
 Data publicação: 09/07/2013
 Preço do contrato: 38.017.467,91
 Termos(s) Aditivado(s):
 Data de Publicação
 Vr. Termo aditivo a PI: 9.189.220,88
 PI atual do contrato: 47.206.688,79
 Firma Executora: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA
 Período Acum: 12/07/2013 a 30/11/2015
 Referência: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
 Período Med. Simples: 01/11/2015 a 30/11/2015

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 Rodovia: MT-336
 Programa:
 Trecho: Fim do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTRª MT-130
 Início : 12/07/2013
 Prazo: 780 (Setecentos e oitenta) dias
 Dias decorridos: 872 DIAS
 Extensão : 51,05 km
 Referência: 20ª (Vigésima) Medição Provisória
 Período Med. Simples: 01/11/2015 a 30/11/2015

SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM		SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA		FINANCEIRO - MEDIÇÕES A PI + REAJUSTAMENTO		
	NESTA MEDIÇÃO	EXECUTADO	ACUMULADO	VALOR %	MEDIÇÕES	VALOR A PI + REAJUSTE	VALOR PI + R
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	85,73%	R\$ 581.088,25	85,73%	1ª	R\$ 1.994.507,70	R\$ 1.994.507,70
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ -	73,15%	R\$ 2.336.761,60	73,15%	2ª	R\$ 2.249.916,62	R\$ 2.249.916,62
TERRAPLENAGEM	R\$ -	99,98%	R\$ 8.268.064,01	99,98%	3ª	R\$ 2.710.835,28	R\$ 2.710.835,28
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 208.872,96	45,56%	R\$ 6.178.887,12	45,56%	4ª	R\$ 1.711.665,11	R\$ 1.711.665,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 453.097,90	41,25%	R\$ 2.654.212,81	41,25%	5ª	R\$ 1.884.584,53	R\$ 1.884.584,53
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	93,82%	R\$ 8.022.777,90	93,82%	6ª	R\$ 3.517.421,51	R\$ 3.517.421,51
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	7ª	R\$ 3.724.065,49	R\$ 3.724.065,49
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ -	92,77%	R\$ 748.693,05	92,77%	8ª	R\$ 1.258.983,43	R\$ 1.258.983,43
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ -	63,39%	R\$ 75.206,00	63,39%	9ª	R\$ 923.152,96	R\$ 923.152,96
SINALIZAÇÃO	R\$ 198.426,20	33,22%	R\$ 198.426,20	33,22%	10ª	R\$ 725.878,83	R\$ 725.878,83
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ -	90,24%	R\$ 2.562.173,50	90,24%	11ª	R\$ 581.707,87	R\$ 581.707,87
					12ª	R\$ 3.028.908,53	R\$ 3.028.908,53
					13ª	R\$ 4.068.597,85	R\$ 4.068.597,85
					14ª	R\$ -	R\$ -
					15ª	R\$ -	R\$ -
					16ª	R\$ -	R\$ -
					17ª	R\$ 2.385.647,67	R\$ 2.385.647,67
					18ª	R\$ -	R\$ -
					19ª	R\$ -	R\$ -
					20ª	R\$ 860.397,06	R\$ 860.397,06
TOTAL	R\$ 860.397,06	84,19%	R\$ 31.626.270,44	84,19%	TOTAL	31.626.270,44	15.580.418,35

Local e data: Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.
 Comissão de Fiscalização

Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 RNP-120776286-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDA ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
Obras: MT - 326									
Projeto: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PAV-ENTR-0611-130									
Trecho: 51,05 KM									
Extensão: 20ª Vigésima) Medição Provisória									
Referência: 12/07/2013 - 08/7/2013									
Ordem início serviço: 01/11/2015 a 30/11/2015									
Período Med. Simples: 17/07/2013 a 30/11/2015									
Termo de Referência: 140/2013/00/09-SETPU									
Nº Contrato: 140/2013/00/09-SETPU									
Data Assinatura: 09/07/2013									
Publicação: 09/07/2013									
Processo Orig.: 45226/2013-SETPU									
Termo Aditivo N.º:									
Vr. Programado: 47.206.688,79									
Vr. Programado Proximos PI: 31.826.270,44									
FIRMA: Construtora Tripolo LTDA									
Prazo de Execução: 28									
Vr. Contratual PI: R\$									
Vr. Acum. Modificado PI: R\$									
Vr. Programado Proximos PI: R\$									
FIRMA: Construtora Tripolo LTDA									
SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									
3.0									
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									
2.5.02.110.00	Regularização do Sub-Leito	m²	655.786,930	-	655.786,930	655.786,930	0,72	472.168,02	100,00%
2.5.02.200.00	Sub-Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	126.019,514	49.799,400	126.019,512	76.229,112	12,12	948.136,63	61,11%
2.5.02.200.01	Sub-Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	121.743,030	8.554,400	41.605,200	50.169,600	12,12	608.055,55	41,21%
2.5.02.300.00	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m²	519.798,020	36.600,000	177.800,000	214.400,000	0,75	55.744,00	41,25%
2.5.02.300.01	Impermeação (execução)	m²	519.798,020	36.600,000	177.800,000	214.400,000	0,17	36.448,00	41,25%
2.5.02.400.00	Pintura de Lixação (execução)	m²	63.375,712	4.392,000	21.336,000	25.728,000	157,74	4.058.334,72	41,25%
2.5.02.500.51	Conc. Betuminoso tratado a quente - capa rolamento AC/BC	t	-	-	-	-	-	6.178.887,12	45,68%
4.0									
ACQUIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO									
2.5.02.999.01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	203,520	1.280,160	1.510,31	1,10	2.022.699,24	41,25%
2.5.02.999.03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t	623,258	43,920	213,360	257,280	2,04	526.924,87	41,25%
2.5.02.999.04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica BR-1C	t	207,919	14,640	71,120	85,760	1,21	104.588,60	41,25%
5.0									
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO									
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. não pav. de sub-base	bkm	6.137,380	-	6.120.769,279	6.120.769,279	0,66	4.039.707,72	99,75%
2.5.09.001.06	Transporte local em rod. não pav. de base	bkm	5.836,181	263,520	783,360	783,360	0,66	3.867.305,21	99,86%
2.5.09.009.01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	203,520	783,360	783,360	141,80	111.060,44	20,93%
2.5.09.009.03	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	623,258	43,920	130,560	130,560	141,80	18.513,40	20,93%
2.5.09.009.04	Transporte de Emulsão Asfáltica BR-1C	t	207,919	14,640	43,520	43,520	141,80	6.174,13	20,93%
6.0									
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA									
2.5.04.900.52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	490,000	-	-	-	42,59	-	0,00%
2.5.04.900.71	Sarjeta cantoneira central de concreto - SCC 01 - AC/BC	m	442,000	-	-	-	35,55	-	0,00%
2.5.04.910.51	Melo fio de concreto - MFC 01 - AC/BC - tipo B - (C/sarjeta de 50,0 cm)	m	1.517,000	-	-	-	66,15	-	0,00%
2.5.04.910.53	Melo fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	20.590,600	-	-	-	32,09	-	0,00%
2.5.04.910.55	Melo fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	993,000	-	-	-	32,24	-	0,00%
2.5.04.940.52	Descida d'água tipo rígido - canal triang. - DAR 02 - AC/BC	m	071,250	-	-	-	87,88	-	0,00%
2.5.04.942.51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	unid.	402,000	-	-	-	16,60	-	0,00%
2.5.04.942.52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	unid.	13,000	-	-	-	55,69	-	0,00%
2.5.04.950.82	Dissipador de energia - DES 02 - AC/BC	unid.	2,000	-	-	-	287,78	-	0,00%
2.5.04.950.83	Dissipador de energia - DES 01 - AC/BC/PC	unid.	408,000	-	-	-	281,04	-	0,00%
2.5.09.001.91	Transporte comercial cbasc. 10m3 em rodov. não pav. - AC/BC/PC	bkm	128.506,619	-	-	-	0,52	-	0,00%
2.5.09.002.91	Transporte comercial cbasc. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	bkm	1.109.571,877	-	-	-	0,33	-	0,00%
7.0									
OBRAS DE ARTE CORRENTE									
2.5.04.001.00	Escaravo mecânica de via em material de 1ª Categoria	m³	811,612	-	811,418	811,418	5,90	4.827,03	99,98%
2.5.04.940.01	Rebordo e compactação	m²	600,221	-	600,220	600,220	31,70	19.189,03	100,00%
2.5.04.100.51	Corpo BSTC D=0,60m - CA-4, inclusive beco e dentes - AC/BC/PC	m	13,000	-	-	-	439,030	-	0,00%
2.5.04.100.52	Corpo BSTC D=0,80m - CA-4, inclusive beco e dentes - AC/BC/PC	m	44,000	-	-	-	619,140	-	0,00%
2.5.04.100.53	Corpo BSTC D=1,00m - CA-4, inclusive beco e dentes - AC/BC/PC	m	128,000	-	128,000	128,000	869,760	111.329,28	100,00%
2.5.04.100.54	Corpo BSTC D=1,20m - CA-4, inclusive beco e dentes - AC/BC/PC	m	15,000	-	15,000	15,000	1.165,830	17.483,45	100,00%
2.5.04.100.55	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	unid.	4,000	-	-	-	1.599,150	-	0,00%
2.5.04.101.52	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	unid.	14,000	-	14,000	14,000	2.429,570	34.013,98	100,00%
2.5.04.101.53	Boca BSTC D=1,20m normal - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	3.485,700	6.917,40	100,00%
2.5.04.101.54	Boca BSTC D=1,20m normal - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	-	-	-	-	-



Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO SINFRA

Obras:		Nº Contrato		Prazo de Execução		780			
Trecho:		Data Assinatura		Prazo Restante		28			
Extensão:		Publicação		Vr. Contratual PT		R\$ 47.206.688,79			
Referência:		Processo Orig.		Vr. Acum. Medido PT		R\$ 31.626.270,44			
Período Med. Simples:		Termo Aditivo N:		Vr. Programado Próx. mês PT					
		Período Acum.:		FIRMA:					
				Construtora Tripolo LTDA					
COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	RESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
2 5 04 101 56	Boca BSTD D=0,60m - esq = 15 - AC/BC/PC	unid.	1.000	-	2.000	-	1.029,850	5.093,04	0,00%
2 5 04 101 58	Boca BSTD D=1,00 m - esq = 15 - AC/BC/PC	unid.	2.000	-	2.000	-	2.546,520	-	100,00%
2 5 04 101 62	Boca BSTD D=0,80 m - esq = 30 - AC/BC/PC	unid.	1.000	-	2.000	-	1.870,750	-	0,00%
2 5 04 110 53	Corpo BDTCC D=1,50m - CA-4, inclusive bogo e dentes - 1.000 AC/BC/PC	m	60.000	-	65.000	-	3.564,150	231.669,75	95,59%
2 5 04 111 53	Boca BDTCC D=1,50m normal - AC/BC/PC	unid.	8.000	-	8.000	-	2.288,070	66.310,96	100,00%
2 5 04 210 52	Corpo BDDC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	m	20.000	-	20.000	-	5.711,120	114.222,40	100,00%
2 5 04 211 53	Boca BDDC 2,50 x 2,50 m normal - AC/BC	unid.	2.000	-	2.000	-	27.878,780	55.757,56	100,00%
2 5 04 930 51	Caixa coleira de sangria - CCS 02 - AC/BC	unid.	1.000	-	-	-	1.732,600	-	0,00%
2 5 04 930 52	Caixa coleira de sangria - CCS 02 - AC/BC	unid.	1.000	-	-	-	1.696,160	-	0,00%
2 5 04 991 51	Tampa caixa p/ caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	unid.	2.000	-	-	-	187,460	-	0,00%
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav.	tkm	23.373,977	-	22.177,730	-	0,520	11.532,41	94,08%
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada	tkm	211.139,400	-	194.584,300	-	0,330	64.144,61	92,35%
5 5 04 999 01	Reinjeção de buenos existentes	m	79.000	-	79.000	-	75,950	6.000,05	100,00%
SUB-TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTE								748.693,05	92,27%
OBRAS COMPLEMENTARES									
2 5 06 410 00	Cerca de Arame Estripado com Superfície de Meliçoca	m	3.441,400	-	3.451,400	-	-	75.206,00	100,29%
4 5 06 010 01	Defensa Semi-Halterel Simples (torçamento e implantação)	m	128.000	-	-	-	219,80	-	0,00%
4 5 06 010 02	Alcargem defensiva semi-moleável simples (torc/imp)	m	64.000	-	-	-	242,51	-	0,00%
SUB-TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES								75.206,00	63,39%
SINALIZAÇÃO									
2 5 06 100 21	Planta fixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	20.691,920	-	7.166,100	-	14,56	104.338,92	34,63%
4 5 06 100 22	Planta solas e rebordo - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	174.920	-	-	-	20,62	-	0,00%
4 5 06 121 01	Form. E colocação de lacha reflet. Bidimensional	unid.	16.047,000	-	6.406,000	-	13,30	85.199,80	39,92%
4 5 06 121 11	Formec. E Colocação de lacha reflexora bidimensional	unid.	305.000	-	-	-	39,82	-	0,00%
4 5 06 100 02	Formec. E Implantação placa Sinalização. Totalmente refletiva	m²	179.980	-	23.922	-	371,54	8.387,98	13,30%
SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO								198.426,20	31,22%
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
2 5 05 100 00	Eriçamento	m²	10.036,370	-	10.036,370	-	7,72	77.480,77	100,00%
2 5 05 102 00	Hidrosemadura	m²	1.281.886,577	-	1.128.915,610	-	1,75	1.975.602,31	87,70%
3 5 01 930 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (banida e simpulsm)	m²	826.086,370	-	826.086,370	-	0,22	181.739,00	100,00%
5 5 01 990 003	Plantio de árvores e arbustos	unid.	11.402,000	-	11.402,000	-	28,71	327.351,42	100,00%
SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								2.562.173,50	90,24%
TOTAL GERAL								31.626.270,44	67,99%
A DEDUZIR: MEDIÇÕES ANTERIORES								30.765.873,38	1,85%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO								860.397,06	

Importa o valor a ser pago de R\$ **860.397,06**

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

Fiscalização:

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

OTOCENTOS E SESENTA MIL, TREZENTOS NOVENTA E SETE REAIS, SEIS CENTAVOS





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

RESUMO DE REAJUSTAMENTO

Obra: Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT-336
Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Oeste/Primavera do Leste - Entº MT-130, numa extensão de 51,05 Km.
Referência: 20ª (Vigésima) Medição Provisória de Reajustamento
O. Serviço: 12/07/2013
Período Med. Simples: 01/11/2015 a 30/11/2015
Período Med. Acumul: 12/07/2013 a 30/11/2015

Número 140/2013/00/00-SETPU
CONTRATO Assinatura 09/07/2013
Aprovações 45226/2013
Processo

Firma : CONSTRUTORA TRÍPOLO LTDA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MEDICÃO REFERENCIA	MEDICÃO ANTERIOR	VALOR REVISIVEL	FATOR K;	VALOR REAJUSTAMENTO
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 581.068,25	581.068,25	-	0,2264	-
	LOCAÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 2.336.761,60	2.336.761,60	-	0,2264	-
	TERRAPLENAGEM	R\$ 8.268.064,01	8.268.064,01	-	0,2264	40.939,10
	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.178.887,12	5.970.014,16	208.872,96	0,1960	-
	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.022.777,90	8.022.777,90	-	0,1960	27.201,11
	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO	R\$ 526.924,87	436.974,06	89.950,79	0,3024	-
	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 2.022.699,34	1.677.406,44	345.292,90	0,2618	90.397,68
	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA	R\$ 104.888,60	86.734,39	17.854,21	0,2569	4.598,74
	DRENAGEM SUPERFICIAL E SURTERRANEA	R\$ -	0,00	-	0,1663	-
	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 748.693,05	748.693,05	-	0,1663	35.348,87
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 189.538,22	0,00	189.538,22	0,1663	2.046,67
	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 8.887,98	0,00	8.887,98	0,2305	-
	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 75.206,00	75.206,00	-	0,1458	-
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 2.562.173,50	2.562.173,50	-	0,1458	-
	TOTAL	31.626.270,44	30.765.873,38	860.397,06		200.522,17

Índices/DNER	FATOR K	
	SET/15	K
TERRAPLENAGEM	268.6150	0,2264
PAVIMENTAÇÃO	290.3720	0,1960
AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO	390.7820	0,3024
AQUISIÇÃO EMULSAO ASFÁLTICA	332.5930	0,2569
AQUISIÇÃO CIMENTO ASFÁLTICO	325.7740	0,2618
DRENAGEM	271.9090	0,1663
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	267.4400	0,1865
CONSERVAÇÃO	263.5420	0,1458
OBRA DE ARTES ESPEC.	266.3750	0,1560
SINALIZAÇÃO VERTICAL	166.5410	0,2305

200.522-17
DUZENTOS MIL, QUINHENTOS VINTE E DOIS REAIS, DEZESSETE CENTAVOS

Importa o valor a ser pago de:

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU - Port.505/2013
CREA RNP 120776286-5



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º José Carlos Ferreira da Silva
M.D. Superintendente de Obras de Transportes - SUOT
CUIABÁ/MT

Assunto : 20ª (Vigésima) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 140/2013

Através da presente , encaminho a V.Sª. a 20ª (Vigésima) Medição Provisória , devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

20ª (Vigésima) Medição ProvisóriaR\$ 200.522,17.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 05 a 10.

Em 26 de Janeiro de 2016.

Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Servidor/Colaborador
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT

• Por ordem

Engª. Paula Janayna Fenerich
Assessora Especial III
CREA-RN: 121267520-7

Governo do Estado
de Mato GrossoSecretaria de Estado
de Fazenda

Data: 25/04/2016 - 10:09:57

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016614281****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **25/04/2016**Hora de emissão: **10:09:58**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **24/05/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TLL2KTK2T2T9U2B7**

Página 1 de 2

Secretaria de Estado
de Fazenda



Gov. nº 13
Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 25/04/2016 - 10:09:57

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0016614281**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **25/04/2016**Hora de Emissão: **10:09:58**

- RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
- 13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA - Contribuinte com parcelamento de débitos regular(em dia) no Sistema de Conta Corrente Fiscal
 - 13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão válida até **24/05/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **TLL2KTK2T2T9U2B7**

Página 2 de 2

Retornar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04879275/0001-06
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Endereço: R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800 SALA B / JD B
HORIZONTE / RONDONOPOLIS / MT / 78705-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/04/2016 a 27/05/2016

Certificação Número: 2016042803470529237001

Informação obtida em 03/05/2016, às 16:31:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CNPJ: 04.879.275/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:35:24 do dia 20/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2016.

Código de controle da certidão: **02C9.229D.45AC.EFC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

UNIMG/SINFRA
Folha nº 46
Ass. JZ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.879.275/0001-06
Certidão nº: 22787559/2016
Expedição: 02/03/2016, às 08:29:19
Validade: 28/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.879.275/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

LOCALIZAÇÃO
ENDEREÇO: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 3.800, SALA - B
BAIRRO: JARDIM BELO HORIZONTE
MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT
CEP: 78.700-000

CNPJ
04.879.275/0001-06

SÓCIOS	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
	712.937.281-87	FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
	902.505.321-15	FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI



Cuiabá, 26/04/2016

Responsável pela Expedição
Arnaldo J. G. Gonçalves
Mat.: 95546
Técnico PGE/MT

Procurador(a) do Estado
Romeu Júlio Tomaz
Procurador do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
 - 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
 - 3 - Autenticador desta certidão: FGUOLITVGLVSK30ZDVBWASDD0P89TT
- | N.º Proc. Órgão | N.º CDA | Tipo do Processo | Situação |
|-----------------|---------|------------------|----------|
| | | | |

UNIMIGISINFRA

19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

ANEXO DE DÉBITOS - CERTIDÃO POSITIVA C/ EFEITO NEGATIVO

3637 / 2016



CONTRIBUINTE

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.

04879275000101

LOGRADOURO / NUMERO / COMPLEMENTO

RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA N° 3800
SALA B

BAIRRO

JD. BELO HORIZONTE

CEP

78705-600

CIDADE

RONDONOPOLIS

DÉBITOS	SITUAÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	ACRÉSCIMOS	TOTAL
I.P.T.U.					
	Imóvel: 000000000986968				
	Emitido	11/07/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/08/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	12/09/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/10/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/11/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/05/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	10/06/2016	873,82	0,00	873,82
TOTAL			6116,74	0,00	6116,74

Os débitos serão acrescidos da TAXA DE SERVIÇO ADM na emissão do DAM

VALDECIR FELTRIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA

CLEOMAR DE LIMA CARVALHO
Servidor Responsável

RONALDO MOTA DE MORAES
GERENTE DEPTO LÇNTO E ARRECAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
CND VÁLIDA
TAXA RECOLHIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA. A. Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190

UNIMG/SINFRA

Folha nº 20

Ass. JZ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO, para devidos fins e para que produza efeitos legais que o contribuinte abaixo, em busca realizada até esta data em nossos arquivos, não foram constatados débitos nesta coordenadoria de arrecadação, cadastro e tributos. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apurados.

Cadastro:	000018310	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	CPF/CNPJ:	04879275000106
Endereço:	RUA FERNADO CORREA DA COSTA, 3800	Complem:	CAIXA POSTAL 023
Bairro:	JARDIM BELO HORIZONTE	CEP:	78705600
Cidade:	RONDONOPOLIS-MT		

ATENÇÃO Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Emissão: 09/05/2016 13:49:51 Validade: 08/06/2016 Usuário: VILMAR
Número/Controle da Certidão: 132E536BF53FCD6C

Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos

Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

MG/SINFRA

Nota nº 21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Código de verificação C52E.E481.1C89	Data/Hora da emissão 25/01/2016 - 17:51:30
Natureza da operação Recolhimento Fora	Número da Nota 512

Prestador de Serviços



CONSTRUTORA TRÍPOLO LTDA

FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06

Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Municipal 1438108

Inscrição Estadual 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CPF/CNPJ 03.507.415/0022-79

Endereço RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A

Bairro CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .

Cep 78049-906

Cidade CUIABÁ - MT - BRASIL

Email silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviço ref. a 20ª medição provisória de reajustamento de serviços da pavimentação asfáltica da rodovia MT 336. Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE/PVA-, ENTR. MT 130 com extensão de 51.05KM-objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, do período 01/11/2015 a 30/11/2015.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (RS)	Qtd.	Desconto (RS)	Dedução (RS)	Base de Cálculo (RS)	Alíquota (%)	Valor do ISS (RS)	Total (RS)
200.522,17	1,00	0,00	120.313,30	80.208,87	0,00	0,00	200.522,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200.522,17

Retenções

INSS (RS)	PIS (RS)	Cofins (RS)	C.S.L.L. (RS)	IRRF (RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (RS)	Outras Deduções (RS)	Total das Retenções (RS)	Valor Líquido da Nota (RS)	
0,00	0,00	0,00	200.522,17	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



Os Serviços foram EXECUTADOS
Ezrei
Joel Teodoro Neto

**Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

MUNICÍPIO/SINFRA

Folha nº 22

[Handwritten signature]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Código de verificação C52E.E481.1C89	Data/Hora da emissão 25/01/2016 - 17:51:30
Natureza da operação Recolhimento Fora	Número da Nota 512

Prestador de Serviços

	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	
	FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495. CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL	
CPF/CNPJ	04.879.275/0001-06	Inscrição Municipal 1438108
Email	contabilidade@construtoratripolo.com.br	Inscrição Estadual 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA	
CPF/CNPJ	03.507.415/0022-79	
Endereço	RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A	
Bairro	CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .	
cep	78049-906	
Cidade	CUIABÁ - MT - BRASIL	Inscrição Municipal
Email	silviopereirarosa@hotmail.com	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviço ref. a 20ª medição provisória de reajustamento de serviços da pavimentação asfáltica da rodovia MT 336. Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE/PVA-, ENTR. MT 130 com extensão de 51.05KM-objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, do período 01/11/2015 a 30/11/2015.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
200.522,17	1,00	0,00	120.313,30	80.208,87	0,00	0,00	200.522,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200.522,17

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	0,00	0,00	200.522,17	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



13

Serviços Fornecidos
Eng. João Teodoro Neto

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO				PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS			Nº 313/16	Data:	10/05/2016	
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Tripolo	649862/15	140/13	Reajust.20º Med.	47.206.688,79	30.765.873,38	16.440.815,41	200.522,17	16.000.370-2	44.90.51	131	R\$ 16.240.293,24	
TOTAL PROGRAMADO							200.522,17					

OBS.:Ref. Aos Serv. De Pavimentação asfáltica Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-336, conforme IC - 140/13

Ciente:

Engº José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras

AUTORIZO:

Engº Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras

Engª Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica





ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 0498621/15 Contrato nº: 1240/13
 Vigência: _____
 Empresa Contratada: Tripolo
 Resumo do Objeto: Ref. Reajustamento 20ª medição de 2015
 Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02	A respeito da cláusula contratual - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
05	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
08	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
09	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Quarta 09 de maio de 2016 de _____ de _____
 (local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)
[Assinatura]
 Assessor Técnico III
 SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

[Assinatura]
 Engº. José Carlos Ferreira da Silva
 Superintendente de Obras
 CREA-RN: 1201387132

[Assinatura]
 Julio Mangini Fernandes Neto
 Chefe da Unidade IV
 Unidade de Medição e Gerenciamento-UNIMG




TRÂMITE DE PROCESSO



PROTOCOLO Nº	649862
EXERCÍCIO	2015
PARTE INTERESSADA	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONTRATO	IC 140/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 11 de maio de 2016.



Eng.º Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB



EM BRANCO



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 140-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

12 de maio de 2016 16:31

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Grezile Ferreira de Oliveira <grezileoliveira@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos. Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.04888-3

NOME DO CREDOR: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ : 04.879.275/0001-06

IC : 140/2013 - 20º MEDIÇÃO REAJUSTAMENTO

SUBCONTA: 218

EMPENHO: 25101000116000370-2
PROCESSO: 649862/2015 20º Medição Reajuste.xlsx
2039K

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 140 - Ano: 2013

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Código: 25361 Inclusão: 12/11/2013

Obra
Contrato Nº/Ano-Obra: 140/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 40.597.659,23 Prazo de Execução Inicial (dias): 540 Nº/Ano: 001/2013
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Concorrência Pública

Objeto
Quantidade: 51,05 Unidade de Medida: km - Quilômetro
Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/ Primavera do Leste - Entº MT-130, com extensão de 51,05 Km.

Contratada
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA Inclusão: 26/08/2013

Detalhes

Endereço da Obra:
Endereço: MT - 336
Bairro: Trecho: Fim do trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT - 130
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
CEP: 78.850-000

Dados Gerais:
Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica
Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada
Setor Beneficiário: Infra-estrutura e Transporte
Bem Público: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Origem de Recursos
Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52 Nº/Ano do Convênio: 20-00011-1/2012 Órgão Concedente: BNDS-BANCO DO BRASIL
Total Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52 Inclusão: 07/03/2013

Localização
Latitude: S 14° 58' 03,22" Longitude: W 54° 03' 47,12" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim
Latitude: S 14° 54' 04,00" Longitude: W 53° 41' 08,55" Descrição do ponto Geo-referenciado: Inicio

Engenheiro de Fiscalização
Engenheiro: JOSÉ TEODORO NETO Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 12/07/2013

Documentos de Engenheiro Fiscalização
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço Nome: ART FISC (2).pdf Tamanho: 593.4 KB
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço Descrição: ART FISC 2
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço Nome: ART FISC (1).pdf Tamanho: 905.4 KB
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Descrição: ART FISC 1
Nome: Portaria 140 13 NOVO l.pdf Tamanho: 105.6 KB
Descrição: Portaria



Engenheiro de Execução

Engenheiro: EVERSON TOMOYOSHIOGAWA

Início Atividade: 12/07/2013

Inclusão: 12/11/2013

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT..pdf
Descrição: ART CONT

Inclusão: 12/11/2013

Tamanho: 388.7 KB

Situação da Obra

Situação: Reiniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 29/04/2015

Data Publicação: 10/08/2015

Descrição: OR

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OR

Tamanho: 412.2 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 01/12/2014

Data Publicação: 17/12/2014

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OP

Tamanho: 377.5 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Data Publicação: 02/08/2013

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 12/11/2013

Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS 140 2.013.pdf
Descrição: OIS

Inclusão: 12/11/2013

Tamanho: 9.6 KB

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 50132 (Cód.: 59513)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 4º Medição de Reajustamento

Inclusão: 19/12/2014

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Valor: R\$ 124.663,13

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4a Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 67698 (Cód.: 70283)

Data da Medição: 03/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 20º Medição de Reajustamento

Inclusão: 12/05/2016

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Valor: R\$ 200.522,17

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 20º Medição Reajuste.xlsx

Descrição: 20º Medição reajuste

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 12/05/2016

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 13º Medição de Reajustamento

Inclusão: 19/12/2014

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Valor: R\$ 188.184,27

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 13a Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: 13º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 52737 (Cód.: 59521)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 6º Medição de Reajustamento

Inclusão: 19/12/2014

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Valor: R\$ 209.879,88



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 6º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.6 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54663 (Cód.: 59522)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 265.905,51

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 7a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 7º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 56207 (Cód.: 59531)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 166.181,27

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 12a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 12º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54917 (Cód.: 59525)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 94.423,74

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 8a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 8º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54918 (Cód.: 59526)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 57.655,09

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 9a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 9º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 52296 (Cód.: 59520)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 107.985,00

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: Reajustamento 5º Medição

Tamanho: 1.5 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54940 (Cód.: 59529)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 37.235,62

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 11a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 11º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54939 (Cód.: 59528)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 45.897,55

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 10a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 10º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 49794)

Data da Medição: 02/08/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.994.507,70

Período: 12/07/2013 a 31/07/2013

Inclusão: 12/11/2013



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª MEDIÇÃO MT-336 (1).xls
 Descrição: MPI
 Tamanho: 2.8 MB
 Inclusão: 12/11/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49795)

Data da Medição: 02/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 2ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 2.249.916,62
 Período: 01/08/2013 a 31/08/2013
 Inclusão: 12/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª MEDIÇÃO MT-336.xls
 Descrição: MPI
 Tamanho: 3.0 MB
 Inclusão: 12/11/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50131)

Data da Medição: 02/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 3ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 2.710.835,28
 Período: 01/09/2013 a 30/09/2013
 Inclusão: 29/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 3ª MEDIÇÃO MT-336.xls
 Descrição: 3ª MEDIÇÃO
 Tamanho: 3.5 MB
 Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 50132)

Data da Medição: 02/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 4ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 1.711.665,11
 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
 Inclusão: 29/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 4ª MEDIÇÃO MT-336.xls
 Descrição: 4ª MEDIÇÃO
 Tamanho: 3.4 MB
 Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 52296)

Data da Medição: 02/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 5ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 1.884.584,53
 Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
 Inclusão: 19/03/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 5ª MEDIÇÃO MT-336.xls
 Descrição: 5ª Medição
 Tamanho: 2.5 MB
 Inclusão: 19/03/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 52737)

Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 6ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 3.517.421,51
 Período: 01/12/2013 a 31/12/2013
 Inclusão: 04/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 6ª MEDIÇÃO MT-336.xls
 Descrição: 6ª medição
 Tamanho: 2.6 MB
 Inclusão: 04/04/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54663)

Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 7ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 3.724.065,49
 Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
 Inclusão: 25/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 7ª MEDIÇÃO MT-336_CORRIGIDA.xls
 Descrição: 7ª Medição
 Tamanho: 7.6 MB
 Inclusão: 25/06/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54917)

Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 8ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 1.258.983,43
 Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
 Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 8ª MEDIÇÃO MT-336.xls
 Descrição: 8ª medição
 Tamanho: 8.3 MB
 Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54918)

Data da Medição: 03/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 9ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 923.152,96
 Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
 Inclusão: 04/07/2014



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nome: 9ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 9ª medição

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54939)

Data da Medição: 03/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 725.878,83

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 07/07/2014

Nome: 10ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 10ª medição

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 54940)

Data da Medição: 03/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 581.707,87

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.1 MB

Inclusão: 07/07/2014

Nome: 11ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 11ª medição

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 56207)

Data da Medição: 03/07/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 3.028.908,53

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 22/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.0 MB

Inclusão: 22/08/2014

Nome: 12ª Medição.xls
Descrição: 12ª Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 56662)

Data da Medição: 03/08/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 4.068.597,85

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 11/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.5 MB

Inclusão: 11/09/2014

Nome: 13ª Medição.xls
Descrição: 13ª Medição

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64625)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 29/04/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nome: 14ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 14ª Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64626)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nome: 15ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 15ª Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 64627)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nome: 16ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 16ª Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 64629)

Data da Medição: 03/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 2.385.647,67

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 16/09/2015



Medição da Obra

Documentos da Medição		Nome: 17ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls		Tamanho: 9.5 MB	Inclusão: 16/09/2015
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 17ª Medição Provisória			
Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 67691)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 0,00	Período: 01/09/2015 a 30/09/2015		Inclusão: 28/01/2016
Data da Medição: 16/10/2015		Observação: 18ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: 18ª MEDIÇÃO MT-336.xls		Tamanho: 9.7 MB	Inclusão: 28/01/2016
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 18ª Medição Provisória			
Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 67692)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 0,00	Período: 01/10/2015 a 31/10/2015		Inclusão: 28/01/2016
Data da Medição: 09/11/2015		Observação: 19ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: 19ª MEDIÇÃO MT-336.xls		Tamanho: 9.7 MB	Inclusão: 28/01/2016
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 19ª Medição Provisória			
Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 67693)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 860.397,06	Período: 01/11/2015 a 30/11/2015		Inclusão: 28/01/2016
Data da Medição: 03/12/2015		Observação: 20ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: 20ª MEDIÇÃO MT-336.xls		Tamanho: 8.3 MB	Inclusão: 28/01/2016
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 20ª Medição Provisória			
Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 69529)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 0,00	Período: 01/12/2015 a 31/12/2015		Inclusão: 12/04/2016
Data da Medição: 01/01/2016		Observação: 21ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: 21ª MEDIÇÃO MT-336.xls		Tamanho: 8.2 MB	Inclusão: 12/04/2016
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 21ª Medição			
Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 69530)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 0,00	Período: 01/01/2016 a 31/01/2016		Inclusão: 12/04/2016
Data da Medição: 01/02/2016		Observação: 22ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: 22ª MEDIÇÃO MT-336.xls		Tamanho: 8.2 MB	Inclusão: 12/04/2016
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 22ª Medição			
Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 69531)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 0,00	Período: 01/02/2016 a 29/02/2016		Inclusão: 12/04/2016
Data da Medição: 01/03/2016		Observação: 23ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: 23ª MEDIÇÃO MT-336.xls		Tamanho: 8.2 MB	Inclusão: 12/04/2016
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 23ª Medição			
Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 69534)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 1.806.550,55	Período: 01/03/2016 a 31/03/2016		Inclusão: 12/04/2016
Data da Medição: 01/04/2016		Observação: 24ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: 24ª Medição.xls		Tamanho: 8.9 MB	Inclusão: 12/04/2016
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 24ª Medição Provisória			
Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 70213)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 4.384.631,75	Período: 01/04/2016 a 30/04/2016		Inclusão: 11/05/2016
Data da Medição: 06/05/2016		Observação: 25ª Medição Provisória			



Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx
Descrição: 25ª Medição

Tamanho: 4.7 MB

Inclusão: 11/05/2016

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 02/2016

Nº/Ano: 01/2015

R\$ 0,00 Inclusão: 05/04/2016
R\$ 0,00 Inclusão: 17/08/2015

R\$ 0,00 Valor Aditado:
R\$ 0,00 Valor Aditado:

R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais:
R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais:

R\$ 0,00 Srv. Decrescidos:
R\$ 0,00 Srv. Decrescidos:

Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra: R\$ 40.597.659,23
Valor Total Aditado Obra: R\$ 0,00
Valor Final Obra: R\$ 40.597.659,23
Valor Total Medido: R\$ 37.817.452,74
Valor Total Reajuste: R\$ 1.498.533,23

Valor Total Medido: R\$ 37.817.452,74
Valor Total Material: R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00
Valor Total Executado Obra: R\$ 37.817.452,74

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 540
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias): 506
Prazo Execução Final Obra (dias): 1046

Quantidade de Dias em Execução: 887
Quantidade de Dias Paralisada: 149





DESPACHO

À SAADS

Sr^a Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Sr^a Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro. Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA

VIRTUTE



PROC N°: 113518/2016

FLS.: 66 - -

DATA.: 13 / 05 / 2016

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, remeto o feito a este Setor para pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

-Prefeitura de Rondonópolis	- folha 50/51
Prefeitura Paranatinga	- folha 52
SEFAZ-MT	- folha 47/48
PGE – MT	- folha 49
Receita Federal	- folha 45
Caixa Econômica	- folha 46
Trabalhista	- folha 44

Com referencia a certidão negativa da PGE – informo que o Decreto nº 8.426, de 18 de dezembro de 2006, revogou a alínea “b” do Decreto nº 8.199, de 16 de outubro de 2006, que fixa critérios para o pagamento relativo às aquisições de bens, contratações de serviços, locações de bens móveis e imóveis e dá outras providências


Eng.º Civil Marciano Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA






Processo nº 649869 / 2015

Fls: 67 / 2016

Data: 16/05/2016

À COFIN,

Encaminhamos o processo para liquidação e pagamento.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA

VIRTUTE

PLUSQU

68
Jefferson



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa:	Construtora Tripolo LTDA		
Processo:	649862/2015	IC:	140/2013
Período da Despesa:	Empenho: 16000370-2		
Produto/serviço:	Notas Fiscais: 512		

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)			X	
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida?	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?			X	
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?	X			
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?		X		
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?		X		

Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 17 de maio de 2015

Check-list elaborado por:

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.000747-1
Nº EMP: 25101.0001.16.000370-2			Data do Doctº: 19/05/2016	
Nº PED: 25101.0001.16.000464-2			Data de vencimento: 19/05/2016	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
NEX: *** ** *				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 200.522,17	DUZENTOS MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: PROC 649862/2015 , IC-140/2013 , REFERENTE 20º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO , execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT-130, numa extensão de 51,05 Km. CONFORME O DESPACHO DA PAG 66, NF 512, PERÍODO 01/11/15 Á 30/11/15				
Código do credor: 2003.04888-3		Credor: Construtora Tripolo Ltda		
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Município UF: Rondonópolis - MT	Nº Processo de Pagamento 59185/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *		Data de Início da Viagem: *** ** *	
		Data de Retorno da Viagem: *** ** *	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000014013		Termínio da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 3.650.781,29	Saldo a liquidar (R\$) *** 200.522,17	Esta liquidação (R\$) *** 200.522,17	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 3.650.781,29	Saldo em liquidação (R\$) *** 200.522,17	Esta liquidação (R\$) *** 200.522,17	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000747-1
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 2.807,31	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 197.714,86	CENTO E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *
---	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 200.522,17
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 200.522,17

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 2.807,31
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 2.807,31




Processo nº /

Data: 02 /06/2016

À CCONT

Após pagamento na Coordenadoria Financeira, encaminha-se o presente processo para arquivo nessa unidade.

P/P 
Fransuise Albuquerque Souza
Coordenadoria Financeira





NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		25101.0001.16.001445-5
Data de Emissão: 20/05/2016			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2003.04888-3			
Credor: Construtora Tripolo Ltda			
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Município UF: Rondonópolis MT	
EMP: 25101.0001.16.000370-2		Fonte de Recurso: 131	
LIQ: 25101.0001.16.000747-1		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3		Valor da Operação (R\$): *** 197.714,86	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Jefferson Marcos Delgado da Silva Superintendente de Orçamento e Finanças Chefe do Núcleo Contábil de Finanças (NSF) SINFRA/MT		Autorizo o Pagamento  006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			




NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.001443-9
Data de Emissão: 20/05/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 25101.0001.16.000370-2	Fonte de Recurso: 131	
IQ: 25101.0001.16.000747-1	Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 2.807,31	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Jefferson Marcos Delgado da Silva Superintendente de Orçamento e Finanças e Contabilidade do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) SINPRAM	 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		


DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2631	2.807,31	*****

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016
			5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600			6 - VALOR DO INSS	2.807,31
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.807,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2016
			5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600			6 - VALOR DO INSS	2.807,31
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.807,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Proc. 649862/2015

WF512



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SIN

Protocolo n.: 29190/2016 Data: 21/01/2016 16:06

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPLO LTDA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: BOLETIM DA 21 MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO 1
40/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ROD

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



0 000074 550906

PROCESO PERTEN
ARQUIVO
DATA Nº: 2017



MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.

Ao Ilmo Sr.
Eng.º. José Carlos Ferreira da Silva
M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT
Nesta

Assunto: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU

Venho, pelo presente encaminhar a 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/12/2015 a 31/12/2015, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato

21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Atenciosamente

Eng.º José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

GEO-OBAS
13/03/17
CONFERIDO
Resp: [assinatura]



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Sub-Trecho:
Referência: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Ordem de Paralisação: 01/12/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 29/04/2015


DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Extensão: 51,05 KM
Firma: Construtora Tripolo LTDA
Instrumento Contratual: 140/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 45226/2013-SETPU
Data da Assinatura: 09/07/2013
Data da Publicação: 09/07/2013
Naturza dos Serviços: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Prazo Contratual: 900
Término Previsto: 23/12/2016
Ordem de Início de Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Prazo Decorrido do Contrato: 903 Dias
Valor Contratual (PI): R\$ 38.017.467,91
Valor Termo Aditivo: R\$ 9.189.220,88
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 47.206.688,79
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 31.339.811,81
Saldo Contratual (PI) : R\$ 15.866.876,98
Valor Empenhado no Exercício:

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.

Atenciosamente


Eng° José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



OFÍCIO – D.T. 003/2016

Rondonópolis/MT, 20, de Janeiro de 2016.


À Secretaria de Infraestrutura e Logística
A/C M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES – SUOT
SR. José Carlos Ferreira da Silva

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTES AO IC 140/2013/00/00-SETPU

Prezado Senhor,

A Empresa Construtora Tripolo Ltda., inscrita sob CNPJ: 04.879.275/0001-06, sediada a Av. Fernando Corrêa, nº 3800, Belo Horizonte, na cidade de Rondonópolis – MT, através deste, **DEM VEM JUSTIFICAR** a 21ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTES AO IC 140/2013/00/00-SETPU, apresentada junto a esta secretaria, com valor zero. Os serviços referentes ao contrato supracitado se encontram em fase final de acabamento, e devido ao início do período de chuvas no estado, não é possível continuar com a execução de serviços de Sub-Base, Base, e Capa de Rolamento em CBUQ, conforme instruções do DNIT através da ES 301/97, ES 303/97, e ES 031/2006 respectivamente, obedecendo a instruções onde não deverão ser executados estes serviços com tempo chuvoso.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos e contamos com vossa colaboração.


CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Engº Cassio Rodrigo Parra Pansolin
Engº Responsável Técnico

Email: engenharia@construtoratripolo.com.br - Fone: (66) 3423-1446

Rua Fernando Corrêa da Costa, 3800 – Jd. Belo Horizonte – Caixa Postal 23
CEP 78705-600 – Rondonópolis – Mato Grosso



MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.

Ao Ilmo Sr.

Eng.º José Carlos Ferreira da Silva

M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

Nesta

Assunto: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória

Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU

Venho, pelo presente encaminhar a 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/12/2015 a 31/12/2015, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato

21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Atenciosamente

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN




BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA	Firma: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
FISCALIZAÇÃO:	Contrato: 140/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT - 336	Data Assinatura: 09/07/2013
Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTRº MT-130	Data de Aprovação: 09/07/2013
Extensão: 51,05 Km	Ordem de Serviço : 12/07/2013-087/2013
	Prazo: 540 (Quinhentos e Quarenta) dias
	Obra: Pavimentação Asfáltica de Rodovia
	Termo Aditivo:
	Data de Publicação:
Desempenho relativo aos serviços da Pavimentação Asfáltica	
Serviços Executados entre: 01/12/2015 a 31/12/2015	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,9				
2) Pessoal	0,9				
3) Instalações	0,8				
4) Cronograma Físico	0,9				
5) Qualidade dos Serviços	0,9				
6) Atend. À Fiscalização	0,9				
7) Administração da Obra	0,9				
Local e Data: Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.		 Eng. José Teodoro Neto - Fiscal SETPU- 505/2013 RNP- 120776286-5			

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	
1) Equipamento	0,9	1,50	1,35	DESEMP. PARCIAL = (NxP) $\frac{8,85}{10} = \mathbf{0,89}$ Conceito: Excelente
2) Pessoal	0,9	1,50	1,35	
3) Instalações	0,9	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,9	2,00	1,7	
5) Qualidade dos Serviços	0,9	3,00	2,7	
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,85	
7) Administração da Obra	0,9	0,50	0,45	
TOTAL	6,2	10,00	8,85	
OBSERVAÇÕES:				
LOCAL E DATA Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.		_____ Coordenador de Obras de Transportes		

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

_____ Superintendente de Obras de Transportes
--




DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT - 336


Trecho: Fim do trecho pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTR° MT-130

Sub-Trecho:

Extensão: 51,05 km

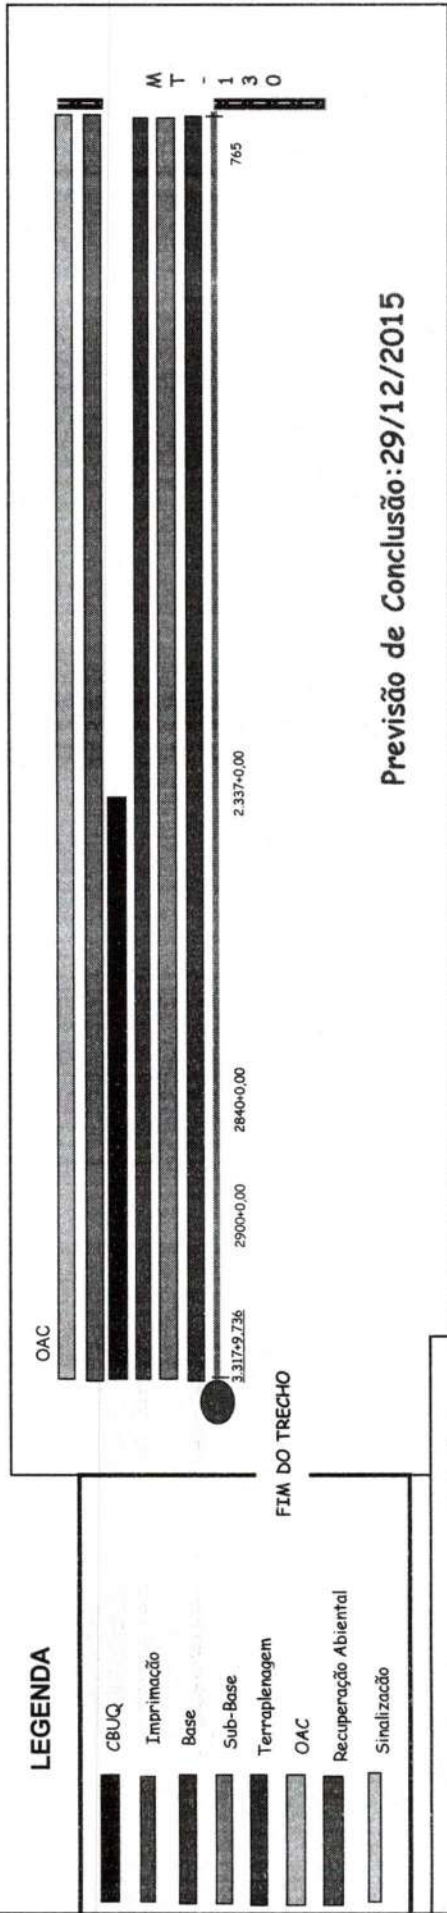

SERVIÇOS	ATACADO	CONCLUÍDO
QUILOMETRAGEM	---	---
ESTAQUEAMENTO	---	---
TERRAPLENAGEM	---	---
SUB-BASE	---	---
BASE	---	---
IMPRIMAÇÃO	---	---
REVESTIMENTO - (CBUQ)	---	---
OBRAS DE ARTES CORRENTE	---	---
DRENAGEM	---	---
OBRAS COMPLEMENTARES	---	---
SINALIZAÇÃO	---	---

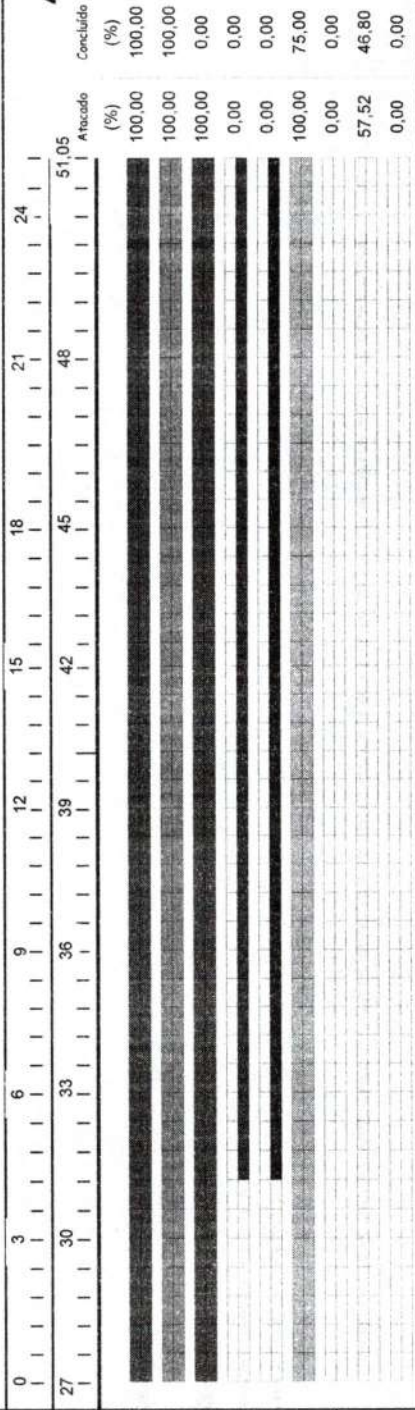

Jose Teodoro Neto
Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 14/07/2013/00/00 RODOVIA MT-336	FIRMA: Construtora Tripolo LTDA	VALOR CONTRATUAL 38.017.467,91		ADITAMENTO 9.189.220,88		TOTAL 47.206.688,79						
		SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO		FISCAL								
		Engº José Teodoro Neto		TOTAL								
Nº DO PROCESSO	TRECHO: Fim do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Oeste/Primavera do Leste-ENTRº MT-130	DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DIAS CORRIDOS	MEDIÇÕES P.I.	PERÍODO	ACUMULADO	MEDIÇÕES REAJUST.	ACUMULADO	TOTAL MEDIÇÃO	TOTAL GERAL	SALDO P. INICIAL 47.206.688,79
1ª medição	12/07/13	à	31/07/13	20	1.994.507,70	20	1.994.507,70	-	-	1.994.507,70	1.994.507,70	45.212.181,09
2ª medição	01/08/13	à	31/08/13	31	2.249.916,62	51	4.244.424,32	-	-	2.249.916,62	4.244.424,32	42.962.264,47
3ª medição	01/09/13	à	30/09/13	30	2.710.835,28	81	6.955.259,60	-	-	2.710.835,28	6.955.259,60	40.251.429,19
4ª medição	01/10/13	à	31/10/13	31	1.711.665,11	112	8.666.924,71	-	-	1.711.665,11	8.666.924,71	38.539.764,08
5ª medição	01/11/13	à	30/11/13	30	1.884.584,53	142	10.551.509,24	-	-	1.884.584,53	10.551.509,24	36.655.175,55
6ª medição	01/12/13	à	31/12/13	31	3.517.421,51	173	14.068.930,75	-	-	3.517.421,51	14.068.930,75	33.137.758,04
7ª medição	01/01/14	à	31/01/14	31	3.724.065,49	204	17.792.996,24	-	-	3.724.065,49	17.792.996,24	29.413.692,55
8ª medição	01/02/14	à	28/02/14	28	1.258.983,43	232	19.051.979,67	-	-	1.258.983,43	19.051.979,67	28.154.709,12
9ª medição	01/03/14	à	31/03/14	31	923.152,96	263	19.975.132,63	-	-	923.152,96	19.975.132,63	27.231.556,16
10ª medição	01/04/14	à	30/04/14	30	725.878,83	293	20.701.011,46	-	-	725.878,83	20.701.011,46	26.505.677,33
11ª medição	01/05/14	à	31/05/14	31	581.707,87	324	21.282.719,33	-	-	581.707,87	21.282.719,33	25.923.969,46
12ª medição	01/06/14	à	30/06/14	30	3.028.908,53	354	24.311.627,86	-	-	3.028.908,53	24.311.627,86	22.895.060,93
13ª medição	01/07/14	à	31/07/14	31	4.068.597,85	385	28.380.225,71	-	-	4.068.597,85	28.380.225,71	18.826.463,08
14ª medição	29/04/15	à	31/05/15	33	-	689	28.380.225,71	-	-	-	28.380.225,71	18.826.463,08
15ª medição	01/06/15	à	30/06/15	30	-	719	28.380.225,71	-	-	-	28.380.225,71	18.826.463,08
16ª medição	01/07/15	à	31/07/15	31	-	750	28.380.225,71	-	-	-	28.380.225,71	18.826.463,08
17ª medição	01/08/15	à	30/08/15	30	2.385.647,67	780	30.765.873,38	-	-	2.385.647,67	30.765.873,38	16.440.815,41
18ª medição	01/09/15	à	30/09/15	30	-	811	30.765.873,38	-	-	-	30.765.873,38	16.440.815,41
19ª medição	01/10/15	à	31/10/15	31	-	842	30.765.873,38	-	-	-	30.765.873,38	16.440.815,41
20ª medição	01/11/15	à	30/11/15	30	573.938,43	872	31.339.811,81	-	-	573.938,43	31.339.811,81	15.866.876,98
21ª medição	01/12/15	à	31/12/15	31	-	903	31.339.811,81	-	-	-	31.339.811,81	15.866.876,98
Prazo decorridos e saldo												357
Local e data:												903


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-12076286-5/RN

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra:	CONTRATO		140/2013/00/00-SETPU		Prazo Atual:		900 Dias		Valor Contratual R\$:		
	Pavimentação Asfáltica				Aditivo de prazo:		360 Dias		38.017.467,91		
Rodovia:	MT - 336								Valor Aditivo R\$:		
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRª MT-130								Valor Contratual + Aditivo R\$:		
Extensão	51,05 KM				Prazo Total:		1.260 Dias		Firma: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA		
INÍCIO:	12/07/2013	12/07/2013 a 31/07/2013	01/08/2013 a 31/08/2013	01/09/2013 a 30/09/2013	01/10/2013 a 31/10/2013	01/11/2013 a 30/11/2013					
TÉRMINO:	29/12/2015	20 / 20	31 / 51	30 / 81	31 / 112	30 / 142					
Serviço	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	85,73%	581.068,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	8,87%	283.369,85	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	
TERRAPLENAGEM	12,62%	1.130.069,58	23,21%	2.078.800,63	9,37%	839.531,21	14,01%	1.255.032,85	0,07%	6.510,00	
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	1,51%	204.845,76	0,00%	-	0,60%	80.740,80	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	15,83%	1.353.834,83	0,00%	-	4,25%	363.422,86	
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	17,41%	141.507,50	35,13%	285.516,28	0,00%	-	
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	63,39%	75.206,01	
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	41,83%	1.187.588,88	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,23%		4,77%		5,74%		3,63%		3,99%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	4,23%		8,99%		14,73%		18,36%		22,35%		
FATURAMENTO SIMPLES	1ª	1.994.507,69	2ª	2.249.916,62	3ª	2.210.833,28	4ª	1.711.865,11	5ª	1.884.384,53	
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	1.994.307,69	MED	4.244.424,30	MED	6.955.259,58	MED	8.666.924,69	MED	10.551.309,22	

Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Valor Contratual R\$:** 38.017.467,91
Rodovia: MT- 336 **Aditivo de prazo:** 360 Dias **Valor Aditivo R\$:** 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130 **Valor Contratual + Aditivo R\$:** 47.206.688,79
Extensão 51,05 KM **Prazo Total:** 1.260 Dias **Firma:** CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA

MÊS/ANO	01/12/2013 a 31/12/2013		01/01/2014 a 31/01/2014		01/02/2014 a 28/02/2014		01/03/2014 a 31/03/2014		01/04/2014 a 30/04/2014	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
TÉRMINO: 29/12/2015	31 / 173		31 / 204		28 / 232		31 / 263		30 / 293	
SERVIÇO										
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	0,02	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	5,36%	171.115,97	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM	-1,74%	155.430,38	29,41%	2.633.650,60	12,15%	1.087.867,45	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	4,28%	580.410,72	3,98%	540.412,70	0,00%	-	0,28%	38.102,40	0,59%	80.132,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	34,16%	2.921.325,26	0,16%	13.403,68	0,00%	-	8,35%	713.934,58	5,55%	474.630,65
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	0,02	43,13%	350.566,53	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	0,01	0,53%	14.916,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	7,45%		7,85%		2,67%		1,95%		1,74%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	29,80%		37,69%		40,36%		42,31%		43,35%	
FATURAMENTO SIMPLES	6ª	3.517.421,51	7ª	3.724.063,49	8ª	1.258.983,43	9ª	923.152,96	10ª	725.878,83
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	14.068.930,73	MED	17.792.996,22	MED	15.051.979,65	MED	19.975.132,61	MED	20.701.011,44

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Jose Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Prazo Atual:** 900 Dias **Valor Contratual R\$:** 38.017.467,91
Rodovia: MT - 336 **Aditivo de prazo:** 360 Dias **Valor Aditivo R\$:** 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRªMT-130 **Valor Contratual + Aditivo R\$:** 47.206.688,79
Extensão 51,05 KM **Prazo Total:** 1.260 Dias **Firma:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

MÊS/ANO	01/05/2014 a 31/05/2014		01/06/2014 a 30/06/2014		01/07/2014 a 31/07/2014		01/12/2014 a 29/04/2015		29/04/2015 a 31/05/2015	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
TÉRMINO: 29/12/2015	31 / 324		30 / 354		31 / 385		150 / 535		33 / 568	
DIAS CORRIDOS										
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	-6,79%	- 607.967,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,56%	76.326,91	3,12%	422.793,01	17,81%	2.414.802,94	0,00%	-	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	20,93%	1.346.913,96	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	4,25%	363.162,21	19,69%	1.683.298,87	1,59%	135.764,97	0,00%	-	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	-3,56%	- 28.897,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	47,89%	1.359.668,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	1,23%		5,42%		8,62%		0,00%		0,00%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	45,08%		51,50%		60,12%		60,12%		60,12%	
FATURAMENTO SIMPLES	11ª	581.707,87	12ª	3.028.908,53	13ª	4.068.597,85			14ª	
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	21.282.719,31	MED	24.311.627,84	MED	28.380.225,69			MED	28.380.225,69

OBRA PARALIZADA

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS


Engº Jose Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra:	CONTRATO		Prazo Atual:		Valor Contratual R\$:	
	140/2013/00/00-SETPU	900 Dias	Aditivo de prazo:	360 Dias	Valor Contratual R\$:	Valor Aditivo R\$:
Rodovia:	140/2013/00/00-SETPU		1.260 Dias		Valor Contratual + Aditivo R\$:	
Trecho:	01/07/2015 a 31/07/2015		31 / 660		Firma: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	
Extensão:	01/06/2015 a 30/06/2015		31 / 629		01/09/2015 a 30/09/2015	
INÍCIO: 04/11/2013	30 / 598		31 / 721		01/10/2015 a 31/10/2015	
TERMINO: 29/12/2015	31 / 598		31 / 629		31 / 721	
MÊS/ANO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
DIAS CORRIDOS	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	11,29%	1.531.446,72	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	13,27%	854.200,95	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (FGS)	0,00%	-	5,05%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	60,12%	-	65,17%	-	65,17%	-
FATURAMENTO SIMPLES	15ª	-	17ª	2.385.647,67	18ª	-
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	28.380.225,69	MED	30.765.873,36	MED	30.765.873,36


 Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PCA - Será a soma acumulada do PGS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obras:	CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU		900 Dias		Valor Contratual R\$: 38.017.467,91	
	Pavimentação Asfáltica		360 Dias		Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88	
Rodovia:	MT- 336		Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79		Firma: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130		Prazo Total: 1.260 Dias		01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/03/2016	
Extensão	51,05 KM		33 / 813		29 / 842 31 / 873	
INÍCIO: 04/11/2013	01/11/2015 a 30/11/2015		30/12/2015		31/01/2016	
TÉRMINO: 29/12/2015	30 / 751		29 / 780		29 / 842	
MÊS/ANO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$		
DÍAS CORRIDOS						
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$		
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	95.838,51
SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO	2,72%	368.435,01	0,00%	-	0,00%	687.293,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	3,19%	205.503,42	0,00%	-	0,00%	813.717,37
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	386.097,41
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	171.020,18
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	146.312,68
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.127,76
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.745,73
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	1,22%	-	0,00%	-	0,00%	4,90%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	66,39%	-	66,39%	-	66,39%	71,29%
FATURAMENTO SIMPLES	20*	573.938,43	21*	-	-	2.313.153,30
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	31.339.811,79	MED	31.339.811,79	31.339.811,79	33.652.965,09

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

Cr\$0





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica		CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$: 38.017.467,91	
Rodovia: MT- 336		Prazo Atual: 900 Dias		Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88	
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRª MT-130		Aditivo de prazo: 360 Dias		Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79	
Extensão: 51,05 KM		Prazo Total: 1.260 Dias		Firma: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	
INÍCIO: 04/11/2013		01/04/2016 a 30/04/2016		01/07/2016 a 31/07/2016	
MÊS/ANO		01/05/2016 a 31/05/2016		01/08/2016 a 31/08/2016	
TÉRMINO: 29/12/2015		30 / 903		31 / 995	
DIAS CORRIDOS		31 / 934		31 / 1026	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	3,00%	95.838,51	3,00%	95.838,51	95.838,51
TERRAPLENAGEM	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	6,00%	813.717,37	6,00%	813.717,37	813.717,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	6,00%	386.097,41	6,00%	386.097,41	386.097,41
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	2,00%	171.020,18	2,18%	186.190,51	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	146.312,68
OBRAS DE ARTE CORRENTE	1,00%	8.127,76	1,00%	8.127,76	8.127,76
OBRAS COMPLEMENTARES	4,00%	4.745,73	4,00%	4.745,73	4.745,73
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	3,44%	-	3,08%	-	1,08%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	74,73%	-	81,29%	-	87,45%
FATURAMENTO SIMPLES	1.625.859,62	1.641.029,96	1.454.839,45	1.454.839,45	1.454.839,45
FATURAMENTO ACUMULADO	35.278.824,71	36.919.854,67	38.374.694,12	39.829.533,56	41.284.373,01


 Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

UNIRG/S...
 Fis: M
 Nome: D
 Area:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRªMT-130
Extensão: 51,05 KM

Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
 Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

INÍCIO: 04/11/2013 TÉRMINO: 29/12/2015	CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU		900 Dias		Valor Contratual R\$:	
	01/09/2016 a 30/09/2016	01/10/2016 a 31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	31/12/2016
MÊS/ANO	30 / 1056	31 / 1087	30 / 1117	23 / 1140	Firma: Cr\$0	
DIAS CORRIDOS	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$		
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	14,27%	96.709,91
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	3,00%	95.838,51	2,00%	63.892,34	1,85%	59.201,07
TERRAPLENAGEM						
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	6,00%	813.717,37	4,00%	542.478,24	3,26%	442.528,89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	10,00%	643.495,69	10,00%	643.495,69	3,60%	231.713,98
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO						
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68
OBRAS DE ARTE CORRENTE	1,88%	15.316,44				
OBRAS COMPLEMENTARES	4,00%	4.745,73	3,00%	3.559,29	2,61%	3.098,47
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	597.320,70
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	9,76%	276.974,19
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	3,64%		2,97%		3,93%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	91,10%		94,16%		100,00%	
FATURAMENTO SIMPLES		1.719.426,48		1.399.738,24		1.853.859,68
FATURAMENTO ACUMULADO		43.003.799,41		44.403.537,65		47.206.688,79

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Jose Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
 Rodovia: MT-336
 Programa:
 Trecho: Fim do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Oeste/
 Primavera do Leste-ENTRº MT-130
 Início : 12/07/2013
 Prazo : 1260 (Mil duzentos e sessenta) dias
 Término previsto: 12/01/2015
 Extensão : 51,05 km
 Dias decorridos: 903 DIAS
 Referência: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
 Período Med. Simples: 01/12/2015 a 31/12/2015

Edital: Concorrência Pública 023/2009
 Processo: 45226/2013
 Contrato: 140/2013/00/00-SETPU
 Data Assinatura: 09/07/2013
 Data publicação: 09/07/2013
 Preço do contrato: 38.017.467,91
 Termo(s) Aditivo(s):
 Data de Publicação
 V. Termo aditivo a PI: 9.189.220,88
 PI atual do contrato: 47.206.688,79
 Firma Executora: CONSTRUTORA TRUPOLO LTDA
 Período Acum: 12/07/2013 a 31/12/2015

Nesta a PI: R\$ -
 Acumulada a PI: R\$ 31.339.811,81
 Reajuste nesta: R\$ -
 Reajuste acumulado: R\$ -
 Total PI + Reaj: R\$ 31.339.811,81
 Saldo contrato a PI: R\$ 15.866.876,98
 Empenhado até esta data:
 Saldo empenhado: R\$ 15.866.876,98
 Saldo de prazo(Dias): 357
 Preço inicial do contrato: R\$ 38.017.467,91
 Termo de Re-Ratificação: 140/2013/03/01-SETPU

SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM		SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA		FINANCEIRO - MEDIÇÕES A PI + REAJUSTAMENTO		
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO	VALOR %	VALOR A PI	REAJUSTE	VALOR PI + R
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 581.068,25	85,73%		R\$ 1.994.507,70	R\$ -	R\$ 1.994.507,70
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ -	R\$ 2.336.761,50	73,15%		R\$ 2.249.916,62	R\$ -	R\$ 2.249.916,62
TERRAPLENAGEM	R\$ -	R\$ 8.268.064,01	99,98%		R\$ 2.710.835,28	R\$ -	R\$ 2.710.835,28
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 6.338.449,17	46,74%		R\$ 1.711.665,11	R\$ -	R\$ 1.711.665,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ -	R\$ 2.406.618,33	37,40%		R\$ 1.884.584,53	R\$ -	R\$ 1.884.584,53
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 8.022.777,90	93,82%		R\$ 3.517.421,51	R\$ -	R\$ 3.517.421,51
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	R\$ -	R\$ -	0,00%		R\$ 3.724.065,49	R\$ -	R\$ 3.724.065,49
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ -	R\$ 748.693,05	92,27%		R\$ 1.258.983,43	R\$ -	R\$ 1.258.983,43
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ 75.206,00	63,39%		R\$ 923.152,96	R\$ -	R\$ 923.152,96
SINALIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%		R\$ 725.878,83	R\$ -	R\$ 725.878,83
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ -	R\$ 2.562.173,50	90,24%		R\$ 581.707,87	R\$ -	R\$ 581.707,87
					R\$ 3.028.908,53	R\$ -	R\$ 3.028.908,53
					R\$ 4.068.597,85	R\$ -	R\$ 4.068.597,85
					R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 2.385.647,67	R\$ -	R\$ 2.385.647,67
					R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ 573.938,43	R\$ -	R\$ 573.938,43
					R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 31.339.811,81	83,43%		31.339.811,81		

Local e data: Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.
Comissão de Fiscalização
 Engº José Yedrobo Netto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 RNP-120776286-5

(Assinatura)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		RESUMO DE MEDIÇÃO		SINFRA					
ODO SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% DIZ
1.0 INSTALAÇÃO DO CARTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO									
2.5 00 0001 10	Instalação de Carteiro e Acompanhamento	q	1,000	-	1,000	1,000	484.358,35	484.358,35	100,00%
2.5 00 0002 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	q	1,000	-	0,500	0,500	7.990,48	7.990,48	50,00%
2.5 00 0002 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	q	1,000	-	1,000	1,000	22.147,75	22.147,75	100,00%
2.5 00 0002 24	Desmobilização de Equipamento Rodante	q	1,000	-	1,000	1,000	22.147,75	22.147,75	100,00%
2.5 00 0002 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,67	66.571,67	100,00%
2.5 00 0002 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,68	66.571,68	100,00%
SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 581.068,25 85,73%									
1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRO									
2.5 00 0001 01	Administração local da Obra - Despesas Fixas	q	1,00	-	1,000	1,000	105.799,86	105.799,86	100,00%
2.5 00 0001 02	Administração local da Obra - Despesas Variáveis	mês	18,00	-	13,000	13,000	5.448,17	70.806,21	72,22%
-	Manutenção e Serviços de Consumo	mês	18,00	-	13,000	13,000	19.829,98	257.789,74	72,22%
-	Alimentação Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	19.721,08	256.374,04	72,22%
-	Aluguel de Veículos para Deslocamento Local do Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	7.852,65	102.084,45	72,22%
-	Locação de Equipamentos para Controle Tecnológico	mês	18,00	-	13,000	13,000	4.101,13	53.314,69	72,22%
-	Deslocamento para Dabandas do Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	104.267,12	1.355.472,56	72,22%
2.5 00 0001 03	Administração local da Obra - Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	9.895,85	128.046,05	72,22%
-	Administração e Gestão Ambiental	m²	25,00	-	25,000	25,000	258,16	6.454,00	100,00%
74209/001	Placa de Obra	unid.	1,000	-	-	-	2.275,39	-	0,00%
2.5 00 0002 30	Marco de Concreto de Identificação da Obra	unid.	1,000	-	-	-	2.275,39	-	0,00%
SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 2.336.761,60 73,15%									
2.0 TERRAPLENAGEM									
2.5 01 0000 00	Desm., Desc., Limpeza, Áreas com árvores diâmetro até 0,15 M	m²	1.123.042,500	-	1.123.042,500	1.123.042,500	0,31	348.143,17	100,00%
2.5 01 0100 00	Deslocamento de árvores diâmetro 0,15 m a 0,30 m	unid.	50,000	-	-	-	30,51	-	0,00%
2.5 01 1000 01	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT até 50 M	m³	48.126,418	-	48.126,418	48.126,418	1,58	-	-
2.5 01 1002 23	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 200 a 400 M c/e	m³	509.155,235	-	509.155,232	509.155,232	5,00	240.031,59	100,00%
2.5 01 1002 24	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 400 a 600 M c/e	m³	275.873,198	-	275.874,205	275.874,205	6,29	3.202.586,78	100,00%
2.5 01 1002 25	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 600 a 800 M c/e	m³	23.567,294	-	23.567,294	23.567,294	6,99	1.938.360,69	100,00%
2.5 01 1002 26	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 800 a 1000 M c/e	m³	19.677,287	-	19.677,287	19.677,287	7,39	174.162,30	100,00%
2.5 01 1002 27	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 1000 a 1200 M c/Carregadora	m³	7.419,850	-	7.419,850	7.419,850	2,83	153.838,41	99,87%
2.5 01 3000 03	Esc. Carga Transp. Solos moles DMT 400 a 600 M	m³	291.659,703	-	291.659,785	291.659,785	18,14	134.596,07	100,00%
2.5 01 5100 00	Compactação de Alterros a 95,00% do Proctor Normal	m³	592.157,578	-	592.139,472	592.139,472	2,36	688.295,85	100,00%
2.5 01 5100 00	Compactação de Alterros a 100,00% do Proctor Intermediário	m³	-	-	-	-	-	1.397.449,15	100,00%
SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM 8.288.064,01 99,98%									

Eng. José Teodoro Neto
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013
 RNP-120776286-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE	
										Nº Contrato
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Rodovia: MT - 336 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONÍO DO LESTE / PVA ENTR:PM-130 Estreito: 51,05 KM Referência: 219 (Vigilância Financeira) Medição Provisória Ordem Início serviço: 12/07/2013 - 08/12/2013 Período Med. Simples: 01/12/2013 a 31/12/2013										
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
3.0	Regularização do Sub. Leito	m²	655.786,930	-	655.786,930	655.786,930	0,72	472.168,02	100,00%	
2.5 02 110 00	Sub - Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	128.019,512	-	128.019,512	128.019,512	12,12	1.551.596,48	100,00%	
2.5 02 200 01	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	121.743,030	-	45.489,600	45.489,600	12,12	551.333,95	37,27%	
2.5 02 300 00	Impregnação (execução)	m²	519.796,020	-	194.400,000	194.400,000	0,26	50.544,00	37,40%	
2.5 02 400 00	Pintura de Ligação (execução)	m²	519.796,020	-	194.400,000	194.400,000	0,17	33.048,00	37,40%	
2.5 02 510 51	Conc. Betuminoso usado a quente - capa rolamento AC/BC	t	62.375,762	-	23.328,000	23.328,000	157,74	3.679.758,72	37,40%	
SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 6.338.449,17										
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO										
4.0	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	-	1.399,680	1.399,680	1.310,31	1.834.014,70	37,40%	
2.5 02 999 01	Fornecimento de Asfalto Diluído CH-30	t	623,758	-	233,280	233,280	2.048,06	477.771,43	37,40%	
2.5 02 999 04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica BR-1C	t	207,919	-	77,760	77,760	1.219,55	94.832,20	37,40%	
SUB-TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 2.406.618,33										
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO										
3.0	Transporte local em rod. Não pav. De sub-base	bdm	6.137.127,800	-	6.120.769,279	6.120.769,279	0,66	4.039.707,72	99,73%	
2.5 09 001 05	Transporte local em rod. Não pav. De base	bdm	5.836.181,152	-	5.829.250,330	5.829.250,330	0,66	3.847.305,21	99,88%	
2.5 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	-	783,360	783,360	141,80	111.080,44	20,93%	
2.5 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CH-30	t	623,758	-	130,560	130,560	141,80	18.513,40	20,93%	
2.5 09 009 04	Transporte de Emulsão Asfáltica BR-1C	t	207,919	-	43,520	43,520	141,80	6.171,13	20,93%	
SUB-TOTAL DE TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO 8.022.777,90										
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA										
2.5 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	490,000	-	-	-	42,59	-	0,00%	
2.5 04 900 71	Sarjeta cantoneira central de concreto - SCC 01 - AC/BC	m	442,000	-	-	-	35,55	-	0,00%	
2.5 04 910 51	Mão fio de concreto - MFC 01 - AC/BC - tipo B - (sarjeta de 50,0 cm)	m	1.517,000	-	-	-	66,15	-	0,00%	
2.5 04 910 53	Mão fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	20.990,000	-	-	-	32,09	-	0,00%	
2.5 04 910 55	Mão fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	993,000	-	-	-	32,24	-	0,00%	
2.5 04 940 52	Descida d'água tipo rápido - canal retâng. - DAR 02 - AC/BC	m	871,250	-	-	-	87,88	-	0,00%	
2.5 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	unid.	402,000	-	-	-	46,60	-	0,00%	
2.5 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	unid.	13,000	-	-	-	55,69	-	0,00%	
2.5 04 950 62	Dispersor de energia - DES 02 - AC/BC	unid.	2.000	-	-	-	289,78	-	0,00%	
2.5 04 950 71	Dispersor de energia - DES 01 - AC/BC/PC	unid.	468,000	-	-	-	281,04	-	0,00%	
2.5 09 001 31	Transporte comercial Chasc. 10m3 em rodov. Não pav. - AC/BC/PC	bdm	128.906,619	-	-	-	0,52	-	0,00%	
2.5 09 002 91	Transporte comercial Chasc. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	bdm	1.109.571,877	-	-	-	0,33	-	0,00%	
SUB-TOTAL DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA 8.827,93										
OBRAS DE ARTE CORRENTE										
2.5 04 100 01	Execução mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³	811,612	-	811,618	811,618	5,950	4.827,93	99,98%	
2.5 03 940 01	Relevo e compactação	m³	600,221	-	600,220	600,220	31,970	19.189,03	100,00%	
2.5 04 100 51	Corpo BSTC D=0,60m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	13,000	-	-	-	439,020	-	0,00%	
2.5 04 100 52	Corpo BSTC D=0,80m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	44,000	-	-	-	619,140	-	0,00%	
2.5 04 100 53	Corpo BSTC D=1,00m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	128,000	-	128,000	128,000	869,760	111.329,28	100,00%	
2.5 04 100 54	Corpo BSTC D=1,20m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	15,000	-	15,000	15,000	1.165,630	17.484,45	100,00%	
2.5 04 101 52	Boca BSTC D=0,80m normal - AC/BC/PC	unid.	4,000	-	-	-	1.599,160	-	0,00%	
2.5 04 101 53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	unid.	14,000	-	14,000	14,000	2.459,570	34.013,98	100,00%	
2.5 04 101 54	Boca BSTC D=1,20m normal - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	3.458,700	6.917,40	100,00%	

UNING/SINFRA
Fls. 18
Ass. [assinatura]

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obras:		Nº Contrato		140/2013/000/00-SETPU		Prazo de Execução		1260		
Rodovias:		Data Assinatura		09/07/2013		Prazo Restante		357		
Trechos:		Publicação		09/07/2013		Vr. Contratual PI		R\$ 47.206.688,79		
Extensão:		Processo Orig.		45226/2013-SETPU		Vr. Acum. Medido PI		R\$ 31.339.811,81		
Referência:		Termo Aditivo N:		21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória		Vr. Acum. Programado PI				
Ordem Início serviço:		Termo Re-Ratificação		140/2013/03101-SETPU		Vr. Programado Prox. mês PI				
Período Med. Simples:		Período Acum.:		12/07/2013 a 31/12/2015		FIRMA:		Construtora Tripolo LTDA		
COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	RESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MIEDIO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE	
2.5 04 101 56	Boca BSTD D=0,60m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	1.000	-	-	-	1.029,850	-	0,00%	
2.5 04 101 58	Boca BSTD D=1,00 m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	2.000	-	2.000	2.000	2.546,520	5.093,04	100,00%	
2.5 04 101 62	Boca BSTD D=0,80 m - esc.=30 - AC/BC/PC	unid.	1.000	-	-	-	1.870,750	-	0,00%	
2.5 04 110 53	Corpo BDTIC D=1,50m - CA=4, inclusive berge e dentes - 1,000 AC/BC/PC	m	66,000	-	65,000	65,000	3.564,150	231.669,75	95,59%	
2.5 04 111 53	Boca BDTIC D=1,50m normal - AC/BC/PC	unid.	8,000	-	8,000	8,000	8.288,870	66.310,96	100,00%	
2.5 04 210 57	Corpo BOCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	m	20,000	-	20,000	20,000	5.711,120	114.222,40	100,00%	
2.5 04 211 53	Corpo BOCC 2,50 x 2,50 m normal - AC/BC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	27.878,780	55.757,56	100,00%	
2.5 04 930 51	Caixa coleira de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.732,600	-	0,00%	
2.5 04 930 52	Caixa coleira de sarjeta - CCS 02 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.696,160	-	0,00%	
2.5 04 991 51	Tempa conc. p/casa colet. (4 nervuras) - TTC 01 - AC/BC	unid.	2,000	-	-	-	187,460	-	0,00%	
2.5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. solo pav.	bakm	23.173,977	-	22.177,730	22.177,730	11.532,41	64.344,81	94,88%	
2.5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. Pavimentada	bakm	211.139,460	-	194.984,300	194.984,300	0,330	64.344,81	92,35%	
5.5 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	79,000	-	79,000	79,000	75,950	6.000,05	100,00%	
SUB-TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTE										
8.0 OBRAS COMPLEMENTARES										
2.5 06 110 00	Cerca de Arame Farpado com Suporte de Madeira	m	3.441,400	-	3.451,400	3.451,400	21,79	75.206,00	100,25%	
4.5 06 010 01	Defensa Semi-Habitat Simples (fornecimento e implantação)	m	128,000	-	-	-	219,80	-	0,00%	
4.5 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples (tom/limp)	m	64,000	-	-	-	242,51	-	0,00%	
SUB-TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES										
9.0 SINALIZAÇÃO										
2.5 06 100 21	Platina base - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	20.694,950	-	-	-	14,56	-	0,00%	
4.5 06 100 22	Pintura selar e zebrao - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	174,920	-	-	-	20,62	-	0,00%	
4.5 06 121 01	Forn. E colocação de lacha reflet. Bidimensional	unid.	16.647,000	-	-	-	13,30	-	0,00%	
4.5 06 121 11	Fornec. E Colocação de tachão reflexivo bidimensional	unid.	305,000	-	-	-	39,82	-	0,00%	
4.5 06 200 02	Fornec. E Implantação placa Sinalização Totalmente reflexiva	m²	179,860	-	-	-	371,54	-	0,00%	
SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO										
10.0 CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
2.5 05 100 00	Envelhecimento	m²	10.036,370	-	10.036,370	10.036,370	7,72	77.480,77	100,00%	
2.5 05 102 00	Hidrosemeadura	m²	1.287,066,577	-	1.128.915,610	1.128.915,610	1,75	1.975.602,31	87,70%	
3.5 01 030 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (ajustes e empedrado)	m³	826.886,370	-	826.886,370	826.886,370	0,22	181.795,00	100,00%	
Shapi 73967/003	Plantio de árvores e arbustos	unid.	11.402,000	-	11.402,000	11.402,000	28,71	327.351,42	100,00%	
SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
								TOTAL GERAL	31.339.811,81	67,38%
								A DEDUZIR MEDIÇÕES ANTERIORES	31.339.811,81	0,00%
								TOTAL DESTA MEDIÇÃO	0,00	0,00%

Importa o valor a ser pago de R\$

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.

Fiscalização:

Eng. Jose Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5





MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.

Ao Ilmo Sr.

Eng.º. José Carlos Ferreira da Silva

M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

Nesta

Assunto: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória

Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU

Venho, pelo presente encaminhar a 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/12/2015 a 31/12/2015, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato

21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Atenciosamente

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Sub-Trecho:
Referência: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Ordem de Paralisação: 01/12/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 29/04/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Extensão: 51,05 KM
Firma: Construtora Tripolo LTDA
Instrumento Contratual: 140/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 45226/2013-SETPU
Data da Assinatura: 09/07/2013
Data da Publicação: 09/07/2013
Naturaza dos Serviços: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Prazo Contratual: 900
Término Previsto: 23/12/2016
Ordem de Início de Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Prazo Decorrido do Contrato: 903 Dias
Valor Contratual (PI): R\$ 38.017.467,91
Valor Termo Aditivo: R\$ 9.189.220,88
Valor Contratul + T. Aditivo: R\$ 47.206.688,79
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 31.339.811,81
Saldo Contratual (PI) : R\$ 15.866.876,98
Valor Empenhado no Exercício:

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.

Atenciosamente


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Sub-Trecho:
Referência: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Ordem de Paralisação: 01/12/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 29/04/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Extensão: 51,05 KM
Firma: Construtora Tripolo LTDA
Instrumento Contratual: 140/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 45226/2013-SETPU
Data da Assinatura: 09/07/2013
Data da Publicação: 09/07/2013
Naturaza dos Serviços: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Prazo Contratual: 900
Término Previsto: 23/12/2016
Ordem de Início de Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Prazo Decorrido do Contrato: 903 Dias
Valor Contratual (PI): R\$ 38.017.467,91
Valor Termo Aditivo: R\$ 9.189.220,88
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 47.206.688,79
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 31.339.811,81
Saldo Contratual (PI) : R\$ 15.866.876,98
Valor Empenhado no Exercício:

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.

Atenciosamente


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA	Firma: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
FISCALIZAÇÃO:	Contrato: 140/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT - 336	Data Assinatura: 09/07/2013
Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTRº MT-130	Data de Aprovação: 09/07/2013
Extensão: 51,05 Km	Ordem de Serviço : 12/07/2013-087/2013
	Prazo: 540 (Quinhentos e Quarenta) dias
	Obra: Pavimentação Asfáltica de Rodovia
	Termo Aditivo:
	Data de Publicação:
Desempenho relativo aos serviços da Pavimentação Asfáltica	
Serviços Executados entre: 01/12/2015 a 31/12/2015	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,9				
2) Pessoal	0,9				
3) Instalações	0,8				
4) Cronograma Físico	0,9				
5) Qualidade dos Serviços	0,9				
6) Atend. À Fiscalização	0,9				
7) Administração da Obra	0,9				
Local e Data:	Eng. José Teodoro Neto - Fiscal SETPU- 505/2013 RNP- 120776286-5				
Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.					

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	
1) Equipamento	0,9	1,50	1,35	DESEMP. PARCIAL = $\frac{NxP}{10}$ $\frac{8,85}{10} = \mathbf{0,89}$ Conceito: Excelente
2) Pessoal	0,9	1,50	1,35	
3) Instalações	0,9	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,9	2,00	1,7	
5) Qualidade dos Serviços	0,9	3,00	2,7	
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,85	
7) Administração da Obra	0,9	0,50	0,45	
TOTAL	6,2	10,00	8,85	
OBSERVAÇÕES:				
LOCAL E DATA				
Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.			_____ Coordenador de Obras de Transportes	

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

_____ Superintendente de Obras de Transportes
--




DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT - 336

Trecho: Fim do trecho pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTR° MT-130

Sub-Trecho:

Extensão: 51,05 km

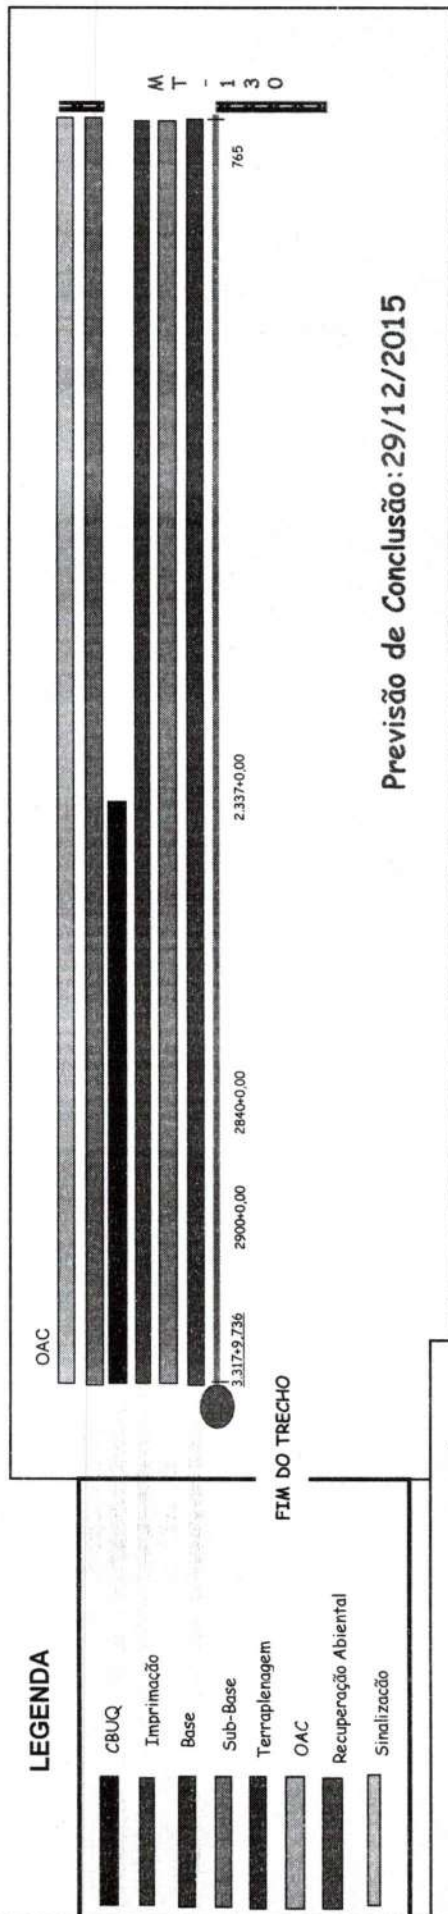

ATIVIDADE	CONCLUÍDO	ATACADO	Atacado (%)	Concluído (%)
QUILOMETRAGEM	27	24	100,00	100,00
ESTACQUEAMENTO	30	48	100,00	100,00
TERRAPLENAGEM	33	45	100,00	100,00
SUB-BASE	36	42	100,00	100,00
BASE	39	40	0,00	0,00
IMPRIMAÇÃO	42	40	0,00	0,00
REVESTIMENTO - (CBUQ)	45	40	0,00	0,00
OBRAS DE ARTES CORRENTE	48	40	100,00	75,00
DRENAGEM	51,05	40	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARES	51,05	40	57,52	48,80
SINALIZAÇÃO	51,05	40	0,00	0,00

Jose Teodoro Neto
Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU - Port. 505/2013
RNP-120776286-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SJOT

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 140/2013/00/00 RODOVIA MT-336	FIRMA: Construtora Tripolo LTDA	VALOR CONTRATUAL 38.017.467,91		ADITAMENTO 9.189.220,88		TOTAL 47.206.688,79
		SERVICO PAVIMENTAÇÃO		FISCAL		
Nº DO PROCESSO	TRECHO: Fim do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Oeste/Primavera do Leste-ENTRº MT-130	MEDIÇÕES P.I		Engº José Teodoro Neto		TOTAL GERAL
		PERIODO	ACUMULADO	MEDIÇÕES REAJUST.	TOTAL MEDIÇÃO	
REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	1260	PERIODO	ACUMULADO	TOTAL GERAL	Saldo P. INICIAIS
1ª medição	01/12/2015 a 31/12/2015	20	12/07/13 a 31/07/13	1.994.507,70	1.994.507,70	45.212.181,09
2ª medição		31	01/08/13 a 31/08/13	4.244.424,32	4.244.424,32	42.962.264,47
3ª medição		30	01/09/13 a 30/09/13	6.955.259,60	6.955.259,60	40.251.429,19
4ª medição		31	01/10/13 a 31/10/13	8.666.924,71	8.666.924,71	38.539.764,08
5ª medição		30	01/11/13 a 30/11/13	10.551.509,24	10.551.509,24	36.655.179,55
6ª medição		31	01/12/13 a 31/12/13	14.068.930,75	14.068.930,75	33.137.758,04
7ª medição		31	01/01/14 a 31/01/14	17.792.996,24	17.792.996,24	29.413.692,55
8ª medição		28	01/02/14 a 28/02/14	19.051.979,67	19.051.979,67	28.154.709,12
9ª medição		31	01/03/14 a 31/03/14	19.975.132,63	19.975.132,63	27.231.556,16
10ª medição		30	01/04/14 a 30/04/14	20.701.011,46	20.701.011,46	26.505.677,33
11ª medição		31	01/05/14 a 31/05/14	21.282.719,33	21.282.719,33	25.923.969,46
12ª medição		30	01/06/14 a 30/06/14	24.311.627,86	24.311.627,86	22.895.060,93
13ª medição		31	01/07/14 a 31/07/14	28.380.225,71	28.380.225,71	18.826.463,08
14ª medição		33	29/04/15 a 31/05/15	28.380.225,71	28.380.225,71	18.826.463,08
15ª medição		30	01/06/15 a 30/06/15	28.380.225,71	28.380.225,71	18.826.463,08
16ª medição		31	01/07/15 a 31/07/15	28.380.225,71	28.380.225,71	18.826.463,08
17ª medição		30	01/08/15 a 30/08/15	30.765.873,38	2.385.647,67	16.440.815,41
18ª medição		30	01/09/15 a 30/09/15	30.765.873,38	-	16.440.815,41
19ª medição		31	01/10/15 a 31/10/15	30.765.873,38	-	16.440.815,41
20ª medição		30	01/11/15 a 30/11/15	31.339.811,81	573.938,43	15.866.876,98
21ª medição		31	01/12/15 a 31/12/15	31.339.811,81	-	15.866.876,98
Prezo decorridos e saldo		903				
Local e data:		357				


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Pont 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2016.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra:	CONTRATO		140/2013/00/00-SETPU		Prazo Atual:		900 Dias		Valor Contratual R\$:		38.017.467,91	
	Rodovia:		MT- 336		Aditivo de prazo:		360 Dias		Valor Aditivo R\$:		9.189.220,88	
Trecho:	FILM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRªMT-130				Prazo Total:		1.260 Dias		Valor Contratual + Aditivo R\$:		47.206.688,79	
Extensão	51,05 KM				Firma:		CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA		01/10/2013 a 31/10/2013		01/11/2013 a 30/11/2013	
INICIO:	12/07/2013 a 31/07/2013		01/08/2013 a 31/08/2013		01/09/2013 a 30/09/2013		01/10/2013 a 31/10/2013		01/11/2013 a 30/11/2013			
TÉRMINO:	29/12/2015		DIAS CORRIDOS		20 / 20		31 / 51		30 / 61		31 / 112	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	85,73%	581.068,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	8,87%	283.369,85	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM	12,62%	1.130.069,58	23,21%	2.078.800,63	9,37%	839.531,21	14,01%	1.255.032,85	0,07%	6.510,00	0,07%	6.510,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	1,51%	204.845,76	0,00%	-	0,60%	80.740,80	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	15,83%	1.353.834,83	0,00%	-	4,25%	363.422,86	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	17,41%	141.507,50	35,13%	285.516,28	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	63,39%	75.206,01	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	41,83%	1.187.588,88	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,23%		4,77%		5,74%		3,63%		3,99%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	4,23%		5,99%		14,73%		19,36%		22,35%			
FATURAMENTO SIMPLES	1ª	1.954.507,69	2ª	2.243.916,61	3ª	2.710.835,28	4ª	1.711.665,12	5ª	1.894.584,53		
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	1.954.507,69	MED	4.294.424,30	MED	6.955.259,58	MED	8.666.924,69	MED	10.551.509,22		


 Engº Jose Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

UNIMAG/SINFRA
 Fis. 26
 Nome P
 Área



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obras:	Pavimentação Asfáltica	CONTRATO	140/2013/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$:	900 Dias		Valor Contratual + Aditivo R\$:
			PRazo Atual:	PRazo Total:		Valor Aditivo R\$:	Valor Contratual R\$:	
Rodovia:	MT - 336				38.017.467,91			9.189.220,88
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTR ^{MT-130}				47.206.688,79			47.206.688,79
Extensão	51,05 KM							
INICIO:	04/11/2013	01/12/2013 a 31/12/2013	01/01/2014 a 31/01/2014	01/02/2014 a 26/02/2014	01/03/2014 a 31/03/2014	01/04/2014 a 30/04/2014	Firma: CONSTRUTORA TRIPOLTO LTDA	
TÉRMINO:	29/12/2015	31 / 173	31 / 204	28 / 232	31 / 263	30 / 293		
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	- 0,02	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	5,36%	171.115,97	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM	-1,74%	- 155.430,38	29,41%	2.633.650,60	12,15%	1.087.867,45	0,00%	-
SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	4,28%	580.410,72	3,98%	540.412,70	0,00%	-	0,28%	38.102,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	34,16%	2.921.325,26	0,16%	13.403,68	0,00%	-	8,35%	713.934,58
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	- 0,02	43,13%	350.566,53	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	- 0,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	- 0,01	0,53%	14.916,00	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	7,45%		7,89%		2,67%		1,95%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	29,80%		57,69%		40,36%		47,31%	
FATURAMENTO SIMPLES	6ª	3.517.421,51	7ª	3.724.065,49	8ª	1.258.983,43	9ª	925.152,96
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	14.068.930,73	MED	17.792.996,22	MED	19.051.979,65	MED	19.975.132,61
NOTAS								725.878,83
								20.701.011,44

Engº Jose Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Prazo Atual:** 900 Dias **Valor Contratual R\$:** 38.017.467,91
Rodovia: MT- 336 **Aditivo de prazo:** 360 Dias **Valor Aditivo R\$:** 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE /PVA-ENTRªMT-130 **Valor Contratual + Aditivo R\$:** 47.206.688,79
Extensão: 51,05 KM **Prazo Total:** 1.260 Dias **Firma:** CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

INÍCIO: 04/11/2013	MÊS/ANO	01/05/2014 a 31/05/2014		01/06/2014 a 30/06/2014		01/07/2014 a 31/07/2014		01/12/2014 a 29/04/2015		29/04/2015 a 31/05/2015	
		31 / 314	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
TÉRMINO: 29/12/2015	DIAS CORRIDOS	31		30	354	31	385	31	535	33	568
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO		5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM		0,00%	-	-6,79%	607.967,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		0,56%	76.326,91	3,12%	422.793,01	17,81%	2.414.802,94	0,00%	-	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		0,00%	-	0,00%	-	20,93%	1.346.913,96	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO		4,25%	363.162,21	19,69%	1.683.298,87	1,59%	135.764,97	0,00%	-	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE		-3,56%	28.897,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		0,00%	-	47,89%	1.359.668,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		1,23%		6,42%		8,62%		0,00%		0,00%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		45,08%		51,00%		60,12%		60,12%		60,12%	
FATURAMENTO SIMPLES		11ª	581.707,87	12ª	3.028.308,52	13ª	4.068.597,85			14ª	
FATURAMENTO ACUMULADO		MED	21.282.719,31	MED	24.311.627,84	MED	28.380.225,69			MED	28.380.225,69

OBRA PARALIZADA

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Jose Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

URMG/SINFRA
 Fil. 28
 Num. P
 Ass.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Prazo Atual:** 900 Dias **Valor Contratual R\$:** 38.017.467,91
Rodovia: MT- 336 **Aditivo de prazo:** 360 Dias **Valor Aditivo R\$:** 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR"MT-130 **Valor Contratual + Aditivo R\$:** 47.206.688,79
Extensão: 51,05 KM **Firma:** CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

INÍCIO: 04/11/2013	MÊS/ANO	01/06/2015 a 30/06/2015	01/07/2015 a 31/07/2015	01/08/2015 a 31/08/2015	01/09/2015 a 30/09/2015	01/10/2015 a 31/10/2015
TÉRMINO: 29/12/2015	DIAS CORRIDOS	30 / 598	31 / 629	31 / 660	30 / 690	31 / 721
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	11,29%	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	13,27%	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	0,00%	-	0,00%	5,05%	0,00%	0,00%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	60,12%	-	60,12%	65,17%	65,17%	65,17%
FATURAMENTO SIMPLES	15ª	-	16ª	17ª	18ª	19ª
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	28.380.275,69	MED	28.380.225,69	MED	30.765.873,36

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Jose Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT- 336 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRªMT-130 Extensão: 51,05 KM		CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU		900 Dias Valor Contratual R\$: 38.017.467,91	
MÊS/ANO		PRazo Atual:		Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88	
INÍCIO: 04/11/2013		ADITIVO DE PRAZO:		Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79	
TÉRMINO: 29/12/2015		PRazo Total:		Firma: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	
DIAS CORRIDOS		30 / 751		01/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 31 / 873	
SERVIÇO		VALOR R\$		29 / 842	
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	PS	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	PS	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM	PS	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	PS	2,72%	368.435,01	0,00%	95.838,51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	PS	3,19%	205.503,42	0,00%	687.293,67
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	PS	0,00%	-	0,00%	813.717,37
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	PS	0,00%	-	0,00%	386.097,41
OBRAS DE ARTE CORRENTE	PS	0,00%	-	0,00%	171.020,18
OBRAS COMPLEMENTARES	PS	0,00%	-	0,00%	146.312,68
SINALIZAÇÃO	PS	0,00%	-	0,00%	8.127,76
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	PS	0,00%	-	0,00%	4.745,73
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 1,22% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90%					
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 66,39% 66,39% 66,39% 66,39% 71,29%					
FATURAMENTO SIMPLES 20º 21º MED MED MED					
FATURAMENTO ACUMULADO		31.339.811,79		31.339.811,79	
FATURAMENTO ACUMULADO		573.938,45		2.313.151,30	
FATURAMENTO ACUMULADO		31.339.811,79		33.652.965,09	

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Jose Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

Cr\$0






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT - 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130
Extensão: 51,05 KM


MÊS/ANO	CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU		PRazo Atual:		PRazo Total:		Valor Contratual R\$: Valor Aditivo R\$: Valor Contratual + Aditivo R\$:		Firma: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	
	01/04/2016 a 30/04/2016	01/05/2016 a 31/05/2016	01/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	31 / 995	31 / 1026
30 / 903	31 / 934	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	0,00%	360 Dias	0,00%	360 Dias	0,00%
DIAS CORRIDOS	DIAS CORRIDOS	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	3,00%	30 / 964	3,00%	30 / 964	3,00%
SERVIÇO										
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	3,00%	95.838,51	95.838,51	3,00%	95.838,51	3,00%	95.838,51	3,00%	95.838,51	3,00%
TERRAPLENAGEM		-	-		-		-		-	
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	6,00%	813.717,37	813.717,37	6,00%	813.717,37	6,00%	813.717,37	6,00%	813.717,37	6,00%
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	6,00%	386.097,41	386.097,41	6,00%	386.097,41	6,00%	386.097,41	6,00%	386.097,41	6,00%
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	2,00%	171.020,18	186.190,51	2,18%	186.190,51		-		-	
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	10,00%	146.312,68	146.312,68	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	10,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTE	1,00%	8.127,76	8.127,76	1,00%	8.127,76	1,00%	8.127,76	1,00%	8.127,76	1,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	4,00%	4.745,73	4.745,73	4,00%	4.745,73	4,00%	4.745,73	4,00%	4.745,73	4,00%
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	3,44%			3,48%		3,08%		3,08%		3,08%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	74,73%			81,29%		84,27%		84,27%		87,45%
FATURAMENTO SIMPLES		1.625.859,62	1.641.020,96		1.454.839,45		1.454.839,45		1.454.839,45	
FATURAMENTO ACUMULADO		35.278.824,71	36.919.854,67		38.374.694,12		39.829.533,56		41.284.373,01	


NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS


 Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

		CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU		900 Dias		Valor Contratual R\$:	
Obra: Pavimentação Asfáltica		Prazo Atual: 360 Dias		Valor Aditivo R\$:		38.017.467,91	
Rodovia: MT- 336		Aditivo de prazo: 360 Dias		Valor Contratual + Aditivo R\$:		9.189.220,88	
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRªMT-130		Prazo Total: 1.260 Dias		Valor Contratual + Aditivo R\$:		47.206.688,79	
Extensão: 51,05 KM		Firma: Cr\$0		01/12/2016		23/12/2016	
INÍCIO: 04/11/2013		01/09/2016 a 30/09/2016		30/11/2016		23 / 1140	
TERMINO: 29/12/2015		30 / 1056		30 / 1117			
MÊS/ANO		01/10/2016 a 31/10/2016		31 / 1067			
DIAS CORRIDOS		PS VALOR R\$ PS VALOR R\$		VALOR R\$			
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$			
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96.709,91
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	3,00%	95.838,51	2,00%	63.892,34	2,00%	63.892,34	59.201,07
TERRAPLENAGEM							
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	6,00%	813.717,37	4,00%	542.478,24	4,00%	542.478,24	442.528,89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	10,00%	643.495,69	10,00%	643.495,69	3,00%	193.048,71	231.713,98
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO							
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	146.312,68
OBRAS DE ARTE CORRENTE	1,88%	15.316,44					
OBRAS COMPLEMENTARES	4,00%	4.745,73	3,00%	3.559,29	3,00%	3.559,29	3.098,47
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	597.320,70
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	276.974,19
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	3,64%		2,97%		2,01%		3,30%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	91,10%		94,06%		96,07%		100,00%
FATURAMENTO SIMPLES		1.719.426,40		1.399.738,24		949.291,26	1.853.859,88
FATURAMENTO ACUMULADO		43.003.799,41		44.403.537,65		45.352.878,91	47.206.688,79


 Engº Jose Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

SINFRA

CRONOGRAMA FISICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT-336
Programa:
Trecho: Fm do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Oeste/
Primavera do Leste-ENTRº MT-130
Início : 12/07/2013
Prazo: 1260 (Mil duzentos e sessenta) dias
Termo previsto: 12/01/2015
Extensão : 51,05 km
Referência: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
Período Med. Simples: 01/12/2015 a 31/12/2015

Edital: Concorrência Pública 023/2009
Processo: 45226/2013
Contrato: 140/2013/00-00-SETPU
Data Assinatura: 09/07/2013
Data publicação: 09/07/2013
Preço do contrato: 38.017.467,91
Termo(s) Aditivo(s):
Data da Publicação
Vr. Termo aditivo a PI: 9.189.220,88
PI atual do contrato: 47.206.688,79
Firma Executora: CONSTRUTORA TRISPOLO LTDA
Período Acum: 12/07/2013 a 31/12/2015

Nesta a PI: R\$ -
Acumulada a PI: R\$ 31.339.811,81
Reajuste nesta: R\$ -
Reajuste acumulado: R\$ -
Total PI + Reaj: R\$ 31.339.811,81
Saldo contrato a PI: R\$ 15.866.876,98
Empenhado até esta data: R\$ 15.866.876,98
Saldo empenhado: R\$ 357
Saldo de prazo(Dias): 357
Preço inicial do contrato: R\$ 38.017.467,91
Termo de Re-licitação: 140/2013/03/01-SETPU

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA

SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM		VALOR % EXECUTADO	FINANCEIRO - MEDIÇÕES A PI + REAJUSTAMENTO		
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO		MEDIÇÕES	VALOR A PI	REAJUSTE
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO; MOBILIZAÇÃO; DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 581.066,25	85,73%	1ª	R\$ 1.994.507,70	R\$ 1.994.507,70
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ -	R\$ 2.336.761,60	73,15%	2ª	R\$ 2.249.916,62	R\$ 2.249.916,62
TERRAPLENAGEM	R\$ -	R\$ 8.268.064,01	99,98%	3ª	R\$ 2.710.835,28	R\$ 2.710.835,28
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 6.338.449,17	46,74%	4ª	R\$ 1.711.665,11	R\$ 1.711.665,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ -	R\$ 2.406.618,33	37,40%	5ª	R\$ 1.884.584,53	R\$ 1.884.584,53
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 8.022.777,90	93,82%	6ª	R\$ 3.517.421,51	R\$ 3.517.421,51
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	R\$ -	R\$ -	0,00%	7ª	R\$ 3.724.065,49	R\$ 3.724.065,49
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ -	R\$ 748.693,05	92,27%	8ª	R\$ 1.258.983,43	R\$ 1.258.983,43
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ 75.206,00	63,39%	9ª	R\$ 923.152,96	R\$ 923.152,96
SINALIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%	10ª	R\$ 725.878,83	R\$ 725.878,83
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ -	R\$ 2.582.173,50	90,24%	11ª	R\$ 581.707,87	R\$ 581.707,87
				12ª	R\$ 3.028.908,53	R\$ 3.028.908,53
				13ª	R\$ 4.068.597,85	R\$ 4.068.597,85
				14ª	R\$ -	R\$ -
				15ª	R\$ -	R\$ -
				16ª	R\$ -	R\$ -
				17ª	R\$ 2.385.647,67	R\$ 2.385.647,67
				18ª	R\$ -	R\$ -
				19ª	R\$ -	R\$ -
				20ª	R\$ 573.938,43	R\$ 573.938,43
				21ª	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ 31.339.811,81	83,43%	TOTAL	R\$ 31.339.811,81	R\$ 31.339.811,81
						15.866.876,98

Local e data: Curitiba, 05 de Janeiro de 2016.
Comissão de Fiscalização

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
RNP-120776286-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra:	Nº Contrato	140/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução	1360					
Rodoviar:	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	357					
Trecho:	Publicação	09/07/2013	Vr. Contratual PI	R\$ 47.206.688,79					
Extensão:	Processo Orig.	45226/2013-SETPU	Vr. Acum. Medido PI	R\$ 31.339.811,81					
Referência:	Termo Aditivo N°:		Vr. Acum. Programado PI						
Ordem Início serviço:	Termo Re-Ratificação	140/2013/03/01-SETPU	Vr. Programado Próxima PI						
Período Med. Simples:	Período Acum.:	12/07/2011 a 31/12/2015	FIRMA:	Construtora Tripolo LTDA					
1.0	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% DDF
2.5.00.000.10	INSTALAÇÃO DO CARTEIRO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO								
	Instalação de Carteiro e Acampamento	Gj	1,000	-	1,000	1,000	484.358,35	484.358,35	100,00%
2.5.00.000.20	Mobilização e Desmobilização de Pesoad	Gj	1,000	-	0,500	0,500	15.980,96	7.990,48	50,00%
2.5.00.000.22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	Gj	1,000	-	1,000	1,000	22.147,75	22.147,75	100,00%
2.5.00.000.24	Desmobilização de Equipamento Rodante	Gj	1,000	-	1,000	1,000	22.147,75	22.147,75	100,00%
	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	Gj	1,000	-	1,000	1,000	66.571,67	66.571,67	100,00%
	Mobilização de Equipamentos Pesado	Gj	1,000	-	1,000	1,000	66.571,67	66.571,67	100,00%
	Desmobilização de Equipamento Pesado	Gj	1,000	-	1,000	1,000	66.571,67	66.571,67	100,00%
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES							581.066,25	85,73%
1.1	LOGAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRO								
2.5.00.001.01	Administração local da Obra - Despesas Fixas	Gj	1,00	-	1,000	1,000	105.799,86	105.799,86	100,00%
2.5.00.001.02	Administração local da Obra - Despesas Variáveis								
	Materiais e Serviços de Consumo	mês	18,00	-	13,000	13,000	5.448,17	70.826,21	72,22%
	Alimentação Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	19.829,98	257.789,74	72,22%
	Aluguel de Veículos para Deslocamento Local do Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	19.721,08	256.374,04	72,22%
	Locação de Equipamentos para Controle Tecnológico	mês	18,00	-	13,000	13,000	7.852,65	102.084,45	72,22%
2.5.00.001.03	Deslocamento para Distança do Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	4.101,13	53.314,69	72,22%
	Administração local da Obra - Pessoal	mês	18,00	-	13,000	13,000	104.267,12	1.355.472,56	72,22%
	Administração e Gestão Ambiental	mês	18,00	-	13,000	13,000	9.895,85	128.646,05	72,22%
74209/001	Placa de Obra	m²	25,00	-	25,000	25,000	258,16	6.454,00	100,00%
2.5.00.000.30	Marco de Concreto de Identificação da Obra	unid.	1,000	-	1,000	1,000	2.275,39	2.275,39	100,00%
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES							2.316.761,60	75,15%
2.0	TERRAPLENAGEM								
2.5.01.000.00	Desm., Desl., Limpeza, áreas com árvores diâmetro até 0,15 m	m³	1.123.042,500	-	1.123.042,500	1.123.042,500	0,31	348.143,17	100,00%
2.5.01.010.00	Deslocamento de árvores diâmetro 0,15 m a 0,30 m	unid.	50,000	-	50,000	50,000	30,51	1.525,50	0,00%
2.5.01.100.01	Esc., Carga e Trampo, Mat. de 1º Cat., DMT até 50 M	m³	46.126,418	-	46.126,418	46.126,418	5,00	240.631,59	100,00%
2.5.01.100.23	Esc., Carga e Trampo, Mat. de 1º Cat., DMT de 200 a 400 M c/e	m³	509.155,292	-	509.155,292	509.155,292	6,29	3.202.586,78	100,00%
2.5.01.100.24	Esc., Carga e Trampo, Mat. de 1º Cat., DMT de 400 a 600 M c/e	m³	275.875,198	-	275.875,198	275.875,198	6,99	1.928.340,69	100,00%
2.5.01.100.25	Esc., Carga e Trampo, Mat. de 1º Cat., DMT de 600 a 800 M c. esc.	m³	23.567,294	-	23.567,294	23.567,294	7,39	174.162,30	100,00%
2.5.01.100.26	Esc., Carga e Trampo, Mat. de 1º Cat., DMT de 800 a 1000 M c. esc.	m³	19.672,287	-	19.672,287	19.672,287	7,83	153.838,41	99,87%
2.5.01.300.03	Esc., Carga Trampo, Solo mole DMT-400 a 600 M	m³	7.419,850	-	7.419,850	7.419,850	18,14	134.596,07	100,00%
2.5.01.510.00	Compactação de Aterros a 95,00 % do Proctor Normal	m³	291.650,703	-	291.650,703	291.650,703	2,36	688.295,85	100,00%
	Compactação de Aterros a 100,00 % do Proctor Indireto	m³	593.139,472	-	593.139,472	593.139,472	2,36	1.397.449,15	100,00%
	SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM							8.268.064,01	99,88%

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

UNIFORME SINFRA
Fls. 34
Nota
Ass.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

UN: SINFRA
Fil: 308
Nome: P
Area:

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Rodovial: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SARTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR/PMT-130
Extensão: 51,05 KM
Referência: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
Ordem início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013
Período Med. Simples: 01/12/2015 a 31/12/2015

Nº Contrato 140/2013/000-00-SETPU
Data Assinatura 09/07/2013
Publicação 09/07/2013
Processo Orig. 45236/2013-SETPU
Termo Aditivo N:
Termo Re-Ratificação 140/2013/03/01-SETPU
Período Acum.: 12/07/2013 a 31/12/2015

Prazo de Execução 1260
Prazo Restante 357
Vr. Contratual PI R\$ 47.206.686,79
Vr. Acum. Medição PI R\$ 31.339.811,91
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programa Prodimis PI
PRIMA: Construtora Tripolo LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
SERVÍCIOS DE PAVIMENTAÇÃO									
3.0									
2.5.02.110.00	Regularização do Sub Leito	m³	655.788,930	-	655.788,930	655.788,930	0,72	472.168,02	100,00%
2.5.02.200.00	Sub-Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	128.019,534	-	128.019,512	128.019,512	12,12	1.551.996,48	100,00%
2.5.02.200.01	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	121.743,030	-	45.489,600	45.489,600	12,12	551.333,95	37,37%
2.5.02.200.00	Limpeza (execução)	m²	519.798,020	-	194.400,000	194.400,000	0,26	50.544,00	37,40%
2.5.02.400.00	Pintura de Ligação (execução)	m²	519.798,020	-	194.400,000	194.400,000	0,17	33.048,00	37,40%
2.5.02.240.51	Conv. Betumoso Usinado a quente - capa rolamento AC/BC	t	62.375,762	-	23.328,000	23.328,000	157,74	3.679.758,72	37,40%
SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									46,74%
4.0									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO									
2.5.02.999.01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	-	1.399,680	1.399,680	1.310,31	1.834.014,70	37,40%
2.5.02.999.03	Fornecimento de Adetlo Diluído CM-30	t	623,758	-	233,280	233,280	2,048,06	477.771,43	37,40%
2.5.02.999.04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	207,919	-	77,760	77,760	1.219,55	94.832,20	37,40%
SUB-TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO									37,40%
5.0									
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO									
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De sub-base	bkm	6.137.127,680	-	6.120.769,279	6.120.769,279	0,66	4.039.707,72	99,73%
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De base	bkm	5.836.181,152	-	5.829.250,330	5.829.250,330	0,66	3.847.305,21	99,88%
2.5.09.009.01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	-	783,360	783,360	141,80	111.080,44	20,93%
2.5.09.009.03	Transporte de Adetlo Diluído CM 30	t	623,758	-	130,560	130,560	141,80	18.513,40	20,93%
2.5.09.009.04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR 1C	t	207,919	-	43,520	43,520	141,80	6.171,13	20,93%
SUB-TOTAL DE TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO									99,89%
6.0									
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA									
2.5.04.920.52	Superfície triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	490,000	-	-	-	42,59	-	0,00%
2.5.04.920.71	Superfície cunheiro central concreto - SCC 01 - AC/BC	m	442,000	-	-	-	35,55	-	0,00%
2.5.04.910.51	Muro fixo de concreto - MFC 01 - AC/BC - tipo B - (C/argata de 50,0 cm)	m	1.517,000	-	-	-	66,15	-	0,00%
2.5.04.910.53	Muro fixo de concreto - MFC 03 AC/BC	m	20.590,000	-	-	-	32,09	-	0,00%
2.5.04.910.55	Muro fixo de concreto - MFC 05 AC/BC	m	993,000	-	-	-	32,24	-	0,00%
2.5.04.940.52	Decidaçõ d'água tipo rápido - canal rotatng. - DAR 02 - AC/BC	m	671,250	-	-	-	87,88	-	0,00%
2.5.04.942.51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	unid.	402,000	-	-	-	46,50	-	0,00%
2.5.04.942.52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	unid.	13,000	-	-	-	55,69	-	0,00%
2.5.04.950.62	Disipador de energia - DES 02 - AC/PC	unid.	2,000	-	-	-	289,78	-	0,00%
2.5.04.950.71	Disipador de energia - DES 01 - AC/BC/PC	unid.	408,000	-	-	-	281,04	-	0,00%
2.5.09.001.91	Transporte comarcial 1 base. 10m3 em rodov. Não pav. - AC/BC/PC	bkm	128.506,619	-	-	-	0,52	-	0,00%
2.5.09.002.91	Transporte comarcial 1 base. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	bkm	1.109.571,877	-	-	-	0,33	-	0,00%
SUB-TOTAL DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA									0,00%
7.0									
OBRAS DE ARTE CORRENTE									
2.5.04.001.00	Escarpa mecânica de vala em material de 1a. Categoria	m³	811,612	-	811,418	811,418	5,950	4.827,93	99,98%
2.5.04.100.01	Relevo e compactação	m³	600,221	-	600,220	600,220	31,970	19.189,03	100,00%
2.5.04.100.51	Corpo BSTD D=0,60m - CA-4, inclusive bico e dentes - AC/BC/PC	m	13,000	-	-	-	439,020	-	0,00%
2.5.04.100.52	Corpo BSTD D=0,80m - CA-4, inclusive bico e dentes - AC/BC/PC	m	44,000	-	-	-	619,140	-	0,00%
2.5.04.100.53	Corpo BSTD D=1,00m - CA-4, inclusive bico e dentes - AC/BC/PC	m	128,000	-	128,000	128,000	869,760	111.329,28	100,00%
2.5.04.100.54	Corpo BSTD D=1,20m - CA-4, inclusive bico e dentes - AC/BC/PC	m	15,000	-	15,000	15,000	1.105,630	17.484,45	100,00%
2.5.04.101.52	Boca BSTD D=0,80m normal - AC/BC/PC	unid.	4,000	-	-	-	1.399,150	-	0,00%
2.5.04.101.53	Boca BSTD D=1,00m normal - AC/BC/PC	unid.	14,000	-	14,000	14,000	2.429,570	34.013,98	100,00%
2.5.04.101.54	Boca BSTD D=1,20m normal - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	3.458,700	6.917,40	100,00%
Eng. José Teodoro Neto Fiscal SETPU-Port. 505/2013 RNP-120776286-5									



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obras: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 Rodovia: MT- 336
 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130
 Extensão: 51,05 KM
 Referência: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
 Ordem Início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013
 Período Med. Simples: 01/12/2015 a 31/12/2015

Nº Contrato 140/2013.009/009-SETRU
 Data Assinatura 08/07/2013
 Publicação 09/07/2013
 Processo Orig. 45226/2013-SETRU
 Termo Aditivo N:
 Termo Re-Ratificação 140/2013.03/01-SETRU
 Período Acum.: 12/07/2013 a 31/12/2015

Prazo de Execução 1260
 V. Contratual PI 357
 V. Acum.Medido PI R\$ 47.206.688,79
 V. Programado Procr.mês PI 31.339.811,81

FIRMA: Construtora Tripolo LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% ENE
2.5 04 101 56	Boca B5TC D=0,60m - esc=15 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.029,850	-	0,00%
2.5 04 101 58	Boca B5TC D=1,00 m - esc=15 - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	2.546,570	5.093,04	100,00%
2.5 04 101 62	Boca B5TC D=0,80 m - esc=30 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.870,750	-	0,00%
2.5 04 110 53	Corpo BDTIC D=1,50m - CA-4, inclusive bento e dentes - 1,000 AC/BC/PC	m	66,000	-	65,000	65,000	3.564,150	231.669,75	95,99%
2.5 04 111 53	Corpo BDTIC D=1,50m normal - AC/BC/PC	unid.	8,000	-	8,000	8,000	8.288,870	66.310,96	100,00%
2.5 04 210 57	Corpo BDDC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	m	20,000	-	20,000	20,000	5.711,120	114.222,40	100,00%
2.5 04 211 53	Boca BDDC 2,50 x 2,50 m normal - AC/BC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	27.876,780	55.757,56	100,00%
2.5 04 930 51	Caixa coleira de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.732,600	-	0,00%
2.5 04 930 52	Caixa coleira de sarjeta - CCS 02 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.696,160	-	0,00%
2.5 04 991 51	Tampa coner. p/caixa colet. (4 rebarbas) - TCC 01 - AC/BC	unid.	2,000	-	-	-	187,460	-	0,00%
2.5 09 001 91	Transporte comercial C/ base. 10m3 rodov. não pav.	bdm	23.373,977	-	22.177,730	22.177,730	0,520	11.532,41	94,88%
2.5 09 002 91	Transporte comercial C/ base. 10m3 rodov. Pavimentada	bdm	211.139,460	-	194.984,300	194.984,300	0,330	64.344,81	92,35%
5.5 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	79,000	-	79,000	79,000	75,950	6.000,05	100,00%
	SUB-TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTE							748.693,05	92,27%
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES								
2.5 06 410 00	Cerca de Arame Enapado com Suporte de Madeira	m	3.441,400	-	3.451,400	3.451,400	21,79	75.206,00	100,00%
4.5 06 010 01	Defensiva Semi-Habitad Simples (fornecimento e implantação)	m	126,000	-	-	-	219,80	-	0,00%
4.5 06 010 02	Ancoragem de defensas semi-habitad simples (om/imp)	m	64,000	-	-	-	249,51	-	0,00%
	SUB-TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES							75.206,00	63,39%
9.0	SINALIZAÇÃO								
2.5 06 100 21	Platina laço - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	20.694,950	-	-	-	14,56	-	0,00%
4.5 06 100 22	Platina setas e zebrao - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	174,920	-	-	-	20,62	-	0,00%
4.5 06 121 01	Fornec. E colocação de tacha reflet. Bidimensional	unid.	16.047,000	-	-	-	13,30	-	0,00%
4.5 06 121 11	Fornec. E colocação de tacho refletiva bidimensional	unid.	305,000	-	-	-	39,82	-	0,00%
4.5 06 200 02	Fornec. E Implantação placa Sinalização Totalmente refletiva	m²	179,860	-	-	-	371,54	-	0,00%
	SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO								0,00%
10.0	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								
2.5 05 100 00	Eriçamento	m²	10.036,370	-	10.036,370	10.036,370	7,72	77.480,77	100,00%
2.5 05 102 00	Hidrosemeadura	m²	1.287.186,577	-	1.128.915,610	1.128.915,610	1,75	1.975.602,31	87,70%
3.5 01 930 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (laçadas e empilhamento)	m²	826.086,370	-	826.086,370	826.086,370	0,22	181.739,00	100,00%
Snapt 73962/003	Plantio de árvores e arbustos	unid.	11.402,000	-	11.402,000	11.402,000	28,71	327.351,42	100,00%
	SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							2.562.173,50	90,24%
	TOTAL GERAL							31.339.811,81	67,38%
	A DEDUZIR MEDIÇÕES ANTERIORES							31.339.811,81	0,00%
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO							0,00	

Importa o valor a ser pago de R\$

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2015.

Assinatura:

Assinatura
 Eng. José Teodoro Neto
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013
 RNP-120776286-5

UNIM
 Fls. 36
 Hora 10
 Assinatura



DESPACHO/N°009/UNIMG/SAOB/SINFRA



Interessado: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.

Referente: 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO 140/2013 – PROCESSO 29190/2016

A

SAOB

Secretaria Adjunta de Obras.

Sr. Secretario

- Considerando as Leis Federais nº 8.666/93 com alterações posteriores e 10.520/02 que versa sobre normas para aplicação das sanções administrativas em contratos da administração pública e dá outras providências.
- Considerando a cláusula contratual referenciada aos critérios de medição dos serviços que estabelece:

As medições dos serviços executados serão efetivadas preferencialmente no final de cada período mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Salvo guardando a primeira medição após ordem de início e medição final, após concluso o objeto (Obra), independente do período mensal.

Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição e a última medição (Medição Final).

- Considerando a cláusula contratual que versa sobre as sanções administrativas aplicáveis ao contratado se:

Por dia que exceder o prazo de conclusão dos serviços ou obras;

Os serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma.

Diante do exposto, orientamos:

Que o senhor Secretário Adjunto de Obras, gestor do órgão que exija do responsável pela fiscalização e execução dos contratos de obras públicas a explicitação dos critérios adotados para aferir os



serviços executados e seus respectivos valores computados nas planilhas de medições; conforme apresentado nos autos, cito fl 04.



Assim a autoridade competente para a decisão no processo em epígrafe, deverá analisar os autos e se posicionar, concordando ou não com a justificativa apresentada pela empresa Construtora Tripolo Ltda . Caso não concorde, deverá motivar sua posição, encaminhando os autos a área competente, para procedimento das penalidades previstas em contrato.

Caso concorde, remeter o processo 29190/2016 para arquivamento junto aos autos do processo administrativo que gerou esse contrato.

Remeto o processo a esta adjunta para que se tome ciência para tomada de providências.

Era o que este setor tinha a informar e segue o processo para deliberações.

Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto

Gestor de UNIMG - SINFRA

Secretaria Adjunta de Obras – SAOB – SINFRA/MT



Despacho

Processo nº 29190/2016

À SUAC,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a V.S.^a o processo nº 29190/2016 que se trata da 21ª medição provisória do instrumento contratual nº 140/2013/00/00-SETPU, referente ao período de 01/12/2015 a 31/12/2015, da empresa contratada Construtora Tripolo Ltda., considerando que a 21ª medição provisória não tem valor financeiro a ser pago e, portanto, nenhum documento contábil a ser gerado. Logo, em atendimento a orientação da Controladoria Geral do Estado, encaminha-se para apensar esta medição ao processo administrativo do contrato supracitado. E igualmente:

1) Informar que esta SAOB, após tomar conhecimento das informações contidas no despacho nº 009/UNIMG/SAOB/SINFRA, através do qual o chefe da Unidade de medição e Gerenciamento faz as devidas considerações, delibera por acatar à justificativa apresentada pela empresa Construtora Tripolo Ltda. (fl. 04), considerando que também estava previsto no cronograma físico-financeiro atualizado, elaborado pelo fiscal do contrato, Eng.º José Teodoro Neto (fls. 09/15).

2) Ressaltar que esta SAOB não autorizará qualquer pedido de aditivo de prazo de execução ou de vigência ao instrumento contratual nº 140/2013, considerando que conforme previsão atualizada do cronograma físico-financeiro anexo ao processo, o prazo de execução vigente, que termina no dia 23/12/2016 e que igualmente prevê as medições de valor zero nos períodos de chuva no Estado, é suficiente para finalizar a execução da obra, salvo fatores supervenientes às previsões contratuais, ou por restrições orçamentárias.

Sendo o que tínhamos a informar, coloco-me a disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional.

Em, 22 de fevereiro de 2.016.


Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
SAOB/SINFRA



SAADS/SINFRA
40
e
Ass.:


PROC Nº: 29190/2016

FLS.: 40 - -

DATA.: 02 / 02 / 2017

À
SUOF,

Considerando medição zerada da empresa, considerando que o arquivo e controle fica de posse da SUOF e CCONT, restituo processo para conhecimento e controle dos autos.


Eng.ª Civil Marciane Brevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistemática/SINFRA





Ass.:
41
e

MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

PROC Nº: 29.190/2016

FLS.: 41 - _____ - _____

DATA.: 09 / 03 / 2017

À
CGEO,

Encaminho os autos lançamento no sistema Geo-Obras e posterior encaminhamos dos autos a GEARQ para arquivo por tratar de medição gerada.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Secretário Adjunto de Adm. Sistêmica
em Substituição / SINFRA





DESPACHO

À GEARQ

ASSUNTO: Medição zerada – verificação no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras zerada devidamente verificada.

Encaminhamos a este setor para arquivamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



ex 291

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 160096/2016 Data: 04/04/2016 09:19
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: 24 MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 140/2013
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MT-3

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



IC. 340/2013.

N.E. - 16.000.210 - 2 F 151

19/4/16





MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Cuiabá, 01 de abril de 2016.

Ao Ilmo Sr.

Eng.º. José Carlos Ferreira da Silva

M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

Nesta

Assunto: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória

Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU

Venho, pelo presente encaminhar a 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/03/2016 a 31/03/2016, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato


24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Atenciosamente

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

Ed. Edgar Prado Arze Centro Político Administrativo – CPA – S/N , CEP 78049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613 - 6600





Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Sub-Trecho:
Referência: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Ordem de Paralisação: 01/12/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 29/04/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Extensão: 51,05 KM
Firma: Construtora Tripolo LTDA
Instrumento Contratual: 140/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 45226/2013-SETPU
Data da Assinatura: 09/07/2013
Data da Publicação: 09/07/2013
Naturaza dos Serviços: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Prazo Contratual: 1260 Dias
Término Previsto: 23/12/2016
Ordem de Início de Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Prazo Decorrido do Contrato: 994 Dias
Valor Contratual (PI): R\$ 38.017.467,91
Valor Termo Aditivo: R\$ 9.189.220,88
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 47.206.688,79
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 33.432.820,99
Saldo Contratual (PI) : R\$ 13.773.867,80
Valor Empenhado no Exercício:

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 01 de abril de 2016.

Atenciosamente


Eng° José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



ATESTADO

Atesto que a 24ª **Medição Provisória** dos Serviços de Pavimentação executados pela firma Construtora Tripolo LTDA, na Rodovia: MT - 336, trecho: Fim do trecho do pavimento – Divisa Santo Antonio do Leste /PVA-Entrª MT-130, com extensão de 51,05 Km, Objeto do IC nº 140/2013/STPU – Período de 01/03/2016 a 31/03/2016, foi analisada segundo Parâmetros Técnicos, não apresentando não-conformidades em relação à frente de serviço e avanço físico.

Cuiabá, 05 de abril de 2016.

Atenciosamente

Paulo Roberto Santos Dorilêo

Coordenador de Construção de Rodovias, Aeroportos e Obras de Arte Especiais



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

FISCALIZAÇÃO:

Rodovia: MT - 336
Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTRº MT-130
Extensão: 51,05 Km

Firma: Construtora Tripolo LTDA
Contrato: 140/2013/00/00-SETPU
Data Assinatura: 09/07/2013
Data de Aprovação: 09/07/2013
Ordem de Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Prazo: 1.260 Dias
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Termo Aditivo: 140/2013/04/01-SETPU
Data de Publicação: 12/08/2014

Desempenho relativo aos serviços da 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Serviços Executados entre: 01/03/2016 a 31/03/2016

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,9				
2) Pessoal	0,9				
3) Instalações	0,8				
4) Cronograma Físico	0,9				
5) Qualidade dos Serviços	0,9				
6) Atend. À Fiscalização	0,9				
7) Administração da Obra	0,9				

Local e Data:
Cuiabá, 01 de abril de 2016.

Eng. José Teodoro Neto - Fiscal SETPU- 505/2013
RNP- 120776286-5

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	
1) Equipamento	0,9	1,50	1,35	DESEMP. PARCIAL = $\frac{(NxP)}{10}$ $\frac{8,85}{10} = \mathbf{0,89}$ Conceito: Excelente
2) Pessoal	0,9	1,50	1,35	
3) Instalações	0,9	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,9	2,00	1,7	
5) Qualidade dos Serviços	0,9	3,00	2,7	
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,85	
7) Administração da Obra	0,9	0,50	0,45	
TOTAL	6,2	10,00	8,85	

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA
Cuiabá, 01 de abril de 2016.

Coordenador de Obras de Transportes

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes


Superintendente de Obras de Transportes



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 MATO GROSSO ESTÁDO DE TRANSFORMAÇÃO
 WWW.MT.GOV.BR

DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT - 336
 Trecho: Fim do trecho pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTR° MT-130
 Sub-Trecho:
 Extensão: 51,05 km

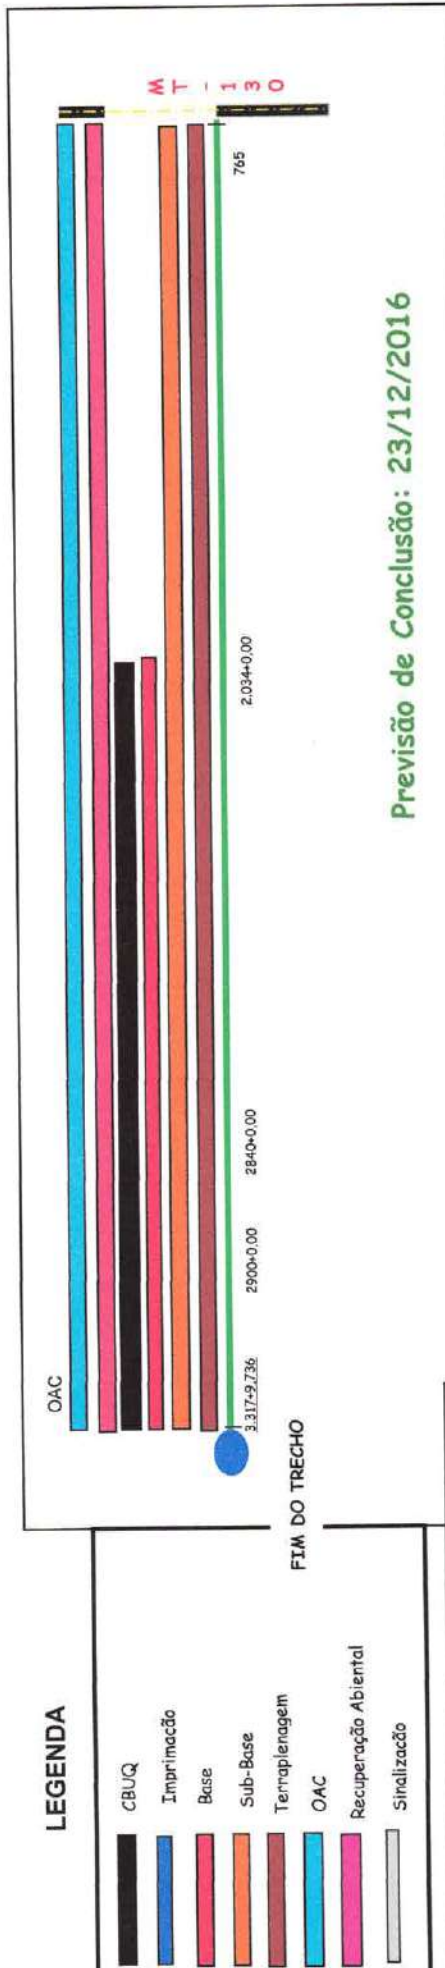

QUILOMETRAGEM	ATAQUEAMENTO	TERRAPLENAGEM	SUB-BASE	BASE	IMPRIMAÇÃO	REVESTIMENTO - (CBUQ)	OBRAS DE ARTES CORRENTE	DRENAGEM	OBRAS COMPLEMENTARES	SINALIZAÇÃO	CONCLUÍDO	Atacado (%)	Concluído (%)
0												100%	100%
3												100%	61%
6												100%	49%
9												49%	49%
12												49%	49%
15												100%	100%
18												100%	100%
21												0%	0%
24												63%	63%
27												42%	42%
30													
33													
36													
39													
42													
45													
48													
51,05													

Eng. José Teodoro Neto
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013
 RNP-120776286-5





GOVERNO DE
MATO GROSSO
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FISCALIAZADO DE LICITAÇÃO E EMPREITADA
RUA DEBILIA BRAGA, 2000 - CENTRO - 78000-000
FONE: (67) 3366-1111 FAX: (67) 3366-1112
WWW.MT.GOV.BR

ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 140/2013/00/00	RODOVIA MT-336	FIRMA: Construtora Tripolo LTDA	VALOR CONTRATUAL 38.017.467,91	ADITAMENTO 9.189.220,88	TOTAL 47.206.688,79	FISCAL											
						O. I. SERVIÇO 12/07/2013											
						Engº José Teodoro Neto											
Nº DO PROCESSO	TRECHO: DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DIAS CORRIDOS	MEDIÇÕES P.I		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL MEDIÇÃO	TOTAL GERAL	TOTAL MEDIÇÃO	TOTAL GERAL	SALDO P. INICIAIS	TOTAL				
				01/03/2016 a 31/03/2016	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO							ACUMULADO			
	1ª medição	12/07/13 à 31/07/13	20	1.994.507,70	1.994.507,70	-	-	1.994.507,70	1.994.507,70	-	1.994.507,70	45.212.181,09					
	2ª medição	01/08/13 à 31/08/13	31	2.249.916,62	4.244.424,32	-	-	2.249.916,62	4.244.424,32	-	4.244.424,32	42.962.264,47					
	3ª medição	01/09/13 à 30/09/13	30	2.710.835,28	6.955.259,60	-	-	2.710.835,28	6.955.259,60	-	6.955.259,60	40.251.429,19					
	4ª medição	01/10/13 à 31/10/13	31	1.711.665,11	8.666.924,71	-	-	1.711.665,11	8.666.924,71	-	8.666.924,71	38.539.764,08					
	5ª medição	01/11/13 à 30/11/13	30	1.884.584,53	10.551.509,24	-	-	1.884.584,53	10.551.509,24	-	10.551.509,24	36.655.179,55					
	6ª medição	01/12/13 à 31/12/13	31	3.517.421,51	14.068.930,75	-	-	3.517.421,51	14.068.930,75	-	14.068.930,75	33.137.758,04					
	7ª medição	01/01/14 à 31/01/14	31	3.724.065,49	17.792.996,24	-	-	3.724.065,49	17.792.996,24	-	17.792.996,24	29.413.692,55					
	8ª medição	01/02/14 à 28/02/14	28	1.258.983,43	19.051.979,67	-	-	1.258.983,43	19.051.979,67	-	19.051.979,67	28.154.709,12					
	9ª medição	01/03/14 à 31/03/14	31	923.152,96	19.975.132,63	-	-	923.152,96	19.975.132,63	-	19.975.132,63	27.231.556,16					
	10ª medição	01/04/14 à 30/04/14	30	725.878,83	20.701.011,46	-	-	725.878,83	20.701.011,46	-	20.701.011,46	26.505.677,33					
	11ª medição	01/05/14 à 31/05/14	31	581.707,87	21.282.719,33	-	-	581.707,87	21.282.719,33	-	21.282.719,33	25.923.969,46					
	12ª medição	01/06/14 à 30/06/14	30	3.028.908,53	24.311.627,86	-	-	3.028.908,53	24.311.627,86	-	24.311.627,86	22.895.060,93					
	13ª medição	01/07/14 à 31/07/14	31	4.068.597,85	28.380.225,71	-	-	4.068.597,85	28.380.225,71	-	28.380.225,71	18.826.463,08					
	14ª medição	29/04/15 à 31/05/15	33	-	28.380.225,71	-	-	-	28.380.225,71	-	28.380.225,71	18.826.463,08					
	15ª medição	01/06/15 à 30/06/15	30	-	28.380.225,71	-	-	-	28.380.225,71	-	28.380.225,71	18.826.463,08					
	16ª medição	01/07/15 à 31/07/15	31	-	28.380.225,71	-	-	-	28.380.225,71	-	28.380.225,71	18.826.463,08					
	17ª medição	01/08/15 à 30/08/15	30	2.385.647,67	30.765.873,38	-	-	2.385.647,67	30.765.873,38	-	30.765.873,38	16.440.815,41					
	18ª medição	01/09/15 à 30/09/15	30	-	30.765.873,38	-	-	-	30.765.873,38	-	30.765.873,38	16.440.815,41					
	19ª medição	01/10/15 à 31/10/15	31	-	30.765.873,38	-	-	-	30.765.873,38	-	30.765.873,38	16.440.815,41					
	20ª medição	01/11/15 à 30/11/15	30	860.397,06	31.626.270,44	-	-	860.397,06	31.626.270,44	-	31.626.270,44	15.580.418,35					
	21ª medição	01/12/15 à 31/12/15	31	-	31.626.270,44	-	-	-	31.626.270,44	-	31.626.270,44	15.580.418,35					
	22ª medição	01/01/16 à 31/01/16	31	-	31.626.270,44	-	-	-	31.626.270,44	-	31.626.270,44	15.580.418,35					
	23ª medição	01/02/16 à 29/02/16	29	-	31.626.270,44	-	-	-	31.626.270,44	-	31.626.270,44	15.580.418,35					
	24ª medição	01/03/16 à 31/03/16	31	1.806.550,55	33.432.820,99	-	-	1.806.550,55	33.432.820,99	-	33.432.820,99	13.773.667,80					
Prazo decorridos e saldo			994														

Local e data: Cuiabá, 01 de abril de 2016.

S. J. Natal
Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica
 Rodovia: MT - 336
 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
 Extensão: 51,05 KM

CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU

Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
 Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

Prazo Atual: 900 Dias
 Aditivo de prazo: 360 Dias
 Prazo Total: 1.260 Dias

Firma: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

MÊS/ANO	12/07/2013 a 31/07/2013		01/08/2013 a 31/08/2013		01/09/2013 a 30/09/2013		01/10/2013 a 31/10/2013		01/11/2013 a 30/11/2013	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
DIAS CORRIDOS	20 / 20		31 / 31		30 / 31		31 / 31		30 / 30	
SERVIÇO										
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	85,73%	581.068,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	8,87%	283.369,85	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM	12,62%	1.130.069,58	23,21%	2.078.800,64	9,37%	839.531,21	14,01%	1.255.032,85	0,07%	6.510,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	1,51%	204.845,76	0,00%	-	0,60%	80.740,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	15,83%	1.353.834,83	0,00%	-	4,25%	363.422,86
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	17,41%	141.507,50	35,13%	285.516,28	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	63,39%	75.206,01
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	41,83%	1.187.588,88
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,23%		4,77%		5,74%		3,63%		3,99%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	4,23%		8,99%		14,73%		18,36%		22,35%	
FATURAMENTO SIMPLES	1ª	1.994.507,70	2ª	2.249.916,62	3ª	2.710.835,28	4ª	1.711.665,11	5ª	1.894.584,53
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	1.994.507,70	MED	4.244.424,32	MED	6.955.259,60	MED	8.666.924,71	MED	10.551.509,24

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR-MT-130
Extensão: 51,05 KM

CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU
Prazo Atual: 900 Dias
Aditivo de prazo: 360 Dias
Prazo Total: 1.260 Dias

Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

Firma: CONSTRUTORA TRIPLO LTDA
01/03/2014 a 31/03/2014
01/04/2014 a 30/04/2014

MÊS/ANO	01/12/2013 a 31/12/2013		01/01/2014 a 31/01/2014		01/02/2014 a 28/02/2014		01/03/2014 a 31/03/2014		01/04/2014 a 30/04/2014	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
TÉRMINO: 23/12/2016										
DIAS CORRIDOS	31 / 173		31 / 204		28 / 232		31 / 263		30 / 293	
SERVIÇO										
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	0,02	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	5,36%	171.115,97	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM	-1,74%	- 155.430,38	29,41%	2.633.650,60	12,15%	1.087.867,45	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	4,28%	580.410,72	3,98%	540.412,70	0,00%	-	0,28%	38.102,40	0,59%	80.132,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	34,16%	2.921.325,26	0,16%	13.403,68	0,00%	-	0,00%	-	8,35%	713.934,58
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	- 0,02	43,13%	350.566,53	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	- 0,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	- 0,01	0,53%	14.916,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	7,45%		7,89%		2,67%		1,96%		1,54%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	29,80%		37,69%		40,36%		42,31%		43,85%	
FATURAMENTO SIMPLES	6ª	3.517.421,51	7ª	3.724.065,49	8ª	1.256.983,43	9ª	923.152,96	10ª	775.878,83
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	14.068.930,75	MED	17.792.996,24	MED	19.051.979,67	MED	19.975.132,63	MED	20.701.011,46

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130
Extensão: 51,05 KM

Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

Prazo Atual: 900 Dias
Aditivo de prazo: 360 Dias
Prazo Total: 1.260 Dias

Firma: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

INÍCIO: 12/07/2013	TÉRMINO: 23/12/2016	01/05/2014 a 31/05/2014		01/06/2014 a 30/06/2014		01/07/2014 a 31/07/2014		01/08/2014 a 29/04/2015		30/04/2015 a 31/05/2015	
		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
SERVIÇO											
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO		5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM		0,00%	-	-6,79%	- 607.967,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		0,56%	76.326,91	3,12%	422.793,01	17,81%	2.414.802,94	0,00%	-	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		0,00%	-	0,00%	-	20,93%	1.346.913,96	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO		4,25%	363.162,21	19,69%	1.683.298,87	1,59%	135.764,97	0,00%	-	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE		-3,56%	- 28.897,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		0,00%	-	47,89%	1.359.668,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		1,23%		6,42%		8,62%		0,00%		0,00%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		45,08%		51,50%		60,12%		60,12%		60,12%	
FATURAMENTO SIMPLES		11ª	581.707,87	12ª	3.028.908,53	13ª	4.068.597,85	14ª	-	14ª	-
FATURAMENTO ACUMULADO		MED	21.282.719,33	MED	24.311.627,86	MED	28.380.225,71	MED	28.380.225,71	MED	28.380.225,71

OBRA PARALIZADA

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT-336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR=MT-130
Extensão: 51,05 KM

Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
Valor Aditivo R\$: 9.186.220,88
Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

Firma: CONSTRUTORA TRIPLO LTDA

Prazo Atual: 900 Dias
Aditivo de prazo: 360 Dias
Prazo Total: 1.260 Dias

CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU

MÊS/ANO	01/06/2015 a 30/06/2015		01/07/2015 a 31/07/2015		01/08/2015 a 31/08/2015		01/09/2015 a 30/09/2015		01/10/2015 a 31/10/2015		
	30 / 719	31 / 750	31 / 781	30 / 811	31 / 842	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
DIAS CORRIDOS											
SERVIÇO											
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	11,29%	1.531.446,72	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	0,00%	13,27%	854.200,95	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	0,00%	0,00%	5,05%			0,00%		0,00%		0,00%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	60,12%	60,12%	65,17%			65,17%		65,17%		65,17%	
FATURAMENTO SIMPLES	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	MED	28.380.225,71	MED	30.765.873,38	MED	30.765.873,38
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	MED	MED	MED	MED						

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Jose Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
Extensão: 51,05 KM

Prazo Atual: 900 Dias
Aditivo de prazo: 360 Dias
Prazo Total: 1.260 Dias

Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

Firma: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

MÊS/ANO	01/11/2015 a 30/11/2015		01/12/2015 a 31/12/2015		01/01/2016 a 31/01/2016		01/02/2016 a 29/02/2016		01/03/2016 a 31/03/2016	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
DIAS CORRIDOS	30 / 872		31 / 903		31 / 934		29 / 963		31 / 994	
SERVIÇO										
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,54%	208.872,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6,64%	901.112,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	7,04%	453.097,90	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	7,81%	502.616,81
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2,13%	182.434,23
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-0,18%	217,90
SINALIZAÇÃO	33,22%	198.426,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	8,29%	49.489,30
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	1,82%		0,00%		0,00%		0,00%		3,83%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	67,00%		67,00%		67,00%		67,00%		70,82%	
FATURAMENTO SIMPLES	20ª	860.397,06	21ª	31.626.270,44	22ª	31.626.270,44	23ª	31.626.270,44	24ª	1.806.550,55
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	31.526.270,44	MED	31.626.270,44	MED	31.626.270,44	MED	31.626.270,44	MED	33.432.820,99

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PCS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRª-MT-130
Extensão: 51,05 KM

CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU

Prazo Atual: 900 Dias
Aditivo de prazo: 360 Dias
Prazo Total: 1.260 Dias

Valor Contratual R\$: 36.017.467,91
Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

Firma: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

MÊS/ANO	01/04/2016 a 30/04/2016		01/05/2016 a 31/05/2016		01/06/2016 a 30/06/2016		01/07/2016 a 31/07/2016		01/08/2016 a 31/08/2016	
	30 / 1024	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	30 / 1085	30 / 1116	31 / 1147		
DIAS CORRIDOS										
SERVIÇO										
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESNOB	0,00%		-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	3,00%		95.838,51	3,00%	95.838,51	3,00%	95.838,51	3,00%	95.838,51	3,00%
TERRAPLENAGEM			-		-					
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	6,00%		813.717,37	6,00%	813.717,37	6,00%	813.717,37	6,00%	813.717,37	6,00%
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	6,00%		386.097,41	6,00%	386.097,41	6,00%	386.097,41	6,00%	386.097,41	6,00%
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	2,00%		171.020,18	2,04%	174.776,45					
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	10,00%		146.312,68	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	10,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTE	1,00%		8.127,76	1,00%	8.127,76	1,00%	8.127,76	1,00%	8.127,76	1,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	4,00%		4.745,73	4,00%	4.745,73	4,00%	4.745,73	4,00%	4.745,73	4,00%
SINALIZAÇÃO	0,00%		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	3,44%			3,45%		3,08%			3,08%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	74,27%			77,72%		80,80%			86,96%	
FATURAMENTO SIMPLES			1.625.859,62		1.629.615,90		1.454.839,45		1.454.839,45	
FATURAMENTO ACUMULADO			35.058.680,61		36.688.296,51		38.143.135,96		39.597.975,41	

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO DE PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
Extensão: 51,05 KM

Prazo Atual: 900 Dias
Aditivo de prazo: 360 Dias
Prazo Total: 1.260 Dias

Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

Firma: Cr\$0

MÊS/ANO	01/09/2016 a 30/09/2016		01/10/2016 a 31/10/2016		01/11/2016 a 30/11/2016		01/12/2016 a 23/12/2016	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
TÉRMINO: 23/12/2016								
DIAS CORRIDOS	30 / 1177		31 / 1208		30 / 1238		22 / 1260	
SERVIÇO								
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,27%	96.709,90
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	1,00%	31.946,17	1,00%	31.946,17	1,00%	31.946,17	3,50%	111.708,27
TERRAPLENAGEM							7,67%	687.293,66
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	6,00%	813.717,37	4,00%	542.478,24	4,00%	542.478,24	3,80%	514.696,18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	10,00%	643.495,69	5,00%	321.747,84	3,00%	193.048,71	2,94%	189.347,94
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO							0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	10,00%	146.312,68	20,00%	292.625,35
OBRAS DE ARTE CORRENTE	1,88%	15.316,44					1,00%	8.127,76
OBRAS COMPLEMENTARES	4,00%	4.745,73	3,00%	3.559,29	3,00%	3.559,29	6,80%	8.062,10
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	58,50%	349.405,20
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	9,76%	276.974,19
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	3,51%		2,22%		1,94%		5,37%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	90,47%		92,69%		94,63%		100,00%	
FATURAMENTO SIMPLES		1.655.534,06		1.046.044,23		917.345,09		2.534.950,56
FATURAMENTO ACUMULADO		47.708.348,92		43.754.393,14		44.671.738,23		47.206.688,79

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

MEDICÕES

Nessa a PI: R\$ 1.806.550,55
 Acumulada a PI: R\$ 33.432.820,99
 Reajuste nessa: R\$ -
 Reajuste acumulado: R\$ -
 Total PI + Reaj: R\$ 33.432.820,99
 Saldo contrato a PI: R\$ 13.773.867,80
 Empenhado até esta data: R\$ 13.773.867,80
 Saldo empenhado: R\$ -
 Saldo de prazo(Dias): 266
 Preço inicial do contrato: R\$ 38.017.467,91
 Termo de Re-Ratificação: 14/03/2013/03/01-SETPU

EDITAL

Concorrência Pública 023/2009
 Edital: 45226/2013
 Processo: 140/2013/00/00-SETPU
 Rodovia: MT-336
 Contrato: 09/07/2013
 Data Assinatura: 09/07/2013
 Data publicação: 09/07/2013
 Data do contrato: 38.017.467,91
 Preço do contrato: 38.017.467,91
 Termo(s) Aditiv(ões): 140/2013/004/001 - SINFRA
 Data de publicação: 12/08/2014
 V: Termo aditivo a PI: 9.189.220,88
 PI atual do contrato: 47.206.688,79
 Firma Executora: CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA
 Período Acum: 12/07/2013 a 31/03/2016

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA

01/03/2016 a 31/03/2016
 Referência: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
 Período Med. Simples:

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA	VALOR EM PORCENTAGEM		VALOR % EXECUTADO	FINANCEIRO - MEDIÇÕES A PI + REAJUSTAMENTO	
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO		VALOR A PI	REAJUSTE
SERVIÇOS					
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 581.068,25	85,73%	R\$ 1.994.507,70	R\$ 1.994.507,70
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 171.115,98	R\$ 2.507.877,58	78,50%	R\$ 2.249.916,62	R\$ 2.249.916,62
TERRAPLENAGEM	R\$ -	R\$ 8.268.064,01	99,98%	R\$ 2.710.835,28	R\$ 2.710.835,28
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 901.112,13	R\$ 7.079.999,25	52,20%	R\$ 1.711.665,11	R\$ 1.711.665,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 502.616,81	R\$ 3.156.829,62	49,06%	R\$ 1.884.584,53	R\$ 1.884.584,53
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 182.434,23	R\$ 8.205.212,13	95,96%	R\$ 3.517.421,51	R\$ 3.517.421,51
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 3.724.065,49	R\$ 3.724.065,49
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ -	R\$ 748.693,05	92,27%	R\$ 1.258.983,43	R\$ 1.258.983,43
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 217,90	R\$ 74.988,10	63,20%	R\$ 923.152,96	R\$ 923.152,96
SINALIZAÇÃO	R\$ 48.489,30	R\$ 247.915,50	41,50%	R\$ 725.878,83	R\$ 725.878,83
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ -	R\$ 2.562.173,50	90,24%	R\$ 581.707,87	R\$ 581.707,87
TOTAL	R\$ 1.806.550,55	R\$ 33.432.820,99	89,00%	R\$ 2.385.647,67	R\$ 2.385.647,67
				VALOR A PI	VALOR PI + R
				R\$ 33.432.820,99	R\$ 13.773.867,80

Local e data: Curitiba, 01 de abril de 2016.
 Comissão de Fiscalização
 Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 RNP-1207/6286-5

RESUMO DE MEDIÇÃO SINFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Projeto: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR-PM-130
Extensão: 51,05 KM
Referência: 2ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Ordem Início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013
Período Med. Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016

Nº Contrato: 140/2013/00/00-SETPU
Data Assinatura: 09/07/2013
Publicação: 09/07/2013
Processo Orig.: 45226/2013-SETPU
Termo Aditivo N.º: 140/2013/04/01-SETPU
Termo Re-Ratificação N.º: 140/2013/04/01-SETPU
Período Acum.: 12/07/2013 a 31/03/2016

Prazo de Execução: 1260
Prazo Resíduo: 266
Vr. Contratual PI: R\$ 47.206.688,79
Vr. Acum-Medição PI: R\$ 33.432.820,99
Vr. Acum. Programado PI:
Vr. Programado Próx.mês PI:
FIRMA: Construtora Tripolo LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO								
2 S 00 000 10	Instalações de Camêrio e Acampamento	q	1,000	-	1,000	1,000	484.358,35	484.358,35	100,00%
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	q	1,000	-	0,500	0,500	15.980,96	7.990,48	50,00%
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	q	1,000	-	1,000	1,000	22.147,75	22.147,75	100,00%
2 S 00 000 24	Mobilização de Equipamento Rodante	q	1,000	-	1,000	1,000	22.147,76	-	0,00%
2 S 00 000 24	Desmobilização de Equipamento Rodante	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,67	66.571,67	100,00%
2 S 00 000 24	Mobilização de Equipamentos Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,68	-	0,00%
2 S 00 000 24	Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,68	-	0,00%
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES							581.068,25	85,73%
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO								
2 S 00 001 01	Administração local de Obra - Despesas Fixas	q	1,000	-	1,000	1,000	105.799,86	105.799,86	100,00%
2 S 00 001 02	Administração local da Obra - Despesas Diversas	mês	18,000	1,000	13,000	14,000	5.448,17	76.274,36	77,78%
-	Materiais e Serviços de Consumo	mês	18,000	1,000	13,000	14,000	19.829,98	277.619,72	77,78%
-	Alimentação Pessoal	mês	18,000	1,000	13,000	14,000	19.721,08	276.095,12	77,78%
-	Aluguel de Veículos para Deslocamento Local do Pessoal	mês	18,000	1,000	13,000	14,000	7.852,65	109.937,10	77,78%
-	Locação de Equipamentos para Controle Tecnológico	mês	18,000	1,000	13,000	14,000	4.101,13	57.415,82	77,78%
-	Deslocamento para Dêbenda do Pessoal	mês	18,000	1,000	13,000	14,000	104.267,12	1.459.739,68	77,78%
2 S 00 001 03	Administração local da Obra - Pessoal	mês	18,000	1,000	13,000	14,000	9.895,85	138.541,90	77,78%
-	Administração e Gestão Ambiental	mês	18,000	1,000	13,000	14,000	258,16	6.454,00	100,00%
74209/001	Placa de Obra	m²	25,000	-	25,000	25,000	-	-	0,00%
2 S 00 000 30	Marco de Concreto de Identificação da Obra	unid.	1,000	-	1,000	1,000	2.275,39	-	0,00%
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES							2.507.877,58	78,50%
2.0	TERRAPLENAGEM								
2 S 01 000 00	Desm., Dest., Limpeza, áreas com ârvores diâmetro até 0,15 M	m²	1.123.042,500	-	1.123.042,500	1.123.042,500	0,31	348.143,17	100,00%
2 S 01 010 00	Deslocamento de ârvores diâmetro 0,15 m a 0,30 m	unid.	50,000	-	-	-	30,51	-	0,00%
2 S 01 100 01	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT até 50 M	m³	48.126,418	-	48.126,418	48.126,418	5,00	240.631,59	100,00%
2 S 01 100 23	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 200 a 400 M c/e	m³	509.155,235	-	509.155,235	509.155,235	6,29	3.202.886,78	100,00%
2 S 01 100 24	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 400 a 600 M c/e	m³	275.874,205	-	275.874,205	275.874,205	6,99	1.928.360,69	100,00%
2 S 01 100 25	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 600 a 800 M c. esc.	m³	23.567,294	-	23.567,294	23.567,294	7,39	174.162,30	100,00%
2 S 01 100 26	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 800 a 1000 M c. esc.	m³	19.672,287	-	19.672,287	19.672,287	7,83	153.838,41	99,87%
2 S 01 100 27	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 1000 a 1200 M c. Carregadeira	m³	7.419,850	-	7.419,850	7.419,850	18,14	134.596,07	100,00%
2 S 01 300 03	Esc., Carga transp. Solos moles DMT 400 a 600 M	m³	291.659,703	-	291.659,785	291.659,785	2,36	688.295,85	100,00%
2 S 01 510 00	Compactação de Aterros a 95,00% do Proctor Normal	m³	592.157,576	-	592.159,472	592.159,472	2,36	1.397.449,15	100,00%
s/ código	Compactação de Aterros a 100,00% do Proctor Intermediário	m³		-				8.268.064,01	99,98%
	SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM								

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

RESUMO DE MEDIÇÃO SINFRA



GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ADMINISTRATIVA ESPECIAL - UASIS

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTR-MT-130
Extensão: 51,05 KM
Referencial: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Ordem Início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013
Período Med. Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016

Nº Contrato: 140/2013/00/00-SETPU
Data Assinatura: 09/07/2013
Publicação: 09/07/2013
Processo Orig.: 45226/2013-SETPU
Termo Aditivo N.º: 140/2013/04/01-SETPU
Termo Re-Ratificação N.º: 140/2013/04/01-SETPU
Período Acum.: 12/07/2013 a 31/03/2016

FIRMA: Construtora Tripolo LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.5.02.110.00	Regularização do Solo Leito	m²	655.788,930	-	655.788,930	655.788,930	0,72	472.169,02	100,00%
2.5.02.200.00	Sub - Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	128.019,534	-	78.229,112	78.229,112	12,12	948.136,83	61,11%
2.5.02.200.01	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	121.743,030	9.500,400	50.169,600	59.670,000	12,12	723.200,40	49,01%
2.5.02.300.00	Impregnação (execução)	m²	519.798,020	40.600,000	214.400,000	255.000,000	0,26	66.300,00	49,06%
2.5.02.400.00	Pintura de Ligação (execução)	m²	519.798,020	40.600,000	214.400,000	255.000,000	0,17	43.350,00	49,06%
2.5.02.540.51	Conc. Betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	t	62.375,762	4.872,000	25.728,000	30.600,000	157,74	4.826.844,00	52,20%
SUB-TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO									
4.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
2.5.02.999.01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	292,320	1.543,680	1.836,000	1.310,31	2.405.729,16	49,06%
2.5.02.999.03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t	623,758	48,720	257,280	306,000	2.046,06	626.706,36	49,06%
2.5.02.999.04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	207,919	16,240	85,760	102,000	1.219,55	124.394,10	49,06%
SUB-TOTAL DE TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO									
5.0	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO								
2.5.05.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De sub-base	bxkm	6.137.127,880	-	6.120.769,279	6.120.769,279	0,66	4.039.707,72	99,73%
2.5.05.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De base	bxkm	5.636.161,152	-	5.829.250,330	5.829.250,330	0,66	3.847.305,21	99,88%
2.5.05.009.01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	1.052,640	783,360	1.836,000	141,80	260.344,80	49,06%
2.5.05.009.03	Transporte de Asfalto Diluído CM 30	t	623,758	175,440	130,560	306,000	141,80	43.390,80	49,06%
2.5.05.009.04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR 1C	t	207,919	58,480	43,520	102,000	141,80	14.463,60	49,06%
SUB-TOTAL DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA									
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA								
2.5.04.900.52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	490,000	-	-	-	42,59	-	0,00%
2.5.04.900.71	Sarjeta cantoneira central de concreto - SCC 01 - AC/BC	m	442,000	-	-	-	35,55	-	0,00%
2.5.04.910.51	Melo fio de concreto - MFC 01 - AC/BC - tipo B - (c/sarjeta de 50,0 cm)	m	1.517,000	-	-	-	66,15	-	0,00%
2.5.04.910.53	Melo fio de concreto - MFC 03 AC/DC	m	20.590,000	-	-	-	32,24	-	0,00%
2.5.04.910.55	Melo fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	993,000	-	-	-	87,88	-	0,00%
2.5.04.940.52	Descida d'água tipo rápido - canal retang. - DAR 02 - AC/BC	unid.	671,250	-	-	-	46,60	-	0,00%
2.5.04.942.51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	unid.	402,000	-	-	-	55,69	-	0,00%
2.5.04.942.52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	unid.	13,000	-	-	-	289,78	-	0,00%
2.5.04.950.62	Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC	unid.	408,000	-	-	-	281,04	-	0,00%
2.5.09.001.91	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	bxkm	128.506,619	-	-	-	0,52	-	0,00%
2.5.09.002.91	Transporte comercial c/basc. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	bxkm	1.109.571,677	-	-	-	0,33	-	0,00%
SUB-TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTE									
7.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE								
2.5.04.001.00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	811,612	-	811,418	811,418	5,950	4.827,93	99,98%

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

RESUMO DE MEDIÇÃO SINFRA

ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		Nº Contrato		140/2013/000/00-SETPU		Prazo de Execução		1260	
Rodovia:		MT- 336		Data Assinatura		09/07/2013		Prazo Restante		266	
Trecho:		FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTR+MT-130		Publicação		09/07/2013		Vr. Contratual PI		R\$ 47.206.688,79	
Extensão:		51,05 KM		Processo Orig.		45226/2013-SETPU		Vr. Acum. Medido PI		R\$ 33.432.820,99	
Referência:		24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória		Termo Aditivo N:		140/2013/04/01-SETPU		Vr. Acum. Programado PI			
Ordem Início serviço:		12/07/2013 - 08/7/2013		Termo Re-Ratificação N:		140/2013/04/01-SETPU		Vr. Programado Próx. mês PI			
Período Med. Simples:		01/03/2015 a 31/03/2016		Período Acum.:		12/07/2013 a 31/03/2016		FIRMA:		Construtora Tripolo LTDA	
COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE		
4 5 06 121 01	Forn. E colocação de tacha reflet. Bidimensional	unid.	16.047,000	3.038,000	6.406,000	9.444,000	13,30	125.605,20	58,85%		
4 5 06 121 11	Fornec. E Colocação de tacho refletiva bidimensional	unid.	305,000	-	-	-	39,82	-	0,00%		
4 5 06 200 02	Fornec. E Implantação placa Sinalização Totalmente refletiva	m²	179,860	5,927	23,922	29,849	371,54	11.090,10	16,60%		
	SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO							247.915,50	41,50%		
10.0	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
2 5 05 100 00	Enlameamento	m²	10.036,370	-	10.036,370	10.036,370	7,72	77.480,77	100,00%		
2 5 05 102 00	Hidrosemeadura	m²	1.287.186,577	-	1.128.915,610	1.128.915,610	1,75	1.975.602,31	87,70%		
3 5 01 930 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (jazidas e empréstimo)	m²	826.086,370	-	826.086,370	826.086,370	0,22	181.739,00	100,00%		
Sinapi 72967/003	Plantio de árvores e arbustos	unid.	11.402,000	-	11.402,000	11.402,000	29,71	327.351,42	100,00%		
	SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							2.562.173,50	90,24%		
TOTAL GERAL								33.432.820,99	71,88%		
A DEDUZIR MEDIÇÕES ANTERIORES								31.626.270,44	3,88%		
TOTAL DESTA MEDIÇÃO								1.806.550,55			

Cuiabá, 01 de abril de 2016.

Fiscalização:

Importa o valor a ser pago de R\$

1.806.550,55

UM MILHÃO, OITOCENTOS E SES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

S. Theodoro
Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO

CONTRATO:	140/2013/00/00-SETPU
RODOVIA:	MT- 336
TRECHO:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130
EMPRESA:	Construtora Tripolo LTDA
PERÍODO:	01/03/2016 a 31/03/2016

MEDIÇÃO: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANHÃ	N	B	B	B	B	C	N	N	C	B	N	N	B	B	B	N	N	B	N	N	B	B	N	B	N	I	N	B	B	B	B
TARDE	C	B	B	B	B	N	C	B	N	B	C	N	B	B	B	N	C	C	B	N	B	C	B	B	C	C	N	B	B	B	B
NOITE	N	B	B	B	B	I	C	B	B	C	B	C	B	B	B	B	I	C	C	B	C	I	B	C	C	C	N	N	B	B	B
MM																															

CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"

J. M. Coll.

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRADA MT-130
Referência: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013
Período acumulado: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE VOLUME DE BASE E TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO

Período Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
IC 140/2013/00/00-SETPU

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA FIXA (Km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARG. MÉDIA (m)	ESP. (m)	FATOR EMPOL. (m³/m³)	VOLUME (m³)	DMT (Km)	MOMENTO TRANSPORTE (km³xton)			
	INICIAL	FRAC.		INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.										
				765	+	0,00	2265	+	0,00	30.000,00	11,70	0,20	1,84	70.200,000			
J-1	1.370	+	0,00	5,345											13,13	1.695.373,056	
				2265	+	0,00	3050	+	0,00	15.700,00	11,70	0,20	1,84	36.738,000			
J-4	1.725	+	0,00	32,500											51,15	3.457.633,608	
				2265	+	0,00	3050	+	0,00	15.700,00							
				3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00	11,70	0,20	1,84	12.355,200			
J-5	2.433	+	0,00	9,200											24,18	549.697,674	
				3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00							
				interseção 01				587,43	21,649	0,20	1,84	2.543,454					
J-5	2.433	+	0,00	9,200											27,04	126.545,992	
				interseção 01				587,43									

EXECUÇÃO DA BASE

EXECUÇÃO DA BASE				2770	+	0,00	3314	+	0,00	10.880,00	11,70	0,20	1,84	25.459,200		
EXECUÇÃO DA BASE				2583	+	0,00	2770	+	0,00	3.740,00	11,70	0,20	1,84	8.751,600		
EXECUÇÃO DA BASE				2420	+	0,00	2578	+	0,00	3.160,00	11,70	0,20	1,84	7.394,400		
EXECUÇÃO DA BASE				2337	+	0,00	2420	+	0,00	1.660,00	11,70	0,20	1,84	3.884,400		
EXECUÇÃO DA BASE				2237	+	0,00	2337	+	0,00	2.000,00	11,70	0,20	1,84	4.680,000		
EXECUÇÃO DA BASE				2034	+	0,00	2237	+	0,00	4.060,00	11,70	0,20	1,84	9.500,400		

TOTAL ACUMULADO														59.670,000		5.829.250,330
À DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES														50.169,600		5.829.250,330
TOTAL DESTA MEDIÇÃO														9.500,400		-

Cuiabá, 01 de abril de 2016.
 Comissão de Fiscalização

Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336

Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Referência : 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória

Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013

Período acumulado: 12/07/2013 a 31/03/2016

Período Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016

PLANILHA PARA CÁLCULO

DE ÁREA DE IMPRIMAÇÃO, FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DE CM-30

Firma: Construtora Tripolo LTDA

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA FIXA (Km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)			EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	PESO DO LIGANTE (kg/m²)	PESO LIGANTE (ton)	IC 140/2013/00/00-SETPU OBSERVAÇÕES	
	INICIAL	FRAC.		INICIAL	FRAC.	FINAL							FRAC.
				2770	+ 0,00	3314	+ 0,00	10,00	108.800,00	1,2000	130,560		
				2583	+ 0,00	2770	+ 0,00	10,00	37.400,00	1,2000	44,880		
				2420	+ 0,00	2578	+ 0,00	10,00	31.600,00	1,2000	37,920		
				2337	+ 0,00	2420	+ 0,00	10,00	16.600,00	1,2000	19,920		
				2237	+ 0,00	2337	+ 0,00	10,00	20.000,00	1,2000	24,000		
				2034	+ 0,00	2237	+ 0,00	10,00	40.600,00	1,2000	48,720		
TOTAL ACUMULADO													
Á DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES													
TOTAL ACUMULADO													
											306,000		
											257,280		
											48,720		

Cuiabá, 01 de abril de 2016.
Comissão de Fiscalização

Jose Teodoro Neto
Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

05.65 3013/0000 / 3013/0000 / 3013/0000
EDIFÍCIO ENG. ERIGAR ERADIO ARZÉ - RUA J. OLIVEIRA - LOTE 5 - SETOR A
8049-905 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

**PLANILHA PARA CÁLCULO
DE ÁREA DE CBUQ, FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DE CAP 50/70 E RR-1C**

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
Referência : 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013
Período acumulado: 12/07/2013 a 31/03/2016

Período Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016

Firma: Construtora Tripolo LTDA

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA FIXA (Km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA PINTURA LIGAÇÃO RR-1C	VOLUME CBUQ(m3) ESP.(5,00cm)	PESO CBUQ (ton)	PESO(ton) CAP - 50/70	PESO(ton) 1C	RR-
	INICIAL	FRAC.		INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.								
				2770	+ 0,00	3314	+ 0,00	10.880,00	10,00	108.800,00	5.440,00	13.056,00	783,36		43,52
				2583	+ 0,00	2770	+ 0,00	3.740,00	10,00	37.400,00	1.870,00	4.488,00	269,28		14,96
				2420	+ 0,00	2578	+ 0,00	3.160,00	10,00	31.600,00	1.580,00	3.792,00	227,52		12,64
				2337	+ 0,00	2420	+ 0,00	1.660,00	10,00	16.600,00	830,00	1.992,00	119,52		6,64
				2237	+ 0,00	2337	+ 0,00	2.000,00	10,00	20.000,00	1.000,00	2.400,00	144,00		8,00
				2034	+ 0,00	2237	+ 0,00	4.060,00	10,00	40.600,00	2.030,00	4.872,00	292,32		16,24
TOTAL ACUMULADO											30.600,000	1.836,000	102,000		
Á DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES											25.728,000	1.543,680	85,760		
TOTAL ACUMULADO											4.872,000	292,320	16,240		

Cuiabá, 01 de abril de 2016.
Comissão de Fiscalização

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

União



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rodovia: MT- 336

Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130

Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória

Período simples: 01/03/2016 a 31/03/2016

Período acumulado: 12/07/2013 a 31/03/2016

Firma: Construtora Tripolo LTDA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE
QUANTIDADE DE TAXAS REFLETIVAS

IC:140/2013/00/00-SETPU

BORDO ESQUERDO													BORDO DIREITO													
INÍCIO	FIM	QTDE	PROJETO TIPO	ESPAÇO	INÍCIO	FIM	QTDE	PROJETO TIPO	ESPAÇO	INÍCIO	FIM	QTDE	PROJETO TIPO	ESPAÇO	INÍCIO	FIM	QTDE	PROJETO TIPO	ESPAÇO							
2034	+	15	2096	+	10	77	TACHA	16,00	2034	+	10	2096	+	5	77	TACHA	16,00	2034	+	10	2096	+	5	77	TACHA	16,00
2096	+	5	2122	+	15	66	TACHA	8,00	2096	+	5	2122	+	15	66	TACHA	8,00	2096	+	5	2122	+	15	66	TACHA	8,00
2122	+	10	2404	+	5	352	TACHA	16,00	2122	+	15	2404	+	10	352	TACHA	16,00	2122	+	15	2404	+	10	352	TACHA	16,00
2404	+	10,00	2439	+	0,00	86	TACHA	8,00	2404	+	10,00	2439	+	0,00	86	TACHA	8,00	2404	+	10,00	2439	+	0,00	86	TACHA	8,00
2439	+	0,00	2540	+	0,00	126	TACHA	16,00	2439	+	0,00	2540	+	0,00	126	TACHA	16,00	2439	+	0,00	2540	+	0,00	126	TACHA	16,00
2540	+	0,00	2556	+	0,00	40	TACHA	8,00	2540	+	0,00	2556	+	0,00	40	TACHA	8,00	2540	+	0,00	2556	+	0,00	40	TACHA	8,00
2556	+	0,00	2585	+	15,00	37	TACHA	16,00	2556	+	0,00	2585	+	15,00	37	TACHA	16,00	2556	+	0,00	2585	+	15,00	37	TACHA	16,00
2585	+	15,00	2626	+	10,00	101	TACHA	8,00	2585	+	15,00	2626	+	10,00	101	TACHA	8,00	2585	+	15,00	2626	+	10,00	101	TACHA	8,00
2626	+	10,00	2705	+	15,00	99	TACHA	16,00	2626	+	10,00	2705	+	15,00	99	TACHA	16,00	2626	+	10,00	2705	+	15,00	99	TACHA	16,00
2705	+	15,00	2735	+	10,00	74	TACHA	8,00	2705	+	15,00	2735	+	10,00	74	TACHA	8,00	2705	+	15,00	2735	+	10,00	74	TACHA	8,00
2735	+	10,00	2935	+	0,00	249	TACHA	16,00	2735	+	10,00	2935	+	0,00	249	TACHA	16,00	2735	+	10,00	2935	+	0,00	249	TACHA	16,00
2935	+	0,00	2951	+	0,00	40	TACHA	8,00	2935	+	0,00	2951	+	0,00	40	TACHA	8,00	2935	+	0,00	2951	+	0,00	40	TACHA	8,00
2951	+	0,00	3243	+	0,00	365	TACHA	16,00	2951	+	0,00	3243	+	0,00	365	TACHA	16,00	2951	+	0,00	3243	+	0,00	365	TACHA	16,00
3243	+	0,00	3271	+	0,00	70	TACHA	8,00	3243	+	0,00	3271	+	0,00	70	TACHA	8,00	3243	+	0,00	3271	+	0,00	70	TACHA	8,00
3271	+	0,00	3317	+	9,736	58	TACHA	16,00	3271	+	0,00	3317	+	9,736	58	TACHA	16,00	3271	+	0,00	3317	+	9,736	58	TACHA	16,00
	+			+						+																
	+			+						+																
1840													1840													
ACUMULADO TOTAL													5764													
A DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES													9.444,00													
SALDO A MEDIR													6.406,00													
3.038,00													3.038,00													

Cuiabá, 01 de abril de 2016.

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



UNIVERSIDADE
26
P

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130
Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
Período acumulado: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA


**PLANILHA PARA CÁLCULO
DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL**

IC:140/2013/00/00-SETPU

TIPO	LOCALIZAÇÃO	LADO	DIMENSÃO	ÁREA	OBS
R-7	2538+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2572+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2705+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2932+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	3240+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2436+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
7	2558+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2626+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2736+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2953+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	3307+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.4	3277+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.6	3273+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2675+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	3175+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2760+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	3285+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-24B	3314+12	EX	Ø=1,00	0,7854	
R-28	3313+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
A-2A	2440+0	LE	L=1,00	1	
A-2A	2740+0	LE	L=1,00	1	
A-2A	3237+0	LD	L=1,00	1	
A-2A	2562+0	LE	L=1,00	1	
A-2A	2957+0	LE	L=1,00	1	
A-2B	2702+0	LD	L=1,00	1	
A-2B	3275+0	LE	L=1,00	1	
A-2B	2535+0	LD	L=1,00	1	
A-2B	2929+0	LD	L=1,00	1	
R-7	2406+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2096+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2122+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2175+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2260+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
A-2A	2126+0	LE	L=1,00	1	
A-2B	2093+0	LD	L=1,00	1	

ACUMULADO TOTAL	29,85
A DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES	23,92
SALDO A MEDIR	5,93

Cuiabá, 01 de abril de 2016.


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

27
P

SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

AVENIDA BRASILEIRA / 3613 BOMBAS / 70030000
EDIFÍCIO ENO EDGAR PRADO ARZÉ - P. 1A D - QUADRA 1 - LOTE 8 - SETOR A
70043-000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

WWW.MT.GOV.BR


Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
Período acumulado: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE
ÁREA DE SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL

I.C.: 140/2013/00/00-SETPU

LOCALIZAÇÃO (EST.)				OBS.	LADO	COMP. (M)	ESPESES. (M)	ÁREA (M²)	TIPO
INÍCIO	FINAL		PINTURA						
2088	16	2096		8	EX	76	0,15	11,4	4x4
2096	8	2119		0	LD	452	0,15	67,8	contínua
2119	0	2122		12	LD	36	0,15	5,4	4x4
2096	8	2100		0	LE	36	0,15	5,4	4x4
2100	0	2122		12	LE	452	0,15	67,8	contínua
2122	12	2130		4	EX	76	0,15	11,4	4x4
2130	4	2398		16	EX	1343	0,15	201,45	4x12
2398	16	2406		8	EX	76	0,15	11,4	4x4
2406	8	2433		0	LD	532	0,15	79,8	contínua
2433	0	2436		12	LD	36	0,15	5,4	4x4
2406	8	2410		0	LE	36	0,15	5,4	4x4
2410	0	2436		12	LE	532	0,15	79,8	contínua
2436	12	2444		4	EX	76	0,15	11,4	4x4
2444	4	2530		16	EX	433	0,15	64,95	4x12
2530	16	2538		8	EX	76	0,15	11,4	4x4
2538	8	2555		0	LD	332	0,15	49,8	contínua
2555	0	2558		12	LD	36	0,15	5,4	4x4
2538	8	2542		0	LE	36	0,15	5,4	4x4
2542	0	2558		12	LE	332	0,15	49,8	contínua
2558	12	2572		0	EX	134	0,15	20,1	4x4
2572	0	2623		0	LD	1020	0,15	153	contínua
2623	0	2626		12	LD	36	0,15	5,4	4x4
2572	0	2575		12	LE	36	0,15	5,4	4x4
2575	12	2626		12	LE	1020	0,15	153	contínua
2626	12	2634		4	EX	76	0,15	11,4	4x4
2634	4	2697		16	EX	318	0,15	47,7	4x12
2697	16	2705		8	EX	76	0,15	11,4	4x4
2705	8	2733		0	LD	552	0,15	82,8	contínua
2733	0	2736		12	LD	36	0,15	5,4	4x4
2705	8	2709		0	LE	36	0,15	5,4	4x4
2709	0	2736		12	LE	552	0,15	82,8	contínua
2736	12	2744		4	EX	76	0,15	11,4	4x4
2744	4	2924		16	EX	903	0,15	135,45	4x12
2924	16	2932		8	EX	76	0,15	11,4	4x4

Cuiabá, 01 de abril de 2016.


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

UNIMAT/SINFRA
 F.S. 28
 1
 103

SINFRA
 SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA
 E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO GROSSO
 ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

+55 65 3613 6000 / 3613 6100 / 3613 6200
 EDIFÍCIO ENG. EDISAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA I - LOTE 5 - SETOR A
 78049-908 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
 WWW.MT.GOV.BR


Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
Período acumulado: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE
 ÁREA DE SINALIZAÇÃO
 HORIZONTAL

I.C.: 140/2013/00/00-SETPU

LOCALIZAÇÃO (EST.)					OBS.	LADO	COMP. (M)	ESPESES. (M)	ÁREA (M²)	TIPO
INÍCIO	FINAL			PINTURA						
2932	8	2950		0	LD	352	0,15	52,8	contínua	
2950	0	2953		12	LD	36	0,15	5,4	4x4	
932	8	2936		0	LE	36	0,15	5,4	4x4	
2936	0	2953		12	LE	352	0,15	52,8	contínua	
2953	12	2961		4	EX	76	0,15	11,4	4x4	
2961	4	3232		16	EX	1358	0,15	203,7	4x12	
3232	16	3240		8	EX	76	0,15	11,4	4x4	
3240	8	3314		10	LD	1482	0,15	222,3	contínua	
3240	8	3244		0	LE	36	0,15	5,4	4x4	
3244	0	3314		10	LE	1410	0,15	211,5	contínua	
2420	0	3314		0	LE	17880	0,15	2682	contínua	
2420	0	3314		0	LD	17880	0,15	2682	contínua	
Acumulado total								7.638,75		
A deduzir de medições anteriore								7.166,10		
Saldo a medir								472,65		

Cuiabá, 01 de abril de 2016.



 Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

Unidade: SINFRA
 Fls: 20
 Nota: P
 Data:


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-EN
Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
Período Acum: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

**RELATÓRIO
 FOTOGRÁFICO**

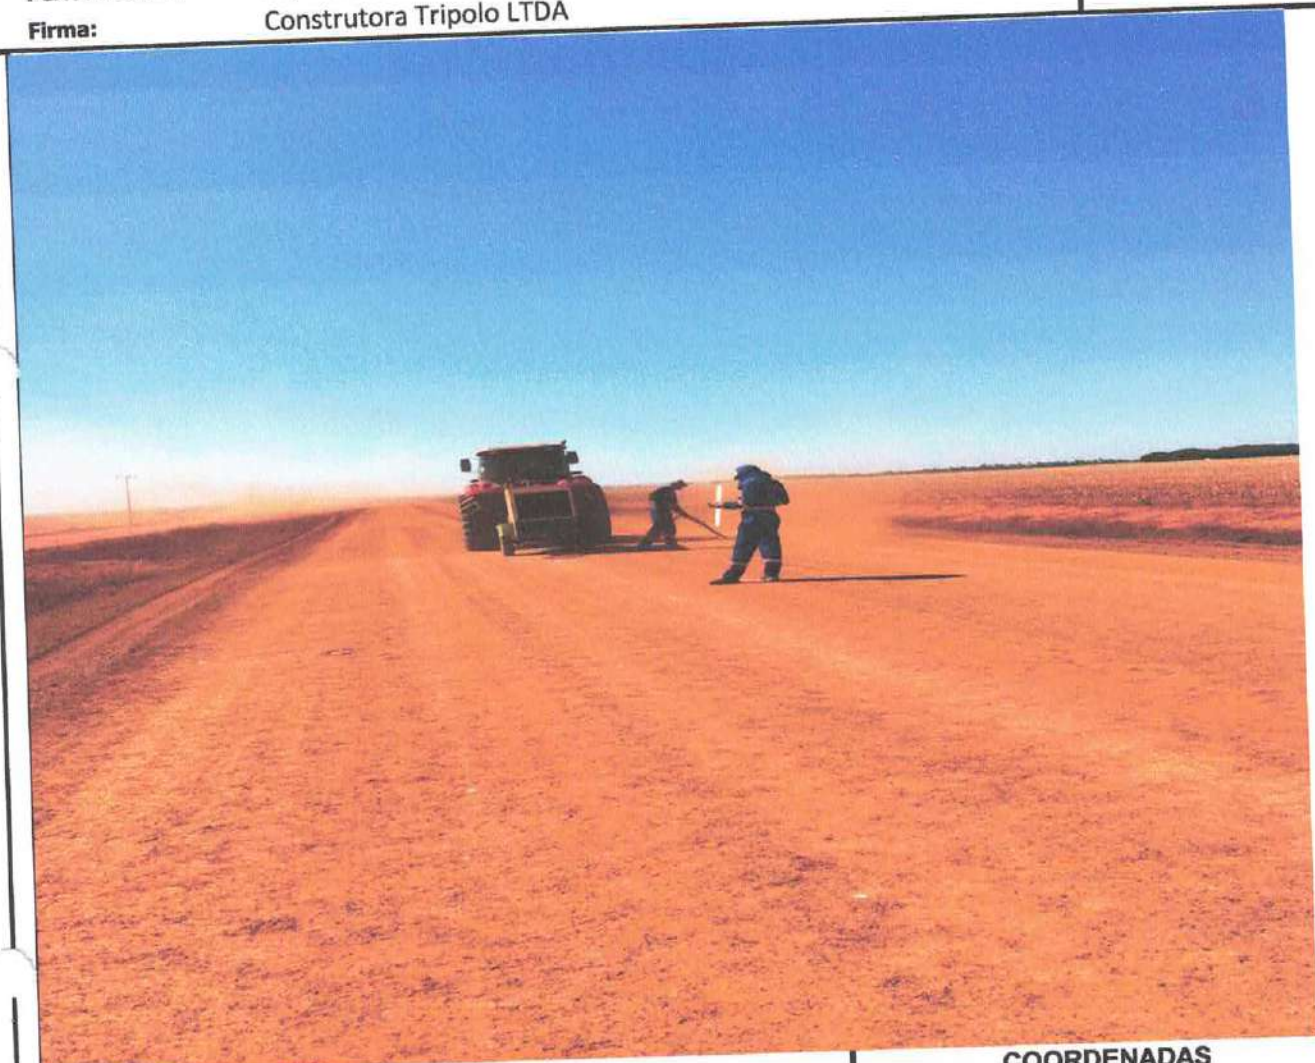

Serviço	COORDENADAS	
EXECUÇÃO DE BASE	N	8.347.500
	E	190.300


 Engº José Teodoro neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA - RN 120776286-5

Cuiabá, 01 de abril de 2016

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-EN
Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
Período Acum: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

**RELATÓRIO
 FOTOGRÁFICO**



Serviço	COORDENADAS	
EXECUÇÃO CAPA DE ROLAMENTO	N	8.345.900
	E	189.900

Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA - RN 120776286-5

Cuiabá, 01 de abril de 2016

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRÁ

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-EN
Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
Período Acum: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

**RELATÓRIO
 FOTOGRÁFICO**




Serviço	COORDENADAS	
EXECUÇÃO CAPA DE ROLAMENTO	N	8.347.100
	E	190.300


 Engº José Teodoro neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA - RN 120776286-5

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-EN
Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
Período Acum: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

**RELATÓRIO
FOTOGRAFICO**

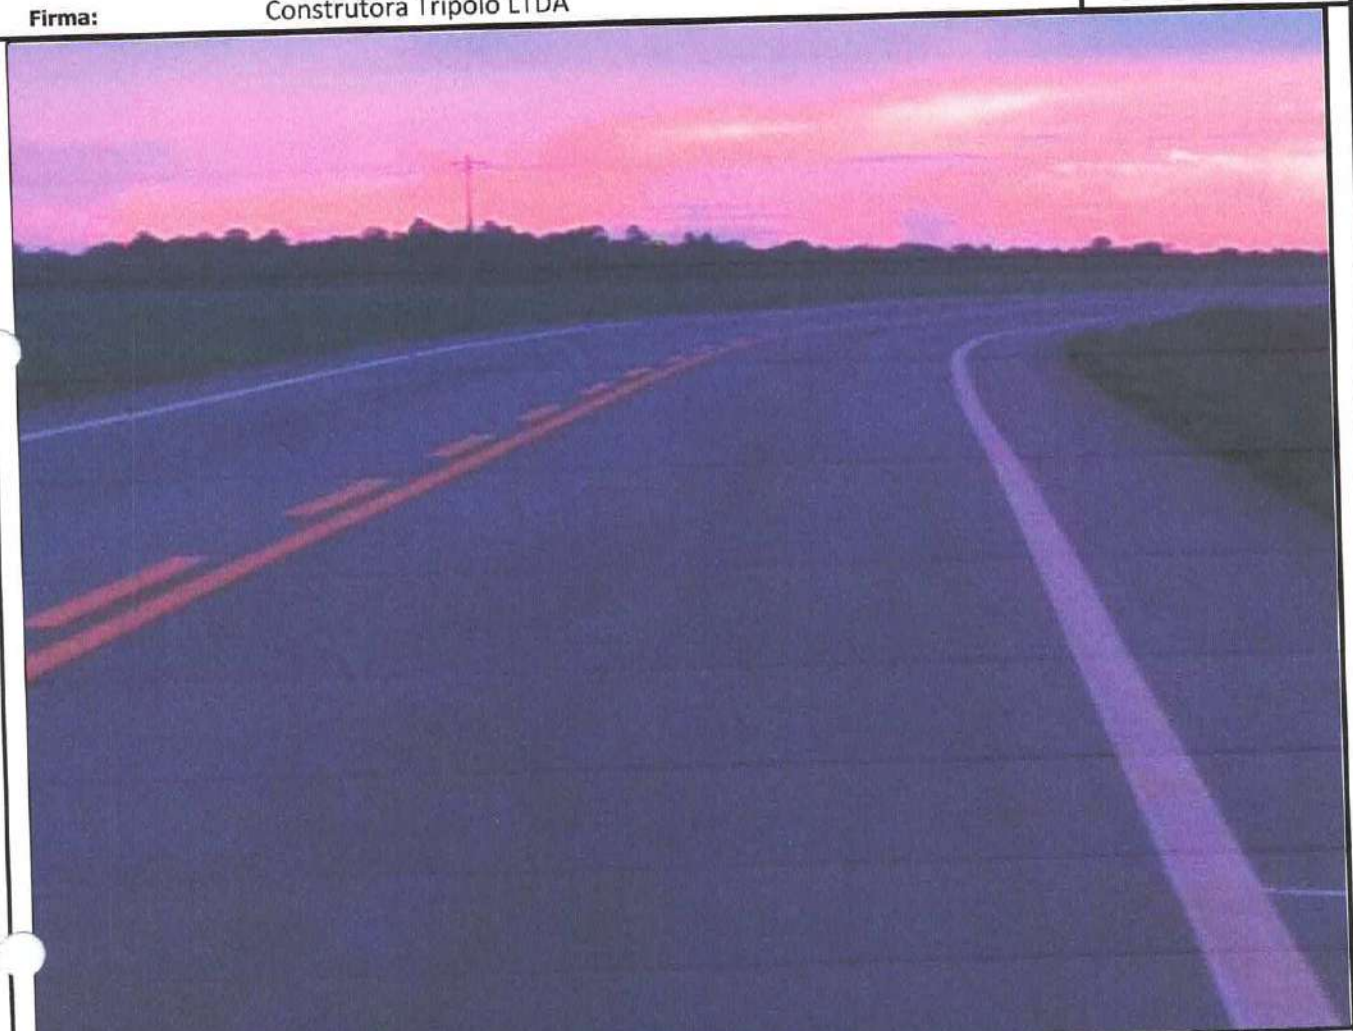

Serviço	COORDENADAS	
SINALIZAÇÃO	N	8.339.900
	E	183.500


 Engº José Teodoro neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA - RN 120776286-5

UNBAG/SINFRA
 Fis. 33
 0
 Anos

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-EN
Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
Período Acum: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

**RELATÓRIO
 FOTOGRÁFICO**



Serviço	COORDENADAS	
SINALIZAÇÃO	N	8.344.700
	E	189.500


 Engº José Teodoro neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA - RN 120776286-5

Cuiabá, 01 de abril de 2016

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-EN
Referencia: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
Período Acum: 12/07/2013 a 31/03/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

**RELATÓRIO
 FOTOGRÁFICO**



Serviço	COORDENADAS	
SINALIZAÇÃO	N	8.385.800
	E	600.200

Engº José Teodoro neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA - RN 120776286-5



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º José Carlos Ferreira da Silva
M.D. Superintendente de Obras de Transportes - SUOT
CUIABÁ/MT

Assunto : 24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 140/2013

Através da presente , encaminho a V.Sª. a 24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória , devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

24º (Vigésima Quarta) Medição ProvisóriaR\$ 1.806.550,55 .

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 05 a 34.

Em 12 de Abril de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Servidor/Colaborador
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT

imprimir

 Folha nº 36
 Série COCT/SETPU
 Ass: J


PREFEITURA MUNICIPAL DE
 RONDONÓPOLIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data Hora da emissão
2B24.6EC8.C420	31/03/2016 - 17:05:27
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	526

Prestador de Serviços

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B
 JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06

Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Municipal 1438108

Inscrição Estadual 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CP/CNPJ

03.507.415/0022-79

Endereço

RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A

Bairro

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .

Cep

78049-906

Cidade

CUIABÁ - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. a 24ª medição provisória de serviços de Pavimentação Asfáltica da rod. MT-336, trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE/PVA ENTR. MT 130, com extensão de 51,05KM - Objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, referente período 01/03/2016 a 31/03/2016.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.806.550,55	1,00	0,00	1.083.930,33	722.620,22	0,00	0,00	1.806.550,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.806.550,55

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.806.550,55	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



imprimir

 Folha nº 37
 Setor: COOT/SET
 Ass.: J


PREFEITURA MUNICIPAL DE
 RONDONÓPOLIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código de verificação

2B24.6EC8.C420

Data Hora da emissão

31/03/2016 - 17:05:27

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

526

Prestador de Serviços

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B
 JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06

Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Municipal 1438108

Inscrição Estadual 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CNPJ

03.507.415/0022-79

Endereço

RUA 3, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A

Bairro

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .

Cep

78049-906

Cidade

CUIABÁ - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. a 24ª medição provisória de serviços de Pavimentação Asfáltica da rod. MT-336, trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE/PVA ENTR. MT 130, com extensão de 51,05KM - Objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, referente período 01/03/2016 a 31/03/2016.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
1.806.550,55	1,00	0,00	1.083.930,33	722.620,22	0,00	0,00	1.806.550,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.806.550,55
Retenções

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

PIS (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	1.806.550,55

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFS-e é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 07/04/2016 - 13:16:37

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016505201****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **07/04/2016**Hora de emissão: **13:16:40**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **06/05/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TULT2T22TA29B2UL**

Página 1 de 2

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 07/04/2016 - 13:16:37

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0016505201**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **07/04/2016**Hora de Emissão: **13:16:40**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com parcelamento de débitos
regular(em dia) no Sistema de Conta Corrente Fiscal
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até **06/05/2016**.Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessadoCódigo de Autenticidade : **TULT2T22TA29B2UL**Página **2** de **2**[Retornar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR

Folha nº 40
Série: DOT/SETPU
Ass: J



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04879275/0001-06
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA
Endereço: R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800 SALA B / JD B
HORIZONTE / RONDONOPOLIS / MT / 78705-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2016 a 19/04/2016

Certificação Número: 2016032123130404621284

Informação obtida em 07/04/2016, às 16:20:27. ✓

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA
CNPJ: 04.879.275/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:35:24 do dia 20/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2016. ✓

Código de controle da certidão: **02C9.229D.45AC.EFC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 42
Setor: COOT/SETPU
Ass: T

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.879.275/0001-06

Certidão nº: 22787559/2016

Expedição: 02/03/2016, às 08:29:19

Validade: 28/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.879.275/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**ESTADO DE MATO GROSSO
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

Data: 02/02/2016
 Hora: 10:54
 Usu: S_GRIEICHENBACH

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 3.800, SALA - B
 BAIRRO: JARDIM BELO HORIZONTE
 MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT
 CEP: 78.700-000

CNPJ

04.879.275/0001-06

SÓCIOS

CNPJ

712.937.281-87

01.149.137/0001-75

NOME/RAZÃO SOCIAL

FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI

CONSTRUTORA DETERRA LTDA EPP



Cuiabá, 02/02/2016

[Handwritten Signature]
 Responsável pela Expedição
Gustavo Vesleide Amorim Reichenbach
 Técnico PGE - Mat. 124736

[Handwritten Signature]
 Procurador(a) do Estado
Daniel Costa de Melo
 Procurador do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: RHENRRFDT5FRJID0XANV2U7MGWOZDF

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS



ANEXO DE DÉBITOS - CERTIDÃO POSITIVA C/ EFEITO NEGATIVO

2792 / 2016

CONTRIBUINTE
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
C.N.P.J./C.P.F. 04879275000104


LOGRADOURO / NUMERO / COMPLEMENTO
RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 3900
SALA B


BAIRRO ID. BELO HORIZONTE
CEP 78705-600
CIDADE RONDONOPOLIS

DÉBITOS	SITUAÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	ACRÉSCIMOS	TOTAL
I.P.T.U.	Imóvel: 000000000986968 Emitido	11/04/2016	6.990,53	0,00	6.990,53
TOTAL			6990,53	0,00	6990,53

Os débitos serão acrescidos da TAXA DE SERVIÇO ADM na emissão do DAM


VALDECIR FELTRIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA


CLEOMAR DE LIMA CARVALHO
Servidor Responsável


RONALDO MOTA DE MORAES
GERENTE DEPTO LÇNTO E ARRECAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
CND VÁLIDA
TAXA RECOLHIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA: A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÉS
CNPJ: 04217362000190


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO, para devidos fins e para que produza efeitos legais que o contribuinte abaixo, em busca realizada ate esta data em nossos arquivos, não foram constatados débitos nesta coordenadoria de arrecadação, cadastro e tributos. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apurados.

Cadastro:	000018310	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	CPF/CNPJ:	04879275000106
Endereço:	RUA FERNADO CORREA DA COSTA, 3800	Complem:	CAIXA POSTAL 023
Bairro:	JARDIM BELO HORIZONTE	CEP:	78705600
Cidade:	RONDONOPOLIS-MT		

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Emissão: 06/04/2016 14:33:49 Validade: 06/05/2016 ✓ Usuário: VILMAR
Número/Controle da Certidão: BE3B407A45FD6FF9


Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos

Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO				PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS			Data:			
CREDOR	PROCESSO	I. C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Francisco Marino	160096/16	140/13	24º Med.	47.206.688,79	31.626.270,44	15.580.418,35	1.806.550,55	16.000.210-2	44.90.51	151	R\$ 13.773.867,80	
TOTAL PROGRAMADO							1.806.550,55					

OBS.:Ref. Aos Serv. De Pavimentação asfáltica Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-336, conforme IC - 140/13

AUTORIZO:


Engº José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras


Engº Marcos Catalano Corrêa
Secretário Adjunto de Obras

Engº Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica





ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 160096/16 Contrato nº: 1210/13

Vigência: _____ Empresa Contratada: TRILHO 20

Resumo do Objeto: Pavimentação LOT-336

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 12 de out de 2016, _____ de _____ de _____
(local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras
SINFRA/MT

Julio Mangin Fernandes Neto
Chefe da Unidade IV
Unidade de Medição e Gerenciamento-UNIMG




SAOB/SINFRA
Folha nº 49
Ass. _____

DESPACHO

PROTOCOLO Nº	160096
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONTRATO	IC 140/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 12 de abril de 2016.

Engº. Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB





COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 140-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

12 de abril de 2016 15:37

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA <fransuisesouza@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos.
Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.04888-3

NOME DO CREDOR: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ : 04.879.275/0001-06

IC : 140/2013 - 24º MEDIÇÃO PROVISÓRIA

SUBCONTA: 218

EMPENHO: 25101000116000210-2

PROCESSO: 160096/2016

 24º Medição.xls
8667K

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 140 - Ano: 2013

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Código: 25361 Inclusão: 12/11/2013

Obra	Contrato Nº/Ano-Obra: 140/2013-1	Valor Inicial da Obra: R\$ 40.597.659,23	Prazo de Execução Inicial (dias): 540
	Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Concorrência Pública
	BEM PÚBLICO: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336		

Objeto

Quantidade: 51,05 Unidade de Medida: km - Quilômetro
Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antonio do Leste/ Primavera do Leste - Entrº MT-130, com extensão de 51,05 Km.

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Inclusão: 26/08/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: MT - 336

Bairro: Trecho: Fim do trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entrº MT - 130

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78.850-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Origem de Recursos

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52

Total Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52

Nº/Ano do Convênio: 20-00011-1/2012 Órgão Concedente: BNDS-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 07/03/2013

Localização

Latitude: S 14° 58' 03,22" Longitude: W 54° 03' 47,12"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 14° 54' 04,00" Longitude: W 53° 41' 08,55"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Inicio

Inclusão: 12/11/2013

Inclusão: 12/11/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: JOSÉ TEODORO NETO

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 593.4 KB

Nome: ART FISC (2).pdf

Descrição: ART FISC 2

Tamanho: 905.4 KB

Nome: ART FISC (1).pdf

Descrição: ART FISC 1

Tamanho: 105.6 KB

Nome: Portaria 140 13 NOVO l.pdf

Descrição: Portaria

Inclusão: 12/11/2013

Inclusão: 12/11/2013

Inclusão: 12/11/2013



Engenheiro de Execução

Engenheiro: EVERSON TOMOYOSHI OGAWA

Início Atividade: 12/07/2013

Inclusão: 12/11/2013

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT.pdf
Descrição: ART CONT

Tamanho: 388.7 KB

Inclusão: 12/11/2013

Situação da Obra

Data Situação: 29/04/2015

Data Publicação: 10/08/2015

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

Situação: Reiniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OR

Tamanho: 412.2 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 01/12/2014

Data Publicação: 17/12/2014

Inclusão: 19/08/2015

Descrição: OR

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OP

Tamanho: 377.5 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Data Publicação: 02/08/2013

Inclusão: 12/11/2013

Descrição: OIS

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS 140 2.013.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 9.6 KB

Inclusão: 12/11/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 58662 (Cód.: 59553)

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 188.184,27

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 13a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 13º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 56207 (Cód.: 59531)

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 166.181,27

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 12a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 12º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54939 (Cód.: 59528)

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 45.897,55

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 10a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 10º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 52737 (Cód.: 59521)

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 209.879,88



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 6º Medição de Reajustamento

Inclusão: 19/12/2014

Tamanho: 1,6 MB

Nº Medição: MR / Vinc.: 50132 (Cód.: 59513)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 124.663,13

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1,4 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54663 (Cód.: 59522)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 265.905,51

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 7a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 7º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1,7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 52296 (Cód.: 59520)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 107.985,00

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: Reajustamento 5º Medição

Tamanho: 1,5 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54917 (Cód.: 59525)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 94.423,74

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 8a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 8º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1,7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54940 (Cód.: 59529)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 37.235,62

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 11a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 11º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1,7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54918 (Cód.: 59526)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 57.655,09

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 9a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 9º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1,7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 49794)

Data da Medição: 02/08/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.994.507,70

Período: 12/07/2013 a 31/07/2013

Inclusão: 12/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1º MEDIÇÃO MT-336 (1).xls
Descrição: MPI

Tamanho: 2,8 MB

Inclusão: 12/11/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49795)

Data da Medição: 02/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 2.249.916,62

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 12/11/2013



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 3.0 MB

Inclusão: 12/11/2013

Nome: 2ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: MPI

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50131)

Data da Medição: 02/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 3ª Medição Provisória

Valor: R\$ 2.710.835,28

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 3ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 3.5 MB

Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 50132)

Data da Medição: 02/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.711.665,11

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 29/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 4ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 4ª MEDIÇÃO

Tamanho: 3.4 MB

Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 52296)

Data da Medição: 02/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.884.584,53

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 19/03/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 5ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 19/03/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 52737)

Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 3.517.421,51

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 04/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 6ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 6ª medição

Tamanho: 2.6 MB

Inclusão: 04/04/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54663)

Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 3.724.065,49

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 25/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 7ª MEDIÇÃO MT-336_CORRIGIDA.xls

Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 7.6 MB

Inclusão: 25/06/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54917)

Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.258.983,43

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 8ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 8ª medição

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54918)

Data da Medição: 03/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 923.152,96

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 9ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 9ª medição

Tamanho: 8.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54939)

Data da Medição: 03/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 725.878,83

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 07/07/2014



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 10ª MEDIÇÃO/O MT-336.xls
Descrição: 10ª medição

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 64940)

Data da Medição: 03/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 581.707,87

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 11ª MEDIÇÃO/O MT-336.xls
Descrição: 11ª medição

Tamanho: 8.1 MB

Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 66207)

Data da Medição: 03/07/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 3.028.908,53

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 22/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 12ª Medição.xls
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 8.0 MB

Inclusão: 22/08/2014

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 66662)

Data da Medição: 03/08/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 4.068.597,85

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 11/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 13ª Medição.xls
Descrição: 13ª Medição

Tamanho: 8.5 MB

Inclusão: 11/09/2014

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64625)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 29/04/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 14ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64626)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 64627)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 16ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 64629)

Data da Medição: 03/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 2.385.647,67

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 17ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 9.5 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 67691)

Data da Medição: 16/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 28/01/2016



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 18ª Medição Provisória

Inclusão: 28/01/2016

Tamanho: 9.7 MB

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 28/01/2016

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 67692)

Data da Medição: 09/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Provisória**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 19ª Medição Provisória

Inclusão: 28/01/2016

Tamanho: 9.7 MB

Valor: R\$ 660.397,06

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 28/01/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 67693)

Data da Medição: 03/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 20ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 20ª Medição Provisória

Inclusão: 28/01/2016

Tamanho: 8.3 MB

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 69529)

Data da Medição: 01/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 21ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 21ª Medição

Inclusão: 12/04/2016

Tamanho: 8.2 MB

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 69530)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 22ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 22ª Medição

Inclusão: 12/04/2016

Tamanho: 8.2 MB

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 69531)

Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23ª Medição Provisória**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 23ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 23ª Medição

Inclusão: 12/04/2016

Tamanho: 8.2 MB

Valor: R\$ 1.806.550,55

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 69534)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24ª Medição Provisória**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24ª Medição.xls
Descrição: 24ª Medição Provisória

Inclusão: 12/04/2016

Tamanho: 8.9 MB

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 02/2016

Nº/Ano: 01/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 146

Prazo Ex. Aditado (dias): 360

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Inclusão: 05/04/2016

Inclusão: 17/06/2015



Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra:	R\$ 40.597.659,23	Valor Total Medido:	R\$ 33.432.820,99
Valor Total Adilado Obra:	R\$ 0,00	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final Obra:	R\$ 40.597.659,23	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 33.432.820,99	Valor Total Executado Obra:	R\$ 33.432.820,99
Valor Total Reajuste:	R\$ 1.298.011,06		

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	540	Quantidade de Dias em Execução:	857
Prazo Execução Total Adilado Obra (dias):	506	Quantidade de Dias Paralisada:	149
Prazo Execução Final Obra (dias):	1046		



DESPACHO

À SAADS

Sr^a Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Sr^a Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA

A SUOF,

AUTORIZADO


Eng.ª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA

12/04/16



COFIN
59
Ass.

Processo nº 160096/2016

Fls.: 59/2016

Data 12/04/2016

À COFIN,

Encaminhamos o processo para liquidação e pagamento.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS/SINFRA





IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04879275/0001-06
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Endereço: R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800 SALA B / JD B
HORIZONTE / RONDONOPOLIS / MT / 78705-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/04/2016 a 08/05/2016 ✓

Certificação Número: 2016040904440113021904

Informação obtida em 13/04/2016, às 15:51:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa: <i>Construtora Tripelo Ltda</i>	
Processo: <i>360096/2016</i>	IC: <i>340/2013</i>
Período da Despesa: <i>01/03/16 a 31/03/16</i>	Empenho: <i>36.000.210-2</i>
Produto/serviço:	Notas Fiscais: <i>526/16</i>

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)	<input checked="" type="checkbox"/>			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	<input checked="" type="checkbox"/>			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida?	<input checked="" type="checkbox"/>			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?		<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	<input checked="" type="checkbox"/>			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	<input checked="" type="checkbox"/>			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?	X			
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?		X		
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?		X		

Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 13 de abril de 2016.

Check-list elaborado por:

Leticia O.

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

PROT./SINFRA
Fl. 62
Nome C
Área COFI

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000415-4
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 25101.0001.16.000210-2	Data do Doctº: 13/04/2016
--------------------------------	---------------------------

Nº PED: 25101.0001.16.000279-8	Data de vencimento: 13/04/2016
--------------------------------	--------------------------------

Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
---------	-------------	-------------

Órgão:
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Unidade Orçamentária:
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
25101.0001 Geral

Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **
------------------------------	-----------------------------------

Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1
-------------------------------	-----------------------	--

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
--	---

NEX:*** **

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6
--	---------------------------------	---

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6	Valor Liquidação: *** 1.806.550,55	UM MILHÃO E OITOCENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **
---	---------------------------------------	--

Histórico:
PROC 160096/2016 IC-140/2013 , REFERENTE 24º MEDIÇÃO execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado à Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste à Entº MT-130, numa extensão de 51,05 Km.PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016 , CONFORME O DESPACHO DA pag 58, NF 526

Código do credor: 2003.04888-3	Credor: Construtora Tripolo Ltda
-----------------------------------	-------------------------------------

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06	Município UF: Rondonópolis - MT	Nº Processo de Pagamento 59185/2014
---------------------------------	------------------------------------	--

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
---------------	----------------------------------

	Data de Retorno da Viagem: *** **
--	-----------------------------------

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000014013	Término da vigência: *** **
--------------------------------	-----------------------------

Nº Convênio: *** **

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 4.385.071,88	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.806.550,55	Esta liquidação (R\$) *** 1.806.550,55	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 4.385.071,88	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.806.550,55	Esta liquidação (R\$) *** 1.806.550,55	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	---



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000415-4
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00
INSS (R\$):	*** 63.229,27	MTPREV (R\$):	*** 0,00
		Município:	*** **
		Outras consignações (R\$):	*** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 1.743.321,28	UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **
-----------------------	------------------	--



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			Valor
Natureza Despesa	Descrição		
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros		*** 1.806.550,55
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 1.806.550,55

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR			Valor
Código	Descrição		
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social		*** 63.229,27
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:			*** 63.229,27

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

160096/16



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.000621-5
Data de Emissão: 14/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 2003.04888-3		
Credor: Construtora Tripolo Ltda		
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06	Município UF: Rondonópolis MT	
Nº EMP: 25101.0001.16.000210-2	Fonte de Recurso: 151	
Nº LIQ: 25101.0001.16.000415-4	Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3	Valor da Operação (R\$): *** 1.743.321,28	Valor por Extenso: UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E TRÊZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006141 - Marciano Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.000624-1
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 14/04/2016

Nº NOBLIST: _____ **Nº DOTLIST:** _____

Unidade Orçamentária:
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não	Nº NEX : ***
--	---	------------------------------	------------------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Município UF:** Brasília DF

EMP: 25101.0001.16.000210-2


Nº LIQ: 25101.0001.16.000415-4 **Fonte de Recurso:** 151

Nº Processo de Pagamento: 59185/2014 **Forma Recebimento:** Pagamento de Faturas

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 63.229,27	Valor por Extenso: SESSENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** ** * ** * ** * ***** ** * ** * ** * ** * ***** ** * ** * ** * ** *
-------------------------------	--	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.



 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Autorizo o Pagamento



 006141 - Marciane Prevedello Curvo
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
 Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2100	63.229,27	88DEDABDB4F 00018

PROT./SINFRA
Fl. 64
Nome C
Área COFS


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2016
	5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	63.229,27
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	63.229,27
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 04.879.275/0001-06
 CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B
 CENTRO
 RONDONOPOLIS MT
 CEP 78705-600

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/05/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2016
	5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06
	6 - VALOR DO INSS	63.229,27
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	63.229,27
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 04.879.275/0001-06
 CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B
 CENTRO
 RONDONOPOLIS MT
 CEP 78705-600

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) **20/05/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Proc. 160096/2016

NF 526



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SIN

Protocolo n.: 160101/2016 Data: 04/04/2016 09:19

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Assunto: REAJUSTAMENTO
Resumo: DA 24 MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 140/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA M

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



IC J40113.

16.000.370-2 44 90 51 J51

25/5/16



REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Cuiabá, 01 de abril de 2016.

Ao Ilmo Sr.

Eng.º José Carlos Ferreira da Silva

M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT


Nesta

Assunto: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Reajustamento
Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU


Venho, pelo presente encaminhar a 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Reajustamento de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/03/2016 a 31/03/2016, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato

24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Reajustamento
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Atenciosamente


Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

Ed. Edgar Prado Arze Centro Político Administrativo - CPA - S/N, CEP 78049-906 - Cuiabá - MT - Fone (065) 3613 - 6600





Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Sub-Trecho:
Referência: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Ordem de Paralisação: 01/12/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 29/04/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
Extensão: 51,05 KM
Firma: Construtora Tripolo LTDA
Instrumento Contratual: 140/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 45226/2013-SETPU
Data da Assinatura: 09/07/2013
Data da Publicação: 09/07/2013
Naturaza dos Serviços: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Prazo Contratual: 1260 Dias
Término Previsto: 23/12/2016
Ordem de Início de Serviço: 12/07/2013 - 087/2013
Prazo Decorrido do Contrato: 994 Dias
Valor Contratual (PI): R\$ 38.017.467,91
Valor Termo Aditivo: R\$ 9.189.220,88
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 47.206.688,79
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 33.432.820,99
Saldo Contratual (PI) : R\$ 13.773.867,80
Valor Empenhado no Exercício:

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 01 de abril de 2016.

Atenciosamente


Eng° José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN


DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT - 336

Trecho: Fim do trecho pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTR° MT-130

Sub-Trecho:

Extensão: 51,05 km

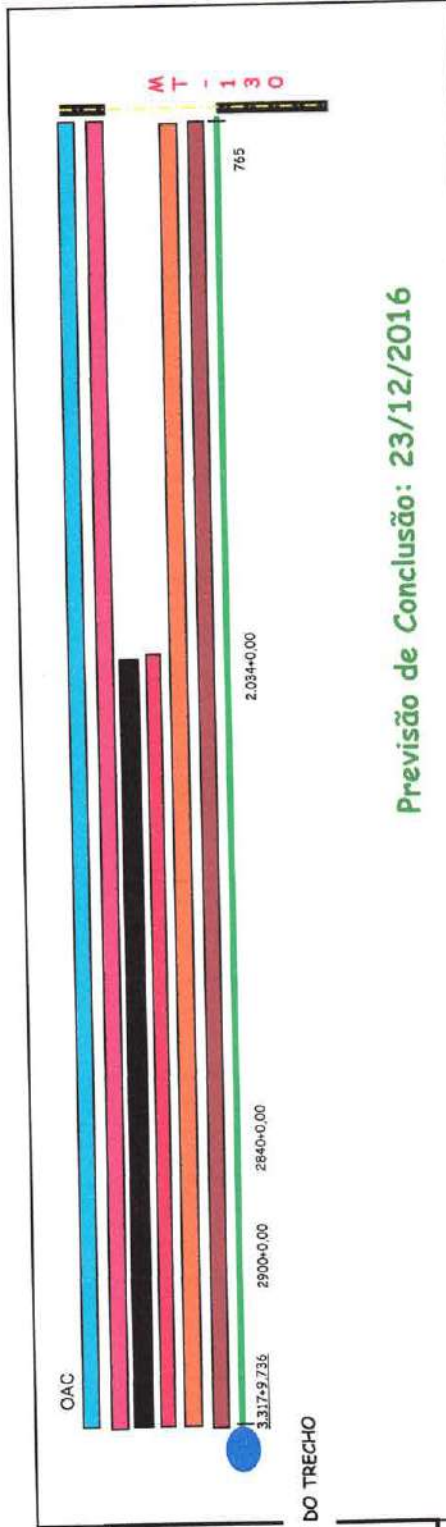

LEGENDA

- CBUQ
- Imprimação
- Base
- Sub-Base
- Terraplenagem
- OAC
- Recuperação Ambiental
- Sinalização

FIM DO TRECHO

CONCLUÍDO

ATACADO

QUILOMETRAGEM	ATACADO (%)	CONCLUÍDO (%)
0	100%	100%
3	100%	100%
6	100%	100%
9	100%	100%
12	100%	100%
15	100%	100%
18	100%	100%
21	100%	100%
24	100%	100%
27	100%	100%
30	100%	100%
33	100%	100%
36	100%	100%
39	100%	100%
42	100%	100%
45	100%	100%
48	100%	100%
51,05	100%	100%

S. Theodoro

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5



GOVERNO DO MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AV. ANTONIO TEIXEIRA, 2075 - FONE: (51) 3333-1000
RUA J. J. CALAZANS, 1 - FONE: (51) 3333-1000
TRONCO 5000 - COLÔNIA - SANTA RITA DO SUL

SINFRA

ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodoviar: MT-336
Processo: 45226/2013
Contra: 140/2013/00/00-SETPU
Data Assinatura: 09/07/2013
Data publicação: 09/07/2013
Preço do contrato: 38.017.467,91
Termo(s) Aditivo(s): 140/2013/004/001 - SINFRA
Data de Publicação: 12/08/2014
Vr. Termo aditivo a PI: 9.189.220,88
PI atual do contrato: 47.206.688,79
Firma Executora: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Período Acum: 12/07/2013 a 31/03/2016
Referência: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Período Med. Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016

SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM		SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA		FINANCEIRO - MEDIÇÕES A PI + REAJUSTAMENTO	
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO	VALOR A PI	REAJUSTE	VALOR PI + R
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 581.066,25	85,73%	R\$ 1.994.507,70		R\$ 1.994.507,70
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 171.115,98	R\$ 2.507.877,58	78,50%	R\$ 2.249.916,62		R\$ 2.249.916,62
TERRAPLENAGEM	R\$ -	R\$ 8.268.064,01	99,98%	R\$ 2.710.835,28		R\$ 2.710.835,28
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 901.112,13	R\$ 7.079.999,25	52,20%	R\$ 1.711.665,11		R\$ 1.711.665,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 502.616,81	R\$ 3.156.829,62	49,06%	R\$ 1.884.584,53		R\$ 1.884.584,53
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 182.434,23	R\$ 8.205.212,13	95,96%	R\$ 3.517.421,51		R\$ 3.517.421,51
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 3.724.065,49		R\$ 3.724.065,49
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ -	R\$ 748.693,05	92,27%	R\$ 1.258.983,43		R\$ 1.258.983,43
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 217,90	R\$ 74.988,10	63,20%	R\$ 923.152,96		R\$ 923.152,96
SINALIZAÇÃO	R\$ 49.489,30	R\$ 247.915,50	41,50%	R\$ 725.878,83		R\$ 725.878,83
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ -	R\$ 2.562.173,50	90,24%	R\$ 581.707,87		R\$ 581.707,87
				R\$ 3.028.906,53		R\$ 3.028.906,53
				R\$ 4.068.597,85		R\$ 4.068.597,85
				R\$ -		R\$ -
				R\$ -		R\$ -
				R\$ -		R\$ -
				R\$ 2.385.647,67		R\$ 2.385.647,67
				R\$ -		R\$ -
				R\$ -		R\$ -
				R\$ -		R\$ -
				R\$ 860.397,06		R\$ 860.397,06
				R\$ -		R\$ -
				R\$ -		R\$ -
				R\$ -		R\$ -
				R\$ 1.806.550,55		R\$ 1.806.550,55
TOTAL	R\$ 1.806.550,55	R\$ 33.432.820,99	89,00%	33.432.820,99		13.773.867,80

Local e data: Curitiba, 01 de abril de 2016.
Comissão de Fiscalização
Engº José Teodoro Neto
Fiscal Pnt 505/2013/SETPU
RNP-1207/16286-5

UNIMG/SINFRA
Folha nº 01
Ass.

SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICAGOVERNO DE
MATO GROSSO
SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃOESTADO DE MATO GROSSO - BRASIL - RUA J. QUARETA, 111 - SETOR A
BOQUEIRÃO - FORTALEZA - FORTALEZA

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

www.mt.gov.br

RESUMO DE REAJUSTAMENTO

Obra: Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica
 Rodovia: MT-336
 Trecho: Km.
 Referência: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Reajustamento
 O. Serviço: 12/07/2013
 Período Med. Simples: 01/03/2016 a 31/03/2016
 Período Med. Acumul: 12/07/2013 a 31/03/2016

Número 140/2013/00/00-SETPU
 Assinatura 09/07/2013
 Aprovações
 Processo 45226/2013

Firma : CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA	MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR REVISIVEL	FATOR K _i	VALOR REAJUSTAMENTO
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 581.068,25	R\$ 581.068,25	-	0,2264	-
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 2.507.877,58	R\$ 2.336.761,60	171.115,98	0,2264	38.740,85
	TERRAPLENAGEM	R\$ 8.268.064,01	R\$ 8.268.064,01	-	0,2264	-
	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.079.980,25	R\$ 6.178.887,12	901.112,13	0,1960	176.617,97
	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.205.212,13	R\$ 8.022.777,90	182.434,23	0,1960	35.757,10
	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO	R\$ 626.706,36	R\$ 526.924,87	99.781,49	0,3024	30.173,92
	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 2.405.729,16	R\$ 2.022.699,34	383.029,82	0,2618	100.277,20
	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 124.394,10	R\$ 104.588,60	19.805,50	0,2569	5.088,03
	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	R\$ -	R\$ -	-	0,1663	-
	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 748.693,05	R\$ 748.693,05	-	0,1663	-
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 236.825,40	R\$ 189.538,22	47.287,18	0,1865	8.819,05
	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 11.090,10	R\$ 8.887,98	2.202,12	0,2305	507,58
	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 74.988,10	R\$ 75.206,00	(217,90)	0,1458	(31,76)
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 2.562.173,50	R\$ 2.562.173,50	-	0,1458	-
	TOTAL	33.432.620,99	31.626.270,44	1.806.550,55		395.949,74

Índices/DNER	FATOR K		
	SET12	SET15	K
TERRAPLENAGEM	219,0200	268,6150	0,2264
PAVIMENTAÇÃO	242,7690	290,3720	0,1960
AQUISIÇÃO ASFALTO DILUÍDO	300,0470	390,7820	0,3024
AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA	264,8000	332,5930	0,2569
AQUISIÇÃO CIMENTO ASFÁLTICO	258,1630	325,7740	0,2618
DRENAGEM	233,1310	271,9080	0,1663
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	225,3920	267,4400	0,1865
CONSERVAÇÃO	229,9960	283,5420	0,1458
OBRA DE ARTES ESPEC.	229,5450	265,3750	0,1560
SINALIZAÇÃO VERTICAL	127,2110	156,5410	0,2305

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados em R\$

Importa o valor a ser pago de:

395.949,74
TREZENTOS NOVENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS QUARENTA E NOVE REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Eng. José Teodoro Neto
 Fiscal SETPU - Port.505/2013
 CREA RNP 120776286-5

Cuiabá, 01 de abril de 2016.

140/2013/00.00-SETPU
09/07/2013
09/07/2013
45226/2013-SETPU
140/2013/04.01-SETPU
140/2013/04.01-SETPU
12/07/2013 a 31/03/2016

Obras:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Nº Contrato	140/2013/00.00-SETPU	Prazo de Execução	1260
Rodovias:	MT- 336	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	266
Trechos:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTRADA MT-130	Publicação	09/07/2013	Vr. Contratual PI	R\$ 47.206.688,79
Extensão:	51,05 KM	Processo Orig.	45226/2013-SETPU	Vr. Acum-Medido PI	R\$ 33.432.820,99
Referência:	24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória	Termo Aditivo N.º	140/2013/04.01-SETPU	Vr. Acum. Programado PI	
Ordem Início serviço:	17/07/2013 - 08/12/2013	Termo Re-Ratificação N.º	140/2013/04.01-SETPU	Vr. Programado Próx. mês PI	
Período Med. Simples:	01/03/2016 a 31/03/2016	Período Acum.:	12/07/2013 a 31/03/2016	FIRMA:	Construtora Triplo LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2 S 02 110 00	Regularização do Sub-Leito	m²	655.788,930	-	655.788,930	655.788,930	0,72	472.168,02	100,00%
2 S 02 200 00	Sub - Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	128.019,534	-	78.229,112	78.229,112	12,12	948.136,83	61,11%
2 S 02 200 01	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	121.743,030	9.500,400	50.169,600	59.670,000	12,12	723.200,40	49,01%
2 S 02 300 00	Impedimento (execução)	m³	519.798,020	40.600,000	214.400,000	255.000,000	0,26	66.300,00	49,06%
2 S 02 400 00	Pinura de Ligação (execução)	m²	519.798,020	40.600,000	214.400,000	255.000,000	0,17	43.350,00	49,06%
2 S 02 540 51	Conc. Betuminoso usado a quente - capa rolamento AC/BC	t	62.375,762	4.872,000	25.728,000	30.600,000	157,74	4.826.844,00	49,06%
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							7.079.999,25	52,20%
4.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	292,320	1.543,680	1.836,000	1.310,31	2.405.729,16	49,06%
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído DM-30	t	623,758	48,720	257,280	306,000	2.046,06	626.706,36	49,06%
2 S 02 999 04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RB-1C	t	207,919	16,240	85,760	102,000	1.219,55	124.359,10	49,06%
	SUB-TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							3.156.829,62	49,06%
5.0	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO								
2 S 09 001 05	Transporte local em rod. Não pav. De sub-base	boxm	6.137.127,880	-	6.120.769,279	6.120.769,279	0,66	4.039.707,72	99,73%
2 S 09 001 05	Transporte local em rod. Não pav. De base	boxm	5.836.181,132	-	5.829.250,330	5.829.250,330	0,66	3.847.305,21	99,88%
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	1.052,640	783,360	1.836,000	141,80	260.344,80	49,06%
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM 30	t	623,758	175,440	130,560	306,000	141,80	43.390,80	49,06%
2 S 09 009 04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR 1C	t	207,919	58,480	43,520	102,000	141,80	14.463,60	49,06%
	SUB-TOTAL DE TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO							8.205.212,13	95,96%
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA								
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	490,000	-	-	-	42,59	-	0,00%
2 S 04 900 71	Sarjeta cantoneira central concreto - SCC 01 - AC/BC	m	442,000	-	-	-	35,55	-	0,00%
2 S 04 910 51	Melo fio de concreto - MFC 01 - AC/BC - tipo B - (Sarjeta de 50,0 cm)	m	1.517,000	-	-	-	66,15	-	0,00%
2 S 04 910 53	Melo fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	20.590,000	-	-	-	32,09	-	0,00%
2 S 04 910 35	Melo fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	993,000	-	-	-	32,24	-	0,00%
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rápido - canal retang. - DAR 02 - AC/BC	m	671,250	-	-	-	87,88	-	0,00%
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	unid.	402,000	-	-	-	46,60	-	0,00%
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	unid.	13,000	-	-	-	55,69	-	0,00%
2 S 04 950 62	Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC	unid.	2,000	-	-	-	289,78	-	0,00%
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DES 01 - AC/BC/PC	unid.	408,000	-	-	-	281,04	-	0,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/basc. 10m3 em rodov. Não pav. - AC/BC/PC	boxm	128.506,619	-	-	-	0,52	-	0,00%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/basc. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	boxm	1.109.571,877	-	-	-	0,33	-	0,00%
	SUB-TOTAL DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA								0,00%
7.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE								
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³	811,612	-	811,418	811,418	5,950	4.827,93	99,98%

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

RESUMO DE MEDIÇÃO SINFRA

		Nº Contrato		140/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução		1260	
		Data Assinatura		09/07/2013		Prazo Resolvente		266	
		Publicação		09/07/2013		Vr. Contratado PI		R\$ 47.206.688,79	
		Processo Orig.		45226/2013-SETPU		Vr. Acum. Medido PI		33.432.820,99	
		Termo Aditivo N:		140/2013/04/01-SETPU		Vr. Programado PI			
		Termo Re-Ratificação N:		140/2013/04/01-SETPU		Vr. Programado próx. mês PI			
		Período Acum.:		12/07/2013 a 31/03/2016		FIRMA:		Construtora Tripolo LTDA	
COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
4 S 06 121 01		unid.	16.047,000	3.038,000	6.406,000	9.444,000	13,30	125.605,20	59,85%
4 S 06 121 11	Form. E colocação de tacha reflet. Bidimensional	unid.	305,000	-	-	-	39,82	-	0,00%
4 S 06 200 02	Formac. E Colocação de tachão refletiva bidimensional	m²	179,860	5,927	23,922	29,849	371,54	11.090,10	16,60%
	Formac. E Implantação placa Sinalização Totalmente refletiva							247.915,50	41,50%
	SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO								
10.0	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								
2 S 05 100 00	Enlameamento	m²	10.036,370	-	10.036,370	10.036,370	7,72	77.480,77	100,00%
2 S 05 102 00	Hidrosemeadura	m²	1.287.186,577	-	1.128.915,610	1.128.915,610	1,75	1.975.602,31	87,70%
3 S 01 930 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (jacidas e empréstimo)	m²	826.086,370	-	826.086,370	826.086,370	0,22	181.739,00	100,00%
Sinapi 73967/003	Plantio de árvores e arbustos	unid.	11.402,000	-	11.402,000	11.402,000	26,71	327.351,42	100,00%
	SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							2.562.179,50	90,24%
	TOTAL GERAL							33.432.820,99	71,88%
	A DEDUZIR MEDIÇÕES ANTERIORES							31.626.270,44	3,88%
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO							1.806.550,55	

Importo a ser pago de R\$ 1.806.550,55

Cuiabá, 01 de abril de 2016.

Fiscalização:

Teodoro Neto
Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

UM MILHÃO, OITOCENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º José Carlos Ferreira da Silva
M.D. Superintendente de Obras de Transportes - SUOT
CUIABÁ/MT

Assunto : 24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Reajustamento.
Ref. I.C. Nº 140/2013

Através da presente , encaminho a V.Sª. a 24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Reajustamento, devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Reajustamento.....R\$ 395.949,74

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 05 a 12.

Em 6 de Abril de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Servidor/Colaborador
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES


PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 340/16	Data: 20/05/2016								
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Tripolo	160101/16	140/13	Reajust.24º Med.	47.206.688,79	31.626.270,44	15.580.418,35	395.949,74	16.000.370-2	44.90.51	131	R\$ 15.184.468,61
TOTAL PROGRAMADO							395.949,74				

OBS.:Ref. Aos Serv. De Pavimentação asfáltica Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-336, conforme IC - 140/13

Ciente:


Engº José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras

AUTORIZO:


Engº Marcos Catalano Corrêa
Secretário Adjunto de Obras


Engª Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica



UNIMG/SINFRA

Folha nº 14

Ass. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

M/G/SINFRA

Cidade nº 15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo , informando o código de verificação.	Código de verificação D026.9E9E.67B9	Data/Hora de emissão 31/03/2016 - 17:08:13
	Natureza da operação Recolhimento Fora	Número da Nota 527

Prestador de Serviços



CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.
CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL
CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06
Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Municipal 1438108
Inscrição Estadual 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA
CPF/CNPJ 03.507.415/0022-79
Endereço RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A
Bairro CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .
Cep 78049-906
Cidade CUIABÁ - MT - BRASIL
Email silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. a 24ª medição provisória de reajustamento de serviços de Pavimentação Asfáltica da rod. MT-336, trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE/PVA ENTR. MT 130, com extensão de 51,05KM - Objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, referente período 01/03/2016 a 31/03/2016.

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquotas (%)	Valor da ISS (R\$)	Total (R\$)
395.949,74	1,00	0,00	237.569,84	158.379,90	0,00	0,00	395.949,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 395.949,74

Retenções

ISS (R\$)	IR (R\$)	CoFins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00		395.949,74

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



Os serviços foram executados e por
mim atestados.

Eng^o José Teodoro Neto

Port.: 505 / 2013-SET/PU

CREA: 120776286-5/RN



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data Hora da emissão
D026.9E9E.67B9	31/03/2016 - 17:08:13
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	527

Prestador de Serviços



CONSTRUTORA TRIPOLU LTDA

FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP: 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Email: contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Municipal: 1438108

Inscrição Estadual: 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CPF/CNPJ

03.507.415/0022-79

Rua/Av

RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A

Cidade

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .

CEP

78049-906

Estado

CUIABÁ - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

Fone

silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. a 24ª medição provisória de reajustamento de serviços de Pavimentação Asfáltica da rod. MT-336, trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE/PVA ENTR. MT 130, com extensão de 51,05KM - Objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, referente período 01/03/2016 a 31/03/2016.

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor Serviço (R\$)	Qtd	Descontos (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Totais (R\$)
395.949,74	1,00	0,00	237.569,84	158.379,90	0,00	0,00	395.949,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 395.949,74

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISS (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	395.949,74

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



Os serviços foram executados e por
mim atestados.

Eng^o José Teodoro Neto

Port.: 50512013 SET/PU

CREA: 120776286-5/RN

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**



Data: 25/04/2016 - 10:09:57

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016614281**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **25/04/2016**

Hora de emissão: **10:09:58**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**

Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **24/05/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TLL2KTK2T2T9U2B7**

Página 1 de 2

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

UNIMG/SINFRA
Folha nº 18
Ass. J.S.

Data: 25/04/2016 - 10:09:57

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0016614281**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: 25/04/2016

Hora de Emissão: 10:09:58

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPLO LTDA - Contribuinte com parcelamento de débitos
regular(em dia) no Sistema de Conta Corrente Fiscal
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até 24/05/2016.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : TLL2KTK2T2T9U2B7

Página 2 de 2

Retornar

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04879275/0001-06
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Endereço: R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800 SALA B / JD B
HORIZONTE / RONDONOPOLIS / MT / 78705-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/04/2016 a 27/05/2016

Certificação Número: 2016042803470529237001

Informação obtida em 03/05/2016, às 16:31:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
 TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**
 CNPJ: **04.879.275/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 10:35:24 do dia 20/03/2016 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 16/09/2016.

Código de controle da certidão: **02C9.229D.45AC.EFC2**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

LOCALIZAÇÃO
ENDEREÇO: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 3.800, SALA - B
BAIRRO: JARDIM BELO HORIZONTE
MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT
CEP: 78.700-000

CNPJ
04.879.275/0001-06

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
712.937.281-87	FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
902.505.321-15	FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI



Cuiabá, 26/04/2016

Responsável pela Expedição

Arnaldo J. G. Gonçalves
Arnaldo J. G. Gonçalves
Mat.: 95546
Técnico PGE/MT

Romeu Julio Tomaz
Procurador(a) do Estado
Romeu Julio Tomaz
Procurador do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: FGUOLITVGLVSK30ZDVBWASDD0P89TT

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

ANEXO DE DÉBITOS - CERTIDÃO POSITIVA C/ EFEITO NEGATIVO

3637 / 2016



CONTRIBUINTE CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	C.N.P.J./C.P.F. 0487927500010
--	----------------------------------

LOGRADOURO / NÚMERO / COMPLEMENTO

RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 3800
SALA 8

BAIRRO JD. BELO HORIZONTE	CEP 78705-600	CIDADE RONDONOPOLIS
------------------------------	------------------	------------------------

DEBITOS	SITUAÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	ACRÉSCIMOS	TOTAL
I.P.T.U.					
	Imóvel: 00000000986968				
	Emitido	11/07/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/08/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	12/09/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/10/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/11/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/03/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	10/06/2016	873,82	0,00	873,82
TOTAL			6116,74	0,00	6116,74

Os débitos serão acrescidos da TAXA DE SERVIÇO ADM na emissão do DAM

VALDECIR FELTRIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITACLEOMAR DE LIMA CARVALHO
Servidor ResponsávelRONALDO MOTA DE MORAES
GERENTE DEPTO LCNTO E ARRECAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
CND VALIDA
TAXA RECOLHIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190

UNIMG/SINFR

Folha nº 25
Ass:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO, para devidos fins e para que produza efeitos legais que o contribuinte abaixo, em busca realizada até esta data em nossos arquivos, não foram constatados débitos nesta coordenadoria de arrecadação, cadastro e tributos. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apurados.

Cadastro:	000018310	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	CPF/CNPJ:	04879275000106
Endereço:	RUA FERNADO CORREA DA COSTA, 3800	Compliem:	CAIXA POSTAL 023
Bairro:	JARDIM BELO HORIZONTE	CEP:	78705600
Cidade:	Rondopolis-MT		

ATENÇÃO Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Emissão:	09/05/2016 13:49:51	Validade:	08/06/2016	Usuário:	VILMAR
Número/Controle da Certidão:	132E536BF53FC06C				

Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos

Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos.



ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 160101/16 Contrato nº: 140/13
 Vigência: _____ Empresa Contratada: Tru Polo
 Resumo do Objeto: Registro da 2ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Bebera 19 de junho de 2016 _____ de _____ de _____
 (local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo
preenchimento (Chefe da UNIMG)
Silvio Pereira Rosa
 Assessor Técnico III
 UNIFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

Jose Carlos
 Engº. José Carlos Ferreira da Silva
 Superintendente de Obras
 CREA-RN: 1201387132


Silvio Mangini
 Engº. Silvio Mangini Fernandes Neto
 Chefe da Unidade IV
 Unidade de Medição e Gerenciamento-UNIMG



TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO Nº	160101
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONTRATO	IC 140/2013
ASSUNTO	REAJUSTAMENTO
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 23 de maio de 2016.


Eng. Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB

EM BRANCO



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 140-13**

24 de maio de 2016 11:14

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>
Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA
<janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, cgfo@sefaz.mt.gov.br
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira
<grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>

Bom dia,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos.
Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:


CÓDIGO DO CREDOR: 2003.04888-3

NOME DO CREDOR: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ : 04.879.275/0001-06

IC : 140/2013 - 24º MEDIÇÃO REAJUSTAMENTO

SUBCONTA: 218

EMPENHO: 25101000116000370-2
PROCESSO: 160101/2016 **24a Medição reajuste_OK.xlsx**
1539K



GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS
 Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
 Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632
 e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

Obras por Execução Indireta (Detalhado)
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Total de Obras: 1
 Filtros: - Contrato Nº: 140 - Ano: 2013
 Código: 25361 Inclusão: 12/11/2013

Obra Contrato Nº/Ano-Obra: 140/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 40.597.659,23 Prazo de Execução Inicial (dias): 540 Nº/Ano: 001/2013
 Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Concorrência Pública
BEM PÚBLICO: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Objeto
 Quantidade: 51,05 Unidade de Medida: km - Quilômetro
 Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Oeste/ Primavera do Leste - Entº MT-130, com extensão de 51,05 Km.
 Inclusão: 26/08/2013

Contratada
 Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Endereço da Obra:
 Endereço: MT - 336
 Bairro: Trecho: Fim do trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Oeste/Primavera do Leste Entº MT - 130
 Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
 CEP: 78.850-000

Dados Gerais:
 Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica
 Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada
 Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte
 Bem Público: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Origem de Recursos
 Origem: Federal
 Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52
 Total Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52
 Nº/Ano do Convênio: 20-00011-1/2012 Órgão Concedente: BND-SEB DO BRASIL
 Inclusão: 07/03/2013

Localização
 Latitude: S 14° 58' 03,22" Longitude: W 54° 03' 47,12" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim
 Latitude: S 14° 54' 04,00" Longitude: W 53° 41' 08,55" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Engenheiro de Fiscalização
 Engenheiro: JOSÉ TEODORO NETO
 Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 12/07/2013
Documentos de Engenheiro Fiscalização
 Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço
 Nome: ART FISC (2).pdf
 Descrição: ART FISC 2
 Tamanho: 593,4 KB
 Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço
 Nome: ART FISC (1).pdf
 Descrição: ART FISC 1
 Tamanho: 905,4 KB
 Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço
 Nome: Portaria 140 13 NOVO l.pdf
 Descrição: Portaria
 Tamanho: 105,6 KB
 Inclusão: 12/11/2013
 Inclusão: 12/11/2013
 Inclusão: 12/11/2013



Engenheiro de Execução

Engenheiro: EVERSON TOMOYOSHI OGAWA

Início Atividade: 12/07/2013

Inclusão: 12/11/2013

Documentos de Engenheiro ExecuçãoNome: ART CONT.pdf
Descrição: ART CONT

Inclusão: 12/11/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Tamanho: 388.7 KB

Situação da Obra

Situação: Reiniciada

Data Publicação: 10/08/2015

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 29/04/2015

Descrição: OR

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OR

Tamanho: 412.2 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 01/12/2014

Situação: Paralisada

Data Publicação: 17/12/2014

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OP

Tamanho: 377.5 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Descrição: OIS

Situação: Iniciada

Data Publicação: 02/08/2013

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 12/11/2013

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS 140 2.013.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 9.6 KB

Inclusão: 12/11/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 69534 (Cód.: 70510)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24º Medição de Reajustamento

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 24/05/2016

Valor: R\$ 395.949,74

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 24º Medição Reajustamento

Tamanho: 1.6 MB

Inclusão: 24/05/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54939 (Cód.: 59528)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição de Reajustamento

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 19/12/2014

Valor: R\$ 45.887,55

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 10a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 10º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Valor: R\$ 124.663,13

Nº Medição: MR / Vinc.: 50132 (Cód.: 59513)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4º Medição de Reajustamento

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 19/12/2014

Valor: R\$ 200.522,17

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 67699 (Cód.: 70283)

Data da Medição: 03/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 20º Medição de Reajustamento

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 12/05/2016

Valor: R\$ 200.522,17



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 52737 (Cód.: 59521)

Data da Medição: 17/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 54663 (Cód.: 59522)

Data da Medição: 17/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 54940 (Cód.: 59529)

Data da Medição: 17/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 54917 (Cód.: 59525)

Data da Medição: 17/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 54918 (Cód.: 59526)

Data da Medição: 17/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 52296 (Cód.: 59520)

Data da Medição: 17/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 56207 (Cód.: 59531)

Data da Medição: 17/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 56662 (Cód.: 59533)

Data da Medição: 17/11/2014

Inclusão: 12/05/2016

Tamanho: 2.1 MB

Nome: 20ª Medição Reajuste.xlsx

Descrição: 20ª Medição reajuste

Valor: R\$ 209.879,88

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 6ª Medição de Reajustamento

Nome: 6a Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: 6ª Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 265.905,51

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 19/12/2014

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 7ª Medição de Reajustamento

Nome: 7a Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: 7ª Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 37.235,62

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 19/12/2014

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 11ª Medição de Reajustamento

Nome: 11a Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: 11ª Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 94.423,74

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 19/12/2014

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 8ª Medição de Reajustamento

Nome: 8a Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: 8ª Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 57.655,09

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 19/12/2014

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 9ª Medição de Reajustamento

Nome: 9a Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: 9ª Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 107.985,00

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 19/12/2014

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 5ª Medição de Reajustamento

Nome: 5a Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: Reajustamento 5ª Medição

Valor: R\$ 166.181,27

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 19/12/2014

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 12ª Medição de Reajustamento

Nome: 12a Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: 12ª Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 188.184,27

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 19/12/2014

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 13ª Medição de Reajustamento



Tamanho: 1.7 MB

Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 49794)

Data da Medição: 02/08/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49795)

Data da Medição: 02/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 3 (Cód.: 50131)

Data da Medição: 02/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 4 (Cód.: 50132)

Data da Medição: 02/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 5 (Cód.: 52296)

Data da Medição: 02/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 6 (Cód.: 52737)

Data da Medição: 02/01/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 7 (Cód.: 54663)

Data da Medição: 03/02/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 8 (Cód.: 54917)

Data da Medição: 03/03/2014

Inclusão: 19/12/2014

Tamanho: 1,7 MB

Nome: 13ª Medição reajuste_OK.xlsx

Descrição: 13ª Medição de Reajustamento

Inclusão: 12/11/2013

Período: 12/07/2013 a 31/07/2013

Valor: R\$ 1.994.507,70

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 1ª Medição Provisória

Inclusão: 12/11/2013

Tamanho: 2,8 MB

Nome: 1ª MEDIÇÃO MT-336 (1).xls

Descrição: MPI

Inclusão: 12/11/2013

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Valor: R\$ 2.249.916,82

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 2ª Medição Provisória

Inclusão: 12/11/2013

Tamanho: 3,0 MB

Nome: 2ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: MPI

Inclusão: 29/11/2013

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Valor: R\$ 2.710.835,28

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 3ª Medição Provisória

Inclusão: 29/11/2013

Tamanho: 3,5 MB

Nome: 3ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Inclusão: 29/11/2013

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Valor: R\$ 1.711.665,11

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 4ª Medição Provisória

Inclusão: 29/11/2013

Tamanho: 3,4 MB

Nome: 4ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 4ª MEDIÇÃO

Inclusão: 19/03/2014

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Valor: R\$ 1.884.584,53

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 5ª Medição Provisória

Inclusão: 19/03/2014

Tamanho: 2,5 MB

Nome: 5ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx

Descrição: 5ª Medição

Inclusão: 04/04/2014

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Valor: R\$ 3.517.421,51

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 6ª Medição Provisória

Inclusão: 04/04/2014

Tamanho: 2,6 MB

Nome: 6ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx

Descrição: 6ª medição

Inclusão: 25/06/2014

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Valor: R\$ 3.724.065,49

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 7ª Medição Provisória

Inclusão: 25/06/2014

Tamanho: 7,6 MB

Nome: 7ª MEDIÇÃO MT-336_CORRIGIDA.xls

Descrição: 7ª Medição

Inclusão: 04/07/2014

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Valor: R\$ 1.258.983,43

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 8ª Medição Provisória



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54918)

Data da Medição: 03/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54939)

Data da Medição: 03/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 54940)

Data da Medição: 03/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 56207)

Data da Medição: 03/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 56662)

Data da Medição: 03/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64625)

Data da Medição: 02/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64626)

Data da Medição: 02/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 64627)

Data da Medição: 02/09/2014

Inclusão: 04/07/2014

Tamanho: 8.3 MB

Nome: 8ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 8ª medição

Inclusão: 04/07/2014

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Valor: R\$ 923.152,96

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 9ª Medição Provisória

Inclusão: 04/07/2014

Tamanho: 8.1 MB

Nome: 9ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 9ª medição

Inclusão: 07/07/2014

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Valor: R\$ 725.878,83

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 10ª Medição Provisória

Inclusão: 07/07/2014

Tamanho: 8.3 MB

Nome: 10ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 10ª medição

Inclusão: 07/07/2014

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Valor: R\$ 581.707,87

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 11ª Medição Provisória

Inclusão: 07/07/2014

Tamanho: 8.1 MB

Nome: 11ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Descrição: 11ª medição

Inclusão: 22/08/2014

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Valor: R\$ 3.028.908,53

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 12ª Medição Provisória

Inclusão: 22/08/2014

Tamanho: 8.0 MB

Nome: 12ª Medição.xls

Descrição: 12ª Medição Provisória

Inclusão: 11/09/2014

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Valor: R\$ 4.068.597,85

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 13ª Medição Provisória

Inclusão: 11/09/2014

Tamanho: 8.5 MB

Nome: 13ª Medição.xls

Descrição: 13ª Medição

Inclusão: 16/09/2015

Período: 29/04/2015 a 31/05/2015

Valor: R\$ 0,00

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 14ª Medição Provisória

Inclusão: 16/09/2015

Tamanho: 3.6 MB

Nome: 14ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls

Descrição: 14ª Medição Provisória

Inclusão: 16/09/2015

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Valor: R\$ 0,00

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 15ª Medição Provisória

Inclusão: 16/09/2015

Tamanho: 3.6 MB

Nome: 15ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls

Descrição: 15ª Medição Provisória

Inclusão: 16/09/2015

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Valor: R\$ 0,00

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 16ª Medição Provisória



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 19/09/2015

Nome: 16ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 16ª Medição Provisória**Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 64629)**

Data da Medição: 03/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 2.385.647,67

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 9.5 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nome: 17ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 17ª Medição Provisória**Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 67691)**

Data da Medição: 16/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 9.7 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nome: 18ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 18ª Medição Provisória**Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 67692)**

Data da Medição: 09/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 9.7 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nome: 19ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 19ª Medição Provisória**Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 67693)**

Data da Medição: 03/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória

Valor: R\$ 860.397,06

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nome: 20ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 20ª Medição Provisória**Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 69529)**

Data da Medição: 01/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 12/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.2 MB

Inclusão: 12/04/2016

Nome: 21ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 21ª Medição**Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 69530)**

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 12/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.2 MB

Inclusão: 12/04/2016

Nome: 22ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 22ª Medição**Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 69531)**

Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 12/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 8.2 MB

Inclusão: 12/04/2016

Nome: 23ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 23ª Medição**Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 69534)**

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.806.550,55

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 12/04/2016



Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24ª Medição.xls
Descrição: 24ª Medição Provisória

Inclusão: 12/04/2016

Tamanho: 8.9 MB

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 70213)

Data da Medição: 06/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 25ª Medição Provisória

Valor: R\$ 4.384.631,75

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 11/05/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx
Descrição: 25ª Medição

Tamanho: 4.7 MB

Inclusão: 11/05/2016

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 02/2016

Nº/Ano: 01/2015

R\$ 0,00 Inclusão: 05/04/2016
R\$ 0,00 Inclusão: 17/06/2015

R\$ 0,00 Valor Aditado:
R\$ 0,00 Valor Aditado:

R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais:
R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais:

R\$ 0,00 Srv. Decrescidos:
R\$ 0,00 Srv. Decrescidos:

146 Srv. Acrescidos:
360 Srv. Acrescidos:

Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra: R\$ 40.597.659,23
Valor Total Aditado Obra: R\$ 0,00
Valor Final Obra: R\$ 40.597.659,23
Valor Total Medido: R\$ 37.817.452,74
Valor Total Realjustes: R\$ 1.884.482,97

Valor Total Medido: R\$ 37.817.452,74
Valor Total Material: R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00
Valor Total Executado Obra: R\$ 37.817.452,74

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 540
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias): 506
Prazo Execução Final Obra (dias): 1046

Quantidade de Dias em Execução: 899
Quantidade de Dias Paralisada: 149





DESPACHO

À SAADS

Sr^a Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Sr^a Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro. Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA

VIRTUTE



PROC Nº: _____ 160101/2016 _____

FLS.: 37 _____ - _____ - _____

DATA.: 24 _____ / 05 _____ / 2016 _____

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, remeto o feito a este Setor para pagamento de medição, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

Prefeitura de Rondonópolis	- folha 23/24
Prefeitura de Sto Antonio do Leste	- folha 25
Prefeitura São Jose do Rio Claro	- folha 40
SEFAZ - MT	- folha 17/18
PGE	- folha 22
Receita Federal	- folha 20
Caixa Econômica	- folha 19
Trabalhista	- folha 21

Com referencia a certidão negativa da PGE – informo que o Decreto nº 8.426, de 18 de dezembro de 2006, revogou a alínea “b” do Decreto nº 8.199, de 16 de outubro de 2006, que fixa critérios para o pagamento relativo às aquisições de bens, contratações de serviços, locações de bens móveis e imóveis e dá outras providências

Eng.º Civil *Marciano Predello Curvo*
Secretaria Adjunta de Administração
SINFRA

VIRTUTE

PLUS



Processo nº 160101 / 2016

Fls: 38 / 2016

Data: 24/05/2016

À COFIN,

Encaminhamos o processo para liquidação e pagamento.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA

VIRTUTE

PLUSO

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 29/04/2016 - 07:22:50

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016654717**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **29/04/2016**

Hora de emissão: **07:22:52**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**

Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspensão.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão válida até: **28/05/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2LL9TT92MMUMU2B9**

Página 1 de 2

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 29/04/2016 - 07:22:50

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016654717**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **29/04/2016**

Hora de Emissão: **07:22:52**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **28/05/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2LL9TT92MMUMU2B9**

Página 2 de 2

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa:	Construtora Tempolo Ltda.		
Processo:	16.0101/2016	IC:	140
Período da Despesa:		Empenho:	16.000.370.2
Produto/serviço:		Notas Fiscais:	527

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)			X	
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida?	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?			X	
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?				
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?		X		
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?			X	


Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 20 de maio de 2015.


Check-list elaborado por:

Carolly Mesquita

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600	6 - VALOR DO INSS	5.543,30	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	5.543,30	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600	6 - VALOR DO INSS	5.543,30	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	5.543,30	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Proc 100104/16

RF 527



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.000819-2	
Nº EMP: 25101.0001.16.000370-2			Data do Doctº: 25/05/2016		
Nº PED: 25101.0001.16.000464-2			Data de vencimento: 25/05/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Nº NEX: *** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 395.949,74		TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: PROC 160101/2016 , IC-140/2013 , REFERENTE 24º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT-130, numa extensão de 51,05 Km.PERIODO 01/03/16 Á 31/03/16 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 37, NF 527					
Código do credor: 2003.04888-3		Credor: Construtora Tripolo Ltda			
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Município UF: Rondonópolis - MT		Nº Processo de Pagamento 59185/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4205.0000000000024397-3					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000014013	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 3.650.781,29	*** 395.949,74	*** 395.949,74	*** 0,

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 3.650.781,29	*** 395.949,74	*** 395.949,74	*** 0,




LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000819-2
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 5.543,30	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 390.406,44	TREZENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *
---	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 395.949,74
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 395.949,74
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 5.543,30
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 5.543,30



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		25101.0001.16.001519-2
Data de Emissão: 25/05/2016			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2003.04888-3			
Credor: Construtora Tripolo Ltda		Município UF: Rondonópolis MT	
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Fonte de Recurso: 131	
Nº EMP: 25101.0001.16.000370-2		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Nº LIQ: 25101.0001.16.000819-2			
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3		Valor da Operação (R\$): *** 390.406,44	Valor por Extenso: TREZENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			






Processo nº /2016

Data: 22/06/2016

À CCONT

Com pagamento efetuado, encaminha-se o presente processo para arquivo nessa unidade.


Fransuise Albuquerque Souza
Coordenadoria Financeira

