

Anexo – 19ª Medição

MPI

Detalhado



318

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA


Protocolo n.: 108181/2016 Data: 07/03/2016 16:24
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
 Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
 Resumo: BOLETIM DA 19ª MEDIÇÃO REVISORA, DO CONTRATO 22/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA

Setor Origem: PROTOCOLO
 Setor Destino: UNING - UNIDADE DE MEDICÕES E GERENCIAMENTO

Volume: 1 de 1

IC. 222/2013



15002.479-1 44.9051 131 2015

03/06/16

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA
Caixa 318



Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016

MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.

Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller


M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP

Nesta

Sr. Superintendente,

Ref.: IC Nº 222/2013


Assunto: 19ª Medição Revisora



Venho, pelo presente encaminhar a : 19ª Medição Revisora dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 05/08/13 a 31/12/2015

- : 19ª Medição Revisora..... Período: 05/08/13 a 31/12/2015

Atenciosamente


Eng.º Alaor Avelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 19ª Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

SUBSTITUÍDO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1184 dias
Termino previsto: 25/11/2015
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 843 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ C 2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Alaor Avelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA
SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Nº Contrato	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	1184 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	01/08/13	Prazo Restante	
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Publicação	02/04/09	Vr. Contratual PI	14.625.713,89
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Processo Orig.	275531/2013 - SETPU	Vr. Acum. Medido PI	7.687.498,12
Referência: 19ª Medição Revisora	Data Base	setembro-12	Vr. Programado Próx. mês PI	
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15	Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014			
Período medição: 5/08/13 a 31/12/2015	Acumulado: 05/08/13 31/12/2015			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				ACUMULADO ATUAL (1+2+3)	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			MEDIÇÃO REVISORA (1)	Nesta Medição (2)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)	QUANTIDADE					
1.0	PAVIMENTAÇÃO										
1.1	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00				171,10				
1.2	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00		812,000	812,000	171,10	138.933,20	29,97		
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	11.664,00		8.494,000	8.494,000	11,01	95.518,94	72,82		
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00		22.440,000	22.440,000	37,23	835.441,20	96,19		
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00		109.698,200	109.798,200	0,29	31.841,47	94,13		
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	112.149,43		37.800,000	49.147,239	0,21	10.320,92	43,82		
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00		107.020,000	107.020,000	3,91	418.448,20	28,47		
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00		(815,054)	1.373,750	156,20	214.579,75	37,47		
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93		470.827,355	470.827,355	0,37	174.206,12	30,22		
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24		343.144,471	343.144,471	0,37	79.798,69	37,62		
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39		19.489,723	19.489,723	0,37	4.532,37	29,26		
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.751.898,00		1.379.980,339	1.379.980,339	0,37	555.820,28	85,75		
1.13	Transporte de PMF de usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00		178.756,716	178.756,716	0,61	68.437,48	35,77		
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00		16.240,000	16.240,000	0,61	9.906,40	20,14		
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	256.608,00		185.735,200	185.735,200	0,61	113.298,47	72,38		
	Sub-total							2.749.083,49	845,16		
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS										
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00		131,637	131,637	2,341,97	308.289,90	94,03		
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00		131,637	131,637	279,33	36.770,16	94,03		
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	948,50		509,705	473,754	1.237,55	586.294,75	49,95		
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	948,50		509,705	473,754	279,33	132.333,81	49,95		
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	56,02		21,557	40,447	1.257,33	50.855,22	72,20		
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	56,02		21,557	40,447	279,33	11.298,06	72,20		
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88		6,571	314,489	1.750,22	561.925,63	28,47		
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88		6,571	314,489	279,33	89.681,68	28,47		
	Sub-total							1.777.449,21	389,91		
3.0	CONSERVAÇÃO										
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00		24,000	209,000	19,46	4.534,18	38,51		

Comissão de Fiscalização

Eng.ª Paula Alves Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

SMRP/SINFRA
 Folha nº 04
 Ass.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada		I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Prazo de Execução	
Rodovia: MT-175/MT-248		01/08/13		1184 dias	
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru		02/04/09		Vr. Contratual PI	
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga		275531/2013 - SETPU		14.625.713,89	
Referência: 19ª Medição Revisora		setembro-12		7.687.498,12	
Ordem de renício de serviço: 05/05/15		Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014			
Período medição: 5/08/13 a 31/12/2015		Acumulado: 05/08/13 31/12/2015			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			MEDIÇÃO REVISORA (1)	Nesta Medição (2)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)	Acumulado Atual (1+2+3)	PREÇO UNITÁRIO R\$			
3.2	Roadada pesada	há	92,00			66,620	66,620	3.258,99	217.113,91	72,41
3.3	Capina	m2	129.000,00			84.860,000	84.860,000	0,64	54.310,40	65,78
3.4	Hora de máquina - Motorveladora	h	850,00			648,000	648,000	189,08	122.523,84	76,24
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	1.825,00	5,000		447,560	1.824,361	519,31	947.408,91	99,96
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	115.775,52	2.527,840		29.628,000	112.817,680	0,63	71.075,13	97,45
	Sub-total								1.416.966,37	113,46
4.0	DRENAGEM									
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00					42,08		
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00					41,08		
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00					40,42		
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00					61,69		
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00					74,87		
4.6	Concreto Fc=15,0 Mpa	m3	62,00					504,76		
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00					672,32		
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00					1.877,32		
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00					4.292,59		
	Sub-total									
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00			5.909,006	5.909,006	15,07	89.048,72	15,42
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00					15,07		
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00					22,91		
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I de ABNT	m2	55,00					369,88		
	Placa circular	m2								

Comissão de Fiscalização

Eng.º Amor Alveios Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 029/2015 CREA 830-D/MT
AN nº 12034407-7

SMRP/SINFRA
Folha nº 05
Ass.



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda
Fiscal : Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula	Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248	Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km	Prazo: 843 dias úteis
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 19ª Medição Revisora	
Serviços Executados entre 5/08/13 a 31/12/2015	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,90			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico		0,90			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016		 Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT RN nº 120134407-7			

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,90	1,50	1,35	Desemp. Parcial = (NxP) 10
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	8,95 = 0,90 10
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: EXCELENTE
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	6,20	10,00	8,95	
OBSERVAÇÕES:				
Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016		_____ Coordenador de Obras de Transportes		

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

_____ Superintendente de Obras de Transportes
--

SUBSTITUÍDO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		11.707.378,84		2.918.335,05		14.625.713,89
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT						
FIRMA:		SERVIÇO		FISCAL		Ordem de início de
Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		Restauração		Engº Alair Alves Zeferino de Paula		serviço: 05/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (cachoe) - Jauru		ACUMULADO		REAJUST. PERÍODO		SALDO PREÇOS INICIAIS
Sub-Trecho: Entr. BR 174 (cachoe) - Araputanga - lote 1		PERÍODO DA MEDIÇÃO		MEDIÇÕES P.I.		
843		PERÍODO		ACUMULADO		
843		PERÍODO		ACUMULADO		
CONTRATO	DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	TOTAL GERAL
I. C. Nº						
222/2013/000/00 - SETPU						
RODOVIA						
MT-175/MT-248						
Nº DO PROCESSO	REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	TOTAL GERAL
	1ª Medição	05/08/13 a 31/08/13	27	483.550,30	483.550,30	483.550,30
	2ª Medição	01/09/13 a 30/09/13	30	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00
	3ª Medição	01/10/13 a 31/10/13	31	755.403,025	1.457.531,82	1.457.531,82
	4ª Medição	01/11/13 a 30/11/13	30	725.406.242,96	1.863.774,78	1.863.774,78
	5ª Medição	01/12/13 a 31/12/13	31	894.227.216,11	2.090.990,89	2.090.990,89
	6ª Medição	01/01/14 a 31/01/14	31	663.205.135,78	2.296.126,67	2.296.126,67
	Reaj da 3ª Med	01/10/13 a 31/10/13	-	2.296.126,67	21.638,25	21.638,25
	Reaj da 4ª Med	01/11/13 a 30/11/13	-	2.296.126,67	23.262,43	23.262,43
	Reaj da 5ª Med	01/12/13 a 31/12/13	-	2.296.126,67	44.900,68	44.900,68
	Reaj da 6ª Med	01/01/14 a 31/01/14	-	2.296.126,67	58.407,00	58.407,00
	7ª Medição	01/02/14 a 28/02/14	28	635.167.992,08	70.707,19	70.707,19
	Reaj da 7ª Med	01/02/14 a 28/02/14	-	2.464.118,75	70.707,19	70.707,19
	8ª Medição	01/03/14 a 31/03/14	31	604.2.665.019,91	80.829,06	80.829,06
	Reaj da 8ª Med	01/03/14 a 31/03/14	-	2.665.019,91	80.829,06	80.829,06
	9ª Medição	01/04/14 a 30/04/14	30	574.2.963.645,33	92.682,83	92.682,83
	Reaj da 9ª Med	01/04/14 a 30/04/14	-	2.963.645,33	92.682,83	92.682,83
	10ª Medição	01/05/14 a 31/05/14	31	543.3.017.373,14	109.720,88	109.720,88
	Reaj da 10ª Med	01/05/14 a 31/05/14	-	3.017.373,14	109.720,88	109.720,88
	11ª Medição	01/10/14 a 31/10/14	31	512.3.516.534,51	113.750,46	113.750,46
	Reaj da 11ª Med	01/10/14 a 31/10/14	-	3.516.534,51	113.750,46	113.750,46
	12ª Medição	05/05/15 a 31/05/15	26	486.3.685.684,19	140.674,37	140.674,37
	Reaj da 12ª Med	05/05/15 a 31/05/15	-	3.685.684,19	140.674,37	140.674,37
	13ª Medição	01/06/15 a 30/06/15	30	456.4.532.782,49	158.085,01	158.085,01
	Reaj da 13ª Med	01/06/15 a 30/06/15	-	4.532.782,49	158.085,01	158.085,01
	14ª Medição	01/07/15 a 31/07/15	31	425.358.138,91	238.320,23	238.320,23
	Reaj da 14ª Med	01/07/15 a 31/07/15	-	4.890.921,40	238.320,23	238.320,23
	15ª Medição	01/08/15 a 31/08/15	31	394.5.212.351,98	274.930,74	274.930,74
	Reaj da 15ª Med	01/08/15 a 31/08/15	-	5.212.351,98	274.930,74	274.930,74
	16ª Medição	01/09/15 a 30/09/15	30	364.5.248.389,34	305.702,39	305.702,39
	Reaj da 16ª Med	01/09/15 a 30/09/15	-	5.248.389,34	305.702,39	305.702,39
	17ª Medição	01/10/15 a 31/10/15	30	334.5.842.573,08	309.796,23	309.796,23
	Reaj da 17ª Med	01/10/15 a 31/10/15	-	5.842.573,08	309.796,23	309.796,23
	18ª Medição	01/11/15 a 30/11/15	30	304.1.204.611,11	445.760,11	445.760,11
	Reaj da 18ª Med	01/11/15 a 30/11/15	-	7.047.184,19	445.760,11	445.760,11
	19ª Medição Revisora	01/12/15 a 31/12/15	304	684.316,69	684.316,69	684.316,69
	Reaj da 19ª Med	01/12/15 a 31/12/15	-	7.687.498,12	684.316,69	684.316,69
				7.687.498,12	772.106,49	772.106,49

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016
 Comissão de Fiscalização

Engº Alair Alves Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 630-DMT
 RN nº 120134407-7

SINFRA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GOVERNO DO MATO GROSSO
 ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO


DIAGRAMA LINEAR DE AVANÇO DOS SERVIÇOS

ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Extensão: 62,37 km

Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Referência: 19ª Medição provisória Revisora
 Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
 Ordem de Paralisação: 30/05/2014
 Referência: 19ª Medição provisória Revisora

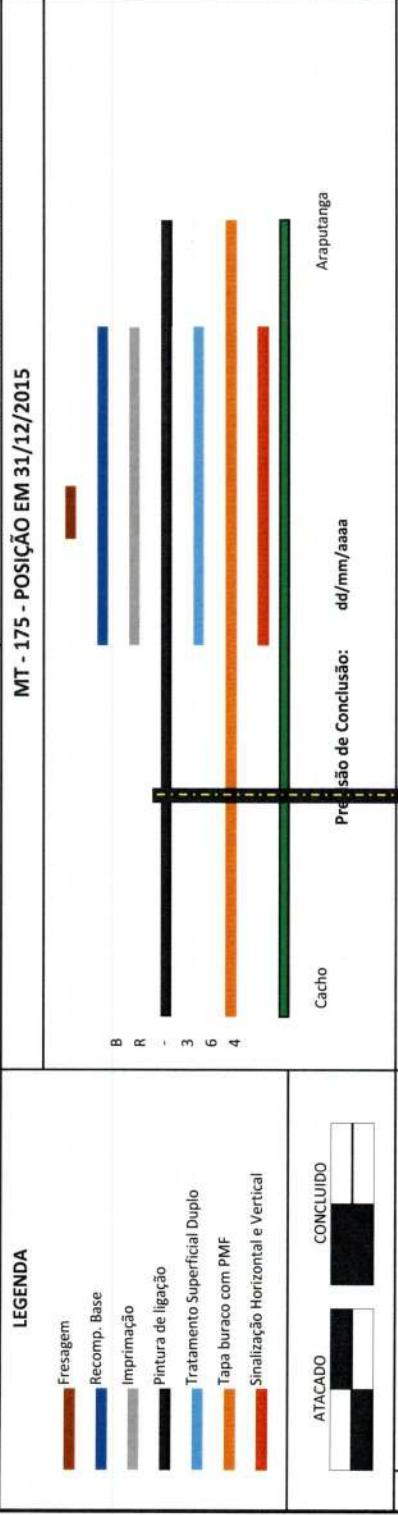

SERVIÇOS	0	5	9	14	23	27	32	36	41	45	50	54	59	62,37	ATACADO	CONCLUÍDO	
QUILOMETRAGEM	0	225	450	675	900	1.125	1.350	1.575	1.800	2.025	2.250	2.475	2.700	2.925	3.119		
ESTAJAMENTO																70,03%	29,97%
Fresagem																3,81%	96,19%
Recomp. Base																5,87%	94,13%
Imprimação																56,18%	43,82%
Pintura de ligação																71,53%	28,47%
Tratamento Superficial Duplo																0,04%	99,96%
Tapa buraco com PMF																90,12%	9,88%
Sinalização Horizontal e Vertical																	

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2015

Eng. Alair Alves Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
 RM nº 120134407-7

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra:		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia:		Data Assinatura		01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho:		Publicação		02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013	
Sub-trecho:		Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda	
MÊS/ANO	DIAS CORRIDOS	27 / 27	30 / 30	31 / 88	30 / 118	31 / 149	
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,8487%	270.391,12	1,1921%	174.359,62	1,2435%	181.868,74
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,2151%	31.455,60	1,1547%	168.887,83	0,9132%	133.564,56
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,4726%	215.381,17	0,0414%	6.050,56	0,2535%	37.081,84
4.0 - DRENAGEM							
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		3,3062%	483.550,30	0,3674%	53.727,81	0,3674%	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO							
8.0 - PAVIMENTAÇÃO							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		3,31%		2,76%		2,78%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		3,31%		9,97%		12,74%	
FATURAMENTO SIMPLES			483.550,30		570.955,70		406.242,96
FATURAMENTO ACUMULADO			483.550,30		1.054.506,00		1.863.774,78
NOTAS							

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra:		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia:		Data Assinatura		01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho:		Publicação		02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013	
Sub-trecho:		Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda	
MÊS/ANO	DIAS CORRIDOS	31 / 31	180 / 208	31 / 239	30 / 269	31 / 300	
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,5969%	87.296,99	0,2994%	43.785,19	0,4550%	66.543,17
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,4383%	64.110,98	0,3593%	52.556,01	0,5513%	80.630,17
3.0 - CONSERVAÇÃO				0,1225%	17.923,07		135.100,55
4.0 - DRENAGEM							
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		0,3674%	53.727,81	0,3674%	53.727,81	0,3674%	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO							
8.0 - PAVIMENTAÇÃO							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		1,40%		1,37%		2,04%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		15,70%		18,22%		20,26%	
FATURAMENTO SIMPLES			205.135,78		167.992,08		298.625,42
FATURAMENTO ACUMULADO			2.296.126,67		2.665.019,91		2.963.645,33
NOTAS							

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS



GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr.: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89		
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias		
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/04/16 a 30/04/2016		
MES/ANO	01/12/15 a 31/12/2015	01/01/16 a 31/01/2016	01/02/16 a 29/02/2016	01/03/16 a 31/03/2016	01/04/16 a 30/04/2016	
DIAS CORRIDOS	31 / 874	31 / 905	29 / 934	31 / 965	30 / 995	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	-1,1562%	-169.107,27	3,8382%	561.366,27	3,8382%	561.366,27
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	-0,0832%	-12.169,67	2,8646%	418.973,96	2,8646%	418.973,96
3.0 - CONSERVAÇÃO	5,2501%	767.863,06	0,2711%	39.647,83	0,2711%	39.647,83
4.0 - DRENAGEM			0,2947%	43.104,75	0,2947%	43.104,75
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,6608%	242.907,74	1,6608%	242.907,74
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3674%	53.727,81	0,2755%	40.295,86	0,2755%	40.295,86
7.0 - TAPA BURACO				13.197,27		13.197,27
8.0 - PAVIMENTAÇÃO				101.894,03		101.894,03
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco				93.944,44		93.944,44
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base				11.723,29		11.723,29
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,38%	9,20%		9,20%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		52,56%	61,77%		80,18%	
FATURAMENTO SIMPLES		640.313,93		1.567.055,44		1.567.055,44
FATURAMENTO ACUMULADO		7.687.498,12		10.821.609,00		12.388.664,45
NOTAS						13.955.719,89

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do P65

SUBSTITUÍDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr.: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/04/16 a 30/04/2016	
MES/ANO	01/05/16 a 11/05/2016	11 / 1.006			
DIAS CORRIDOS	PS	VALOR R\$			
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	2,3930%	350.000,00			
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	2,1879%	320.000,00			
3.0 - CONSERVAÇÃO					
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa Buraco					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,58%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		93,96%			
FATURAMENTO SIMPLES		670.000,00			
FATURAMENTO ACUMULADO		14.625.719,89			
NOTAS					

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do P65

ESTACA		Intera	Frac.	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Área (m²) c/Tapa Buraco	Espessura Média (m)	Volume (m³)	Taxa de Aplicação (t/m³)	RI-1C Volume RM-1C (t)	Taxa de Aplicação (t/m²)	Área (m²) Imprimação	Volume CM-30 (t)	Área (m²) Pintura	Taxa de Aplicação (t/m²)	Volume RR-1C (t)	Obs											
-	807			D+E	16.140,00	7,00	112.980,00	7.117,74	0,0500	355,887	-	49,824	-	-	-	7.117,740	0,400	2,847												
1.000	1.523			D+E	10.460,00	7,00	73.220,00	3.953,88	0,0500	197,694	-	27,677	-	-	-	3.953,880	0,400	1,581												
1.744	2.235			D+E	9.820,00	7,00	68.740,00	7.423,92	0,0500	371,196	0,550	51,967	4,083	7.423,920	4,083	7.423,920	0,400	2,969	Trecho com reperfilamento											
2.235	2.920			D+E	13.700,00	7,00	95.900,00	7.956,44	0,0500	397,821	0,550	55,694	4,376	7.956,439	4,376	7.956,439	0,400	3,162	Trecho restaurado											
2.920	2.975			D+E	1.100,00	7,00	7.700,00	623,70	0,0500	31,185	0,550	4,365	0,343	623,700	0,343	623,700	0,400	0,249												
2.975	3.118			D+E	2.860,00	7,00	20.020,00	360,36	0,0500	18,018	0,550	2,522	-	-	-	360,360	0,400	0,144												
TRANSPORTE PMF USINA > PIETA																														
												VOLUME	t/m³	2,10	ton	2.880,78	DMT	t x km	80,661,840											
												VOLUME	t/m³	1.371,80	ton	28,000	DMT	t x km	80,661,840											
												VOLUME	t/m³	1.371,80	ton	28,000	DMT	t x km	80,661,840											
OBS.: DMT UTILIZADO INFERIOR AO DE PROIETO - QUANTIDADE DISPONIVEL PARA MEDIR AQUEM DO REALIZADO																														
							27.436,039			1.371,801		192,049		16.004,059		8,802		27.436,039		10,972										
TOTAL																														

Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2015
Comissão de fiscalização

J

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cachoi) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cachoi) - Araputanga
Referência: Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15




PLANILHA PARA CÁLCULO

Tapa Buraco

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Const. Ltda

L.C. Nº 222/2013/000/00 - SETPU

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

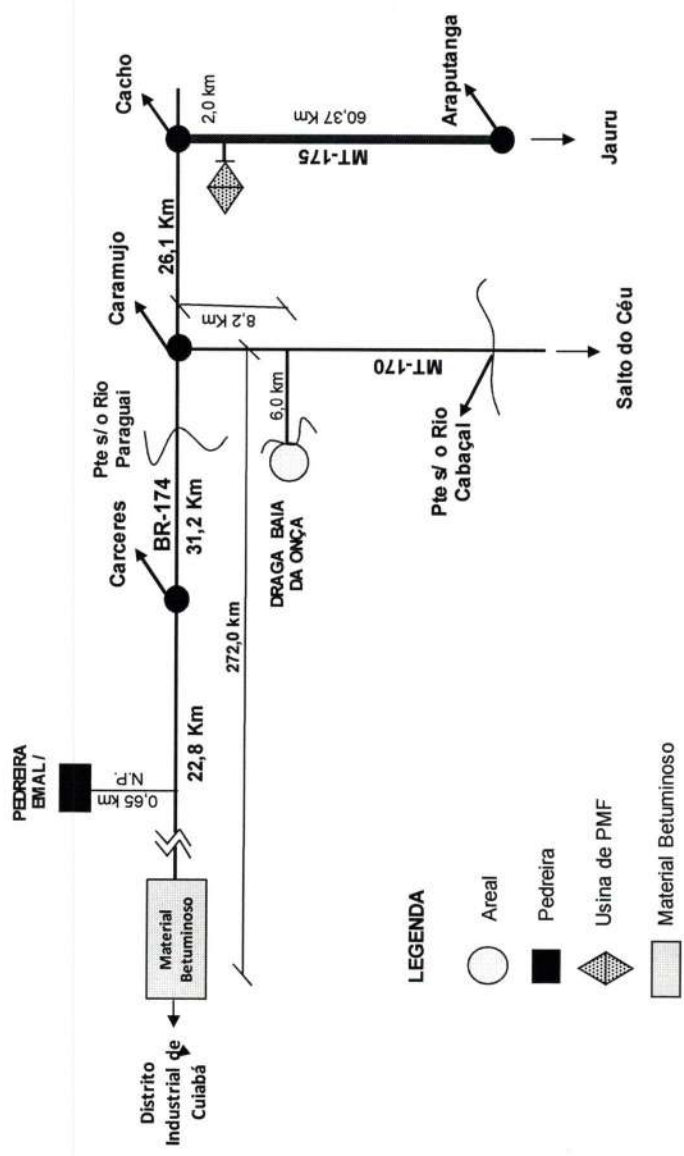

LEGENDA




- Areal
- Pedreira
- Usina de PMF
- Material Betuminoso

N.P. = NÃO PAVIMENTADO

	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO	
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU	
Rodovia:	MT-175	Ext.: 62,37 Km
Sub-trecho:	Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Lote : 1

OBSERVAÇÕES:

[Handwritten signature]

 SINFRA <small>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</small>	 GOVERNO DE MATO GROSSO <small>ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO</small>	<small>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - GERÊNCIA DE LICITAÇÃO</small> <small>PROGRAMA DE LICITAÇÃO - MATO GROSSO</small> MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO <small>WWW.MT.GOV.BR</small>	Nº. DA FOLHA 001 DATA (dd/mm/aa) 01/12/2015 a 31/12/2015
OBRA: Restauração de Rodovia Pavimentada		CONTRATO Nº. I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	
Revitalização de Rodovias Pavimentadas		MT-175/MT-248	
		Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	
CONSTRUTORA GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
TEMPO / CLIMA BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL			
1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO			
RESTAURAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS
XXXXXX			
2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO			
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO
3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA: 			
4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO : 			
5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA : Execução de 8,54 m³ de Tapa Buraco Limpeza de bueiro - 10,50 m³ Sinalização - linha com resina acrílica 0,60 mm - largura 0,15 m - 15,00 m² Tacha refletiva com catadióptrico nas duas faces - 250,00 unid			
Local/Data:		Cuiabá/MT, 06 de janeiro de 2015	
		 Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT RN nº 120134407-7	

RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO

CONTRATO:	IC nº 222/2013/00/00-SETPU
RODOVIA:	MT-175/MT-248
TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB-TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EMPRESA:	GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO:	DEZEMBRO/2015

MEDIÇÃO: 19ª Medição Revisora

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANHÃ	C	C	B	C	C	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	C	B	B	B	B	B	B
TARDE	C	C	B	C	C	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	C	B	B	B	B	B	B
NOITE	C	C	B	C	C	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	C	B	B	B	B	B	B
MM																															

CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"


 Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT -175	Contratada:	GEOSOLO Engen., Planej. e Consultoria Ltda.	
Trecho:	Entrº BR 174 (Cacho) - Jauru	Contrato:	IC Nº 222/2013/00/00-SETPU	
Sub-Trecho:	Entrº BR 174 (Cacho) - Araputanga	Extensão:	62,37 km	Lote: 1




Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA - BURACO

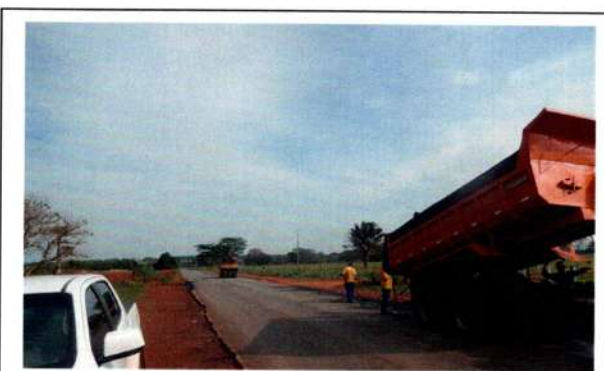

Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA - BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA - BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA - BURACO

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Janeiro de 2016

[Assinatura]
 Eng.º Alap Alvelos Zeferino de Paula
 CREA RN 1201344077
 Portaria Nº 045/2015

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT -175	Contratada:	GEOSOLO Engen., Planej. e Consultoria Ltda.	
Trecho:	Entrª BR 174 (Cacho) - Jauru	Contrato:	IC Nº 222/2013/00/00-SETPU	
Sub-Trecho:	Entrª BR 174 (Cacho) - Araputanga	Extensão:	62,37 km	Lote: 1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	PMF FRESAGEM



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	PMF FRESAGEM



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	PMF FRESAGEM

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Janeiro de 2016

[Signature]
 Eng.ª Alaor Alves Zeferino de Paula
 CREA RN 1201344077
 Portaria Nº 045/2015



RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT -175	Contratada:	GEOSOLO Engen., Planej. e Consultoria Ltda.	
Trecho:	Entrº BR 174 (Cacho) - Jauru	Contrato:	IC Nº 222/2013/00/00-SETPU	
Sub-Trecho:	Entrº BR 174 (Cacho) - Araputanga	Extensão:	62,37 km	Lote: 1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO




Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	PINTURA DE LIGAÇÃO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO

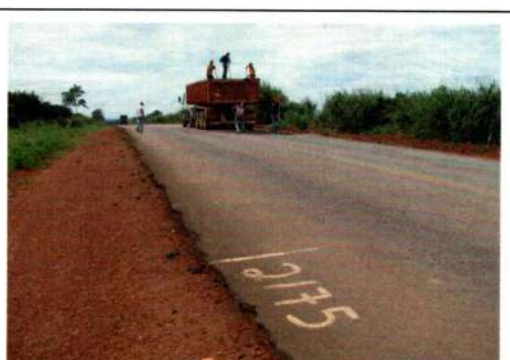

Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Janeiro de 2016

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula
 CREA RN 1201344077
 Portaria Nº 045/2015

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT -175	Contratada:	GEOSOLO Engen., Planej. e Consultoria Ltda.	
Trecho:	Entrº BR 174 (Cacho) - Jauru	Contrato:	IC Nº 222/2013/00/00-SETPU	
Sub-Trecho:	Entrº BR 174 (Cacho) - Araputanga	Extensão:	62,37 km	Lote: 1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA-BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA - BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA - BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA - BURACO



Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT - 175	TAPA - BURACO

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Janeiro de 2016

[Signature]
Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula
CREA RN 1201344077
Portaria Nº 045/2015



Encaminhamento de Medição Provisória a Preços Iniciais

Ilmo Sr.
Julio Mangini Fernandes Neto
M.D. Chefe de Unidade IV – Medições e Gerenciamento
CUIABÁ/MT

Assunto: 19ª (Décima Nona) Medição Revisora
Ref. I.C. Nº 222/2013
Firma: Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda

Através da presente , encaminho a V.Sª. a 19ª (Décima Nona) Medição Revisora após análise Técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 04 a 22

Em 08 de Março de 2016.


Engº Luiz Tadeu Parisi
Coordenador de Manutenção e Restauração
CMR/SMRP/SINFRA-MT



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 19ª Medição provisória Revisora
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1184 dias
Termino previsto: 11/05/2016
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 874 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ (2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 19ª Medição Revisora
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
01/08/13
02/04/09
275531/2013 - SETPU
setembro-12

Prazo de Execução
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Prox. mês PI

1184 dias
14.625.713,89
7.687.498,12

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			MEDIÇÃO REVISORA (1)	Nesta Medição (2)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)	Acumulado Atual (1+2+3)			
			CONTRATO			PREÇO UNITÁRIO R\$			
1.0	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00			171,10			
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00		812,000	171,10	138.933,20	29,97	
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	11.664,00		8.494,000	11,01	93.518,94	72,82	
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00		22.440,000	37,23	835.441,20	96,19	
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	100,000	109.698,200	0,29	31.841,47	94,13	
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	112.149,43	(11.268,000)	32.979,200	0,21	10.320,92	43,82	
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00		107.020,000	3,91	418.448,20	28,47	
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00	(815,054)	2.188,804	156,20	214.579,75	37,47	
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	(127.472,319)	470.827,355	0,37	174.206,12	30,22	
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24		215.672,152	0,37	79.798,69	37,62	
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39	(7.240,066)	19.489,723	0,37	4.532,37	29,26	
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.751.898,00	122.236,646	1.502.216,985	0,37	555.820,28	85,75	
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00	(66.564,122)	178.756,716	0,61	68.437,48	35,77	
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00		16.240,000	0,61	9.906,40	20,14	
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	256.608,00		185.735,200	0,61	113.298,47	72,38	
	Sub-total						2.749.083,49	845,16	
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS								
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00		131,637	2.341,97	308.289,90	94,03	
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00		131,637	279,33	36.770,16	94,03	
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	948,50	(228,000)	509,705	1.237,55	586.294,75	49,95	
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	948,50	(228,000)	509,705	279,33	132.333,81	49,95	
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	56,02	7,918	21,557	1.257,33	50.855,22	72,20	
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	56,02	7,918	21,557	279,33	11.298,06	72,20	
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	6,571	314,489	1.750,22	561.925,63	28,47	
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	6,571	314,489	279,33	89.681,68	28,47	
	Sub-total						1.777.449,21	389,91	
3.0	CONSERVAÇÃO								
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00	24,000	209,000	19,46	4.534,18	38,51	

Comissão de Fiscalização

Eng.º Albert Xavier Zeferno de Paula
Fiscal-Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

UNIMG/SINFRA
Folha nº 24
Ass

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA				SINFRA				
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jaunu Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: 1ª Medição Revisora Ordem de reinício de serviço: 05/05/15 Período medição: 5/08/13 a 31/12/2015		I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 01/08/13 02/04/09 275531/2013 - SETPU setembro-12		Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Prox. mês PI		1184 dias 14.625.713,89 7.687.498,12				
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda												
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			MEDIÇÃO REVISORA (1)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)	Acumulado Atual (1+2+3)	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			Nesta Medição (2)	MEDIÇÃO REVISORA (1)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)							
3.2	Roadada pesada	há				92,00	66,620	66,620	3.258,99	217.113,91	72,41	
3.3	Capina	m2				129.000,00	84.860,000	84.860,000	0,64	54.310,40	65,78	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora Tapa buraco com PMF - Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	h				850,00	648,000	648,000	189,08	122.523,84	76,24	
3.5	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	m3				1.825,00	447,560	1.824,361	519,31	947.408,91	99,96	
3.6	Sub-total	tkm				115.775,52	29.628,000	112.817,680	0,63	71.075,13	97,45	
4.0	DRENAGEM									1.416.966,37		
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m				830,00	-	-	42,08	-	-	
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m				1.330,00	-	-	41,08	-	-	
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m				580,00	-	-	40,42	-	-	
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid				7,00	-	-	61,69	-	-	
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid				9,00	-	-	74,87	-	-	
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3				62,00	-	-	504,76	-	-	
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m				31,00	-	-	672,32	-	-	
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid				1,00	-	-	1.877,32	-	-	
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m Sub-total	unid				1,00	-	-	4.292,59	-	-	
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2				38.319,00	5.909,006	5.909,006	15,07	89.048,72	15,42	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2				930,00	-	-	15,07	-	-	
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2				135,00	-	-	22,91	-	-	
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT Placa circular	m2				55,00	-	-	369,88	-	-	
Comissão de Fiscalização												

Eng. Alair Alves Zeferino de Paula
 Fiscal Rubrica Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 1ª Medição Revisora
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Período medição: 5/08/13 a 31/12/2015
Acumulado: 05/08/13 31/12/2015

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
01/08/13
02/04/09
275531/2013 - SETPU
setembro-12

SINFRA

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Prox. mês PI

1184 dias
14.625.713,89
7.687.498,12

Firma: Geosolo Eng. Pln.e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	MEDIÇÃO REVISORA (1)	QUANTIDADE			MEDIÇÃO ANTERIOR (3)	Acumulado Atual (1+2+3)	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
					Nesta Medição (2)	MEDIÇÃO REVISORA (1)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)						
5.5	Placa quadrada	m2	50,00							369,88			
5.6	Placa retangular	m2	59,00							369,88			
5.7	Placa octogonal	m2	6,00							369,88			
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00							369,88			
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRIG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.600,00							41,49			
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRIG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13.728,00			1.213,000		1.213,000		14,38	17.442,94	8,84	
5.11	Setas e dizeres	m2	49,00							22,91			
5.12	Escudo	m2	1,40							378,16			
5.13	Defensa metálica	m	640,00							224,62			
	Sub-total										106.491,66		9,87
	Mobilização e desmobilização	unid	6,00	0,500			4,000	4,500		107.455,63	483.550,31	75,00	
	Instalação de canteiro	mês	1,00				1,000	1,000		322.366,87	322.366,87	100,00	
	Administração local	mês	12,00				12,000	12,000		53.727,81	644.733,75	100,00	
	Sub-total										1.450.650,93		
	SERVIÇO ADITADO												
	TAPA BURACO												
	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa bu	tkm	127.875,852				27.819,733	27.819,733		0,37	10.293,30	21,76	
	PAVIMENTAÇÃO												
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	m³	5.400,000				2.469,600	2.469,600		71,49	176.563,16	45,73	
	Sub-total										186.856,46		
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO										7.687.498,12		
	A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR										7.047.184,19		
	VALOR LIQUIDO										640.313,93		

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 640.313,93 (Seiscentos e quarenta mil, trezentos e treze reais e noventa e três centavos)

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Janeiro de 2016

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alvaro Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

CONTRATO I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT		VALOR CONTRATUAL 11.707.378,84		ADITAMENTO 2.918.335,05		TOTAL 14.625.713,89		
										FISCAL
PROCESSO	Nº DO	RODOVIA MT-175/MT-248	I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU	FIRMA: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	Treceho: Entr. BR-174 (cachoe) - Jauru Sub-Treceho: Entr. BR 174 (cachoe) - Arapuitanga - Iote 1	SERVIÇO		FISCAL		TOTAL
						Restauração	Medições P.I.	Medições Reajust.	Medições Zefeirno de Paula	
REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	TOTAL MEDIÇÃO	TOTAL ACUMULADO	TOTAL GERAL
DOC.	PRAZO DIAS CORRIDOS	1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184
1ª Medição	05/08/13 a 31/08/13	27	1157	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30
2ª Medição	01/09/13 a 30/09/13	30	1127	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00	1.054.506,00	1.054.506,00	1.054.506,00	1.528.061,30
3ª Medição	01/10/13 a 31/10/13	31	1096	403.025,82	1.457.531,82	1.457.531,82	1.457.531,82	1.457.531,82	1.457.531,82	1.915.593,12
4ª Medição	01/11/13 a 30/11/13	30	1066	408.242,96	1.865.774,78	1.865.774,78	1.865.774,78	1.865.774,78	1.865.774,78	2.321.368,10
5ª Medição	01/12/13 a 31/12/13	31	1035	227.216,11	2.090.990,89	2.090.990,89	2.090.990,89	2.090.990,89	2.090.990,89	2.512.358,99
6ª Medição	01/01/14 a 31/01/14	31	1004	205.135,78	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.708.485,66
Reaj da 3ª Med	01/10/13 a 31/10/13	-	-	-	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.934.612,33
Reaj da 4ª Med	01/11/13 a 30/11/13	-	-	-	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	3.163.739,00
Reaj da 5ª Med	01/12/13 a 31/12/13	-	-	-	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	3.390.865,67
Reaj da 6ª Med	01/01/14 a 31/01/14	-	-	-	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	3.616.992,34
7ª Medição	01/02/14 a 28/02/14	28	976	167.992,08	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	3.784.111,11
Reaj da 7ª Med	01/02/14 a 28/02/14	-	-	-	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	4.000.230,50
8ª Medição	01/03/14 a 31/03/14	31	945	200.901,16	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	4.201.250,41
Reaj da 8ª Med	01/03/14 a 31/03/14	-	-	-	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	4.467.270,32
9ª Medição	01/04/14 a 30/04/14	30	915	298.625,42	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	4.765.915,65
Reaj da 9ª Med	01/04/14 a 30/04/14	-	-	-	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	5.062.560,98
10ª Medição	01/05/14 a 31/05/14	31	884	53.727,81	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	5.369.934,09
Reaj da 10ª Med	01/05/14 a 31/05/14	-	-	-	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	5.671.307,23
11ª Medição	01/10/14 a 31/10/14	31	853	499.161,37	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	6.187.841,60
Reaj da 11ª Med	01/10/14 a 31/10/14	-	-	-	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	6.539.376,11
12ª Medição	05/05/15 a 31/05/15	26	827	169.149,68	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	7.225.060,30
Reaj da 12ª Med	05/05/15 a 31/05/15	-	-	-	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	7.594.744,49
13ª Medição	01/06/15 a 30/06/15	30	797	847.099,30	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	8.127.526,98
Reaj da 13ª Med	01/06/15 a 30/06/15	-	-	-	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	8.580.309,47
14ª Medição	01/07/15 a 31/07/15	31	766	358.138,91	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	9.071.230,87
Reaj da 14ª Med	01/07/15 a 31/07/15	-	-	-	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	9.562.152,27
15ª Medição	01/08/15 a 31/08/15	31	735	321.430,58	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	9.883.503,85
Reaj da 15ª Med	01/08/15 a 31/08/15	-	-	-	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	10.104.855,83
16ª Medição	01/09/15 a 30/09/15	30	705	36.037,36	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	10.140.945,19
Reaj da 16ª Med	01/09/15 a 30/09/15	-	-	-	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	10.309.334,53
17ª Medição	01/10/15 a 31/10/15	30	675	594.183,74	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	10.593.907,61
Reaj da 17ª Med	01/10/15 a 31/10/15	-	-	-	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	10.978.480,69
18ª Medição	01/11/15 a 30/11/15	30	645	1.204.611,11	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	11.185.664,80
Reaj da 18ª Med	01/11/15 a 30/11/15	-	-	-	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	11.892.848,99
19ª Medição Med.	01/12/15 a 31/12/15	31	874	640.313,93	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	12.580.347,11
Reaj da 19ª Med	01/12/15 a 31/12/15	-	-	-	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	13.347.845,23

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016
 Comissão de Fiscalização

Engº. Alagoz Zefeirno de Paula
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

CRONOGRAMA FINANCEIRO

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89				
MT - 175		Data Assinaturc 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias				
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013				
ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda				
MÊS/ANO	05/08/13 a 31/08/2013	01/09/13 a 30/09/2013	01/10/13 a 31/10/2013	01/11/13 a 30/11/2013	01/12/13 a 31/12/2013			
DIAS CORRIDOS	27 / 27	30 / 57	31 / 88	30 / 118	31 / 149			
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS			
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,8487%	270.391,12	1,1921%	174.359,62	1,2435%	181.868,74	0,6839%	100.027,81
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,2151%	31.455,60	1,1547%	168.887,83	0,9132%	133.564,56	0,5023%	73.460,49
3.0 - CONSERVAÇÃO	1,4726%	215.381,17	0,0414%	6.050,56	0,2535%	37.081,84		
4.0 - DRENAGEM								
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3,3062%	483.550,30	0,3674%	53.727,81	0,3674%	53.727,82	0,3674%	53.727,81
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.0 - TAPA BURACO								
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	3,31%		2,76%		2,78%		1,55%	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	3,31%		9,97%		12,74%		14,30%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		483.550,30		403.025,82		406.242,96		227.216,11
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		570.955,70		1.457.531,82		1.863.774,78
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.054.506,00				2.090.990,89

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89		
MT - 175		Data Assinaturc 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias		
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda		
ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda		
MÊS/ANO	01/02/14 a 28/02/2014	01/03/14 a 31/03/2014	01/04/14 a 30/04/2014	01/05/14 a 31/05/2014		
DIAS CORRIDOS	28 / 208	31 / 239	30 / 269	31 / 300		
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,5969%	87.296,99	0,2994%	66.543,17	0,7507%	109.797,06
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,4383%	64.110,98	0,3593%	80.630,17	0,9237%	135.100,55
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,1225%	17.923,07		
4.0 - DRENAGEM						
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,3674%	53.727,81	0,3674%	53.727,82	0,3674%	53.727,81
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
7.0 - TAPA BURACO						
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,40%		1,37%		2,04%	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	15,70%		18,22%		20,26%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		205.135,78		200.901,16		298.655,42
FATURAMENTO SIMPLES		2.296.126,67		2.665.019,91		2.963.645,33
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75		3.017.373,14

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS



GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra::		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinaturc 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda	
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/06/15 a 30/06/2015	
INÍCIO: 05/08/2013		01/06/14 a 30/09/2014		01/10/14 a 31/10/2014		05/05/15 a 31/05/2015	
TÉRMINO: 16/04/2017		122 / 422		31 / 453		27 / 665	
DIAS CORRIDOS		PS		VALOR R\$		PS	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,0284%		150.404,73		0,5217%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		1,2825%		187.573,20		76.296,25	
3.0 - CONSERVAÇÃO						3.9891%	
4.0 - DRENAGEM						1,8027%	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						896,00	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		1,1021%		161.183,44		0,3674%	
7.0 - TAPA BURACO							
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		3,41%				53.727,82	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)		24,04%		499.161,37		1,16%	
FATURAMENTO GLOBAL ACUMULADO (P6A)						25,20%	
FATURAMENTO SIMPLES		3.017.373,14		169.149,68		847.098,30	
FATURAMENTO ACUMULADO		3.516.534,51		3.516.534,51		4.532.782,49	

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P6S - Será a soma do PS
- 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra::		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinaturc 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda	
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/11/15 a 30/11/2015	
INÍCIO: 05/08/2013		01/07/15 a 31/07/2015		01/09/15 a 30/09/2015		01/10/15 a 31/10/2015	
TÉRMINO: 16/04/2017		31 / 726		30 / 787		31 / 818	
DIAS CORRIDOS		PS		VALOR R\$		PS	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,9183%		280.569,41		2,0004%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,5304%		77.569,50		2,0456%	
3.0 - CONSERVAÇÃO						0,0166%	
4.0 - DRENAGEM						2,4325%	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						0,4817%	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		0,2464%		36.037,36		1,4694%	
7.0 - TAPA BURACO							
8.0 - PAVIMENTAÇÃO						0,0704%	
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco						1,2072%	
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base						8,24%	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)		2,45%				4,06%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		33,44%		35,88%		39,95%	
FATURAMENTO SIMPLES		358.138,91		36.037,36		594.183,74	
FATURAMENTO ACUMULADO		4.890.921,40		5.248.389,34		5.842.573,08	

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P6S - Será a soma do PS
- 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

(Handwritten signature)

GEOLOGO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA											
Obra: MT - 175		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89							
Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURO		Data Assinatur: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias							
Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação 02/04/2009									
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda							
MÊS/ANO	01/12/15 a 31/12/2015	01/01/16 a 31/01/2016	01/02/16 a 29/02/2016	01/03/16 a 31/03/2016	01/04/16 a 30/04/2016	31 /	934	29 /	965	30 /	995
DIAS CORRIDOS	874	905	934	965	995	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	-1,1562%	-169.107,27	3,8382%	561.366,27	3,8382%	561.366,27	3,8382%	561.366,27	3,8382%	561.366,27	3,8382%
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	-0,0832%	-12.169,67	2,8646%	418.973,96	2,8646%	418.973,96	2,8646%	418.973,96	2,8646%	418.973,96	2,8646%
3.0 - CONSERVAÇÃO	5,2501%	767.863,06	0,2711%	39.647,83	0,2711%	39.647,83	0,2711%	39.647,83	0,2711%	39.647,83	0,2711%
4.0 - DRENAGEM			0,2947%	43.104,75	0,2947%	43.104,75	0,2947%	43.104,75	0,2947%	43.104,75	0,2947%
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,6608%	242.907,74	1,6608%	242.907,74	1,6608%	242.907,74	1,6608%	242.907,74	1,6608%
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3674%	53.727,81	0,2755%	40.295,86	0,2755%	40.295,86	0,2755%	40.295,86	0,2755%	40.295,86	0,2755%
7.0 - TAPA BURACO				13.197,27		13.197,27		13.197,27		13.197,27	
8.0 - PAVIMENTAÇÃO				101.894,03		101.894,03		101.894,03		101.894,03	
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco											
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	4,38%		9,20%	11.723,29	9,20%	11.723,29	9,20%	11.723,29	9,20%	11.723,29	9,20%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	52,56%		61,77%		70,97%		80,18%		89,38%		
FATURAMENTO SIMPLES		640.313,93		1.567.055,44		1.567.055,44		1.567.055,44		1.567.055,44	
FATURAMENTO ACUMULADO		7.687.498,12		9.254.553,56		10.821.609,00		12.388.664,45		13.955.719,89	

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA											
Obra: MT - 175		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89							
Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURO		Data Assinatur: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias							
Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação 02/04/2009									
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda							
MÊS/ANO	01/05/16 a 11/05/2016	11 /	1.006	11 /	1.006	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
DIAS CORRIDOS											
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	2,3930%	350.000,00									
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	2,1879%	319.994,00									
3.0 - CONSERVAÇÃO											
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tr											
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	4,58%										
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	93,96%										
FATURAMENTO SIMPLES		669.994,00									
FATURAMENTO ACUMULADO		14.625.713,89									

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Fernando Alberto Barbosa Muller
Superintendente de Manutenção e Restauração de Pavimentadas - SMRP
CUIABÁ/MT

Assunto : 19º (décima nona) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013

Através da presente , encaminho a V.Sª. a 19º (décima nona) Medição Provisória , devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em



19º (décima nona) Medição ProvisóriaR\$ 640.313,93

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 30.

Em 16 de Março de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Servidor/Colaborador
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT

Folha nº 32
 Setor: COOT/SETPU
 Y

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda

Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperanca
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	15/3/2016 13:42:12	29 CF 38	603
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Politico Administrativo	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Referente a 19ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
 Serviços executados no Município de Araputanga-MT

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 640.313,93

VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 63.202,67

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 577.111,06

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO
 CONTA CORRENTE: 17.900-0
 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	7	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 640.313,93	R\$ 0,00	R\$ 577.111,06	R\$ 63.202,87	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 4.162,04	R\$ 19.209,42	R\$ 6.952,32	R\$ 9.604,71	R\$ 6.403,14	R\$ 0,00	R\$ 3.160,14

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 590.822,16

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA 830/D - RN: 120134407-7

Folha nº 33

Setor: COOT/SETPU

Ass.: V

	Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
			Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 -Cuiabá- MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	15/3/2016 13:42:12	29 CF 38	603
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços	
Referente a 19ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Araputanga-MT	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 640.313,93	
VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 63.202,67	
VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 577.111,06	
CEI.: 51.221.18164/73	
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28	


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	7	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 640.313,93	R\$ 0,00	R\$ 577.111,06	R\$ 63.202,87	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 4.162,04	R\$ 19.209,42	R\$ 6.952,32	R\$ 9.604,71	R\$ 6.403,14	R\$ 0,00	R\$ 3.160,14

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 590.822,16
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº Algor Avelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA 830/D - RN: 120134407-7

IMPRIMIR

VOLTAR

Folha nº 34
Setor: COOT/SETPU
Ass.: Y

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/02/2016 a 28/03/2016

Certificação Número: 2016022804224731255630

Informação obtida em 01/03/2016, às 08:21:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

Folha nº 35
Setor: COOT/SETPU
Ass.: Y

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **01.898.295/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:21:57 do dia 01/12/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2016.

Código de controle da certidão: **2137.FFA1.6885.7623**


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Dossiê n. 10080.005386/1115-51

Pedido de parcelamento Lei 12.996

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

**Secretaria de Estado
de Fazenda**Folha nº 36
Setor: COOT/SETPU
Ass.: YGoverno do Estado
de Mato Grosso

Data: 23/02/2016 - 08:53:56

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016175445****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **23/02/2016**Hora de emissão: **08:54:00**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **23/03/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2TLUBT22UKMB22UB**

Página **1** de **2**

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**Secretaria de Estado
de Fazenda**Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 23/02/2016 - 08:53:56

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016175445****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de Emissão: **23/02/2016**Hora de Emissão: **08:54:00****RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM ATRASO E DÉBITOS SUSPENSOS**

- 13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão válida até **23/03/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2TLUBT22UKMB22UB**

Página 2 de 2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 159536220/2015 *
Expedição: 28/09/2015, às 15:41:03
Validade: 25/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0004800-58.2010.5.23.0001 - TRT 23ª Região *
0092600-27.2010.5.23.0001 - TRT 23ª Região *
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0136100-65.2009.5.23.0006 - TRT 23ª Região *
0137900-31.2009.5.23.0006 - TRT 23ª Região *
0124300-34.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0022300-66.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017100-44.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 17.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

Data: 23/12/2015
Hora: 16:10
Usu: s_gjesus



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA - GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHÜTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 23/12/2015

Responsável pela Expedição

Procurador(a) do Estado

Gabriela Novis Neves Pereira Lima
Procuradora do Estado de
Mato Grosso.
OAB/MT 5219

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: Q0BJW26JAMOGX5L6RDNIJZP7110DTW

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCALFolha nº 40
Setor: COOT/SETPU
Ass.: Y**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

196433/2016

228293

PROCESSO

2016

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANÇAMENTOS DIVERSOS - 24250



15032016018982950001280010180519643350452916228293

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Licitação

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

PARA CONSTAR EU, *Steffanny Fidelis Cardoso* STEFANNY FIDELIS CARDOSO PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

Cuiabá/MT, terça-feira, 15 de março de 2016



Cezar Fabiano Martins de Campos
Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 13 de Junho de 2016.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



Prefeitura Municipal de Araputanga

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 109/2016

Certifico a pedido de GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, conforme o requerimento protocolado sob número 454/2016-Grl, que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de ARAPUTANGA, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R GOV JARI GOMES 10
BOA ESPERANCA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de ARAPUTANGA de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

O referido é verdade e dou fé.

ARAPUTANGA (MT), 15 de março de 2016.


Junio Cesar Pereira
Gerente Tributário
Portaria nº 12/2016

Certidão válida até 16/04/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.araputanga.mt.gov.br.
Certidão emitida em 15/03/2016 às 10:46:35h. - Código de Validação **A5H3V4.U9J0S4.W5T1R4**

RUA ANTENOR MAMEDES, nº 911 - ARAPUTANGA - MT - CEP 76260-000 - Fone (065) 32611735
CNPJ 15.023.914/0001-45 - e-mail: iss_eletronico@araputanga.mt.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 215/16	Data:	18/03/2016							
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Geosolo	108181/16	222/13	19º Med.	14.625.713,89	7.044.184,19	7.581.529,70	640.313,93	15.001.479-1	44.90.51	131	R\$ 6.941.215,77
TOTAL PROGRAMADO							640.313,93				

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

AUTORIZO:

Engº Fernando Alberto Barbosa Muller
Superint. De Manut. E Rest. De Rodovias Pavimentadas

Engº Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Transportes

Engº Marjane Prevedello Carvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras
SINFRA/MT





Folha nº 44
Setor: COOT/SET
Ass: 8

ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 108/85/16 Contrato nº: 922/13
 Vigência: _____ Empresa Contratada: Geosolo
 Resumo do Objeto: Ref. Rest. de Abd. F

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Quelma _____ de março de 2016 _____ de _____ de _____
 (local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

Julio Mangini Fernandes Neto
Chefe da Unidade IV
Unidade de Medição e Gerenciamento-UNIMG



DESPACHO




PROTOCOLO Nº	108181/2016
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	IC 222/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 22 de março de 2016.

di *M. Catalano*
Engº. Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB

José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras
SINFRA/MT





COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

CADASTRO IC 222-13

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br> 22 de março de 2016 10:53
Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, FRANSUISE ALBUQUERQUE
SOUZA <fransuisesouza@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Grezile Ferreira de Oliveira
<grezileoliveira@sinfra.mt.gov.br>



Bom dia,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos.
Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.00078-3

NOME DO CREDOR: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

CPF/CNPJ : 01.898.295/0001-28


IC : 222/2013 - 19º Medição Revisora e 19º Medição Reajustamento

SUBCONTA: 218

EMPENHO: 25101000115001479-1

PROCESSO: 108213/2016

108181/2016

2 anexos 19º Medição Revisora.xlsx
1044K 19º Medição Reajuste.xlsx
1190K



Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013

Obra
Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 11.707.378,84 Prazo de Execução Inicial (dias): 360
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Concorrência Pública Nº/Ano: 020/2013
BEM PÚBLICO: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

Objeto
Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho) - Jauru; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Detalhes

Inclusão: 18/09/2013

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248
Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga
Cidade: ARAPUTANGA
CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação
Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada
Setor Beneficiário: Infra-estrutura e Transporte
Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Origem de Recursos

Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43
Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37
Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Inclusão: 11/06/2013
Inclusão: 11/06/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL
Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim
Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 24/09/2013
Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: AIR MONTECHI VITORIO

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Inclusão: 24/09/2013

Início Atividade: 05/08/2013

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 576.1 KB

Nome: ART FISC 2.pdf
Descrição: ART FISC 2

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC 1.pdf
Descrição: ART FISC 1

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA

Inclusão: 24/09/2013



Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Documentos de Engenheiro Execução

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2

Tamanho: 679,3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 921,7 KB

Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra

Data Situação: 01/10/2014

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R

Tamanho: 137,1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Descrição: O.P

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P

Tamanho: 600,5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 152,1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 3º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3º medição de reajustamento

Tamanho: 2,1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód: 63761)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória

Inclusão: 08/07/2014

Tamanho: 2.1 MB

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód: 64890)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xls

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xls

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Descrição: 6ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód: 64357)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xls

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Descrição: 4ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xls

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Descrição: 9ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 69024 (Cód: 69025)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 05/08/2013 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19º Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19º Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód: 54914)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 10/04/2014
Observação: 8º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8º medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód: 54913)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 10/03/2014
Observação: 7º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7º medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód: 54304)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 30/04/2014
Observação: 5º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód: 66220)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 03/11/2015
Observação: 17º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód: 66999)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 01/12/2015
Observação: 18º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18º Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18º Medição Reajustamento

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48647)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Data da Medição: 05/09/2013
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49521)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Data da Medição: 07/10/2013
Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2º Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013


Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Data da Medição: 07/11/2013
Observação: 3º Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11º MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12º Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13º Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13º Medição provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14º Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15º Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15º MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16º Medição Provisória

Valor: R\$ 36.037,36

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16º Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17º Medição Provisória

Valor: R\$ 594.183,74

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17º Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66997)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.204.611,11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18º Medição.xlsx
Descrição: 18º Medição

Tamanho: 1.5 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)


Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19º Medição Revisora

Valor: R\$ 640.313,93

Período: 05/08/2013 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016



Medição da Obra

Documentos da Medição

Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 22/03/2016

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 03/2015	Prazo Ex. Aditado (dias):	0	Srv. Acrescidos:	R\$ 2.918.335,05	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 2.918.335,05	Inclusão:	01/12/2015
Nº/Ano: 02/2015	Prazo Ex. Aditado (dias):	341	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão:	01/12/2015
Nº/Ano: 01/2014	Prazo Ex. Aditado (dias):	483	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão:	14/07/2015

Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 7.687.498,12
Valor Total Aditado Obra:	R\$ 2.918.335,05	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final Obra:	R\$ 14.625.713,89	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 7.687.498,12	Valor Total Executado Obra:	R\$ 7.687.498,12
Valor Total Reajuste:	R\$ 762.937,49		

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	837
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias):	824	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final Obra (dias):	1184		





CGEO/SINFRA
Folia nº 59
Ass. G

DESPACHO

À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



PROC Nº: 108181/2016

FLS.: 55 - _____ - _____


DATA.: 02 / 03 / 16


À
SUOF,


Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, remeto o feito a este Setor para pagamento de medição, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

Prefeitura de Cuiabá	- folha 41
Prefeitura de Araputanga	- folha 42
SEFAZ - MT	- folha 36 e 37
PGE	- folha 40
Receita Federal	- folha 35
Caixa Econômica	- folha 34
Trabalhista	- folha 38 e 39


Eng. *Cristóvão de Medeiros Curvo*
Secretaria Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA





Processo nº 108181 / 2016


Fls.: 56 / 2016

Data: 24/03/2016

Á COFIN,

Encaminhamos o processo para liquidação e pagamento.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA





Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa: <u>Guarold Engenharia</u>	
Processo: <u>108181/2016</u>	IC: <u>222/2013</u>
Período da Despesa:	Empenho:
Produto/serviço:	Notas Fiscais:

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	VENCIDA			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	VENCIDA			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida?	VENCIDA			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?	X			
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
---	--	--



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?	X			
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?	X			
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?			X	

Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 20 de março de 2015.

Check-list elaborado por:

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



Processo nº 108181/2016


Fls.: 58


Data: 28/03/2016

À

UNING

CONFORME A VERIFICAÇÃO FOI CONSTATADA QUE EXISTE CERTIDÕES VENCIDAS,
PEDIMOS QUE ATUALIZE AS CERTIDÕES, PARA QUE POSSA DAR ANDAMENTO.


Flansuise Albuquerque Souza
Coordenadora de Planejamento
SINFRA/MT





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2016 a 27/04/2016

Certificação Número: 2016032901060581601159

Informação obtida em 29/03/2016, às 09:18:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Folha nº 60

Setor: COOT/SETP

Ass.: J

Data: 29/03/2016 - 09:00:35

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016421077****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **29/03/2016**Hora de emissão: **09:00:34**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **27/04/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2BL2MTB2M792A2T2**

Página 1 de 2

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 29/03/2016 - 09:00:35

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016421077****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de Emissão: **29/03/2016**Hora de Emissão: **09:00:34****RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS****13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal****13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão válida até **27/04/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2BL2MTB2M792A2T2**Página **2** de **2**[Retornar](#)

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 29111342/2016
Expedição: 29/03/2016, às 09:58:15
Validade: 24/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

- 0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
- 0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
- 0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
- 0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
- 0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
- 0022300-66.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA - GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

1.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ

015.153.998-77

062.075.928-32

NOME/RAZÃO SOCIAL

GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 23/03/2016

Responsável pela Expedição

Arnaldo J. G. Gonçalves
Arnaldo J. G. Gonçalves
Mat.: 95546
Técnico PGE/MT

Oliga Geni Antunes Alves
Oliga Geni Antunes Alves
Procuradora do Estado
OAB-2606

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 30 (trinta) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: MI7DWHTY6QP60L813NB2CS83NO6B05

N.º Proc. Órgão

N.º CDA

Tipo do Processo

Situação



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa:	GEOSOLO ENGENHARIA		
Processo:	10818112016	IC:	222/2013
Período da Despesa:	Empenho:		
Produto/serviço:	Notas Fiscais:		

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida?	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?	X			
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
---	--	--




Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?				
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?	X			
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?	X			
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?			X	

Retenções	
IR	X
ISSQN	não se aplica
INSS	X
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 30 de março de 2015.

Check-list elaborado por:

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000353-0
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 25101.0001.15.001479-1	Data do Doctº: 01/04/2016
--------------------------------	---------------------------

Nº PED: 25101.0001.15.002103-4	Data de vencimento: 01/04/2016
--------------------------------	--------------------------------

Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
---------	-------------	-------------

Órgão:
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Unidade Orçamentária:
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
25101.0001 Geral

Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **
-------------------------------------	--

Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1
--------------------------------------	------------------------------	---

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
---	--

NEX:*** **

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
---	--	--

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 640.313,93	SEISCENTOS E QUARENTA MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** *****
--	--	---

Histórico:
PROC 108181/2016 ,IC-222/2013 , REFERENTE 19º MEDIÇÃO Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248,Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga , nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos , PERIODO 05/08/13 Á 31/12/15 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 55, NF 603

Código do credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda
--	---

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres - MT	Nº Processo de Pagamento 56637/2014
--	--------------------------------------	---

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.702.565,44	Saldo a liquidar (R\$) *** 640.313,93	Esta liquidação (R\$) *** 640.313,93	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.702.565,44	Saldo em liquidação (R\$) *** 640.313,93	Esta liquidação (R\$) *** 640.313,93	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000353-0
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 9.604,71	ISS município (R\$) *** 3.160,14	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 6.952,32	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 620.596,76	SEISCENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
---	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 640.313,93

TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: *** 640.313,93

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 3.160,14
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 6.952,32
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 9.604,71


TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES: *** 19.717,17

ESTORNADO

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000586-1
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 25101.0001.15.001479-1	Data do Doctº: 04/05/2016
--------------------------------	---------------------------

Nº PED: 25101.0001.15.002103-4	Data de vencimento: 04/05/2016
--------------------------------	--------------------------------

Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
---------	-------------	-------------

Órgão:
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Unidade Orçamentária:
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
25101.0001 Geral

Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **
-------------------------------------	--

Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1
--------------------------------------	------------------------------	---

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
---	--

Nº NEX: *** **

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
---	--	--

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 640.313,93	SEISCENTOS E QUARENTA MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** **
--	--	---

Histórico:
PROC 108181/2016 ,IC-222/2013 , REFERENTE 1º MEDIÇÃO Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga , nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos , PERIODO 05/08/13 Á 31/12/15 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 55, NF 603

Código do credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda
--	---

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres - MT	Nº Processo de Pagamento 56637/2014
--	--------------------------------------	---

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
---------------	---

	Data de Retorno da Viagem: *** **
--	--

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 2510100000022213	Término da vigência: *** **
-------------------------------	------------------------------------

Nº Convênio: *** **

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.702.565,44	Saldo a liquidar (R\$) *** 640.313,93	Esta liquidação (R\$) *** 640.313,93	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.702.565,44	Saldo em liquidação (R\$) *** 640.313,93	Esta liquidação (R\$) *** 640.313,93	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000586-1
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 9.604,71	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 6.952,32	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal


Valor Líquido: *** 623.756,90	SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS ***** ***
---	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 640.313,93
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 640.313,93

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 6.952,32
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 9.604,71
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 16.557,03

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULT.LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 04052016 110031	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOV.JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2016	22 - DATA VENCTO. 20/05/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/67.201.038-00
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 9.604,71	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC .108181/2016 IC222/2013 NF603 LIQ25101.0001.16.000586-1		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 9.604,71	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO NOVE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8584000096-5 04710123201-9 60520937700-2 06720103800-6



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULT.LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 04052016 110031	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOV.JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2016	22 - DATA VENCTO. 20/05/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/67.201.038-00
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 9.604,71	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC .108181/2016 IC222/2013 NF603 LIQ25101.0001.16.000586-1		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 9.604,71	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO NOVE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8584000096-5 04710123201-9 60520937700-2 06720103800-6





1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT CEP 78015-285	6 - VALOR DO INSS	6.952,32	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	6.952,32	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT CEP 78015-285	6 - VALOR DO INSS	6.952,32	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	6.952,32	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Comunicação Interna – CI nº 117/2016-SAOB/SINFRA

De: Secretaria Adjunta de Obras - SAOB

Para: SAADS

A SAADS,

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO


Em atenção ao Instrumento Contratual nº 222/2013 firmado entre esta Secretaria e a Empresa GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., que tem como objeto os serviços de restauração de rodovias, Rodovia MT-175, Lote 01, Trecho BR 174 (Cacho) – Jauru, subtrecho NT Br 174 (Cacho) – Araputanga, numa extensão de 62,370 km nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga; **expomos e requeremos o que segue:**

Considerando que se encontra pendente o pagamento da 19ª Medição (PI) e da 19ª (R) relacionada ao referido Contrato, protocolizados sob o nº 108181/2016 e nº 108213/2016;

E, no intuito de dar continuidade às Obras que estão em andamento, evitando que haja descontinuidade ou paralisação, e ainda, visando garantir a trafegabilidade e segurança dos Usuários nas Rodovias; **servimo-nos do presente, para solicitar o pagamento da Medição que ainda se encontra pendente de pagamento.**

Vale constar que:

- a) O pagamento da medição em trâmite por esta Secretaria não implicará em prejuízo, uma vez que, mesmo com o devido pagamento das Medições acima mencionadas, restará um Saldo Contratual no valor de R\$ 6.938.215,77 (Seis milhões, novecentos e trinta e oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e sete centavos), valor muito superior ao apontado pelo TCE/MT;
- b) Será determinado À UNIMG – Unidade de Medição e Gerenciamento por este Secretário, a Análise e se constatado, a realização das correções das Planilhas e Valores, conforme apontamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com prazo de 10 (dez) dias para a sua realização;





- c) Ficarão condicionados os próximos pagamentos das Medições, às correções necessárias e apontadas no Relatório específico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Atenciosamente, e na urgência que o caso requer.


Cuiabá, 23 de Maio de 2.016.


Eng.º Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
SAOB/SINFRA/MT

→ SUOF,
PARA PROVIDENCIAS,

24/05/16


Eng.ª Civil Marciano Prefedetto Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA



Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso



Data: 06/06/2016 - 16:19:17

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016926295**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **06/06/2016**Hora de emissão: **16:19:17**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **01.898.295/0001-28**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **05/07/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T7LT7TM2UL99T2L7**

Página **1** de **2**

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016926295****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de Emissão: **06/06/2016**Hora de Emissão: **16:19:17****RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**

- 13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
- 6207592832 - JOSE MURA JUNIOR - Sócio com parcelamento de débitos regular(em dia) no Sistema de IPVA**
- 13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até **05/07/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **T7LT7TM2UL99T2L7**Página **2** de **2**[Retornar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR

:SINFRA	
Fis.	23
Ass.	G



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2016 a 05/07/2016

Certificação Número: 2016060616412669684080

Informação obtida em 06/06/2016, às 16:50:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 18:00:08 do dia 17/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2016.

Código de controle da certidão: **D0BE.BA7C.BA58.3BE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Dossiê n. 10080.005386/1115-51
Pedido de parcelamento Lei 12.996

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Prefeitura Municipal de Araputanga

ESTADO DE MATO GROSSO



/SINFRA
Fis. 75
Ass. C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 237/2016

Certifico a pedido de GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, conforme o requerimento protocolado sob número 935/2016-Grl, que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de ARAPUTANGA, referente aos "Tributos Municipais", inclusive "Dívida Ativa"(Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **01.898.295/0001-28 (CNPJ)**

Contribuinte: **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R GOV JARI GOMES 10
BOA ESPERANCA**

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de ARAPUTANGA de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

O referido é verdade e dou fé.

ARAPUTANGA (MT), 07 de junho de 2016.

Junio Cesar Pereira
Gerente tributário
Portaria nº 12/2013

Certidão válida até 08/07/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.araputanga.mt.gov.br.
Certidão emitida em 07/06/2016 as 09:14:06h. - Código de Validação **A5H3V4.G3I8N3.L1L6L3**

RUA ANTENOR MAMEDES, nº 911 - ARAPUTANGA - MT - CEP 78260-000 - Fone: (065) 32611736
CNPJ 15.023.914/0001-45 - e-mail: iss.eletronico@araputanga.mt.gov.br



Prefeitura Municipal de Araputanga

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 237/2016

Certifico a pedido de GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, conforme o requerimento protocolado sob número 935/2016-Grl, que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de ARAPUTANGA, referente aos "Tributos Municipais", inclusive "Dívida Ativa" (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R GOV JARI GOMES 10
BOA ESPERANCA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de ARAPUTANGA de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

O referido é verdade e dou fé.

ARAPUTANGA (MT), 07 de junho de 2016.

Junio César Pereira
Gerente Tributário
Portaria nº 12/2013

Certidão válida até 08/07/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.araputanga.mt.gov.br.
Certidão emitida em 07/06/2016 às 09:14:06h. - Código de Validação **A5H3V4.G3I8N3.L1L6L3**

RUA ANTENOR MAMEDES, nº 911 - ARAPUTANGA - MT - CEP 78260-000 - Fone: (065) 32611736
CNPJ 15.023.914/0001-45 - e-mail: iss.eletronico@araputanga.mt.gov.br



Prefeitura Municipal de Araputanga

ESTADO DE MATO GROSSO



#SINF
Fls. 77
Ass.: C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 237/2016

Certifico a pedido de GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, conforme o requerimento protocolado sob número 935/2016-Gri, que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de ARAPUTANGA, referente aos "Tributos Municipais", inclusive "Dívida Ativa" (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R GOV JARI GOMES 10
BOA ESPERANCA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de ARAPUTANGA de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

O referido é verdade e dou fé.


ARAPUTANGA (MT), 07 de junho de 2016.



Junio Cesar Pereira
Gerente tributário
Portaria nº 12/2013

Certidão válida até 08/07/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.araputanga.mt.gov.br.
Certidão emitida em 07/06/2016 às 09:14:06h. - Código de Validação **A5H3V4.G3I8N3.L1L6L3**

RUA ANTENOR MAMEDES, nº 911 - ARAPUTANGA - MT - CEP 78260-000 - Fone: (065) 32811736
CNPJ 15.023.914/0001-45 - e-mail: iss.eletronico@araputanga.mt.gov.br

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.001666-0
Data de Emissão: 09/06/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres MT
Nº EMP: 25101.0001.15.001479-1		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.16.000586-1		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0	Valor da Operação (R\$): *** 623.756,90	Valor por Extenso: SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006141 - Marciane Frevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.001664-4
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 09/06/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

EMP: 25101.0001.15.001479-1

Fonte de Recurso: 131

Nº LIQ: 25101.0001.16.000586-1

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 6.952,32	Valor por Extenso: SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006141 - Marciane Prêvedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil


DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2100	6.952,32	*** ** ** *

108181/2016 Geosolo

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.001665-2
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 09/06/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

EMP: 25101.0001.15.001479-1

Fonte de Recurso: 131

Nº LIQ: 25101.0001.16.000586-1

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R\$):


*** 9.604,71

Valor por Extenso:

NOVE MIL E SEISCENTOS E
QUATRO REAIS E SETENTA
E UM CENTAVOS *** **
*** **

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO


Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)


006141 - Marciane Prevodello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	85840000965047101232019605209377002067201038006	*** **	9.604,71	*** **

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	Fis. 81 OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07062016 124716 Ass.: C	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULT.LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOV.JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2016	22 - DATA VENCTO. 20/06/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/68.091.711-03
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 9.604,71	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC.108181/2016 IIC222/2013 NF603 LIQ25101.0001.16.000586-1		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 9.604,71	
		33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO NOVE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

Via Arrecadação

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

8580000096-8 04710123201-9 60620937700-0 06809171103-6




 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07062016 124716	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULT.LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOV.JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2016	22 - DATA VENCTO. 20/06/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/68.091.711-03
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 9.604,71	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC.108181/2016 IIC222/2013 NF603 LIQ25101.0001.16.000586-1		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 9.604,71	
		33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO NOVE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	


Via Contribuinte

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

8580000096-8 04710123201-9 60620937700-0 06809171103-6



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285	6 - VALOR DO INSS	6.952,32	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	6.952,32
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285	6 - VALOR DO INSS	6.952,32	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	6.952,32
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		




Processo nº /2016

Data: 24/06/2016

À CCONT

Com pagamento efetuado, encaminha-se o presente processo para arquivo nessa unidade.


Fransuise Albuquerque Souza
Coordenadoria Financeira



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.000586-1
Nº EMP: 25101.0001.15.001479-1			Data do Doctº: 04/05/2016	
Nº PED: 25101.0001.15.002103-4			Data de vencimento: 09/06/2016	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: 04/05/2016		Liberador de Pagamento: Marciane Prevedello Curvo		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX:*** **				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 640.313,93	SEISCENTOS E QUARENTA MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** **	

Histórico:

PROC 108181/2016 ,IC-222/2013 , REFERENTE 19º MEDIÇÃO Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248,Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga , nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos , PERIODO 05/08/13 Á 31/12/15 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 55, NF 603

Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 56637/2014
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)				
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.702.565,44	*** 640.313,93	*** 640.313,93	*** 0,

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 1.702.565,44	*** 640.313,93	*** 640.313,93	*** 0,



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000586-1
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 9.604,71	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 6.952,32	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 623.756,90	SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ** * ***
---	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 640.313,93
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 640.313,93

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 6.952,32
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 9.604,71
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 16.557,03

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DE FATURA

Credor	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor (R\$)	Situação
1995008500	GPS		2100	6.952,32	Pago
2001005567	Convênio	858400000965047101232019605209377002067201038006	***	9.604,71	Não Pago

COFI
Fls.: 85

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL			
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA				
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 27072016 142645			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL					
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN				
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES			
CUIABA	90000	03/2016	19/08/2016	000/69.410.000-51			
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR			
IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		9377		9.604,71			
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR			
PROC.108181/2016 IC222/2013 NF603 2IQ25101.0001.16.000586-1				0,00			
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR			
				0,00			
		JUROS		29 - VALOR		0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR		0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR		9.604,71	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA					
NOVE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS							

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85860000096-9 04710123201-9 60819937700-0 06941000051-2



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL			
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA				
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 27072016 142645			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL					
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN				
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES			
CUIABA	90000	03/2016	19/08/2016	000/69.410.000-51			
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR			
IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		9377		9.604,71			
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR			
PROC.108181/2016 IC222/2013 NF603 2IQ25101.0001.16.000586-1				0,00			
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR			
				0,00			
		JUROS		29 - VALOR		0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR		0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR		9.604,71	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA					
NOVE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS							

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002


Via Contribuinte

85860000096-9 04710123201-9 60819937700-0 06941000051-2





108181/16



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.002556-2
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 03/08/2016

Nº NOBLIST: Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 25101.0001.15.001479-1

Nº LIQ: 25101.0001.16.000586-1

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 9.604,71	Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ***** ***** ***** ***
------------------------	--	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Francine Albuquerque Sousa
Coordenadora Financeira

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

006141 - Marciane Provedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858600000969047101232019608199377000069410000512	*** **	9.604,71	9E21C715A4232 34B



COPI
Fls.: 87
Ass. 

Á CCONT,

Para arquivo, com pagamento efetuado.

Cuiabá, 15 de Agosto de 2016


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA





PROC. 108181/2016

FLS.: 88

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA
Fl. 88
Rub. ML

À SUOF

Encaminhamos o processo nº **108181/2016** – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

*À CCONT,
em devolução PARA ARQUIVO.*

14/06/2018

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT
