

Anexo – 24ª Medição

MPI

thorlo



CX 347

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 339402/2016 Data: 12/07/2016 16:52
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: 24 (VIGÉSIMA QUARTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA REFEFE
NTE O IC 222/2013 DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOV

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: UNING - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



0 000077 653024

16.000.622-1 44.9051 131

543

ccont

Arquivado na
Contabilidade/SINFRA
Caixas 347

23/9/16

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA
Caixa 347





Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016

MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.

Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller


M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SIMRP

Nesta

Sr. Superintendente,

Ref.: IC Nº 222/2013


Assunto: 24º (Vigésima Quarta) Medição provisória



Venho, pelo presente encaminhar a 24ª (Vigesima Quarta) Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/05/16 a 31/05/16

- 24ª (Vigesima Quarta) Medição provisória..... Período: 01/05/16 a 31/05/16

Atenciosamente


Eng.º Algor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 24ª Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1184 dias
Termino previsto: ~~11/05/2016~~ 05/11/16
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 1026 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ (2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

SMRP/SINFRA

Folha nº 04

Ass. J

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Referência: 24ª (Vigesima Quarta) Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/08/13
Período: 01/05/16 a 31/05/16
Extensão: 62,37 Km


Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

3.0	CONSERVAÇÃO	
3.1	Limpeza de bueiro	66,170 m3
3.2	Roçada pesada	12,332 há
3.3	Capina	17.000,000 m2
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	285,600 h

Comissão de Fiscalização

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016


Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Caucho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Caucho) - Araputanga
 Referência: 248 (Vigésima Quarta) Medição provisória
 Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
 Ordem de paralisação: 31/5 a 31/10/2014
 Período medição: 01/05/16 a 31/05/16 Acumulado: 05/08/13 a 31/05/16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			
1.0	PAVIMENTAÇÃO							
1.1	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00	-	-	171,10	-	
1.2	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00	812,000	812,000	171,10	138.933,20	29,97
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	11.664,00	8.494,000	8.494,000	11,01	93.518,94	72,82
1.4	Reconhecimento de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00	22.440,000	22.440,000	37,23	835.441,20	96,19
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	109.798,200	109.798,200	0,29	31.841,47	94,13
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	112.149,43	49.147,239	49.147,239	0,21	10.320,92	43,82
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00	107.020,000	107.020,000	3,91	418.448,20	28,47
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00	1.373,750	1.373,750	156,20	214.579,75	37,47
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	470.827,355	470.827,355	0,37	174.206,12	30,22
1.10	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	573.353,24	215.672,152	215.672,152	0,37	79.798,69	37,62
1.11	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	41.869,39	12.249,657	12.249,657	0,37	4.532,37	29,26
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.751.898,00	1.502.216,985	1.502.216,985	0,37	555.820,28	85,75
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00	112.192,594	112.192,594	0,61	68.437,48	35,77
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00	16.240,000	16.240,000	0,61	9.906,40	20,14
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	256.608,00	185.735,200	185.735,200	0,61	113.298,47	72,38
	Sub-total						2.749.083,49	845,16
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS							
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00	131,637	131,637	2.341,97	308.289,90	94,03
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00	131,637	131,637	279,33	36.770,16	94,03
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	948,50	473,754	473,754	1.237,55	586.294,75	49,95
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	948,50	473,754	473,754	279,33	132.333,61	49,95
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	56,02	40,447	40,447	1.257,33	50.855,22	72,20
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	56,02	40,447	40,447	279,33	11.298,06	72,20
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	321,060	321,060	1.750,22	561.925,63	28,47
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	321,060	321,060	279,33	89.681,68	28,47
	Sub-total						1.777.449,21	389,91
3.0	CONSERVAÇÃO							
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00	66,170	235,000	19,46	5.821,84	49,45
Comissão de Fiscalização								

Eng.º Alagoz-Alvelos Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Referência: 24ª (Vigesima Quarta) Medição provisória
 Ordem de início de serviço: 05/05/15
 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
 Período medição: 01/05/16 a 31/05/16
 Acumulado: 05/08/13 a 31/05/16

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

SINFRA

Nº Contrato
 Data Assinatura
 Publicação
 Processo Orig.
 Data Base

Prazo de Execução
 Prazo Restante
 Vr. Contratual PI
 Vr. Acum. Medido PI
 Vr. Acum. Programado PI
 Vr. Programado Próx. mês PI

1184 dias
 14.625.713,89
 7.793.856,88

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
3.2	Roçada pesada	há	92,00	12,332	66,670	3.258,99	257.303,77	85,82	
3.3	Capina	m ²	129.000,00	17.000,00	84.860,000	0,64	65.190,40	78,96	
3.4	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	h	850,00	285,600	648,000	189,08	176.525,08	109,84	
3.5	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	m ³	1.825,00	-	1.824,361	519,31	947.408,91	99,96	
3.6	Sub-total	tkm	115.775,52	-	112.817,680	0,63	71.075,13	97,45	
4.0	DRENAGEM						1.523.325,13	121,98	
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00	-	-	-	-	-	
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00	-	-	42,08	-	-	
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00	-	-	41,08	-	-	
4.4	Entrada p/ descida d' água EDA 01	unid	7,00	-	-	40,42	-	-	
4.5	Entrada p/ descida d' água EDA 02	unid	9,00	-	-	61,69	-	-	
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m ³	62,00	-	-	74,87	-	-	
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00	-	-	504,76	-	-	
4.8	Boca BSTC D=0,80m normal	unid	1,00	-	-	672,32	-	-	
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00	-	-	1.877,32	-	-	
	Sub-total					4.292,59	-	-	
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²	38.319,00	-	5.909,006	15,07	89.048,72	15,42	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²	930,00	-	-	15,07	-	-	
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²	135,00	-	-	22,91	-	-	
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT	m ²	55,00	-	-	-	-	-	
	Placa circular	m ²				369,88	-	-	
Comissão de Fiscalização									

Eng. Alair Alvelos Zefirino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 24# (Vigesima Quarta) Medição provisória
Ordem de rejeição de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
Período medição: 01/05/16 a 31/05/16 Acumulado: 05/08/13 a 31/05/16

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base
Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Prót. mês PI

1184 dias
14.625.713,89
7.793.856,88

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
5.5	Placa quadrada	m ²	50,00	-	-	369,88	-	-	
5.6	Placa retangular	m ²	59,00	-	-	369,88	-	-	
5.7	Placa octogonal	m ²	6,00	-	-	369,88	-	-	
5.8	Marco quilométrico	m ²	31,00	-	-	369,88	-	-	
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.600,00	-	-	41,49	-	-	
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13.728,00	1.213,000	1.213,000	14,38	17.442,94	8,84	
5.11	Setas e dizeres	m ²	49,00	-	-	22,91	-	-	
5.12	Escudo	m ²	1,40	-	-	378,16	-	-	
5.13	Defensa metálica	m	640,00	-	-	224,62	-	-	
	Sub-total						106.491,66	9,87	
	Mobilização e desmobilização	unid	6,00	-	-	-	-	-	
	Instalação de canteiro	mês	1,00	4,500	4,500	107.455,63	483.550,31	75,00	
	Administração local	mês	12,00	1,000	1,000	322.366,87	322.366,87	100,00	
	Sub-total			12,000	12,000	53.727,81	644.733,75	100,00	
	SUB-TOTAL						1.450.650,93		
	SERVIÇO ADITADO								
	TAPA BURACO								
	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco	tkm	127.875,852	27.819,733	27.819,733	0,37	10.293,30	21,76	
	PAVIMENTAÇÃO								
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	m ³	5.400,000	2.469,600	2.469,600	71,49	176.563,16	45,73	
	Sub-total						186.856,46		
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR						7.793.856,88		
	VALOR LÍQUIDO						7.687.498,12		
	Importa o valor líquido desta medição de R\$ 106.358,76 (Cento e seis mil, trezentos cinquenta e oito reais, setenta e seis centavos)						106.358,76		

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016

Comissão de Fiscalização

[Handwritten Signature]

Eng. Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº.019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 420194407-7

SMRP/SINFRA
Folha nº 07
Ass. *[Handwritten Signature]*



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda
Fiscal : Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula	Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248	Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km	Prazo: 843 dias úteis
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 24ª (Vigesima Quarta) Medição provisória	
Serviços Executados entre 01/05/16 a 31/05/16	
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico		0,70			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016		 Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT RN nº 120134407-7			

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp. Parcial = (NxP) 10
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	8,4 = 0,84
4) Cronograma Físico	0,70	2,00	1,40	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: BOM
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	5,90	10,00	8,40	
OBSERVAÇÕES:				
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016		 Coordenador de Obras de Transportes		

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes


 Superintendente de Obras de Transportes Engº. Diogo Melozeiros Souza Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas SMRP / SINFRA

SINFR
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES
 DE FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

Extensão: 62,37 km
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Referência: 19ª Medição provisória Revisora
 Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
 Ordem de Paralisação: 30/05/2014
 Referência: 19ª Medição provisória Revisora

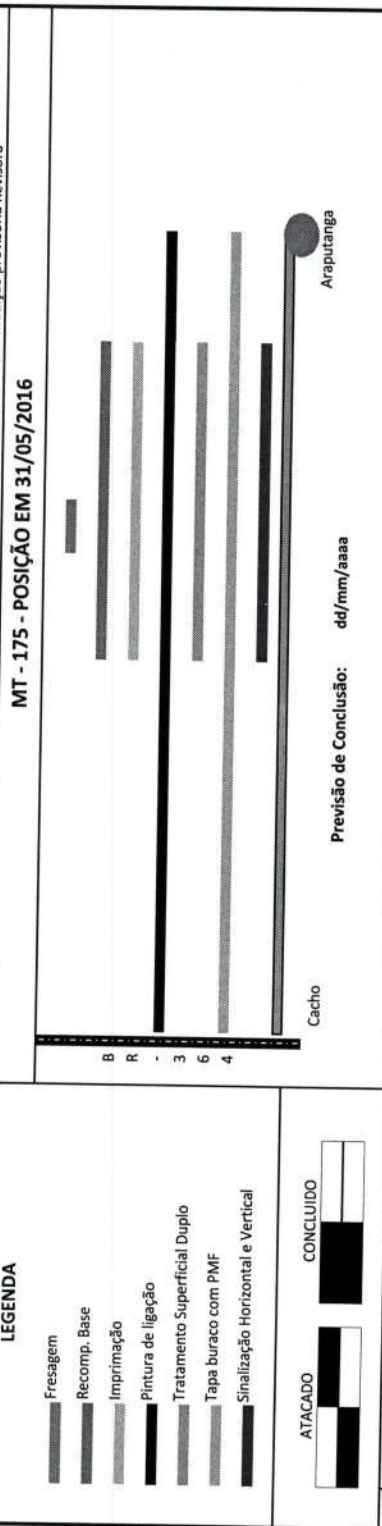

QUILOMETRAGEM	ATACADO	CONCLUÍDO
0	0	0
5	0	0
9	0	0
14	0	0
18	0	0
23	0	0
27	0	0
32	0	0
36	0	0
41	0	0
45	0	0
50	0	0
54	0	0
59	0	0
62,37	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0
1.800	0	0
2.025	0	0
2.250	0	0
2.475	0	0
2.700	0	0
2.925	0	0
3.119	70,03%	29,97%
0	0	0
225	0	0
450	0	0
675	0	0
900	0	0
1.125	0	0
1.350	0	0
1.575	0	0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr.: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda	
MES/ANO	05/08/13 a 31/08/2013	01/09/13 a 30/09/2013	01/10/13 a 31/10/2013	01/11/13 a 30/11/2013	01/12/13 a 31/12/2013
DIAS CORRIDOS	27 / 27	30 / 57	31 / 88	30 / 118	31 / 149
SERVIÇO	PS	PS	PS	PS	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO					
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
3.0 - CONSERVAÇÃO	1,8487%	270.391,12	1,1921%	174.359,62	1,2435%
4.0 - DRENAGEM	0,2151%	31.455,60	1,1547%	168.887,83	0,9132%
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,4726%	215.381,17	0,0414%	6.050,56	0,2535%
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	3,3062%	483.550,30	0,3674%	53.727,81	0,3674%
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	3,31%		2,76%		1,55%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	3,31%		9,97%		14,30%
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		403.025,82	
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.457.531,82	
				406.242,96	227.216,11
				1.863.774,78	2.090.990,89

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Obr.: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda	
MES/ANO	01/01/14 a 31/01/2014	01/02/14 a 28/02/2014	01/03/14 a 31/03/2014	01/04/14 a 30/04/2014	01/05/14 a 31/05/2014
DIAS CORRIDOS	31 / 180	28 / 208	31 / 239	30 / 269	31 / 300
SERVIÇO	PS	PS	PS	PS	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO					
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,5969%	87.296,99	0,2994%	43.785,19	0,4550%
4.0 - DRENAGEM	0,4383%	64.110,98	0,3593%	52.556,01	0,5513%
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,1225%	17.923,07	0,3674%	53.727,81	0,3674%
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	1,40%		1,37%		2,04%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	15,70%		18,22%		20,26%
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		167.992,08	
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75	
				200.901,16	298.625,42
				2.665.019,91	2.963.645,33
					53.727,81
					3.017.373,14

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng.º Alcor Alencar Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 R/Nº 120134407-7

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
MT - 175		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/05/15 a 31/05/2015	
ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		01/11/14 a 04/05/2015		01/06/15 a 30/06/2015	
MÊS/ANO	DIAS CORRIDOS	122 / 422	31 / 453	185 / 638	27 / 665
SERVIÇO		PS		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,0284%		76.296,25	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		1,2825%		38.229,61	
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,1021%		896,00	
4.0 - DRENAGEM		3,41%		53.727,82	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		24,04%			
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		499.161,37			
7.0 - TAPA BURACO		3.516.534,51			
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		3.017.373,14			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)					
FATURAMENTO GLOBAL ACUMULADO (P6A)					
FATURAMENTO SIMPLES					
FATURAMENTO ACUMULADO				847.098,30	
NOTAS				4.532.782,49	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
MT - 175		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/10/15 a 31/10/2015	
ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		01/09/15 a 30/09/2015		01/11/15 a 30/11/2015	
MÊS/ANO	DIAS CORRIDOS	31 / 726	30 / 787	31 / 818	25 / 843
SERVIÇO		PS		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,9183%		292.574,51	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,5304%		87.713,96	
3.0 - CONSERVAÇÃO		0,2464%		2.432,50	
4.0 - DRENAGEM		0,2464%		36.037,36	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		0,2464%			
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		358.136,91			
7.0 - TAPA BURACO		4.890.921,40			
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		321.430,58			
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		2,20%		10.293,30	
FATURAMENTO GLOBAL ACUMULADO (P6A)		35,64%		176.563,16	
FATURAMENTO SIMPLES		39,95%		8.24%	
FATURAMENTO ACUMULADO		594.183,74		48,18%	
NOTAS		5.248.389,34		7.047.184,19	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Nota Otari
 Eng.º Algor-Alvejos Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

OBRA PARALIZADA

OBRA PARALIZADA

OBRA PARALIZADA

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 INICIO: 05/08/2013
 TERMINO: 05/11/2016
 Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89
 Data Assinatura 01/08/2013 Prazo: 1.184 dias
 Publicação 02/04/2009
 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Firma: Geosolo Eng.Plane Cons. Ltda
 01/10/16 a 31/10/16 31 / 1179 5 / 1.184
 DIAS CORRIDOS PS VALOR R\$ PS VALOR R\$

SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO				
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS				
3.0 - CONSERVAÇÃO				
4.0 - DRENAGEM				
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	100,00%		100,00%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)				
FATURAMENTO SIMPLES				
FATURAMENTO ACUMULADO		14.625.652,59		14.625.652,59

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng.º Aluor Alvois Zeferino de Paula
 Fiscal Parting Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

Naoto Otani
 RN 1704394534
 Geosolo Engenharia Cons Ltda



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 24ª Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013


Período: 01/05/16 a 31/05/16

INICIAL		FINAL		FRAC.	Extensão (m)	Largura (m)	LADO	Área (m ²)	OBSERVAÇÃO
55,25		59,50							
					4250,00	2,00	Esq. / Dir.	17.000,000	
TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO									
								17.000,000	
A DEDUZIR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES									
								17.000,000	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016

Eng. Alair Alveios Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

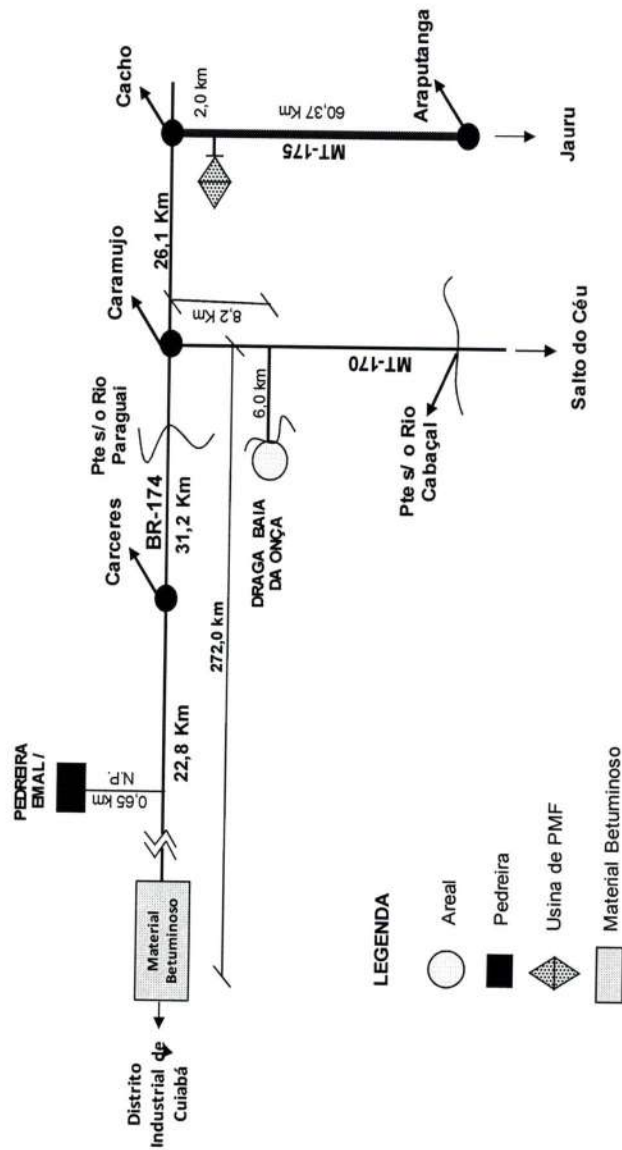

N.P. = NÃO PAVIMENTADO

OBSERVAÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU	
Rodovia:	Trecho : Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
MT-175	Ext.: 62,37 Km
	Sub-trecho : Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
	Lote : 1

[Handwritten signature]



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DE MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

Nº. DA FOLHA

1

Período:

Período: 01/05/16 a 31/05/16

RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:			CONTRATO Nº.		
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Rodovia: MT-175/MT-248	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU			

CONSTRUTORA
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.
Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização. Pavimento do trecho em bom estado de trafegabilidade e segurança.

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016

Naoto Otani
RN 1704394554
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Eng. Alaor Alvelos Zefirino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO

CONTRATO:	IC nº 222/2013/00/00-SETPU
RODOVIA:	MT-175/MT-248
TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB-TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EMPRESA:	GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO:	Período: 01/05/16 a 31/05/16

MEDICÃO: Referência: 24ª Medição provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANHÃ	B	C	B	B	B	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B
TARDE	B	C	B	B	B	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	B	C	B	B	B	B
NOITE	B	C	B	B	B	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	B	C	B	B	B	B
MM																															

CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"

Eng.º Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contratada:	GEOSOLO Eng. Plan. Consultoria Ltda.	
Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU	
Extensão:	Extensão: 62,37 km	Lote:



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 50,8"	MT-*175	ROÇADA
58º 06' 11,6"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 28' 52,0"	MT-*175	LIMPEZA DE BUEIRO
58º 20' 25,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 37' 20,0"	MT-175	LIMPEZA DE BUEIRO
58º 09' 35,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 31' 57,0"	MT-175	CAPINA
58º 16' 23,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 42' 08,0"	MT-*175	LIMPEZA DE BUEIRO
58º 05' 17,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 32' 56,0"	MT-*175	LIMPEZA (HORA MAQUINA)
58º 16' 00,3"		

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016

(Handwritten Signature)
Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.
Julio Mangini Fernandes Neto
M.D. Chefe de Unidade IV – Medições e Gerenciamento
CUIABÁ/MT

Assunto: 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013 - SINFRA
Firma: Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA.

Através do presente, encaminho a V.S.ª a 24ª (Vigésima Quarta) Medição Provisória após análise Técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 04 a 23

Em 13 de Julho de 2016.

Engº Diogo Menezes Souza
Superintendente de Restauração e Manutenção de Rodovias Pavimentadas
SMRP/SINFRA-MT



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória

Ref. I.C. Nº 222/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a 24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória, devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória.....R\$ 106.358,76

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 23.

Em 21 de Julho de 2016.


Eng.º Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda

Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	25/7/2016 10:56:09	E3 70 AB	662
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Referente a 24ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
 Serviços executados no Município de São José dos Quatro Marcos-MT

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 106.358,76

VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 11.579,08

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 94.779,68

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO
 CONTA CORRENTE: 17.900-0
 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	7	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 106.358,76	R\$ 0,00	R\$ 94.779,68	R\$ 11.579,08	R\$ 578,95	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 691,33	R\$ 3.190,76	R\$ 1.273,70	R\$ 1.595,38	R\$ 1.063,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 98.544,00

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



Engº Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA 830/D - RN: 120134407-7

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda

Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 -Cuiabá- MT
Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 25/7/2016 10:56:09	Código de Verificação de Autenticidade E3 70 AB	Número da Nota Fiscal 662
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número	Complemento	Bairro Centro Político Administrativo
CEP 78050-970	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone		e-mail fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Referente a 24ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Serviços executados no Município de São José dos Quatro Marcos-MT

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 106.358,76

VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 11.579,08

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 94.779,68

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO
CONTA CORRENTE: 17.900-0
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101			
Valor Total dos Serviços R\$ 106.358,76	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 94.779,68	Base de Cálculo R\$ 11.579,08	Total do ISSQN R\$ 578,95	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 691,33	COFINS R\$ 3.190,76	INSS R\$ 1.273,70	IRRF R\$ 1.595,38	CSLL R\$ 1.063,59	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 98.544,00

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



Engº Algor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA 830/D - RN: 120134407-7

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 543/16	Data: 22/7/2016				
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Geosolo	339402/16	222/13	24º Med.	14.625.713,89	7.687.498,12	6.938.215,77	106.358,76	16.000.622-1	44.90.51	131	R\$ 6.831.857,01	
TOTAL PROGRAMADO							106.358,76					

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.


Engº Marcos Catalano Corrêa
Secretário Adjunto de Transportes


Engª Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

UNIMG/SINFRA
Folha nº 27
Ass. J



ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 339402/16 Contrato nº: 0222/13
 Vigência: _____ Empresa Contratada: Geosolo
 Resumo do Objeto: Ref. a 24ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 26 de Julho de 2016, _____ de _____ de _____
 (local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata




TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO Nº	339402
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2016.


Eng.º Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA





COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 222-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

28 de julho de 2016 10:31

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Bom dia,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.00078-3**NOME DO CREDOR: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda****CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28****IC: 222/2013 - 24º Medição Provisória****SUBCONTA: 218****EMPENHO: 25101000116000622-1****PROCESSO: 339402/2016** **24º Medição.xlsx**
2451K

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Obra

Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1

Valor Inicial da Obra: R\$ 11.707.378,84

Prazo de Execução Inicial (dias): 360

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Concorrência Pública

Nº/Ano: 020/2013

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho) - Jaunui; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Detalhes

Inclusão: 18/09/2013

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248

Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Origem de Recursos

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Monteichi Vitorio

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC 2.pdf

Descrição: ART FISC 2

Nome: ART FISC 1.pdf

Descrição: ART FISC 1

Nome: PORTARIA.pdf

Descrição: PORTARIA

Tamanho: 576.1 KB

Tamanho: 889.2 KB

Tamanho: 111.6 KB



Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Início Atividade: 05/08/2013

Tamanho: 679.3 KB

Nome: ART CONT 2.pdf

Descrição: ART CONT 2

Nome: ART CONT 1.pdf

Descrição: ART CONT 1

Situação da Obra

Data Situação: 01/10/2014

Situação: Reiniciada

Descrição:

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R. 222 2.013.pdf

Descrição: O.R.

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Descrição: O.P.

Data Publicação: 31/07/2014

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf

Descrição: O.P.

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Descrição: OIS

Data Publicação: 12/08/2013

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf

Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód: 54307)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 6º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Data da Medição: 30/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6º Medição - Reajustamento.xls

Descrição: 6º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód: 63736)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 12º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Data da Medição: 01/06/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12º Medição.xlsx

Descrição: Reajustamento da 12º medição provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód: 64357)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 14º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Data da Medição: 01/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14º Medição.xlsx

Descrição: Reajuste 14º Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód: 63761)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 13º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015

Data da Medição: 01/07/2015



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód: 64890)

Data da Medição: 01/09/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód: 54304)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 3ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 69024 (Cód: 69025)

Data da Medição: 05/01/2016
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19ª Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód: 66220)

Data da Medição: 03/11/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 22/03/2016



Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód.: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód.: 66999)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 18ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18ª Medição Reajustamento

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód.: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód.: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód.: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 48647)

Data da Medição: 05/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1ª Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49521)

Data da Medição: 07/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2ª Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód.: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3ª Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Inclusão: 11/12/2013

Tamanho: 2.1 MB

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Inclusão: 06/05/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Inclusão: 06/05/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Inclusão: 07/05/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição

Inclusão: 02/07/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição

Inclusão: 02/07/2014

Tamanho: 2.1 MB

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição

Inclusão: 02/07/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10ª Medição Provisória

Inclusão: 08/07/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014



Inclusão: 08/07/2014

Inclusão: 06/11/2014

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13ª Medição provisória

Tamanho: 1.1 MB

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 36.037,36

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 594.183,74

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66997)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.204.611,11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição.xlsx
Descrição: 18ª Medição

Tamanho: 1.5 MB

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Revisora

Valor: R\$ 640.313,93

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015



Inclusão: 11/08/2015

Inclusão: 11/08/2015

Inclusão: 11/08/2015

Inclusão: 03/09/2015

Inclusão: 03/09/2015

Inclusão: 25/09/2015

Inclusão: 25/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Inclusão: 25/11/2015

Inclusão: 25/11/2015

Inclusão: 25/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Inclusão: 21/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19º Medição Revisora.xlsx
Descrição: 19º Medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx
Descrição: 20ª Medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)

Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx
Descrição: 21ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx
Descrição: 22ª Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)

Data da Medição: 02/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 25/07/2016

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx
Descrição: 23ª Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24ª Medição Provisória

Valor: R\$ 106.358,76

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 28/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24ª Medição.xlsx
Descrição: 24ª Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 28/07/2016

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 04/2016	Prazo Ex. Aditado (dias):	178	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão:	05/07/2016
Nº/Ano: 03/2015	Prazo Ex. Aditado (dias):	0	Srv. Acrescidos:	R\$ 2.918.335,05	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 2.918.335,05	Inclusão:	01/12/2015
Nº/Ano: 02/2015	Prazo Ex. Aditado (dias):	341	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão:	01/12/2015
Nº/Ano: 01/2014	Prazo Ex. Aditado (dias):	483	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão:	14/07/2015



Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 7.793.856,88
Valor Total Aditado Obra:	R\$ 2.918.335,05	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final Obra:	R\$ 14.625.713,89	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 7.793.856,88	Valor Total Executado Obra:	R\$ 7.793.856,88
Valor Total Reajustes:	R\$ 762.937,49		

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	965
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias):	1002	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final Obra (dias):	1362		



DESPACHO

À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

● **ASSUNTO:** Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA




PROC Nº: 339402/2016

FLS.: 40 - _____ - _____


DATA.: 29 / 07 / 2016

À
SUOF/COFIN,

Em análise ao processo, Autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.


Eng.ª Civil Marciana Provedora Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA





Processo nº 339408/2016


Fls: 41 /2016

Data: 01/08/2016

À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação.

PI 
Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA



RETENÇÕES

Processo nº: 339402/2016

#SINFRA

Fis. 42

Ass.: C

Número da Nota Fiscal

662

Valor da Nota Fiscal

106.358,76

Emissão Nota Fiscal

25/07/2016

Credor

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda**Cálculo do Imposto de Renda**

Valor Tributável

106.358,76

Percentual

1,5%

Valor da Retenção

1.595,38**Cálculo do ISSQN**

Valor Tributável (Base de Cálculo)

Percentual

5,0%

Valor da Retenção

-

Cálculo do INSS

Valor Tributável

11.579,08

Percentual

11,00%

Valor da Retenção

1.273,70**Valor líquido da NF-E****103.489,68****C-MT**

Data

02/08/2016 09:01



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa:	GEOSOLO ENGENHARIA		
Processo:	339402/2016	IC:	
Período da Despesa:		Empenho:	16000622-1
Produto/serviço:		Notas Fiscais:	

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?				
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?				
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)				
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)				
8	A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida?				
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)				
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?				
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
---	--	--

ob
dig
Alu



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)				
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?				
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?				
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?	X			
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?				

Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 02 de 08 de 2015. 2016.

Check-list elaborado por:

Jefferson Delgado da Silva

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------

5: Conforme a folha nº 40 foi autorizado somente para
atualização no FIPLAN e no momento oportuno as CERTIDÕES serão
realizados.

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.001468-0	
Nº EMP: 25101.0001.16.000622-1			Data do Doctº: 02/08/2016		
Nº PED: 25101.0001.16.000897-4			Data de vencimento: 02/08/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 106.358,76		CENTO E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** *** **
Histórico: PROCESSO 339402/2016 IC 222/2013 REFERENTE A 24º MEDIÇÃO NF 662 NO PERIODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016 .					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 56637/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213		Termo da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 597.370,81	*** 106.358,76	*** 106.358,76	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 597.370,81	*** 106.358,76	*** 106.358,76	*** 0,00



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.001468-0
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$):	*** 1.595,38	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município: *****
INSS (R\$):	*** 1.273,70	MTPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal				

Valor Líquido:	*** 103.489,68	CENTO E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****
-----------------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 106.358,76
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 106.358,76
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 1.273,70
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 1.595,38
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 2.869,08



Processo nº: /2016
Fls.: 45 /Rub.:
Data:

DESPACHO

À SAADS,

Encaminhamos o presente processo a esse Setor para **regularização das Certidões Negativas de Débitos e inserção de Comprovante de Recolhimento do ISSQN** correspondente ao(s) Município(s) onde estiver sendo executado o serviço/obra, em cumprimento ao disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 101/2000, Lei Complementar nº 116/2003, Lei Estadual nº 10.162/2014, Orientação/Resposta nº 001491/2015 da CGE, bem como as Comunicações Internas nº 261/2015/UNISECI e nº 021/2016/SUOF e Parecer nº 141/2016/UNIJUR desta SINFRA.

Atenciosamente,


BRUNA MORAES RODRIGUES
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

De acordo:


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

SAAD/SINFRU
46
Ass.: *re*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

211147/2016

PROCESSO

243815

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



14092016018982950001280010056521114753591016243815

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10


BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de setembro de 2016


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 2016.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
 CNPJ: 15.024.029/0001-80
 Dr. Guilherme Pinto Cardoso - n°. 539 - Centro - CEP 78.285-000
 Fone: (65) 3251-1138
 fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



ADS/SINFRA
 47
 le

Certidão Negativa De Débito Do Contribuinte

Certidão N° 443 / 2016

Imóvel		Inscrição	
Código	Tp Imóvel		
0	0		
Rua		N°	
0 -			
Bairro		Quadra	Lote
0 -			

Contribuinte

Nome /

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMNTO E CONSULTORIA
 CPF/CN

01.898.295/0001-28

Endereç

RUA GOV. JARI GOMES

N°

10

Cep

78068-480

Bairro

BOA ESPERANCA

Cidade

RUA ROMA

UF

MT

Complemento

Finalidade

FINS GERAIS

Referência

CERTIDÃO

Resolvendo o direito da Fazenda Pública do Município do cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade acima indicada, NÃO EXISTIR, débitos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

Certidão emitida em 21/08/2016

Certidão válida até 21/09/2016

Amir Izidorio Pereira
 Amir Izidorio Pereira
 chefe de Departamento Tributos
 21/08/2016

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539. Fone/Fax: 65-3251- 1138. CEP: 78.285-000 .
 São José dos Quatro Marcos - MT C.N.P.J. 15.024.029/0001-80

Pag: 1

Secretaria de Estado
de Fazenda



Setor: SCEO/SIN/MT
Fl. Nº 44/48
Ass. [Assinatura]

Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 26/08/2016 - 12:06:28

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº: 0017489065

CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Data de emissão: **26/08/2016**

Hora de emissão: **12:06:28**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**

Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspensão.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **24/09/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TBM2LTK2U9K2927L**

Página 1 de 2

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 1549
Ass.: [assinatura]

Data: 26/08/2016 - 12:06:28

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0017489065**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: 26/08/2016

Hora de Emissão: 12:06:28

- RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
- 13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal
 - 6207592832 - JOSE MURA JUNIOR - Sócio com parcelamento de débitos regular(em dia) no Sistema de IPVA
 - 13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até 24/09/2016.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : TBM2LTK2U9K2927L

Página 2 de 2

Retornar

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



Selo: SCEO/SINFR
SEFAZ-MT
Ass. *[Signature]*

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ
01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 14/07/2016

Andréia E. A. Ribeiro
Responsável pela Expedição

[Signature]
Procurador(a) do Estado

Dra. Olga Geny de Almeida Alves
Subprocuradora-Geral Fiscal

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: OW3R90JSV5WMD9GT77CU225ALU3DF

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Setor: SCEO/SINCR
Fl. Nº: 13 51
Ass:

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 14:41:00 do dia 09/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2016.

Código de controle da certidão: **EE3E.C318.19A2.B866**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2016 a 30/09/2016

Certificação Número: 2016090118411975289452

Informação obtida em 01/09/2016, às 23:15:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 50166887/2016
Expedição: 27/05/2016, às 10:47:55
Validade: 22/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.898.295/0001-28, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0022300-66.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

Setor: SCEO/SINF
Fl. N° 1854
Ass. 



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Estado de MATO GROSSO

Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO, 539
CENTRO
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT
CEP: 78285-000
CNPJ 15.024.029/0001-80

Ass:

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 2637/2016-21

Responsável: 00053 - Data de Emissão 15/09/2016 15:10:16

Contribuinte						Contribuinte - Inscrição					
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA 78285-000 CUIABA MT						01898295000128-					
Localização											
RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA											
ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO
2016	021	0	7	12	ISSQN (M)	20/08/2016	578,95	0,00	11,58	11,58	602,11
Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/09/2016											602,11
Instruções											
Movimento Tributado R\$: 11579,08 x Aliquota de 5%, Notas de 662 a -> Mês de competência: 7/2016.											

81640000006-2 02114161201-6 60930920000-2 02637201621-7

Contribuinte



destaque aqui



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Estado de MATO GROSSO

Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO, 539 -
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT -
CEP: 78285-000
CNPJ 15.024.029/0001-80

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 2637/2016-21

Responsável: 00053 - Data de Emissão 15/09/2016 15:10:16

Contribuinte						Contribuinte - Inscrição					
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA 78285-000 CUIABA MT						01898295000128-					
Localização											
RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA											
ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO
2016	021	0	7	12	ISSQN (M)	20/08/2016	578,95	0,00	11,58	11,58	602,11
Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/09/2016											602,11
Instruções											
Movimento Tributado R\$: 11579,08 x Aliquota de 5%, Notas de 662 a -> Mês de competência: 7/2016.											

81640000006-2 02114161201-6 60930920000-2 02637201621-7

Via Banco / Prefeitura



Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Cuiabá, 15 de setembro de 2016

Of. 130/2016



À
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Nesta

Prezados Senhores,

REF.: Contrato IC-222/2013/00/00-SINFRA
Revitalização da Rodovia MT-175

Vimos pelo presente encaminhar a guia de recolhimento de ISSQN da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, referente à **Nota Fiscal nº 662**, relativa a 24ª Medição de serviços da obra Restauração e Revitalização da Rodovia MT-175, objeto do contrato IC-222/2013/00/00-SINFRA, e DECLARAR o compromisso de quitação do tributo em até 05 dias após o pagamento da referida Nota por esta Secretaria.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos mui

Cordialmente

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.
CNPJ: 01.898.295/0001-28

José Mura Junior
CREA Nº. 2601708043



PROC N°: _____ 339402/2016 _____

FLS.: 58 _____ - _____ - _____

DATA.: 16 _____ / 09 _____ / 2016 _____

À
SUOF/COFIN,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, encaminho os autos para pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

VENCIMENTO

Prefeitura Cuiabá	- folha 46	13/12/2016
Prefeitura São Jose dos 4 Marcos	- folha 47	21/09/2016
SEFAZ – MT	- folha 48/49	24/09/2016
PGE	- folha 50	14/10/2016
Receita Federal	- folha 51	06/12/2016
Caixa Econômica	- folha 52	30/09/2016
Trabalhista	- folha 53/54	22/11/2016

ISSQN

Considerando a Declaração de folha 56 e a Guia de ISSQN do Município de São Jose dos Quatro Marcos – MT, folha 55, com vencimento para o próximo dia 30/09/2016 para cumprimento da obrigação.

Dessa forma, AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN ao processo.


Eng.ª Civil Marlene Provedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
SINFRA

59

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 19092016 163813	
GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA 02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		01.898.295/0001-28 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
CUIABA	90000	07/2016	20/10/2016	000/70.769.886-32	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR	
IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		9377		1.595,38	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR		
proc 339402/2016 IC 222/2013 LIQ 160014680		MULTA	28 - VALOR	0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		JUROS	29 - VALOR	0,00	
		T.S.E.	30 - VALOR	0,00	
		TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR	1.595,38	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
HUM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

8587000015-4 95380123201-3 61020937700-9 07076988632-0



Via Arrecadação

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 19092016 163813	
GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA 02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		01.898.295/0001-28 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
CUIABA	90000	07/2016	20/10/2016	000/70.769.886-32	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR	
IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		9377		1.595,38	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR		
proc 339402/2016 IC 222/2013 LIQ 160014680		MULTA	28 - VALOR	0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		JUROS	29 - VALOR	0,00	
		T.S.E.	30 - VALOR	0,00	
		TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR	1.595,38	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
HUM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS					


Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002


8587000015-4 95380123201-3 61020937700-9 07076988632-0



Via Contribuinte

60

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		6 - VALOR DO INSS	1.273,70	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.273,70	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		6 - VALOR DO INSS	1.273,70	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.273,70	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Processo nº: 339402/2016
Fls.: 01 /Rub.: W
Data: 23/09/2016

DESPACHO

À SAADS,

Encaminhamos o presente processo a esse Setor para **regularização das Certidões Negativas de Débitos e inserção de Comprovante de Recolhimento do ISSQN** correspondente ao(s) Município(s) onde estiver sendo executado o serviço/obra, em cumprimento ao disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 101/2000, Lei Complementar nº 116/2003, Lei Estadual nº 10.162/2014, Orientação/Resposta nº 001491/2015 da CGE, bem como as Comunicações Internas nº 261/2015/UNISECI e nº 021/2016/SUOF e Parecer nº 141/2016/UNI JUR desta SINFRA.

Atenciosamente,


BRUNA MORAES RODRIGUES
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

De acordo:


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
 CNPJ: 15.024.029/0001-80
 Dr. Guilherme Pinto Cardoso - nº. 539 - Centro - CEP 78.285-000
 Fone: (65) 3251-1138
 fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



SAADS/SINFR
 Fls. 62
 SS: 10

Certidão Negativa De Débito Do Contribuinte

Certidão Nº 524 / 2016

Código	Imóvel	Tp Imóvel	Inscrição	Rua	Nº	Bairro	Quadra	Lote
0		0		0 -		0 -		
Contribuinte								

Nome /
 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMNTO E CONSULTORIA
CPF/CN
 01.898.295/0001-28

Endereç
 RUA GOV. JARI GOMES

Cidade
 RUA ROMA

Complemento

Nº
10

Cep
78068-480

Bairro
BOA ESPERANCA

UF
MT

Finalidade

PARA FINS GERAIS.

Referência

REF. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS.

Resslvado o direito da Fazenda Pública do Município do cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade acima indicada, NÃO EXISTIR, débitos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

Certidão emitida em 20/09/2016
Certidão válida até 20/10/2016

Valmir Izidário Pereira
 Chefe do Departamento Tributário
 20/09/2016



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

339402/16
 COM
 Fls.: 69
 Ass:

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.003761-7
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 23/09/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

Município UF: Cáceres MT

Nº MP: 25101.0001.16.000622-1

Fonte de Recurso: 131

Nº LIQ: 25101.0001.16.001468-0

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Tipo de OB:

31-DOC/TED

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0

Valor da Operação (R\$):

*** 103.489,68

Valor por Extenso:

CENTO E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *****

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Francisne Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Marciane Prevedello Curvo
006141 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.003762-5
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 23/09/2016

Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
-------------	-------------

Unidade Orçamentária:
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
--	---	------------------------------	------------------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT
-------------------------------------	--------------------------------

IMP: 25101.0001.16.000622-1	Fonte de Recurso: 131
------------------------------------	------------------------------

LIQ: 25101.0001.16.001468-0	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
------------------------------------	---------------------------------------

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 1.595,38	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ***** ***** *****
-------------------------------	---	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Franciuse Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)


AUTORIZO O PAGAMENTO

006141 - Marciane Provedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858700000154953801232013610209377009070769886320	*** **	1.595,38	28BB95E4A9E2 CCAD

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.003763-3
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 23/09/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

MP: 25101.0001.16.000622-1

LIQ: 25101.0001.16.001468-0

Fonte de Recurso: 131

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Tipo de OB:

39-FAT S/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R\$):

*** 1.273,70

Valor por Extenso:

UM MIL E DUZENTOS E
SETENTA E TRÊS REAIS E
SETENTA CENTAVOS ***
*** ** * ** * ** * ** * ** * ** *
*** ** * ** * ** * ** * ** * ** *
*** ** * ** *

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Franciuse Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

006141 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2640	1.273,70	4E1586837680C0 48



Processo nº: 339402/2016

Fls.: 72/Rub.: 104

Data: 03/10/2016

DESPACHO

À SAADS,

Conforme despacho autorizado pagina 58, solicitamos requerer junto à empresa o comprovante de recolhimento ou ISSQN para que possamos dar continuidade nos procedimentos.

Atenciosamente,


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA

Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

JA
COFIN,

Restituo processo com comprovante de recolhimento de ISSQN ref. a nota fiscal 662.



Luciana de Lima Cândido Campos
Assessora Técnica
SAADS/SINFRA

03/04/10/16



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Estado de MATO GROSSO
Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO, 539 - CENTRO
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - CEP: 78285-000
CNPJ 15.024.029/0001-80

SAADS/SINFR
Fls. **B**
Ass.: **lc**

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 2637/2016-21

Contribuinte: **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E** **CONTRIBUINTE** Responsável: 00053 - Data de Emissão 15/09/2016 15:10:16
RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA 78285-000 CUIABA MT Contribuinte - Inscrição: **01898295000128-**

Localização: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA

ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO
2016	021	0	7	12	ISSQN (M)	20/08/2016	578,95	0,00	11,58	11,58	602,11

Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/09/2016 **602,11**

Instruções: Movimento Tributado R\$: 11579,08 x Aliquota de 5%, Notas de 662 a -> Mês de competência: 7/2016.

Autenticação Mecânica

81640000006-2 02114161201-6 60930920000-2 02637201621-7



Contribuinte

destaque aqui



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Estado de MATO GROSSO
Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO, 539 - SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - CEP: 78285-000
CNPJ 15.024.029/0001-80

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 2637/2016-21

Contribuinte: **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA** Responsável: 00053 - Data de Emissão 15/09/2016 15:10:16
RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA 78285-000 CUIABA MT Contribuinte - Inscrição: **01898295000128-**

Localização: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA

ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO
2016	021	0	7	12	ISSQN (M)	20/08/2016	578,95	0,00	11,58	11,58	602,11

Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/09/2016 **602,11**

Instruções: Movimento Tributado R\$: 11579,08 x Aliquota de 5%, Notas de 662 a -> Mês de competência: 7/2016.

Autenticação Mecânica

81640000006-2 02114161201-6 60930920000-2 02637201621-7



Via Banco / Prefeitura

MT 175
249 med

27/09/2016

Banco do Brasil

CAAD/SISINERA
15 34
10
Ass: _____



Outros convênios

A33R271132768996016
27/09/2016 11:40:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.25
1216501216

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GEOSOLO ENG CONSTR LTDA
AGENCIA: 1216-5 CONTA: 8.136-1
EFETUADO POR: JOSE MURA JUNIOR
=====

Convenio	SAO JOSE DOS QUATRO MARCO
Codigo de Barras	81640000006-2 02114161201-6
	60930920000-2 02637201621-7
Data do pagamento	27/09/2016
Valor em Dinheiro	602,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	602,11

=====

DOCUMENTO: 092704
AUTENTICACAO SISBB:
4.F48.16F.49F.064.DB8

Transação efetuada com sucesso por: J6242322 JOSE MURA JUNIOR.



PROC. 339402/2016

FLS.: 75

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA

Fl. 75

Rub. M

À SUOF

Encaminhamos o processo nº 339402/2016 – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT,

Em devolução PARA ARQUIVO.

14/06/2018

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT
