

Anexo – 28ª Medição

MPI



CX 369

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 545770/2016 Data: 27/10/2016 09:33

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: 28 (VIGÉSIMA OITAVA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CON  
TRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1



887

16.001.081 4490.51 131

Arquivado na Contabilidade / SINFRA
369 Caixa 369

05/12/16



Cuiabá/MT, 04 de Outubro de 2016

**28a. MEDIÇÃO PROVISÓRIA**


Ilmo Sr.  
Eng.º Diogo Menezes Souza  
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP  
Nesta


Sr. Superintendente,  
Ref.: IC Nº 222/2013  
Assunto: 28º (Vigésima Oitava) Medição provisória

Venho, pelo presente encaminhar a 28ª (Vigesima Oitava) Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/09/16 a 30/09/16

- 28ª (Vigesima Oitava) Medição provisória..... Período: 01/09/16 a 30/09/16

Atenciosamente

  
Eng.º Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 28ª (Vigesima Oitava) Medição provisória  
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013  
Ordem de Paralisação: 30/05/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014  
Ordem de Paralisação: 31/10/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

### DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Extensão: 62,37 km  
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA  
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 275531/2013-SETPU  
Data da assinatura: 01/08/2013  
Data da publicação: 01/08/2013  
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Prazo contratual: 1184 dias  
Termino previsto: 05/11/2016  
Ordem de início de serviços: 05/08/2013  
Prazo de corrido do contrato: 1148 dias  
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84  
Valor termo aditivo: R\$ ( 2.918.335,05  
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89  
Valor medido acumulado (PI):  
Saldo contratual (PI):  
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 04 de Outubro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,

Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SUFF!  
 Fis. 04  
 Ass. 



## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL


<b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA</b>		Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda
Fiscal :Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula		Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248		Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru		Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga		Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km		Prazo: 1184 dias úteis
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 28ª (Vigesima Oitava) Medição provisória		Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Serviços Executados entre 01/09/16 a 30/09/16		

### A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico		0,70			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 04 de Outubro de 2016					

### B) Visto do Fiscal do Contrato

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp.Parcial = $\frac{NxP}{10}$
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,70	2,00	1,40	8,4 = 0,84
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	10
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	Conceito: <b>BOM</b>
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	5,90	10,00	8,40	
OBSERVAÇÕES:				

  
 Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 28f (Vigesima Oitava) Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15      Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/09/16 a 30/09/16      Acumulado: 05/08/13 a 30/09/16

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SINFRA**

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base

Prazo de Execução  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI  
Vr. Acum. Medido PI  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Prox. mês PI

1184 dias  
14.625.713,89  
8.897.168,20

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00		812,00	171,10	138.933,20	29,97	
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00		812,00	171,10	138.933,20	29,97	
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	11.664,00		8.662,00	11,01	95.368,62	74,26	
1.4	Reconfecção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00		23.304,00	37,23	867.607,92	99,90	
1.4	Impressação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00		116.458,20	0,29	33.772,87	99,84	
1.5	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	112.149,43		49.147,24	0,21	10.320,92	43,82	
1.6	Pré-Misturado a Frio - PMF	m2	375.960,00	38.700,000	135.820,00	3,91	682.373,20	46,42	
1.7	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	129.846,240	567.457,12	0,37	258.002,24	44,76	
1.8	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24		215.672,15	0,37	79.798,69	37,62	
1.9	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39		12.249,66	0,37	4.532,37	29,26	
1.10	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.751.898,00		1.521.542,94	0,37	562.970,88	86,85	
1.11	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00		112.192,59	0,61	68.437,48	35,77	
1.12	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00		16.240,00	0,61	9.906,40	20,14	
1.13	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	256.608,00		189.431,20	0,61	115.553,03	73,82	
1.14	<b>Sub-total</b>						<b>3.142.157,57</b>	<b>966,00</b>	
<b>2.0</b>	<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>								
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ impressação	t	140,00		139,63	2.341,97	327.006,92	99,74	
2.2	Transporte de CM-30 p/ impressação (DMT=300,10km)	t	140,00		139,63	279,33	39.002,56	99,74	
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	948,50		473,75	1.237,55	586.294,75	49,95	
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	948,50		473,75	279,33	132.333,81	49,95	
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	56,02		40,45	1.257,33	50.855,22	72,20	
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	56,02		40,45	279,33	11.298,06	72,20	
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	116,100	407,46	1.750,22	916.345,18	46,42	
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	116,100	407,46	279,33	146.246,01	46,42	
	<b>Sub-total</b>						<b>2.209.382,51</b>	<b>484,66</b>	
<b>3.0</b>	<b>CONSERVAÇÃO</b>								
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00		579,17	19,46	11.270,64	95,73	
<b>Comissão de Fiscalização</b>									

Eng.º Alair Alveiga Zeferrino de Paula  
Fiscal PQTaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Referência: 28ª (Vigesima Oitava) Medição provisória  
 Ordem de início de serviço: 05/05/15  
 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
 Período medição: 01/09/16 a 30/09/16  
 Acumulado: 05/08/13 a 30/09/16

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SINFRA**

Nº Contrato  
 Data Assinatura  
 Publicação  
 Processo Orig.  
 Data Base

Prazo de Execução  
 Prazo Restante  
 Vr. Contratual PI  
 Vr. Acum. Medido PI  
 Vr. Acum. Programado PI  
 Vr. Programado Prox. mês PI

1184 dias  
 14.625.713,89  
 8.897.166,20

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADA			
3.2	Roadada pesada	há	92,00		91,95	3.258,99	299.670,64	99,95	
3.3	Capina	m2	129.000,00		125.860,00	0,64	80.550,40	97,57	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	850,00		848,60	189,08	160.453,28	99,84	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	1.825,00		1.824,36		947.408,91	99,96	
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km) Sub-total	tkm	115.775,52		112.817,68	0,63	71.075,13	97,45	
4.0	<b>DRENAGEM</b>						<b>1.570.429,00</b>	<b>125,75</b>	
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00			42,08			
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00			41,08			
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00			40,42			
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00			61,69			
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00			74,87			
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00			504,76			
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00			672,32			
4.8	Boca BSTC D=0,80m normal	unid	1,00			1.877,32			
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m Sub-total	unid	1,00			4.292,59			
5.0	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>								
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00		5.909,01	15,07	89.048,72	15,42	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00			15,07			
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00			22,91			
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT Placa circular	m2	55,00			369,88			
<b>Comissão de Fiscalização</b>									

Eng.º Aloisio Veloso Zefirino de Paula  
 Fiscal/Porç. nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 28f (Vigesima Oitava) Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/09/16 a 30/09/16  
Acumulado: 05/08/13 a 30/09/16

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base  
Prazo de Execução  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI  
Vr. Acum. Medido PI  
Vr. Programado Prox. mês PI

1184 dias  
14.625.713,89  
8.897.168,20

Firmat: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
5.5	Placa quadrada	m2	50,00			369,88			
5.6	Placa retangular	m2	59,00			369,88			
5.7	Placa octogonal	m2	6,00			369,88			
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00			369,88			
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com cataóptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unit	1.600,00			41,49			
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com cataóptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unit	13.728,00		1.213,00	14,38	17.442,94	8,84	
5.11	Setas e dizeres	m2	49,00			22,91			
5.12	Escudo	m2	1,40			378,16			
5.13	Defensa metálica	m	640,00			224,62	106.491,66	9,87	
	<b>Sub-total</b>								
	Mobilização e desmobilização	unit	6,00		5,00	107.455,63	537.278,12	83,33	
	Instalação de canteiro	mês	1,00		1,00	322.366,87	322.366,87	100,00	
	Administração local	mês	12,00		12,00	53.727,81	644.733,75	100,00	
	<b>Sub-total</b>						1.504.378,74		
	<b>SERVICO ADITADO</b>								
	<b>TAPA BURACO</b>								
	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco	tkm	127.875,852		127.831,01	0,37	47.297,47	99,96	
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	m³	5.400,000		4.434,34	71,49	317.031,25	82,12	
	<b>Sub-total</b>						364.328,72		
	<b>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO</b>						8.897.168,20		
	<b>A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR</b>						8.462.177,34		
	<b>VALOR LIQUIDO</b>						434.990,86		

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 434.990,86 (Quatrocentos trinta e quatro mil, novecentos e noventa reais, oitenta e seis centavos)

Local/Data: Cuiabá/MT, 04 de Outubro de 2016

Comissão de Fiscalização

Eng.º Algor. Alveios Zelenko de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 1.2013-4407-7





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT



CONTRÓLE FINANCEIRO

CONTRATO I. C. Nº SETPU	RODOVIA MT-175/MT-248 Nº DO PROCESSO	FIRMA: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL
			11.707.378,84		2.918.335,05		
			SERVIÇO Restauração		FISCAL		
DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO	FRACZO DIAZ CORRIDOS	PERÍODO	ACUMULADO	MEDIÇÕES REALIUST.	TOTAL	TOTAL GERAL
1ª Medição	05/08/13 a 31/08/13	27	1157	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30
2ª Medição	01/09/13 a 30/09/13	30	1127	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00	13.571.207,89
3ª Medição	01/10/13 a 31/10/13	31	1096	403.025,82	1.457.531,82	403.025,82	13.168.182,07
4ª Medição	01/11/13 a 30/11/13	30	1066	406.242,96	1.863.774,78	21.638,25	1.479.170,07
5ª Medição	01/12/13 a 31/12/13	31	1035	227.216,11	2.090.990,89	44.900,68	1.885.413,03
6ª Medição	01/01/14 a 31/01/14	31	1004	205.135,78	2.296.126,67	58.407,00	1.908.675,46
7ª Medição	01/02/14 a 28/02/14	28	976	167.992,08	2.464.118,75	70.707,19	2.366.533,67
8ª Medição	01/03/14 a 31/03/14	31	945	200.901,16	2.665.019,91	80.829,06	2.544.947,81
9ª Medição	01/04/14 a 30/04/14	30	915	298.625,42	2.963.645,33	92.662,83	2.745.848,97
10ª Medição	01/05/14 a 31/05/14	31	884	53.727,81	3.017.373,14	109.720,88	11.662.068,56
11ª Medição	01/06/14 a 31/06/14	154	730	499.161,37	3.516.534,51	113.750,46	3.131.123,60
12ª Medição	05/05/15 a 31/05/15	207	523	169.149,68	3.685.684,19	140.674,37	4.029,58
13ª Medição	01/06/15 a 30/06/15	30	493	847.098,30	4.532.782,49	158.085,01	4.991.61,37
14ª Medição	01/07/15 a 31/07/15	31	462	358.138,91	4.890.921,40	238.320,23	5.129.241,63
15ª Medição	01/08/15 a 31/08/15	31	431	321.430,58	5.212.351,98	274.930,74	5.165.852,14
16ª Medição	01/09/15 a 30/09/15	30	401	36.037,36	5.248.389,34	303.702,39	5.152.369,31
17ª Medição	01/10/15 a 31/10/15	30	371	594.163,74	5.842.573,08	445.760,11	6.152.369,31
18ª Medição	01/11/15 a 30/11/15	30	341	1.204.611,11	7.047.184,19	674.941,09	7.722.125,28
19ª Medição	01/12/15 a 31/12/15	31	874	640.313,93	7.687.498,12	762.966,54	8.362.439,21
20ª Medição	01/01/16 a 31/01/16	31	843	7.687.498,12	14.374.986,24	88.025,45	8.450.464,66
21ª Medição	01/02/16 a 29/02/16	29	814	7.687.498,12	22.062.484,36	762.966,54	8.450.464,66
22ª Medição	01/03/16 a 31/03/16	31	783	7.687.498,12	29.749.982,48	762.966,54	8.450.464,66
23ª Medição	01/04/16 a 30/04/16	30	753	7.687.498,12	37.437.480,60	762.966,54	8.450.464,66
24ª Medição	01/05/16 a 31/05/16	31	722	106.356,76	38.503.837,36	778.473,64	8.450.464,66
25ª Medição	01/06/16 a 30/06/16	30	128	7.793.856,88	46.297.694,24	1.017.566,95	8.450.464,66
26ª Medição	01/07/16 a 31/07/16	31	97	7.793.856,88	54.091.551,12	778.473,64	8.450.464,66
27ª Medição	01/08/16 a 31/08/16	31	66	668.320,46	60.760.171,58	778.473,64	8.450.464,66
28ª Medição	01/09/16 a 30/09/16	30	36	434.990,86	65.195.162,44	919.933,84	8.450.464,66
29ª Medição	01/10/16 a 30/10/16	30	36	8.897.168,20	74.092.330,64	1.017.566,95	8.450.464,66
30ª Medição	01/11/16 a 30/11/16	30	36	8.897.168,20	82.989.500,84	1.017.566,95	8.450.464,66
31ª Medição	01/12/16 a 31/12/16	31	36	8.897.168,20	91.886.669,04	1.017.566,95	8.450.464,66
32ª Medição	02/01/17 a 31/01/17	31	36	8.897.168,20	100.783.837,24	1.017.566,95	8.450.464,66
33ª Medição	02/02/17 a 28/02/17	28	36	8.897.168,20	109.681.005,44	1.017.566,95	8.450.464,66
34ª Medição	02/03/17 a 31/03/17	31	36	8.897.168,20	118.578.173,64	1.017.566,95	8.450.464,66
35ª Medição	02/04/17 a 30/04/17	30	36	8.897.168,20	127.475.341,84	1.017.566,95	8.450.464,66
36ª Medição	02/05/17 a 31/05/17	31	36	8.897.168,20	136.372.510,04	1.017.566,95	8.450.464,66
37ª Medição	02/06/17 a 30/06/17	30	36	8.897.168,20	145.269.678,24	1.017.566,95	8.450.464,66
38ª Medição	02/07/17 a 31/07/17	31	36	8.897.168,20	154.166.846,44	1.017.566,95	8.450.464,66
39ª Medição	02/08/17 a 31/08/17	31	36	8.897.168,20	163.064.014,64	1.017.566,95	8.450.464,66
40ª Medição	02/09/17 a 30/09/17	30	36	8.897.168,20	171.961.182,84	1.017.566,95	8.450.464,66
41ª Medição	02/10/17 a 30/10/17	30	36	8.897.168,20	180.858.351,04	1.017.566,95	8.450.464,66
42ª Medição	02/11/17 a 30/11/17	30	36	8.897.168,20	189.755.519,24	1.017.566,95	8.450.464,66
43ª Medição	02/12/17 a 31/12/17	31	36	8.897.168,20	198.652.687,44	1.017.566,95	8.450.464,66
44ª Medição	03/01/18 a 31/01/18	31	36	8.897.168,20	207.549.855,64	1.017.566,95	8.450.464,66
45ª Medição	03/02/18 a 28/02/18	28	36	8.897.168,20	216.447.023,84	1.017.566,95	8.450.464,66
46ª Medição	03/03/18 a 31/03/18	31	36	8.897.168,20	225.344.192,04	1.017.566,95	8.450.464,66
47ª Medição	03/04/18 a 30/04/18	30	36	8.897.168,20	234.241.360,24	1.017.566,95	8.450.464,66
48ª Medição	03/05/18 a 31/05/18	31	36	8.897.168,20	243.138.528,44	1.017.566,95	8.450.464,66
49ª Medição	03/06/18 a 30/06/18	30	36	8.897.168,20	252.035.696,64	1.017.566,95	8.450.464,66
50ª Medição	03/07/18 a 31/07/18	31	36	8.897.168,20	260.932.864,84	1.017.566,95	8.450.464,66
51ª Medição	03/08/18 a 31/08/18	31	36	8.897.168,20	269.830.033,04	1.017.566,95	8.450.464,66
52ª Medição	03/09/18 a 30/09/18	30	36	8.897.168,20	278.727.201,24	1.017.566,95	8.450.464,66
53ª Medição	03/10/18 a 30/10/18	30	36	8.897.168,20	287.624.369,44	1.017.566,95	8.450.464,66
54ª Medição	03/11/18 a 30/11/18	30	36	8.897.168,20	296.521.537,64	1.017.566,95	8.450.464,66
55ª Medição	03/12/18 a 31/12/18	31	36	8.897.168,20	305.418.705,84	1.017.566,95	8.450.464,66
56ª Medição	04/01/19 a 31/01/19	31	36	8.897.168,20	314.315.874,04	1.017.566,95	8.450.464,66
57ª Medição	04/02/19 a 28/02/19	28	36	8.897.168,20	323.213.042,24	1.017.566,95	8.450.464,66
58ª Medição	04/03/19 a 31/03/19	31	36	8.897.168,20	332.110.210,44	1.017.566,95	8.450.464,66
59ª Medição	04/04/19 a 30/04/19	30	36	8.897.168,20	341.007.378,64	1.017.566,95	8.450.464,66
60ª Medição	04/05/19 a 31/05/19	31	36	8.897.168,20	349.904.546,84	1.017.566,95	8.450.464,66
61ª Medição	04/06/19 a 30/06/19	30	36	8.897.168,20	358.801.715,04	1.017.566,95	8.450.464,66
62ª Medição	04/07/19 a 31/07/19	31	36	8.897.168,20	367.698.883,24	1.017.566,95	8.450.464,66
63ª Medição	04/08/19 a 31/08/19	31	36	8.897.168,20	376.596.051,44	1.017.566,95	8.450.464,66
64ª Medição	04/09/19 a 30/09/19	30	36	8.897.168,20	385.493.219,64	1.017.566,95	8.450.464,66
65ª Medição	04/10/19 a 30/10/19	30	36	8.897.168,20	394.390.387,84	1.017.566,95	8.450.464,66
66ª Medição	04/11/19 a 30/11/19	30	36	8.897.168,20	403.287.556,04	1.017.566,95	8.450.464,66
67ª Medição	04/12/19 a 31/12/19	31	36	8.897.168,20	412.184.724,24	1.017.566,95	8.450.464,66
68ª Medição	05/01/20 a 31/01/20	31	36	8.897.168,20	421.081.892,44	1.017.566,95	8.450.464,66
69ª Medição	05/02/20 a 28/02/20	28	36	8.897.168,20	429.979.060,64	1.017.566,95	8.450.464,66
70ª Medição	05/03/20 a 31/03/20	31	36	8.897.168,20	438.876.228,84	1.017.566,95	8.450.464,66
71ª Medição	05/04/20 a 30/04/20	30	36	8.897.168,20	447.773.397,04	1.017.566,95	8.450.464,66
72ª Medição	05/05/20 a 31/05/20	31	36	8.897.168,20	456.670.565,24	1.017.566,95	8.450.464,66
73ª Medição	05/06/20 a 30/06/20	30	36	8.897.168,20	465.567.733,44	1.017.566,95	8.450.464,66
74ª Medição	05/07/20 a 31/07/20	31	36	8.897.168,20	474.464.901,64	1.017.566,95	8.450.464,66
75ª Medição	05/08/20 a 31/08/20	31	36	8.897.168,20	483.362.069,84	1.017.566,95	8.450.464,66
76ª Medição	05/09/20 a 30/09/20	30	36	8.897.168,20	492.259.238,04	1.017.566,95	8.450.464,66
77ª Medição	05/10/20 a 30/10/20	30	36	8.897.168,20	501.156.406,24	1.017.566,95	8.450.464,66
78ª Medição	05/11/20 a 30/11/20	30	36	8.897.168,20	510.053.574,44	1.017.566,95	8.450.464,66
79ª Medição	05/12/20 a 31/12/20	31	36	8.897.168,20	518.950.742,64	1.017.566,95	8.450.464,66
80ª Medição	06/01/21 a 31/01/21	31	36	8.897.168,20	527.847.910,84	1.017.566,95	8.450.464,66
81ª Medição	06/02/21 a 28/02/21	28	36	8.897.168,20	536.745.079,04	1.017.566,95	8.450.464,66
82ª Medição	06/03/21 a 31/03/21	31	36	8.897.168,20	545.642.247,24	1.017.566,95	8.450.464,66
83ª Medição	06/04/21 a 30/04/21	30	36	8.897.168,20	554.539.415,44	1.017.566,95	8.450.464,66
84ª Medição	06/05/21 a 31/05/21	31	36	8.897.168,20	563.436.583,64	1.017.566,95	8.450.464,66
85ª Medição	06/06/21 a 30/06/21	30	36	8.897.168,20	572.333.751,84	1.017.566,95	8.450.464,66
86ª Medição	06/07/21 a 31/07/21	31	36	8.897.168,20	581.230.920,04	1.017.566,95	8.450.464,66
87ª Medição	06/08/21 a 31/08/21	31	36	8.897.168,20	590.128.088,24	1.017.566,95	8.450.464,66
88ª Medição	06/09/21 a 30/09/21	30	36	8.897.168,20	599.025.256,44	1.017.566,95	8.450.464,66
89ª Medição	06/10/21 a 30/10/21	30	36	8.897.168,20	607.922.424,64	1.017.566,95	8.450.464,66
90ª Medição	06/11/21 a 30/11/21	30	36	8.897.168,20	616.819.592,84	1.017.566,95	8.450.464,66
91ª Medição	06/12/21 a 31/12/21	31	36	8.897.168,20	625.716.761,04	1.017.566,95	8.450.464,66

**SINERA** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
**MATO GROSSO** ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

DIAGRAMA LINEAR DE AVANÇO DOS SERVIÇOS

Extensão: 62,37 km  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Referência: 1ª Medição provisória Revisora  
 Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013  
 Ordem de Paralisação: 30/05/2014  
 Referência: 1ª Medição provisória Revisora

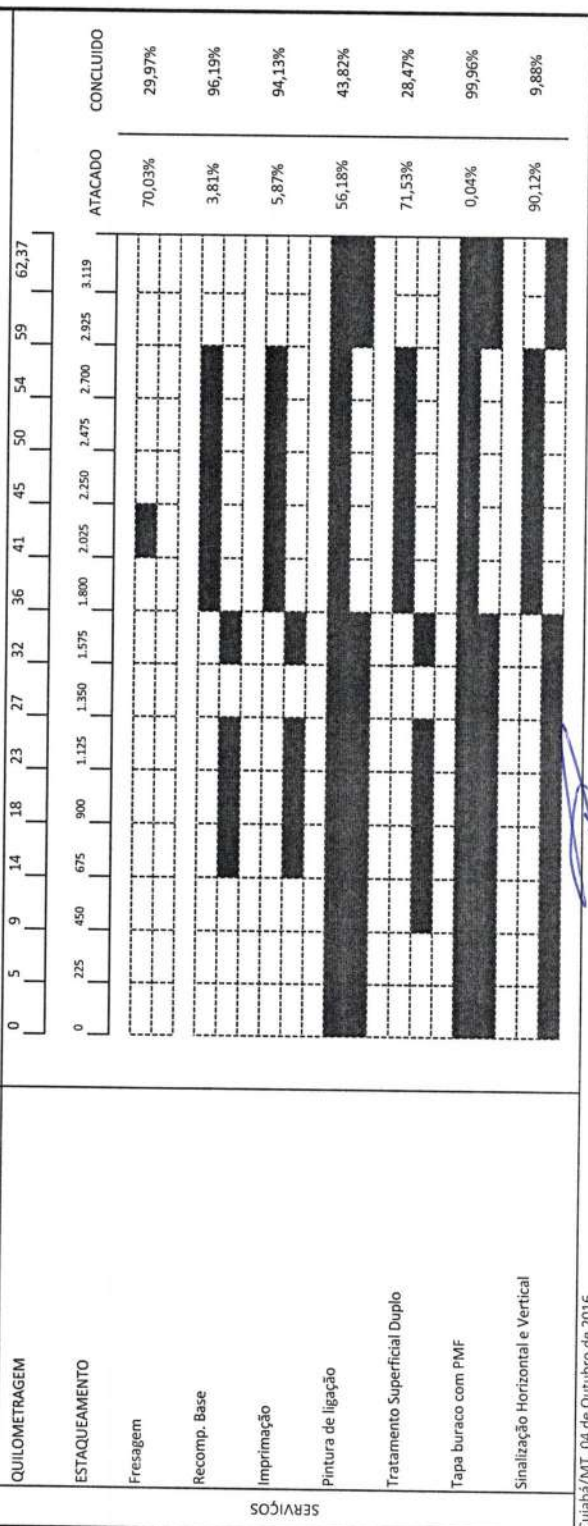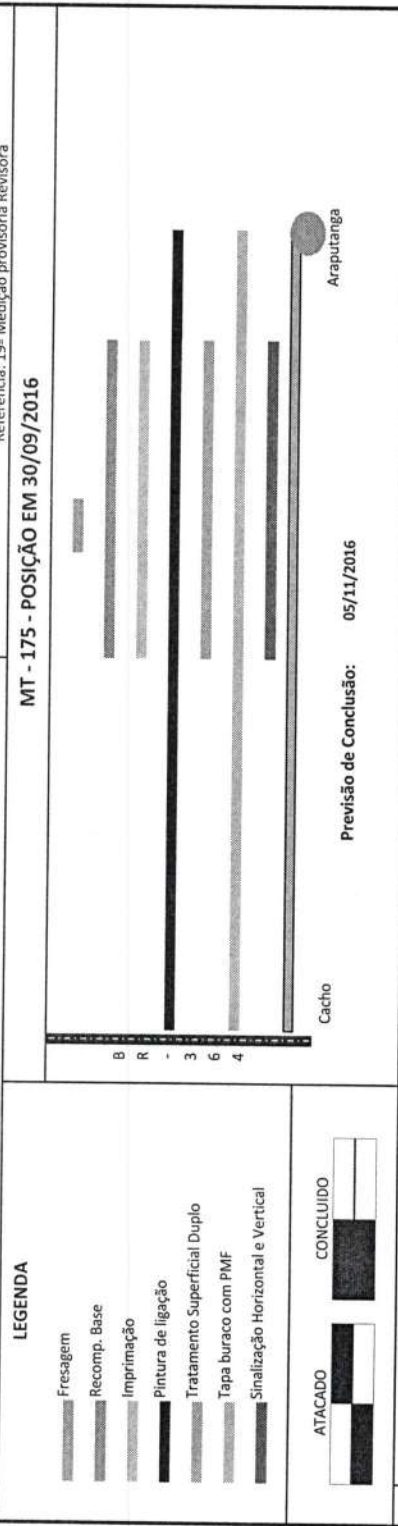


Cuiabá/MT, 04 de Outubro de 2016

Eng.º Alvaro Veloso Zetserino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 045/2016 CREA 830-D/MT  
 CRM Nº 120134407-7



CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

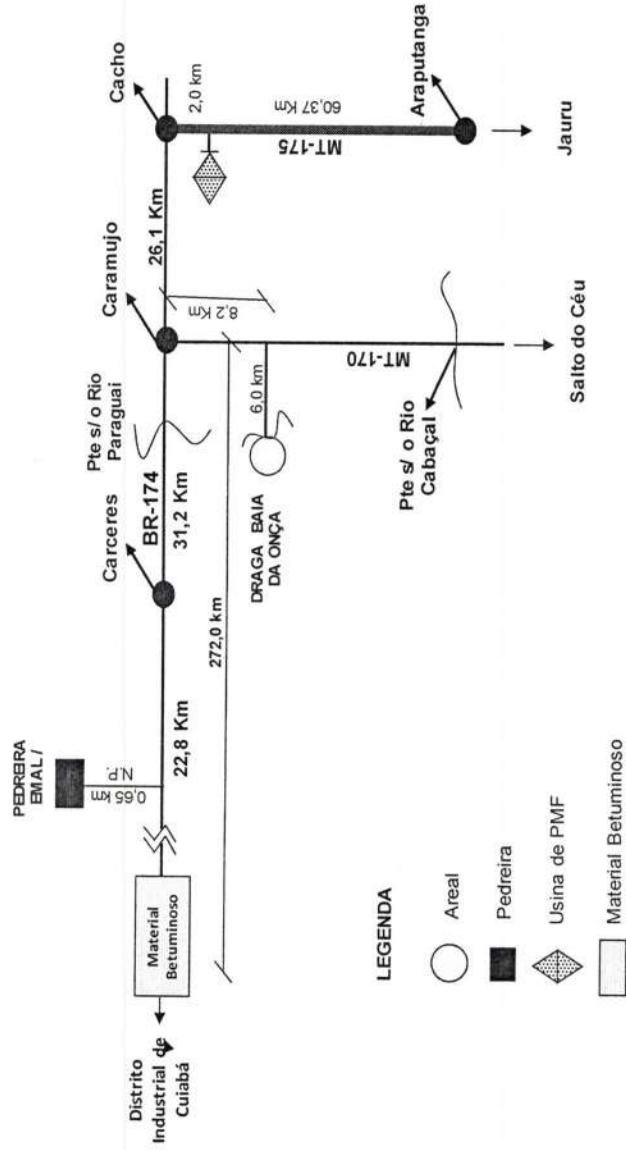

	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO	
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU	
	Rodovia: MT-175	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
		Ext.: 62,37 Km Lote : 1

OBSERVAÇÕES:

*[Handwritten signature]*

Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra::		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$:		14.625.713,89	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinatura		01/08/2013		Prazo:		1.184 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação		02/04/2009		O. I. Serviço:		05/08/2013	
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		Firma:		Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/09/13 a 31/08/2013		01/10/13 a 31/10/2013		01/11/13 a 30/11/2013		01/12/13 a 31/12/2013			
TERMINO: 05/11/2016		27 / 27		30 / 57		31 / 88		30 / 118		31 / 149	
DIAS CORRIDOS		PS		VALOR R\$		PS		VALOR R\$		PS	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1.8487%		270.391,12		1.2435%		181.868,74		0,6839%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,2151%		31.455,60		1,1547%		133.564,56		0,5023%	
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,4726%		215.381,17		0,0414%		37.081,84			
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		3,3062%		483.550,30		0,3674%		53.727,81		0,3674%	
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)		3,31%				2,76%				1,55%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		3,31%				9,97%		12,74%		14,30%	
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		570.955,70		403.025,82		406.242,96		227.216,11	
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.054.506,00		1.457.531,82		1.863.774,78		2.090.990,89	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P6S - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra::		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$:		14.625.713,89	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinatura		01/08/2013		Prazo:		1.184 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação		02/04/2009		Firma:		Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		01/05/14 a 31/05/2014			
INICIO: 05/08/2013		01/01/14 a 31/01/2014		01/02/14 a 28/02/2014		01/03/14 a 31/03/2014		01/04/14 a 30/04/2014		01/05/14 a 31/05/2014	
TERMINO: 05/11/2016		31 / 180		28 / 208		31 / 239		30 / 269		31 / 300	
DIAS CORRIDOS		PS		VALOR R\$		PS		VALOR R\$		PS	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,5969%		87.296,99		0,2994%		66.543,17		0,7507%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,4383%		64.110,98		0,3593%		80.630,17		0,9237%	
3.0 - CONSERVAÇÃO											
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		0,3674%		53.727,81		0,3674%		53.727,82		0,3674%	
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)		1,40%				1,37%				0,37%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		15,70%		16,85%		18,22%		20,26%		20,63%	
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		167.992,08		200.901,16		298.625,42		53.727,81	
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75		2.645.019,91		2.963.645,33		3.017.373,14	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P6S - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

Nsato Chani  
 RN 1704394554  
 Eng.º Alago-Almeidas Zeferino de Paula  
 Fiscaº Portaria Nº 019/2016 GREA 830-D/MT  
 RN Nº 120134407-7

Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda  
 Eng.º Alago-Almeidas Zeferino de Paula  
 Fiscaº Portaria Nº 019/2016 GREA 830-D/MT  
 RN Nº 120134407-7

SUEFI  
 Fis. 12  
 Ass. A

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 ( CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 ( CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/10/14 a 31/09/2014		05/05/15 a 31/05/2015	
TÉRMINO: 05/11/2016		DIAS CORRIDOS 122 / 422		31 / 453	
		185 / 638		27 / 665	
		30 / 695			
SERVIÇO		VALOR R\$		PS	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		150.404,73		0,5217%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		187.573,20		0,2614%	
3.0 - CONSERVAÇÃO				0,0061%	
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		161.183,44		0,3674%	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)				1,16%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)				25,20%	
FATURAMENTO SIMPLES		499.161,37			
FATURAMENTO ACUMULADO		3.516.534,51		169.149,68	
				3.685.684,19	
				847.098,30	
				4.532.782,49	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P6S - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 ( CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 ( CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/09/15 a 31/08/2015		01/10/15 a 31/10/2015	
TÉRMINO: 05/11/2016		DIAS CORRIDOS 31 / 726		30 / 787	
		31 / 757		31 / 818	
		25 / 843			
SERVIÇO		VALOR R\$		PS	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		225.501,82		2,0004%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		95.928,76		2,0456%	
3.0 - CONSERVAÇÃO				0,0166%	
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		36.037,36		0,2464%	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)				0,25%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)				35,88%	
FATURAMENTO SIMPLES		321.430,58		36.037,36	
FATURAMENTO ACUMULADO		5.212.351,98		5.248.389,34	
				594.183,74	
				7.047.184,19	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P6S - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

Nome: Nabor Otton  
 RN 1704394554  
 Eng. Alcor Alveiro Zeferrino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RNE - 120134407-7

Ass: [Assinatura]  
 Fis: [Assinatura]

SUEFI

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinaturc 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 ( CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 ( CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plane Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/12/15 a 31/12/2015		01/03/16 a 31/03/2016	
TÉRMINO: 05/11/2016		DIAS CORRIDOS		01/04/16 a 30/04/2016	
SERVIÇO		31 /	874	31 /	965
		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO			-1.1562%		
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS			-169.107,27		
3.0 - CONSERVAÇÃO			-0,0832%		
4.0 - DRENAGEM			-12.169,67		
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			5,2501%		
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES			767.863,06		
7.0 - TAPA BURACO			0,3674%		
8.0 - PAVIMENTAÇÃO			53.727,81		
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)			4,36%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)			52,56%		
FATURAMENTO SIMPLES			640.313,93		
FATURAMENTO ACUMULADO			7.687.498,12		7.687.498,12
NOTAS					

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do P65

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinaturc 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 ( CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 ( CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plane Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/05/16 a 31/05/2016		01/08/16 a 31/08/2016	
TÉRMINO: 05/11/2016		DIAS CORRIDOS		01/09/16 a 30/09/2016	
SERVIÇO		31 /	1.026	31 /	1.118
		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO					
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS					
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,7272%		
4.0 - DRENAGEM			106.358,76		
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tc					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)			0,73%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)			53,29%		
FATURAMENTO SIMPLES			106.358,76		
FATURAMENTO ACUMULADO			7.793.856,88		7.793.856,88
NOTAS					

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do P65

Eng. Alair Alves Zeferrino de Paula  
 Fiscal Contábil Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Nome: Nairto Chari  
 RN 1704394964  
 Geosolo Eng Plane Cons Ltda  
 RN nº 120134407-7

VALOR R\$ 434.990,86  
 8.897.168,20

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA N° Contrato IC N° 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89  
 Rodovia: MT - 175 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.184 dias  
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação: 02/04/2009  
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Firma: Geosolo Eng.Plane. Cons. Ltda  
 INICIO: 05/08/2013  
 TERMINO: 05/11/2016

SERVIÇO	01/10/16 a 31/10/16		01/11/16 a 05/11/16		VALOR R\$	VALOR R\$
	PS	PS	PS	PS		
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	10,5897%	1.548.815,70	4,4687%	653.575,30	653.575,30	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	7,6165%	1.113.962,56	3,0768%	450.000,00	450.000,00	
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0351%	5.128,70				
4.0 - DRENAGEM	0,8712%	127.419,01	0,3077%	45.000,00	45.000,00	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,9340%	721.630,95	1,7093%	250.000,00	250.000,00	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES			0,7347%	107.455,63	107.455,63	
7.0 - TAPA BURACO	0,3609%	52.789,06				
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	2,7867%	407.576,13				
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tr	1,5641%	228.756,99	0,7522%	110.016,59	110.016,59	
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base	-0,6398%	-93.580,93				
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	28,12%		11,05%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	88,95%		100,00%			
FATURAMENTO SIMPLES		4.112.498,17			1.616.047,52	
FATURAMENTO ACUMULADO		13.009.666,37			14.625.713,89	

NOTAS  
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P6S - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

Eng. Afloor Alveles Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria N° 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN n° 120134407-7

SUEFI  
 Fls. 15  
 Ass. K



### RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO


CONTRATO:	IC nº 222/2013/00-SETPU
RODOVIA:	MT-175/MT-248
TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB-TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EMPRESA:	GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO:	Período: 01/09/16 a 30/09/16

MEDIÇÃO: Referência: 28ª (Vigesima Oitava) Medição provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MANHÃ	B	C	B	B	B	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	B	C	B	B	B	B
TARDE	B	C	B	B	B	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	B	C	B	B	B
NOITE	B	C	B	B	B	B	C	B	C	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	B	C	B	B	B
MM																														

CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"

Eng.º   
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

Local/Data: Cuiabá/MT, 04 de Outubro de 2016

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**


<b>Rodovia:</b>	Rodovia: MT-175/MT-248	<b>Contratada:</b>	GEOSOLO Eng. Plan. Consultoria Ltda.
<b>Trechos:</b>	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	<b>Contrato N.º</b>	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
<b>Sub-trecho:</b>	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	<b>Extensão:</b>	Extensão: 62,37 km <b>Lote:</b>



Coordenada:	Localização:	Serviço:
14º44'55"S	MT-175	IMPRIMAÇÃO
58º06'27"O		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
14º44'55"S	MT-175	TSD
58º06'27"O		

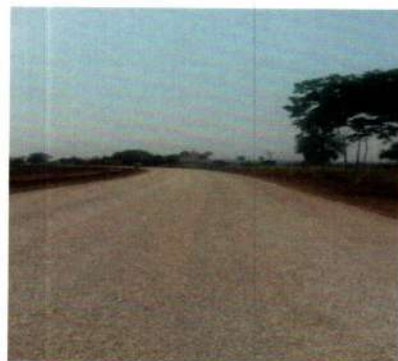

Coordenada:	Localização:	Serviço:
14º44'55"S	MT-175	TSD
58º06'27"O		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
14º44'55"S	MT-175	TSD
58º06'27"O		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
14º44'51"S	MT-175	TSD
58º06'24"O		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
14º44'51"S	MT-175	TSD
58º06'24"O		

Local/Data: Cuiabá/MT, 04 de Outubro de 2016

Eng.º Alair Alves Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:		CONTRATO Nº.
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Rodovia: MT-175/MT-248	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA  
 Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD  
 Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.  
 Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Execução de TSD no trecho entre o Cacho e Mirassol d'Oeste  
 Pavimento do trecho em bom estado de trafegabilidade e segurança.  
 Execução de TSD no trecho entre o Cacho e Mirassol d'Oeste  
 Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.

Local/Data:

Cuiabá/MT, 04 de Outubro de 2016

Naoto Otari  
 RN 1704394554

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7



## Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.  
Julio Mangini Fernandes Neto  
M.D. Superintendente de Controle e Execução de Obras. (SUCEO)  
CUIABÁ/MT

Assunto: 28ª (Vigésima Oitava) Medição. Medição Provisória.  
Ref. I.C. Nº 222/2.013.

Firma: Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.

Através do presente, encaminho a V.S.ª a 28ª (Vigésima Oitava) Medição (Medição Provisória) após análise Técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 04 a 18.

Em 28 de Outubro de 2016.

Engº Diogo Menezes Souza  
Superintendente de Execução e Fiscalização.  
SUEF I/SINFRA-MT



## Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.  
Eng.º Marcos Catalano Correa  
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB  
CUIABÁ/MT


Assunto: 28º (Vigésima Oitava) Medição Provisória  
Ref. I.C. Nº 222/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a 28º (Vigésima Oitava) Medição Provisória, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

28º (Vigésima Oitava) Medição Provisória.....R\$ 434.990,86

CONFORMIDADE  
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 18.

Em 16 de Novembro de 2016.

  
Engº Julio Mangini Fernandes Neto  
Superintendente  
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 21
Ass.: J

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 01.898.295/0001-28  
Certidão nº: 101655296/2016  
Expedição: 04/10/2016, às 17:58:24  
Validade: 01/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região \*\*  
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região \*  
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região \*  
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região \*  
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região \*  
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região \*  
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região \*  
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região \*  
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região \*  
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região \*

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 10.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Setor: SCEO/SINFF
de 2
Fl. N.º <b>R</b>
Ass.: <b>J</b>

Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

**Secretaria de Estado  
de Fazenda**Governador do Estado  
de Mato Grosso

Setor: SCEO/SINFRA

Fl. Nº: 23

Ass.: J

Data: 08/11/2016 - 09:09:55

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:  
0018024898****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **08/11/2016**Hora de emissão: **09:09:55**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

**OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Certidão válida até: **07/12/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **22K27TU2K79KU2B7**

Página **1** de **2**

Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Secretaria de Estado  
de Fazenda



Governo do Estado  
de Mato Grosso

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. N°: 24
Ass: J

Data: 08/11/2016 - 09:09:55

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:  
0018024898**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **08/11/2016**Hora de Emissão: **09:09:55**

PARCELAMENTOS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS  
**13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso  
no Sistema de Conta Corrente Fiscal**  
**13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com  
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)Certidão valida até **07/12/2016**.Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,  
mediante requerimento do interessadoCódigo de Autenticidade : **22K27TU2K79KU2B7**

Página 2 de 2

Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 01.898.295/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 14:41:00 do dia 09/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2016.

Código de controle da certidão: **EE3E.C318.19A2.B866**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Observações PGFN:**

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.



Setor: SCEO/SINFRA  
Fl. Nº. 26 J  
(65) 3642-1341  
III, SEFAZ-MT  
MATO GROSSO

**MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

**NOME**

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

**LOCALIZAÇÃO**

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10  
BAIRRO: BOA ESPERANÇA  
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT  
CEP: 78.068-720

**CNPJ**

01.898.295/0001-28

**SÓCIOS**

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 22/09/2016

Responsável pela Expedição

**Divino Jardim**

Assessor Técnico III - Mat. 103307

Procurador(a) do Estado

**OBSERVAÇÕES**

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: D0D5I4DXH1BS9FX32AOEDLB24ZB8BN

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



Prefeitura Municipal de Cuiabá  
PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 27
Ass.: J

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO 211147/2016	243815	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 262339	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250		



NOME  
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ  
01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO  
Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO  
BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de setembro de 2016

Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 2016.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



# Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

ESTADO DE MATO GROSSO

Sector: BCEO/SINFRA
Fl. Nº. 28
Ass.: J

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 1826/2016

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de MIRASSOL D OESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

*Inscrição:* 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

*Contribuinte:* GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

*Endereço:* R: GOVERNADOR JARI GOMES 10  
BOA ESPERANÇA

Ficam, todavia, ressaltados os direitos do Município de MIRASSOL D OESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

MIRASSOL D OESTE (MT), 27 de outubro de 2016.

**SUBSTITUÍDO**

**Certidão válida até 27/11/2016.**

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço [www.mirassoldoeste.mt.gov.br](http://www.mirassoldoeste.mt.gov.br).  
Certidão emitida em 27/10/2016 às 09:03:12h. - Código de Validação W2J3S9.D8Y4B2.M1H0A7

RUA. ANTONIO TAVARES, nº 3310 - MIRASSOL D OESTE - MT - CEP 78280-000 - Fone: (65) 32411914  
CNPJ 03.755.477/0001-75 - e-mail: [iss@mirassoldoeste.mt.gov.br](mailto:iss@mirassoldoeste.mt.gov.br)



# Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

RUA ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO

Sector: SCEO/SINFRA

Fl. Nº. 29

## Guia de Arrecadação - 11771/2016

Contribuinte / Endereço de Correspondência <b>GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA</b>					Localização <b>CONTRIBUINTE / 01898295000128</b> R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 -				
R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANÇA - CEP:78068-480 - CUIABA/MT									

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2016	136	0	1	51	ISSQN	12/12/2016	10.693,13				10.693,13	ISSQN	10.693,13

Autenticação Mecânica

Observação: ISS REFERENTE A NFPS N. 704 - SERVIÇOS PRESTADOS A MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO. -

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(*) Multa	(*) Correção	(*) Juros	Valor Cobrado
2016	00067	12/12/2016	/-	9164000011771 846	10.693,13		0,00	0,00	0,00	10.693,13

destaque aqui



**399-9**

39994.19827 63916.400003 11771.347629 1 70060001069313

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**

Vencimento

**12/12/2016**

Beneficiário

**Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - CNPJ: 03.755.477/0001-75**

Agência/Código Beneficiário

4198263-

Data do Documento

18/11/2016

Número do Documento

01898295000128

Especie Documento

Aceite

Não

Data do Processamento

18/11/2016

Nosso Número

9164000011771846

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

CNR

Especie de Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

10.693,13

Instruções

2 (-) Desconto

3 (\*) Multa

4 (\*) Juros

5 (\*) Correção

6 (=) Valor Cobrado

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

CONTRIBUINTE / 01898295000128 - Guia nº: 11771/2016

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA -**

R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 78068-480 CUIABA  
BOA ESPERANÇA - CEP:78068-480 - CUIABA/MT

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



Cuiabá, 18 de novembro de 2016

Of. 168/2016

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 30
Ass.: 5

À  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA  
Nesta

Prezados Senhores,

Ref.: Contrato IC-222/2013/00/00  
Restauração da Rodovia MT-175  
Ass.: DECLARAÇÃO

Vimos pelo presente encaminhar a guia de recolhimento de ISSQN da Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste referente à Nota Fiscal nº 704 relativa a 27ª. Medição de serviços da obra de Restauração da Rodovia MT-175, objeto do contrato IC-222/2013/00/00-SINFRA, e DECLARAR o compromisso de quitação do tributo em até 05 (cinco) dias após o pagamento da referida Nota por esta Secretaria.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos mui

Cordialmente

GEO SOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.  
CNPJ: 01.898.295/0001-26

*José Mura Júnior*  
CREA Nº. 2601/05043

Setor: SCEO/SINFRA

Fl. N.º 31

5

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>	 <b>NOTA</b> CUIABANA	Série do Documento	Ass.:
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	

**Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda**  
**Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda**

 Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança  
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT  
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação fora do município</b>	<b>18/11/2016 12:25:25</b>	<b>D 9B 9B 0</b>	<b>705</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>			

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

**Descrição dos Serviços**

 Referente a 28ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU  
 Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 434.990,86

VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 59.274,10 *X 11 = INSS*

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 375.716,76

CEI: 51.221.18164/73

 BANCO BRADESCO  
 AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO  
 CONTA CORRENTE: 17.900-0  
 CNPJ: 01.898.295/0001-28

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	702	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 434.990,86	R\$ 0,00	R\$ 375.716,76	R\$ 59.274,10
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 2.963,71	Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 2.827,44	R\$ 13.049,72	R\$ 6.520,15	R\$ 6.524,86	R\$ 4.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal** **R\$ 401.718,79**
**Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

**Os Serviços descritos  
nesta nota fiscal, foram  
executados.**



  
Alair Alves Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria: 019/2016

CREA 830/D - RN: 120134407-7


Setor: SCEO/SINFRA

Fl. Nº. 32

Ass.: 3

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		 <b>NOTA CUIABANA</b>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
<b>Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda</b> Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 -Cuiabá- MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28						
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação <b>Tributação fora do município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>18/11/2016 12:25:25</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>D 9B 9B 0</b>		
Número da RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal <b>705</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>						
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
CNPJ/CPF <b>03.507.415/0022-79</b>		Inscrição Municipal <b>62557</b>		Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado</b>		
Endereço <b>Edgard Prado Arze, Eng</b>		Número Complemento		Bairro <b>Centro Político Administrativo</b>		
CEP <b>78050-970</b>		Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>		Telefone e-mail <b>fransuise.17@hotmail.com</b>		
<b>Descrição dos Serviços</b>						
Referente a 28ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT						
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 434.990,86						
VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 59.274,10						
VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 375.716,76						
CEI: 51.221.18164/73						
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município <b>4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias</b>			Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>702</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>4211101</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 434.990,86</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 375.716,76</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 59.274,10</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 2.963,71</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
		Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>				
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS <b>R\$ 2.827,44</b>	COFINS <b>R\$ 13.049,72</b>	INSS <b>R\$ 6.520,15</b>	IRRF <b>R\$ 6.524,86</b>	CSLL <b>R\$ 4.349,90</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 401.718,79</b>	
<b>Informações Complementares</b>						
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500						

Os Serviços descritos  
nesta nota fiscal, foram  
executados.



Engº Alaor Atvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria: 019/2016  
CREA 830/D - RN: 120134407-7



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 887/16	Data: 17/11/2016									
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO										
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Geosolo	545770/16	222/13	28º Med.	14.625.713,89	8.462.177,34	6.163.536,55	434.990,86	16.001.081-4	44.90.51	131	R\$ 5.728.545,69	
TOTAL PROGRAMADO							434.990,86					

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

AUTORIZO:

  
Engº Marcos Catalano Correa  
Secretario Adjunto de Obras

  
Engº Marciane Pravedello Curvo  
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica



Sector: SCEO/SINFRA  
Fl. Nº: 33  
Ass.: J



WWW.MT.GOV.BR  
Setor: SCEO/SINFRA  
Fl. Nº 34  
Ass.: J

**ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Processo nº: 545770/2016 Contrato nº: 222/13

Vigência: \_\_\_\_\_ Empresa Contratada: Gesolo

Resumo do Objeto: Ref. a 28ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 21 de novembro de 2016.

Assinatura do responsável pelo preenchimento  
SINFRA/MT  
Assessor Técnico III  
Guilherme Pereira Rosa



## TRÂMITE DE PROCESSO



PROTOCOLO Nº	545770
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

Cuiabá, 22 de novembro de 2016.

  
**Marcos Catalano Correa**  
Secretário Adjunto de Obras  
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA





COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO &lt;cgeo@sinfra.mt.gov.br&gt;

**CADASTRO IC 222-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO &lt;cgeo@sinfra.mt.gov.br&gt;

29 de novembro de 2016 11:23

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO &lt;marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br&gt;, JANAINA CRISTINA DA SILVA &lt;janainasilva@sinfra.mt.gov.br&gt;, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Greziele Ferreira de Oliveira &lt;grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br&gt;, Cristiano Carvalho de Andrade &lt;cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br&gt;



Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: **2003.00078-3**NOME DO CREDOR: **Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda**CPF/CNPJ: **01.898.295/0001-28**IC: **222/2013 - 27º Medição Provisória****28º Medição Provisória**SUBCONTA: **218**EMPENHO: **25101000116000622-1****25101000116001081-4**PROCESSO: **545772/2016****545770/2016****2 anexos** **28º Medição.xlsx**  
1670K **27º Medição.xlsx**  
2604K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

## GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia  
Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632  
e-mail: engenharlia@tce.mt.gov.br



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013

### Obras/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

**BEM PÚBLICO: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.**

Prazo de Execução Inicial (dias): 360

Modalidade: Concorrência Pública

Tipo do Objeto: Obra

Nº/Ano: 020/2013

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

### Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho) - Jauru; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

### Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Inclusão: 18/09/2013

### Detalhes

#### Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248

Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

#### Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

### Origem de Recursos

Origem: Federal

Origem: Federal

Total Valor Estimado:

R\$ 12.898.026,43

R\$ 12.065.989,37

R\$ 24.964.015,80

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012

Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

### Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Firm

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

### Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Afr Montechi Vitorio

### Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Vinculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 05/08/2013

Tamanho: 576.1 KB

Nome: ART FISC 2.pdf

Descrição: ART FISC 2

Inclusão: 24/09/2013


Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 889.2 KB

Nome: ART FISC 1.pdf

Descrição: ART FISC 1



**Engenheiro de Fiscalização****Documentos de Engenheiro Fiscalização**

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf  
Descrição: PORTARIA

Tamanho: 111.6 KB

Inclusão: 24/09/2013

**Engenheiro de Execução**

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

**Documentos de Engenheiro Execução**

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf  
Descrição: ART CONT 2

Tamanho: 679.3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 1.pdf  
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 921.7 KB

Inclusão: 24/09/2013

**Situação da Obra/Serviço**

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Descrição:

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R 222 2.013.pdf  
Descrição: O.R

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Descrição: O.P

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf  
Descrição: O.P

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Descrição: OIS

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf  
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

**Medição da Obra/Serviço**

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód: 64890)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 15º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Data da Medição: 01/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx  
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód: 64357)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 14º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Data da Medição: 01/08/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx  
Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód: 63761)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 13º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015

Data da Medição: 01/07/2015

**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 12/08/2015

Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód.: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 7ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls Tamanho: 2.0 MB Inclusão: 04/07/2014

Descrição: 7ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód.: 54304)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 5ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls Tamanho: 2.2 MB Inclusão: 09/06/2014

Descrição: 5ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód.: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 12ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 11/08/2015

Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód.: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 4ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls Tamanho: 2.2 MB Inclusão: 09/06/2014

Descrição: 4ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód.: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 6ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls Tamanho: 2.2 MB Inclusão: 09/06/2014

Descrição: 6ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód.: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 10ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls Tamanho: 2.1 MB Inclusão: 08/07/2014

Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód.: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 3ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls Tamanho: 2.1 MB Inclusão: 09/06/2014

Descrição: 3ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód.: 66999)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 18ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015



**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18º Medição reajustamento.xlsx  
Descrição: 18º Medição Reajustamento

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MR / V Inc.: 69024 (Cód: 69025)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 19º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19º Medição Reajuste.xlsx  
Descrição: 19º Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / V Inc.: 54817 (Cód: 54914)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 8º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls  
Descrição: 8º medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / V Inc.: 54818 (Cód: 54915)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 9º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls  
Descrição: 9º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / V Inc.: 72451 (Cód: 72790)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 24º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24º Medição Reajuste.xlsx  
Descrição: 24º Medição Reajuste

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MR / V Inc.: 58101 (Cód: 58103)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 11º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xls  
Descrição: 11º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / V Inc.: 66217 (Cód: 66218)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 16º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição Provisória  
Descrição: Reajustamento 16º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / V Inc.: 66219 (Cód: 66220)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 17º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição Provisória  
Descrição: Reajustamento 17º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48647)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls  
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

**Nº Medição:** MPI / 2 (Cód: 49521)

Data da Medição: 07/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 2ª Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls  
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

**Nº Medição:** MPI / 3 (Cód: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 3ª Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls  
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

**Nº Medição:** MPI / 4 (Cód: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls  
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

**Nº Medição:** MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls  
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

**Nº Medição:** MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls  
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 07/05/2014

**Nº Medição:** MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls  
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

**Nº Medição:** MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls  
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

**Nº Medição:** MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls  
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

**Nº Medição:** MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls  
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

**Nº Medição:** MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls  
Descrição: 11ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

**Nº Medição:** MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx  
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

**Nº Medição:** MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx  
Descrição: 13ª Medição provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

**Nº Medição:** MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xls  
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 03/09/2015

**Nº Medição:** MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx  
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

**Nº Medição:** MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 36.037,36

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx  
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

**Nº Medição:** MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 594.183,74

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx  
Descrição: 17ª Medição Provisória  
Tamanho: 1.4 MB  
Inclusão: 25/11/2015

**Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66997)**

Data da Medição: 01/12/2015  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 18ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 1.204.611,11  
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015  
Inclusão: 21/12/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 18ª Medição.xlsx  
Descrição: 18ª Medição  
Tamanho: 1.5 MB  
Inclusão: 21/12/2015

**Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)**

Data da Medição: 05/01/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 19ª Medição Revisora  
Valor: R\$ 640.313,93  
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015  
Inclusão: 22/03/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx  
Descrição: 19ª Medição  
Tamanho: 1.1 MB  
Inclusão: 22/03/2016

**Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)**

Data da Medição: 01/02/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 20ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016  
Inclusão: 25/07/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx  
Descrição: 20ª Medição  
Tamanho: 1.1 MB  
Inclusão: 25/07/2016

**Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)**

Data da Medição: 01/03/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 21ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016  
Inclusão: 25/07/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx  
Descrição: 21ª Medição Provisória  
Tamanho: 1.2 MB  
Inclusão: 25/07/2016

**Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)**

Data da Medição: 01/04/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 22ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016  
Inclusão: 25/07/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx  
Descrição: 22ª Medição  
Tamanho: 1.2 MB  
Inclusão: 25/07/2016

**Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)**

Data da Medição: 02/05/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 23ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016  
Inclusão: 25/07/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx  
Descrição: 23ª Medição  
Tamanho: 1.2 MB  
Inclusão: 25/07/2016

**Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)**

Data da Medição: 01/06/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 24ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 106.358,76  
Período: 01/05/2016 a 31/05/2016  
Inclusão: 28/07/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 24ª Medição.xlsx  
Descrição: 24ª Medição  
Tamanho: 2.5 MB  
Inclusão: 28/07/2016

**Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 76124)**

Data da Medição: 04/07/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 25ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016  
Inclusão: 29/11/2016



**Medição da Obra/Serviço**

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25º Medição.xlsx  
Descrição: 25º Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 76126)

Data da Medição: 01/08/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 26º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Inclusão: 29/11/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 26º Medição.xls  
Descrição: 26º Medição

Tamanho: 3.1 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 76127)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 27º Medição Provisória

Valor: R\$ 668.320,46

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 29/11/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 27º Medição.xlsx  
Descrição: 27º Medição

Tamanho: 2.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 76129)

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 28º Medição Provisória

Valor: R\$ 434.990,96

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 29/11/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 28º Medição.xlsx  
Descrição: 28º Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

**Aditivo da Obra/Serviço**

Nº/Ano: 04/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 178

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Nº/Ano: 03/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 0

Srv. Acrescidos: R\$ 2.918.335,05

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 2.918.335,05

Nº/Ano: 02/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 341

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Nº/Ano: 01/2014

Prazo Ex. Aditado (dias): 483

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

**Resumo da Obra/Serviço**

**Valores da Obra/Serviço (R\$):**


Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84  
Valor Total Aditado: R\$ 2.918.335,05  
Valor Final: R\$ 14.625.713,89  
Valor Total Medido: R\$ 8.897.168,20  
Valor Total Reajustes: R\$ 778.444,59

Valor Total Medido: R\$ 8.897.168,20  
Valor Total Material: R\$ 0,00  
Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00  
Valor Total Executado: R\$ 8.897.168,20

**Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):**

Prazo de Execução Inicial (dias): 360  
Prazo Execução Total Aditado (dias): 1002  
Prazo Execução Final (dias): 1362

Quantidade de Dias em Execução: 1089  
Quantidade de Dias Paralisada: 124





## DESPACHO

À SAADS

**Srª Marciane Curvo.**

**Secretária Adjunta da Área Sistêmica**

**ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS**

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,

  
Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



# Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste



ESTADO DE MATO GROSSO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 2033/2016

**Certifico** que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de MIRASSOL D OESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

**Inscrição:** 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

**Contribuinte:** GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** R: GOVERNADOR JARI GOMES 10  
BOA ESPERANÇA

Ficam, todavia, ressaltados os direitos do Município de MIRASSOL D OESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

MIRASSOL D OESTE (MT), 29 de novembro de 2016.

**Certidão válida até 29/12/2016.**

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço [www.mirassoldoeste.mt.gov.br](http://www.mirassoldoeste.mt.gov.br).  
Certidão emitida em 29/11/2016 as 17:10:16h. - Código de Validação **W2J3S9.H3F0G3.Q4K6M6**

RUA. ANTONIO TAVARES, nº 3310 - MIRASSOL D OESTE - MT - CEP 78280-000 - Fone: (65) 32411914  
CNPJ 03.755.477/0001-75 - e-mail: [iss@mirassoldoeste.mt.gov.br](mailto:iss@mirassoldoeste.mt.gov.br)



PROC N°: \_\_\_\_\_545770/2016\_\_\_\_\_

FLS.: 43 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

DATA.: 29 / 11 / 2016

À  
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, encaminho os autos para pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES


VENCIMENTO

Prefeitura Cuiabá	- folha 27	13/12/2016
Prefeitura Mirassol D'Oeste	- folha 42	29/12/2016
PGE	- folha 26	22/12/2016
SEFAZ – MT	- folha 23/24	07/12/2016
Receita Federal	- folha 25	06/12/2016
Caixa Econômica	- folha 168	18/12/2016
Trabalhista	- folha 21/22	01/04/2017

ISSQN

Com relação ao comprovante de ISSQN, a empresa tem até o mês subsequente considerando que a referencia inicial é estabelecida pela data da emissão da nota fiscal, ou seja: **18/11/2016**, e seu prazo limite para recolhimento do imposto finda no mês **DEZEMBRO**.

Diante do exposto AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN no processo.

  
Eng.ª Civil Marciane Frevedeto Curvo  
Secretária Adjunta de Administração  
Sistemas/SINFRA




Processo nº 545770/2016

Fls: 44 /2016

Data: 30/11/2016

À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação e pagamento.

  
**Jefferson Marcos Delgado da Silva**  
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade  
SUOF/SAADS/SINFRA

VIRTUTE

PLUSQUA

RETENÇÕES		545770/2016
Numero da Nota Fiscal		705
Valor da Nota Fiscal		R\$ 434.990,86
Emissão Nota Fiscal		18/11/2016
Credor		GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
<b>Cálculo do Imposto de Renda</b>		
Valor Tributável		434.990,86
Percentual		1,50%
Valor da Retenção		R\$ 6.524,86
<b>Cálculo do ISS / CBA</b>		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		5,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
<b>Cálculo do INSS</b>		
Valor Tributável		59.274,10
Percentual		11,00%
Valor da Retenção		6.520,15
Valor líquido da NF-E		R\$ 421.945,85
C-MT		
	01/12/2016	





Coordenadoria Financeira

Termo de Conformidade Documental para Pagamento

Empresa: <u>Geosolo Engenharia</u>	
Processo: <u>545770/2016</u>	IC: <u>222/2013</u>
Período da Despesa:	Empenho:
Produto/serviço:	Notas Fiscais: <u>705</u>

Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo fiscal do contrato? (Art. 67 da Lei nº 8666/93).	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo registrada pela Gerência de Patrimônio? (Manual SIGPAT).			X	
3	Em caso de obras, as planilhas de Medição, Cronograma Físico Financeiro e Controle Financeiro foram apresentadas e atestadas pelo fiscal do contrato? (Art. 63, §2º, III da Lei nº 8666/93).	X			
4	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, de acordo com a nota fiscal, devidamente autorizado pelo Superintendente e Secretário Adjunto da área demandante da despesa?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
6	A Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado foi apresentada e está válida? (Orientação Técnica CGE 011/2016).	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal do local de domicílio do credor foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
10	O documento de arrecadação municipal e comprovante de recolhimento foi apresentado? (Lei Estadual nº 10.162/2014 e Lei Complementar Federal nº 116/2003).				
11	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
12	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a GEFIP?			X	

Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Fransuise A. Souza, Luciana Lima. C. Campos	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 19/08/2016
---	--	---------------------------------------



Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores a 2015, excetuando Restos a Pagar inscritos, a despesa foi ratificada nos termos da Portaria SINFRA nº 018/2016?			8	
14	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			

Medida Judicial	
Número do processo judicial	Ação a ser executada

Observações

Responsável pelo check-list	
Data	Assinatura
05 / 12 / 2016	<i>Jefferson</i>

Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Fransuise A. Souza, Luciana Lima. C. Campos	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 19/08/2016
---	--	---------------------------------------

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.16.002815-0</b>
Nº EMP: 25101.0001.16.001081-4			Data do Doctº: 01/12/2016	
Nº PED: 25101.0001.16.001550-4			Data de pagamento: 01/12/2016	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
<b>Unidade Gestora:</b> 25101.0001 Geral				
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **	
Nº NEX: *** **				
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 434.990,86	QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA SEIS CENTAVOS *** ** ***** *****
<b>Histórico:</b> PROC 545770/2016 IC 222/2013 DA 28ª MEDIÇÃO NF 705 NO PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016.				
<b>Código do credor:</b> 2003.00078-3		<b>Credor:</b> Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 01.898.295/0001-28		<b>Município UF:</b> Cáceres - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 56637/2014
<b>Forma de Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.1966.000000000017900-0				

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **		
		Data de Retorno da Viagem: *** **		

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: 25101000000022213		Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **				

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.000.000,00	*** 627.806,37	*** 434.990,86	*** 192.815,51

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 1.000.000,00	*** 627.806,37	*** 434.990,86	*** 192.815,51



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.16.002815-0</b>	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>IRRF (R\$):</b>	*** 6.524,86	<b>ISS município (R\$)</b>	*** 0,00	<b>Município:</b> *****	
<b>INSS (R\$):</b>	*** 6.520,15	<b>MTPREV (R\$):</b>	*** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

<b>Valor Líquido:</b>	*** 421.945,85	QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ***** *****
-----------------------	----------------	---

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Nat. eza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 434.990,86
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 434.990,86</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 6.520,15
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 6.524,86
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 13.045,01</b>

545770116



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Folha nº 48



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.16.004900-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 01/12/2016		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2003.00078-3		
<b>Credor:</b> Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 01.898.295/0001-28		<b>Município UF:</b> Cáceres MT
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.001081-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 131
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.16.002815-0		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 56637/2014		<b>Tipo de OB:</b> 31-DOC/TED
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.1966.00000000017900-0	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 421.945,85	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Francisca Albuquerque Sousa Coordenadora Financeira Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006141 - Marciano Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

<b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>01.898.295/0001-28</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 01122016 161331</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.035.084-2</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>12/2016</b>	22 - DATA VENCTO. <b>20/12/2016</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/72.517.402-15</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA</b>		25 - CÓDIGO <b>9377</b>		26 - VALOR <b>6.524,86</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  <b>PROC 545770/2016 IC 222/2013 NF 705. GEOSOLO</b>  Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>		
		MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>		
		JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>		
		T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>		
		TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>6.524,86</b>		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85810000065-0 24860123201-9 61220937700-5 07251740215-4



<b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>01.898.295/0001-28</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 01122016 161331</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.035.084-2</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>12/2016</b>	22 - DATA VENCTO. <b>20/12/2016</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/72.517.402-15</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA</b>		25 - CÓDIGO <b>9377</b>		26 - VALOR <b>6.524,86</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  <b>PROC 545770/2016 IC 222/2013 NF 705. GEOSOLO</b>  Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>		
		MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>		
		JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>		
		T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>		
		TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>6.524,86</b>		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85810000065-0 24860123201-9 61220937700-5 07251740215-4




**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


Folha nº 50

FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.16.004903-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 01/12/2016		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2001.00556-7		
<b>Credor:</b> Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.001081-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 131
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.16.002815-0		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 56637/2014		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 6.524,86	<b>Valor por Extenso:</b> SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 Fransuise Albuquerque Souza Coordenadora Financeira Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858100000650248601232019612209377005072517402154	*** **	6.524,86	53D980608264784

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285	6 - VALOR DO INSS
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	7 -
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	11 - TOTAL
			6.520,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285	6 - VALOR DO INSS
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	7 -
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	11 - TOTAL
			6.520,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.16.004904-6</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 01/12/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

\*\*\*

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº EMP: 25101.0001.16.001081-4

Fonte de Recurso: 131

Nº LIQ: 25101.0001.16.002815-0

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Tipo de OB:

39-FAT S/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R\$):

\*\*\* 6.520,15

Valor por Extenso:

SEIS MIL E QUINHENTOS E  
VINTE REAIS E QUINZE  
CENTAVOS \*\*\* \*\* \*  
\*\*\* \*\* \*  
\*\*\* \*\* \*

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

*Francisca Albuquerque Soares*  
Coordenadora Financeira

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006141 - *Marsiane Prevedello Curvo*  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal  
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

## DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2640	6.520,15	BE9863BE1D8D 5A6C



Fls. 53  
Ass: 8

**Processo nº: 545770/2016**

**Fls.: 53/Rub.: ~~54~~**

**Data: 12/12/2016**

**DESPACHO**

À SAADS,

Conforme despacho autorizado pagina 43, solicitamos requerer junto à empresa o comprovante de recolhimento do ISSQN para que possamos dar continuidade nos procedimentos.

Atenciosamente,

**FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA**

Coordenadora Financeira  
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

J  
COFIN,

Restituo os autos com guia de ISSQN referente nota fiscal 705. quitado.

Luciana de Lima Cândido Campos  
Assessora Técnica  
SAADS/SINFRA

Ass: 23/10/16



# Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

RUA ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO

SAADS/SINERA  
Fis. 54  
Ass. e

## Guia de Arrecadação - 11772/2016

Contribuinte / Endereço de Correspondência  
**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA**  
 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10  
 BOA ESPERANÇA - CEP: 78068-480 - CUIABA/MT

Localização  
**CONTRIBUINTE / 01898295000128**  
 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 -

Ano	Receta	LC	Parcela	DV	Tribute	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2016	136	1	1	18	ISSQN	12/12/2016	6.959,85				6.959,85	ISSQN

*289 mil*

Observação: ISS REFERENTE A NFPS N. 705 - SERVIÇOS PRESTADOS A MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO. -

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2016	00067	12/12/2016	-	9164000011772 648	6.959,85		0,00	0,00	0,00	6.959,85

destaque aqui



**399-9**

39994.19827 63916.400003 11772.347628 4 70060000695985

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						<b>12/12/2016</b>	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - CNPJ: 03.755.477/0001-75						4198263-	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento		Data do Processamento	
18/11/2016		01898295000128		Acelle		18/11/2016	
Cip		Carteira		Especie de Moeda		Valor	
000		CNR		RS		(x)	
Instruções						1 (+) Valor do Documento	
						6.959,85	
						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (+) Valor Cobrado	

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**  
CONTRIBUINTE / 01898295000128 - Guia nº: 11772/2016

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência  
**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA -**  
 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 78068-480 CUIABA  
 BOA ESPERANÇA - CEP: 78068-480 - CUIABA/MT

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/12/2016 - 12h01

Nº de controle: 394.272.203.575.074.668 | Documento: 0000565

Conta de débito: **Agência: 1966 | Conta: 0017900-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 001.898.295/0001-28**

Código de barras: **39994 19827 63916 400003 11772 347628 4 70060000695985**

Banco destinatário: **399-KIRTON BANK S.A. BCO. MULTIPLO**

Data de vencimento: **12/12/2016**

Valor: **R\$ 6.959,85**

Data de débito: **12/12/2016**

Descrição: **ISSQN MIRASSOL NF 705 - MT175**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

xGEcy@nx 8eRuwFYT cUy2Iors 4PKTeIrQ orgQk\*cF \*Vxne7nV nR7VGfTe z3?ABbuP  
yd62olam MaNi5nFq Uz?ML9t7 @4Nd8T?X lbCdI5F7 ElmrBMjB D1FP#AZX @axsVGUA  
Ep#3daWn EJ78jwOM 6W?sNnwm ONtQbZoS pjZDxWvp #YsSTwMT 82590156 35269151

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



À CCONT,

Para arquivo, com pagamento efetuado.

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2017.

  
**FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA**  
Coordenadora Financeira  
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



PROC. 545770/2016

FLS.: 57

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA

57

11

À SUOF

Encaminhamos o processo nº 545770/2016 – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

*Luciercio Toledo*  
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO  
Coordenadoria Contábil  
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT,

em devolução para arquivo.

11/06/2018

*Jefferson Marcos Delgado da Silva*  
Jefferson Marcos Delgado da Silva  
Superintendente de Orçamento e Finanças  
e Contabilidade  
SINFRA/MT
