

Anexo – 37ª Medição

MPI



CX 595

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

NOB: 22/02/2018

Protocolo n.: 635564/2017 Data: 27/11/2017 15:55
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: 37 (TRIGÉSIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO C
ONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOV
Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1

17.000.445-1 137






Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017

37a. MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.
Eng.º Diogo Menezes Souza
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I - SUEF-I
Nesta

Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória



Venho, pelo presente encaminhar a 37ª Medição Provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU.

37ª (Trigésima Sétima) Medição Provisória..... Período: 01/9/17 a 30/9/17

Atenciosamente

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9

Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 7ª (Trigésima Sétima) Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1610 dias
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ 2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.258.614,72
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,

[Assinatura]
Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9

[Assinatura]
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204068



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Data da Assinatura: 01/08/13 Data de Aprovação: 01/08/13 Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13 Prazo: 1610 dias úteis Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Extensão: 62,37 Km	
Desempenho relativo aos serviços da eferência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória Serviços Executados entre o: 01/9/17 a 30/9/17	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento					0,20
2) Pessoal					0,20
3) Instalações					0,20
4) Cronograma Físico				0,30	
5) Qualidade dos Serviços			0,50		
6) Atend. À Fiscalização				0,40	
7) Administração da Obra					0,20
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017					

B) Visto do Fiscal do Contrato

ITEM	Nota N	Pesos P	Produ. NxP	Obs
1) Equipamento	0,20	1,50	0,30	Desemp. Parcial = (NxP) 10 = 0,33
2) Pessoal	0,20	1,50	0,30	
3) Instalações	0,20	0,50	0,10	
4) Cronograma Físico	0,30	2,00	0,60	10
5) Qualidade dos Serviços	0,50	3,00	1,50	Conceito: FRACO
6) Atend. à Fiscalização	0,40	1,00	0,40	
7) Administração da Obra	0,20	0,50	0,10	
Total	2,00	10,00	3,30	
OBSERVAÇÕES:				

 Magnum G. de Freitas Oliveira CREA-MT 032890 RN Nº. 1214204066	 Eng. Antônio Carlos Tenuta Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA RN nº 120134407-7
--	---



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Data da Assinatura: 01/08/13
Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Extensão: 62,37 Km	Data de Aprovação: 01/08/13 Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13 Prazo: 1610 dias úteis Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Desempenho relativo aos serviços da eferência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória Serviços Executados entre o: 01/9/17 a 30/9/17	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico		0,70			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017					

B) Visto do Fiscal do Contrato

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp. Parcial = (NxP) 10 8,4 = 0,84
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,70	2,00	1,40	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: BOM
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	5,90	10,00	8,40	
OBSERVAÇÕES:				

Engº. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Obra: Restauração de Rodovias pavimentadas
Rodovia: MT-175/MT-348
Trecho: Entr: BR-174 (Cachoeira) - Juruá
Sub-trecho: Entr: BR-174 (Cachoeira) - Arapongas
Referência: 371 (Tribuna Sérvia) Medição provisória
Ordem de serviço: 05/09/17
Acumulado: 05/09/13 a 30/09/17

RESUMO DE MEDIÇÃO

Prazo de Execução
V: Contratual P1 + 3R Aditivo
V: Contratual P1 + 6R Aditivo
V: Acum. Até 35ª Medição
V: Acumulado e partir 36ª medição
Saldo Contratual
1610 dias
14.625.713,89
14.258.634,72
9.541.352,55
10.816.634,04
3.441.980,68

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE 19 ADITIVO						QUANTIDADE 29 ADITIVO						VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	% EXECUTADA	OBS	
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO CONTRATO	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR CONTRATUAL	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATUAL NOVO	MEDIÇÃO ANTERIOR	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO					VALOR NESTA MEDIÇÃO
5.5	Pilha quadrada	m2	50,00	369.880	18.494,01	18.494,01	369.880	18.494,01	369.880	369.880	369.880	369.880	369.880	369.880	-	-	-	-	
5.6	Pilha retangular	m2	59,00	369.880	21.822,92	21.822,92	369.880	21.822,92	369.880	369.880	369.880	369.880	369.880	369.880	-	-	-	-	
5.7	Pilha octogonal	m2	6,00	369.880	2.219,28	2.219,28	369.880	2.219,28	369.880	369.880	369.880	369.880	369.880	369.880	-	-	-	-	
5.8	Muro c/ cimento	m2	31,00	369.880	11.466,28	11.466,28	369.880	11.466,28	369.880	369.880	369.880	369.880	369.880	369.880	-	-	-	-	
5.9	Trilha rebitada tipo SHTM, com catapalisco nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.600,00	66.384,00	66.384,00	66.384,00	66.384,00	66.384,00	66.384,00	66.384,00	66.384,00	66.384,00	66.384,00	66.384,00	-	-	-	-	
5.10	Incluido fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais	unid	13.728,00	14.380	197.408,64	17.442,94	197.408,64	13.728,00	14.380	197.408,64	1.213,00	14.380	197.408,64	1.213,00	17.442,94	17.442,94	6,12%	-	
5.11	Sela e óxera	m2	40,00	22.910	1.122,59	1.122,59	40,00	22.910	1.122,59	40,00	22.910	1.122,59	40,00	22.910	1.122,59	1.122,59	-	-	
5.12	Escudo	m2	1,40	378.160	529,42	529,42	378.160	529,42	378.160	378.160	378.160	378.160	378.160	378.160	-	-	-	-	
5.13	Defensa metálica	m	640,00	224.620	143.756,80	143.756,80	640,00	224.620	143.756,80	640,00	224.620	143.756,80	640,00	224.620	-	-	-	-	
	Sub-total				1.078.322,61	1.078.322,61			1.078.322,61			1.078.322,61			108.491,660	108.491,660			
	Mobilização e desmobilização	unid	6,00	5.000	107.455,625	644.733,75	644.733,75	6,00	107.455,625	644.733,75	5,00	5.000	107.455,625	5,00	5.000	107.455,625	45,45%	-	
	Instalação de castiço	m2	1,00	322.866,870	322.866,87	322.866,87	1,00	322.866,870	322.866,87	1,00	322.866,870	322.866,870	1,00	322.866,870	322.866,870	322.866,870	50,00%	-	
	Administração local	m2	12,00	33.374,960	403.499,52	403.499,52	12,00	33.374,960	403.499,52	12,00	33.374,960	403.499,52	12,00	33.374,960	403.499,52	403.499,520	50,00%	-	
	Sub-total				1.508.378,74	1.508.378,74			1.508.378,74			1.508.378,740			1.508.378,740	1.508.378,740			
	SERVIÇO ADICIONADO																		
	TAPA BURACO																		
	Diferença Transporte de bita p/ PNV via aerea (DMT=375\$/km) para Tapas	bitm	127.875,852	0,370	47.314,06	47.314,06	127.875,852	0,370	47.314,06	47.314,06	127.875,85	0,370	47.314,06	47.314,06	47.314,060	47.314,060	50,00%	-	
	PAVIMENTAÇÃO																		
	fornecimento de bita - Complementado para Reconstrução base	m²	5.400,00	71.495	386.071,02	386.071,02	5.400,00	71.495	386.071,02	5.400,00	71.495	386.071,02	5.400,00	71.495	386.071,02	386.071,020	48,90%	-	
	Sub-total				418.679,95	418.679,95			418.679,95			418.679,950			418.679,950	418.679,950			
	RECAPAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO REVESTIMENTO																		
	Preparação de base	m2	0,210	0,210	55.154,40	55.154,40	0,210	0,210	55.154,40	0,210	0,210	55.154,40	0,210	0,210	55.154,40	55.154,400	-	-	
	Micro-revestimento a frio - Microfina 0,30 mm	m2	2,070	2,070	543.644,90	543.644,90	2,070	2,070	543.644,90	2,070	2,070	543.644,90	2,070	2,070	543.644,90	543.644,900	-	-	
	Transporte comercial c/ base 10m3 ros. não pav. (bita - Micro reconst.)	t	0,370	0,370	130.419,03	130.419,03	0,370	0,370	130.419,03	0,370	0,370	130.419,03	0,370	0,370	130.419,03	130.419,030	-	-	
	Materiais básicos para Recapamento da Estrutura existente com Mic	t	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,23	729.238,230	729.238,230	-	-	
	Forma de Enchimento de Base Afêlica RR-2C	t	1.257,330	1.257,330	29.343,61	29.343,61	1.257,330	1.257,330	29.343,61	1.257,330	1.257,330	29.343,61	1.257,330	1.257,330	29.343,610	29.343,610	-	-	
	Transporte de Enchimento de Base Afêlica RR-2C	t	279,330	279,330	1.746,260	1.746,260	279,330	279,330	1.746,260	279,330	279,330	1.746,260	279,330	279,330	1.746,260	1.746,260	-	-	
	Fornecimento de enchimento polimero p/ micro reconst. a frio	t	279,330	279,330	107.706,84	107.706,84	279,330	279,330	107.706,84	279,330	279,330	107.706,84	279,330	279,330	107.706,840	107.706,840	-	-	
	Transporte de enchimento polimero p/ micro reconst. a frio	t	367,69	367,69	332.050,45	332.050,45	367,69	367,69	332.050,45	367,69	367,69	332.050,45	367,69	367,69	332.050,450	332.050,450	-	-	
	Materiais Betuminosos para Recapamento da Estrutura existente com Mic	t	1.325,060	1.325,060	105.888,41	105.888,41	1.325,060	1.325,060	105.888,41	1.325,060	1.325,060	105.888,41	1.325,060	1.325,060	105.888,410	105.888,410	-	-	
	Fornecimento de RR-2C c/ polimeros	t	279,330	279,330	105.888,41	105.888,41	279,330	279,330	105.888,41	279,330	279,330	105.888,41	279,330	279,330	105.888,410	105.888,410	-	-	
	Transporte de RR-2C c/ polimeros (DMT=300,15/m)	t	379,08	379,08	105.888,41	105.888,41	379,08	379,08	105.888,41	379,08	379,08	105.888,41	379,08	379,08	105.888,410	105.888,410	-	-	
	TREVO SONHO AZUL																		
	TORRORINGEN																		
	Decoratamento Básico, Limpeza, Formas e Árvoreas diâmetro até 0,15 m	m³	9.877,12	0,360	3.555,76	3.555,76	9.877,12	0,360	3.555,76	9.877,12	0,360	3.555,76	9.877,12	0,360	3.555,760	3.555,760	-	-	
	Est. carga e transp. mat. 1' cat DMT 50 m	m³	2.084,09	1,890	3.928,95	3.928,95	2.084,09	1,890	3.928,95	2.084,09	1,890	3.928,95	2.084,09	1,890	3.928,950	3.928,950	99,79%	-	
	Est. carga e transp. mat. 11 cat. DMT 50' a 200 m, c/ a	m³	4.967,71	6,030	26.349,32	26.349,32	4.967,71	6,030	26.349,32	4.967,71	6,030	26.349,32	4.967,71	6,030	26.349,320	26.349,320	99,85%	-	
	Compactação de material de "boca-boca"	m³	5.163,04	2,130	10.997,26	10.997,26	5.163,04	2,130	10.997,26	5.163,04	2,130	10.997,26	5.163,04	2,130	10.997,260	10.997,260	97,87%	-	
	PAVIMENTAÇÃO																		
	Reconstrução de base c/ adição de 20% de bita	m³	1.307,53	37,230	41.679,49	41.679,49	1.307,53	37,230	41.679,49	1.307,53	37,230	41.679,49	1.307,53	37,230	41.679,490	41.679,490	88,72%	-	
	Impedimento (execução)	m³	6.537,67	0,290	1.895,52	1.895,52	6.537,67	0,290	1.895,52	6.537,67	0,290	1.895,52	6.537,67	0,290	1.895,520	1.895,520	99,39%	-	
	Tratamento superficial Duplo c/ polimeros	m³	3.910	3,910	21.562,28	21.562,28	3.910	3,910	21.562,28	3.910	3,910	21.562,28	3.910	3,910	21.562,280	21.562,280	99,39%	-	
	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	11.010	11,010	127,40	127,40	11.010	11,010	127,40	11.010	11,010	127,40	11.010	11,010	127,400	127,400	93,68%	-	
	ADQUIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO																		
	Fornecimento de Aditivo Difenil CN-30	t	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	2.941,970	-	-	
	Fornecimento de Emulsão Afêlica RR-2C c/ polimeros	t	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	1.325,060	-	-	
	TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO																		
	Transporte comercial c/ base 10m3 ros. pav. (bita p/ reconf. base)	t	34.946,30	0,370	12.708,13	12.708,13	34.946,30	0,370	12.708,13	34.946,30	0,370	12.708,13	34.946,30	0,370	12.708,130	12.708,130	100,00%	-	
	Transporte comercial c/ base 10m3 ros. não pav. (bita p/ reconf. base)	t	254,97	0,560	142,78	142,78	254,97	0,560	142,78	254,97	0,560	142,78	254,97	0,560	142,780	142,780	95,81%	-	
	Transporte comercial c/ base 10m3 ros. pav. (bita p/ TSD)	t	21.237,46	0,370	7.857,86	7.857,86	21.237,46	0,370	7.857,86	21.237,46	0,370	7.857,86	21.237,46	0,370	7.857,860	7.857,860	-	-	
	Transporte comercial c/ base 10m3 ros. não pav. (bita p/ TSD)	t	357,66	0,560	88,28	88,28	357,66	0,560	88,28	357,66	0,560	88,28	357,66	0,560	88,280	88,280	-	-	
	Transporte local em rodov. pavim. (Material Removido)	t	59,84	0,830	37,69	37,69	59,84	0,830	37,69	59,84	0,830	37,69	59,84	0,830	37,690	37,690	-	-	
	Transporte de Aditivo Difenil CN-30	t	7,84	279,330	2.151,06	2.151,06	7,84	279,330	2.151,06	7,84	279,330	2.151,06	7,84	279,330	2.151,060	2.151,060	-	-	
	Transporte de Emulsão Afêlica RR-2C c/ polimeros	t	19,61	279,330	5.478,49	5.478,49	19,61	279,330	5.478,49	19,61	279,330	5.478,49	19,61	279,330	5.478,490	5.478,490	-	-	

Protocolo/SINFR
Folha: 07
Ass: [assinatura]

Magnus Magnun S. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN N.º 1214204066

SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Outra: Restauração de Rodovias Pavimentadas
Rodovia MT-125/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cuiabá) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cuiabá) - Anapitanga
Referência: 371 (Tigüema Sólida) Medição provisória
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
Período medição: 01/09/13 a 30/09/13 Acumulado: 05/08/13 a 30/09/13

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base
Rimac Especial Eng. Plan. e Cons. Ltda

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIMINAÇÃO, UNID., QUANTIDADE ACUMULADA, QUANTIDADE CONTRATADA, QUANTIDADE 1º ADITIVO, QUANTIDADE 2º ADITIVO, VALOR ACUMULADA, VALOR CONTRATUAL, VALOR CONTINENTAL NOVO, PREÇO UNITÁRIO, PREÇO UNITÁRIO NOVO, NESTA MEDIÇÃO, MEDIÇÃO ANTERIOR, MEDIÇÃO ACUMULADA, PREÇO UNITÁRIO, VALOR ACUMULADO ANTERIOR, VALOR ACUMULADO, % EXECUTADA, OBS.

1.087.794,07 (Hum milhão, noventa e sete mil, setecentos noventa e quatro reais, sete centavos)

02 de outubro de 2017
Comissão de Fiscalização

Magnum Guentemburgo
Engº Magnum Guentemburgo
CREAMT 032880
RN nº 1214104066

[assinatura]
Fiscal Pontes nº. 018/2017/SAC/0/SINFRA
RN nº. 121164774-9

TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO
TOTAL MEDIDO ATÉ A 3ª MEDIÇÃO
A DEUZEIRA DE MEDIÇÃO ANTERIOR

TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO
A DEUZEIRA DE MEDIÇÃO ANTERIOR
VALOR LÍQUIDO

CONTRATO		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT		FISCAL		ADITAMENTO		TOTAL	
I.C. Nº 22220130000-SETPU		Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		Restauração		VALOR CONTRATUAL		Engº Antônio Carlos Temula		2.561.235,88		14.258.614,72	
RODOVIA MT-175/MT-248		Tronco EHR BR-174 (cabeço) - Iluruí		Medições P.I.		11.707.378,84		TOTAL		TOTAL		Ordem de início de serviço: 05/08/13	
M.F. 175/MT-248		Sub-Tronco EHR BR 174 (cabeço) - Anupitanga - Jote 1		Medições P.I.		11.707.378,84		TOTAL		TOTAL		Ordem de início de serviço: 05/08/13	
Nº DO PROCESSO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		PERÍODO		MEDICÕES REAJUST.		TOTAL		TOTAL		Ordem de início de serviço: 05/08/13	
DOC.		PERÍODO DA MEDIÇÃO		PERÍODO		MEDICÕES REAJUST.		TOTAL		TOTAL		Ordem de início de serviço: 05/08/13	
REFERÊNCIA		PERÍODO DA MEDIÇÃO		PERÍODO		MEDICÕES REAJUST.		TOTAL		TOTAL		Ordem de início de serviço: 05/08/13	
1ª medição		05/08/13 a 31/08/13		27		1583		483.550,30		483.550,30		13.775.044,42	
2ª medição		01/09/13 a 30/09/13		30		1553		483.550,30		967.100,60		13.204.106,72	
3ª medição		01/10/13 a 31/10/13		31		1522		453.025,82		1.420.126,42		12.801.082,90	
4ª medição		01/11/13 a 30/11/13		30		1482		406.242,96		1.826.369,38		12.801.082,90	
5ª medição		01/12/13 a 31/12/13		31		1461		427.216,11		2.253.585,49		12.364.839,94	
6ª medição		01/01/14 a 31/01/14		31		1430		306.135,78		2.559.721,27		12.058.703,71	
7ª medição		01/02/14 a 28/02/14		28		1402		167.892,08		2.727.613,35		11.891.011,63	
8ª medição		01/03/14 a 31/03/14		31		1371		200.901,16		2.928.514,51		11.690.110,47	
9ª medição		01/04/14 a 30/04/14		30		1341		298.625,42		3.227.140,93		11.391.485,07	
10ª medição		01/05/14 a 31/05/14		31		1310		53.727,81		3.280.868,74		11.337.657,26	
11ª medição		01/06/14 a 31/06/14		154		1156		499.161,37		3.779.030,11		11.138.626,37	
12ª medição		05/05/15 a 31/05/15		207		949		189.149,68		3.968.179,79		10.949.476,69	
13ª medição		01/06/15 a 30/06/15		30		919		847.008,30		4.815.188,09		10.102.478,39	
14ª medição		01/07/15 a 31/07/15		31		888		358.138,91		5.173.327,00		9.749.149,39	
15ª medição		01/08/15 a 31/08/15		31		857		321.430,58		5.494.757,58		9.427.398,87	
16ª medição		01/09/15 a 30/09/15		30		827		36.037,36		5.530.794,94		9.361.361,51	
17ª medição		01/10/15 a 31/10/15		30		797		594.183,74		6.124.978,68		9.167.177,85	
18ª medição		01/11/15 a 30/11/15		30		767		1.204.611,11		7.329.589,79		8.937.666,32	
19ª medição		01/12/15 a 31/12/15		31		874		640.313,93		7.970.903,72		8.797.763,32	
20ª medição		01/01/16 a 31/01/16		31		843		767.498,12		8.738.401,84		8.530.265,20	
21ª medição		01/02/16 a 29/02/16		29		814		767.498,12		9.505.900,96		8.262.767,08	
22ª medição		01/03/16 a 31/03/16		31		783		767.498,12		10.273.400,08		7.915.268,96	
23ª medição		01/04/16 a 30/04/16		30		753		767.498,12		11.040.898,20		7.547.770,84	
24ª medição		01/05/16 a 31/05/16		31		722		1.066.348,76		12.107.246,96		7.181.422,08	
25ª medição		01/06/16 a 30/06/16		30		692		793.856,88		12.901.103,84		6.888.565,20	
26ª medição		01/07/16 a 31/07/16		31		661		793.856,88		13.694.960,72		6.494.708,32	
27ª medição		01/08/16 a 31/08/16		31		630		666.320,46		14.361.281,18		6.128.377,86	
28ª medição		01/09/16 a 30/09/16		30		600		434.990,86		14.796.272,04		5.793.387,00	
29ª medição		01/10/16 a 31/10/16		31		569		644.194,75		15.440.466,79		5.429.192,25	
30ª medição		01/11/16 a 31/11/16		92		477		9.541.352,95		24.981.819,74		5.070.839,30	
31ª medição		01/12/16 a 28/12/16		28		449		9.541.352,95		34.523.172,69		4.809.486,35	
32ª medição		01/01/17 a 31/01/17		31		418		9.541.352,95		44.064.525,64		4.598.133,40	
33ª medição		01/02/17 a 30/02/17		30		388		9.541.352,95		53.605.878,59		4.400.780,45	
34ª medição		01/03/17 a 31/03/17		31		357		9.541.352,95		63.147.231,54		4.299.427,50	
35ª medição		01/04/17 a 30/04/17		30		326		9.541.352,95		72.688.584,49		4.299.427,50	
36ª medição		01/05/17 a 31/05/17		31		295		1.177.467,02		74.866.051,51		4.299.427,50	
37ª medição		01/06/17 a 30/06/17		30		235		1.097.794,07		75.963.845,58		4.299.427,50	

Clausula MT 02 de outubro de 2017
 Comissão de Fiscalização
 Engº Antônio Carlos Temula
 Fiscal Pontaria nº. 019/2017/SO/SINFRA
 RN nº. 121164774-9

Magnum Genti com logo
 Engº Magnum G. de Freitas Oliveira
 REA MT 032890
 RN nº 1212204066



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 Km
Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória
Período: 01/09/17 a 30/09/17

MEMORIAL DESCRITIVO
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO

Local		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda										
est. inicial	est. final	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura da Capa (m)	Espessura do solo (m)	Volume Solo (m³)	Volume Revest. Bet (m³)	DMIT Solo (km)	DMIT Revt. Bet (BF) (km)	Mom. Transp. solo (tkm)	Mom. Transp. RevBet (tkm)
272,000	186,000	1,720,00	7,000	12,040,00	0,050	-	-	602,000		10,000	-	13,244,000
348,000	248,000	2,020,00	7,000	14,140,00	0,050	-	-	707,000		10,000	-	15,554,000
365,000	349,000	320,00	7,000	2,240,00	0,050	-	-	112,000		10,000	-	2,464,000
630,000	564,000	1,320,00	7,000	9,240,00	0,050	-	-	462,000		10,000	-	10,164,000
TOTAL A MEDIR								1.883,000				41.426,000
TREVO												
369,000	351,000	5,000	7,000	1,820,00	0,035	-	-	63,700		10,000	-	1,401,400
369,000	351,000	5,000	7,000	1,820,00	0,035	-	-	63,700		10,000	-	1,401,400
TOTAL A MEDIR								127,400				2.802,800

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017
Comissão de Fiscalização

Magnum Gumbertinho
Engº Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA MT 032890
RN nº 1214204066

Antônio Carlos Terete
Engº Antônio Carlos Terete
Fiscal Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
 FOLHA Nº 01/01

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Contrato: I. C. Nº 222/2013/00000 - SETPU
 Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória
 Período: 01/9/17 a 30/9/17

Plânilha para Cálculo de Volume de Reconfeção de Base

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)			EXTENSÃO	LARGURA	ESP.	VOLUME	AGREGADO R. BASE	Peso (t)	DMT	Transporte	OBSERVAÇÃO
	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.									
RECONFECÇÃO DE BASE																
				272,00	0,00	166,00	0,00	1720,00	9,00	0,20	3.096,00	619,20	928,80	111,84	103.876,99	PISTA
				298,00		272,00		520,00	9,00	0,20	936,00	187,20	280,80	111,84	31.404,67	PISTA
				630,00		564,00		1320,00	9,00	0,20	2.376,00	475,20	712,80	111,84	79.719,55	PISTA
				365,00		349,00		320,00	9,00	0,20	576,00	115,20	172,80	111,84	19.325,95	PISTA
											6.984,00				234.327,16	
				378,00	0,00	349,00		580,00	5,00	0,20	580,00	116,00	174,00	111,84	19.460,16	TREVO
				378,00	0,00	349,00		580,00	5,00	0,20	580,00	116,00	174,00	111,84	19.460,16	TREVO
											1160,00				38.920,32	SEM QUANTITATIVO DE PROJETO
															34.346,00	
TOTAL A MEDIR																
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA RE. BASE (DMT= 111,84 km)																

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017

Magnum Guimarães
 Engº Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA MT 032890
 RN nº 1214204066

Engº Antônio Carlos Terúta
 Fiscal Portaria nº 018/2017/SACBSINFRA
 RN nº 121167749



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE

FOLHA Nº 01/01

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248

Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru

Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória

Período: 01/09/17 a 30/09/17

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

PLANILHA PARA CÁLCULO
DE IMPRIMAÇÃO
(m²)

ESTACAS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	IMPRIMAÇÃO ÁREA (m²)	TAXA DE APLIC. CM-30 (l/m²)	QUANTIDADE CM-30 (t)	OBS.
INICIAL	FRAC.						
270	245	500,000	9,00	4.500,00	1,200	5,400	
365	349	320,000	9,00	2.880,00	1,200	3,456	
630	564	1.320,000	9,00	11.880,00	1,200	14,256	
TOTAL A MEDIR				19.260,00		23,112	
TREVO							
369	351	361,000	9,00	3.249,00	1,180	3,833	ALÇA DIREITA
369	351	361,000	9,00	3.249,00	1,180	3,833	ALÇA ESQUERDA
				6.498,00		7,67	

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017

Magnum Guimarães
Engº Magnum G. de Freitas Oliveira

CREA MT 032890

RN nº 1214204066

Engº Antônio Carlos Tenente

Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA

RN nº 121164774-9

Protocolo/SINFRA

Folha: 12

Ass: *[Assinatura]*

FOLHA Nº 0101
 PLANILHA PARA CÁLCULO
 TSD E TRANSPORTE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
 Outra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-243
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jaunu
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Contrato: I. C. Nº 222/2013/0000 - SETPU
 Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória
 Período: 01/5/17 a 30/9/17

Estaca	Comprimento		Largura (m)	Área (m²)	TSD		Agregados TSD		DMT		Obs
	Início	Fim			Taxa de Aplicação (t)	Peso Emulsão RR-ZC E (t)	Taxa de Aplicação (kg/m²)	Peso (t)	Km	L.km	
369	351	1,00	9,00	3.249,00	0,0030	9,747	28,000	90.972,000	111,840	10.174,308	
369	351	1,00	9,00	3.249,00	0,003	9,422	28,000	90.972,000	111,840	10.174,308	
TOTAL A MEDIR				6.498,00		19,169				20.348,617	
PISTA											
564	565	(3.980,00)	9,00	(35.820,00)	0,003	(103,878)	35,000	(1.253.700,000)	111,840	(140.213,808)	estorno 2ª medição
530	554	1.320,00	9,00	11.880,00	0,003	34,452	35,000	415.800,000	111,840	46.533,072	
				(23.940,00)		(69,426)				(93.710,736)	
FORNECIMENTO DE RR-ZC											
TRANSPORTE DE RR-ZC E (DMT= 300,10km)											
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA TSD (DMT= 111,84 km)											

Quilômetro 02 de outubro de 2017
 Comissão de fiscalização

 Engº Magnum Guimarães
 CREA MT 032890
 RN nº 1214204066




 Engº Antônio Carlos Teulada
 Fiscal Porteira nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121154774-9


ESTACA		Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Área (m²) c/Tapa Buraco	Espessura Média (m)	Volume (m³)	RL-IC		Ingrimação		Pintura de Ligação		Obs	
ESTACA	Inteira							Frac.	Leão	Taxa de Aplicação (T/m3)	Volume RL-1C (t)	Taxa de Aplicação (ton/m²)	Área (m²) Ingrimação		Volume CM-30 (t)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Juruá Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Arupungá Referência: 37 (Trigésima Sétima) Medição provisória Período: 01/01/17 a 30/01/17 Extensão: 62,37 km Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda I. C. Nº 222/2013/0000 - SETPU															
Novembro a Dezembro/2016	-	3.118,00	10,00	D-E	62.370,00	7,00	436.590,00	23.775,14	0,140	36,613	-	-	2.015,260	0,500	1,307
Fevereiro a Maio/2017	-	3.118,00	10,00	D-E	62.370,00	7,00	436.590,00	26.467,35	0,110	-	-	-	2.910,300	0,500	1,455
Junho/2017	-	3.118,00	10,00	D-E	62.370,00	7,00	436.590,00	4.584,20	0,110	7,059	-	-	504,260	0,500	0,252
TOTAL REALIZADO															
TOTAL MEDIDO 27ª e 28ª Medição							862.982	43.872					8.029.020		3,014
TOTAL A MEDIR							602.982	18.190					1.296.670		0,520
								25.622					4.733,160		2,484
TRANSPORTE PMF USINA > PISTA VOLUME 1/m3 602,98 2,10 1.266,25 DMT 38,890 1 x km 49.244,851															
TRANSPORTE CBUJUSINA (CUBABA) > PISTA VOLUME 1/m3 291,03 (Mesa de Cubaba) 250,00 DMT 327,000 1 x km 81.750,000 (Mesa de Compresso) 41,03 117,000 4.800,570															
Não medido aguardando aditivo															

Magnum G. de Freitas Oliveira
 Eng.º Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA MT 032.890
 RN nº 121.420-066

Magnum G. de Freitas Oliveira
 Eng.º Medição Obras Terceira
 Fiscal Portaria nº 018/2017/SAC/SINFRA
 RN nº 121.647.4-9

Quilômetro 02 de outubro de 2017
 Comissão de fiscalização

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGIS		FOLHA Nº 01/01 PLANILHA PARA CÁLCULO Dispositivos de Drenagem					
				Obs			
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: 37ª (Trigesima Sétima) Medição provisória Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Período: 01/9/17 a 30/9/17							
Inteira	Frção	Inteira	Frac.	Comprimento (m)	DESCRIÇÃO	QUANT	Obs
				KM			
				ESTACA			
				6,90	349 VAP - 04	150	
				6,90	349 SCC01	120	
				6,90	350 SCC 04	40	
				6,90	351 MFC 03		
				6,90	351 MFC 05		
				6,90	354 CCS 02	3	
				6,90	354 CCS 03	1	
				6,90	355 DAR 02	226,5	
				6,90	357 EDA 02	14	
				6,90	360 DES 03	1	
				6,90	360 DEB 01	2	
				6,90	361 DEB 04	1	
				6,90	364 BLD 02	5	
				6,90	368 BSTC Ø 0,60 m	25	
				6,90	368 BSTC Ø 0,80 m	50	
				6,90	370 TCC 01	4	
				6,90	378 ARRANCAMENTO		
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017 Comissão de fiscalização  Engº Magnum Spantombango CREA MT 032890 RN nº 1214204066							
 Engº Antônio Carlos Tenuta Fiscal Portaria nº. 018/2017/ISAQB/SINFRA RN nº. 121164774-9							

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGIS		FOLHA Nº 01/01 PLANILHA PARA CÁLCULO O.A.C			
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Período: 01/9/17 a 30/9/17					
Inteira	Comprimento (m)		DESCRIÇÃO	QUANT	Obs
	Fração	Frac.			
			O.A.C		
		KM	ESTACA		
		6,90	351	BSTC 0,8	20
		6,90	349	BSTC 1,0	70
		6,90	350	BSTC 0,8	1
		6,90	351	BSTC 1,0	1
		6,90	351	BSTC 1,0	2
		6,90	354	REMOÇÃO	25

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017
 Comissão de fiscalização
 Engº Magnum Quintanilha
 Engº Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA MT 032890
 RN nº 1214204066

Engº Arnildo Carlos Ferreira
 Fiscal Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru

Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória

Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Período: 01/09/17 a 30/09/17

Inleira	Estaca		Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Obs
	Fração	Inteira				
TREVO SONHO AZUL						
349		360	220,00	30,00	6.600,00	
362		368	120,00	20,00	2.400,00	
368		378	200,00	22,00	4.400,00	
					13.400,00	
ENLEIVAMENTO						
351		360	180,00	30,00	5.400,00	
365		368	60,00	20,00	1.200,00	
371		378	148,00	22,00	3.256,00	
					9.856,00	
REGULARIZAÇÃO MECANIZADA						
DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO						
351		360	180,00	30,00	5.400,00	
365		368	60,00	20,00	1.200,00	
371		378	148,00	22,00	3.256,00	
					9.856,00	

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017

Comissão de fiscalização

Magnum Quintemburgo

Engº Mágnum G. de Freitas Oliveira

CREA MT 032890

RN nº 1214204066

Engº Antônio Carlos Tenuta

Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA

RN nº. 121164774-9

Protocolo/SINFRA
Folha: 17
Ass: *UHS*



Obra: Restauração de Rodovia pavimentada Sub-trecho: Entr. BR -174 (Cacho) - Araputanga
 Local: Rodovia MT-175/ MT-248 Contrato nº: 222/2013-00-00
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Período: 01/9/17 a 30/9/17
 Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória Firma: Geosolo Eng .Planj. E Consultoria Ltda


Planilha de cubação - corte e bota-fora

Estaca	Área seção de corte		Área seção de aterro		Semi distância	Volume de corte (m³)		Volume de aterro (m³)	
	da estaca	acumulada	da estaca	acumulada		da estaca	acumulado	da estaca	acumulado
Volume do lado esquerdo									
349	9,247	9,247	0,000	0,000					
					10,000	194,970	194,970	0,000	0,000
350	10,250	19,497	0,000	0,000					
					10,000	252,000	446,970	0,000	0,000
351	14,950	34,447	0,000	0,000					
					10,000	334,620	781,590	0,000	0,000
352	18,512	52,959	0,000	0,000					
					10,000	360,980	1.142,570	0,000	0,000
353	17,586	70,545	0,000	0,000					
					10,000	362,230	1.504,800	0,000	0,000
354	18,637	89,182	0,000	0,000					
					10,000	328,470	1.833,270	0,000	0,000
355	14,210	103,392	0,000	0,000					
					10,000	244,600	2.077,870	0,000	0,000
356	10,250	113,642	0,000	0,000					
Volume do lado direito									
356	12,250	0,528	0,000	0,000					
					10,000	255,000	255,000	0,000	0,000
357	13,250	13,778	0,000	0,000					
					10,000	278,100	533,100	0,000	0,000
358	14,560	28,338	0,000	0,000					
					10,000	288,100	821,200	0,000	0,000
359	14,250	42,588	0,000	0,000					
					10,000	244,470	1.065,670	0,000	0,000
360	10,197	52,785	0,000	0,000					
					10,000	410,100	1.475,770	0,000	0,000
361	30,813	83,598	0,000	0,000					
					10,000	463,730	1.939,500	0,000	0,000
362	15,560	99,158	0,000	0,000					
Volume do lado direito									
363	14,5200	14,520	0,000	0,000					
					10,000	290,800	290,800	0,000	0,000
364	14,5600	29,080	0,000	0,000					
					10,000	320,800	611,600	0,000	0,000
365	17,5200	46,600	0,000	0,000					
					10,000	368,700	980,300	0,000	0,000
366	19,3500	65,950	0,000	0,000					
					10,000	346,000	1.326,300	0,000	0,000
367	15,2500	81,200	0,000	0,000					
					10,000	335,000	1.661,300	0,000	0,000
368	18,2500	99,450	0,000	0,000					
					10,000	368,100	2.029,400	0,000	0,000
369	18,5600	118,010	0,000	0,000					
					10,000	394,100	2.423,500	0,000	0,000
370	20,8500	138,860	0,000	0,000					

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017

Engº Magnum G de Freitas Oliveira
 CREA MT 032890
 RN nº 1214204066

Engº Antônio Carlos Fenuta
 Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº. 121164774-9


 SINFRA SECRETARIA FEDERAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO		Cálculo do Volume de Terraplenagem realizada com caminhões - boca-fora de material de baixa capacidade de suporte - DMT 3-5km			
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT - 248 Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória Período: 01/9/17 a 30/9/17		Trecho: Entr. BR-174 - Jauru Sub-trecho: Entrº BR-174 - Araputanga		Firma: Geosolo Eng. Plan e Consultoria Ltda.			
Logradouro	Estacas		Extensão (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)	
	Inicial	Final					
Lado direito	349 + 0	356 + 0	(Ver planilha de cubação)			2.077,870	
Lado esquerdo	356 + 0	362 + 0	(Ver planilha de cubação)			1.939,500	
Lado direito	364 + 0	367 + 0	(Ver planilha de cubação)			1.035,500	
Remoção Mecanizada de Material de Baixa Capac. De Suporte			Total				
			Medido Nesta				
			Total:			5.052,870	

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017

Magnum G. de Freitas Oliveira
 Engº Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA MT 032890
 RN nº 1214204066

Eng. Antônio Carlos Ferruta
 Eng. Antônio Carlos Ferruta
 Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº. 121164274-9

SINFRA		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		ESTADO DO MATO GROSSO		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		Planilha para cálculo de Reaterro Apiloado	
Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Período: 01/9/17 a 30/9/17									
Contrato nº. 222/2013/00/00-SETPU Trecho: Entr. BR -174 - Jauru Sub-trecho: Entrª BR - 174 - Araputanga Firma: Geosolo Eng. Plan e Consultoria Ltda									
Local (Rue, Avenida)	Posição	Estaca		Extensão (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Empolamento m³	Volume (m³)	Observação:
		inicial	final						
Pista direita	Rotatória 2 - Ramo 1	349 + 0,00	356 + 17,000	157,000	5,00	0,50		392,500	
Pista esquerda	Rotatória 2 - Ramo 2	364 + 0,00	367 + 15,000	75,000	5,00	0,40		150,000	
ESCAVAÇÃO MECANIZADA									
Pista direita	Rotatória 2 - Ramo 1	349 + 0,00	356 + 17,00	157,00	5,0000	0,500	1,150	451,375	
Pista esquerda	Rotatória 2 - Ramo 2	364 + 0,00	367 + 15,00	75,00	5,0000	0,400	1,150	172,500	
				Total				542,500	



Magnum
 Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA-MT 032890
 RN Nº. 1214204066

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr.: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 INICIO: 05/08/2013
 TÉRMINO: 05/11/2016
 MÊS/ANO: 05/08/13 a 31/08/2013
 DIAS CORRIDOS: 27 / 27 / 27 / 30 / 31 / 31 / 31 / 30 / 118 / 31 / 149

Nº Contrato: IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Data Assinatura: 01/08/2013
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU
 O. I. Serviço: 05/08/2013
 Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda
 Firma: 01/11/13 a 30/11/2013

SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,8963%	270.391,12	1,2228%	174.359,62	1,2755%	181.868,74	0,7015%	100.027,81
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,2206%	31.455,60	1,1845%	168.887,83	0,9267%	133.564,56	0,5152%	73.460,49
3.0 - CONSERVAÇÃO	1,5105%	215.381,17	0,0424%	6.050,56	0,2601%	37.081,84		
4.0 - DRENAGEM								
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	3,3913%	483.550,30	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,82	0,3768%	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO								
8.0 - PAVIMENTAÇÃO								
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,39%		4,00%		2,83%		1,99%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	3,39%		7,40%		10,22%		14,66%	
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		570.995,70		403.025,82		227.216,11
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.054.506,00		1.457.531,82		2.090.990,89
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,39%		4,00%		2,83%		1,99%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	3,39%		7,40%		10,22%		14,66%	
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		570.995,70		403.025,82		227.216,11
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.054.506,00		1.457.531,82		2.090.990,89

NOTAS:
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma de PS
 03) P6A - Será a soma acumulada de P65

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr.: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 INICIO: 05/08/2013
 TÉRMINO: 05/11/2016
 MÊS/ANO: 01/01/14 a 31/01/2014
 DIAS CORRIDOS: 31 / 31 / 31 / 31 / 289 / 31 / 300

Nº Contrato: IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Data Assinatura: 02/04/2009
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU
 O. I. Serviço: 05/08/2013
 Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda
 Firma: 01/04/14 a 30/04/2014

SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,6122%	2.296,126,67	0,3071%	43.785,19	0,4667%	66.543,17	0,7700%	109.797,06
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,4496%	2.296,126,67	0,2686%	52.556,01	0,5655%	80.630,17	0,9475%	135.100,55
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,1257%	17.923,07				
4.0 - DRENAGEM								
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,82	0,3768%	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO								
8.0 - PAVIMENTAÇÃO								
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	1,44%		1,18%		1,41%		2,09%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	16,10%		17,28%		18,69%		20,76%	
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		167.992,08		200.901,16		298.625,42
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75		2.665.019,91		2.963.645,33
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	1,44%		1,18%		1,41%		2,09%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	16,10%		17,28%		18,69%		20,76%	
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		167.992,08		200.901,16		298.625,42
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75		2.665.019,91		2.963.645,33

NOTAS:
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma de PS
 03) P6A - Será a soma acumulada de P65

Eng.º Ambiental Geosolo Ltda
 Nilton Ottoni
 R# 1704394054
 Fiscal Pontaria Nº 018/2017/SACB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Obras:		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia: MT - 175		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Prazo: 1.610 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURI		Data Assinatura 01/08/2013			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação 02/04/2009			
INÍCIO: 05/08/2013		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
MÊS/ANO 01/06/14 a 30/09/2014		01/10/14 a 31/10/2014		05/05/15 a 31/05/2015	
TERMINO: 05/11/2016		122 / 422		185 / 638	
DIAS CORRIDOS		31 / 433		27 / 665	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	PS	1,0548%	150.404,73	0,5351%	76.296,25
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	PS	1,3155%	187.573,20	0,2681%	38.229,61
3.0 - CONSERVAÇÃO	PS			0,0063%	896,00
4.0 - DRENAGEM	PS				
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	PS	1,1304%	161.183,44	0,3768%	53.727,82
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	PS				
7.0 - TAPA BURACO	PS				
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	PS	3,50%		1,19%	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		24,66%		25,85%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)					
FATURAMENTO SIMPLES			499.161,37		169.149,68
FATURAMENTO ACUMULADO			3.516.534,51		3.685.684,19
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		3,50%		1,19%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		24,66%		25,85%	
FATURAMENTO SIMPLES			499.161,37		169.149,68
FATURAMENTO ACUMULADO			3.516.534,51		3.685.684,19

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Obras:		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia: MT - 175		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Prazo: 1.610 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURI		Data Assinatura 01/08/2013			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação 02/04/2009			
INÍCIO: 05/08/2013		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
MÊS/ANO 01/07/15 a 31/07/2015		01/09/15 a 30/09/2015		01/11/15 a 30/11/2015	
TERMINO: 05/11/2016		736 / 757		31 / 818	
DIAS CORRIDOS		31 / 757		31 / 818	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	PS	1,9677%	280.359,41	2,0519%	292.574,51
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	PS	0,5400%	77.569,50	2,0982%	299.176,73
3.0 - CONSERVAÇÃO	PS			0,0171%	2.432,50
4.0 - DRENAGEM	PS				
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	PS	0,3257%	36.037,36	0,4941%	70.451,30
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	PS			1,5072%	214.911,25
7.0 - TAPA BURACO	PS				
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	PS				
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		2,51%		0,0722%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		34,30%		1,2383%	
FATURAMENTO SIMPLES			368.138,91		594.183,74
FATURAMENTO ACUMULADO			4.890.921,40		5.842.573,08
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		2,51%		0,0722%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		34,30%		1,2383%	
FATURAMENTO SIMPLES			368.138,91		594.183,74
FATURAMENTO ACUMULADO			4.890.921,40		5.842.573,08

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

SUBSTITUÍDO

Eng.º Arnaldo Carlos Tenora
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SACB/SINERA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA									
Obra: MT - 175									
Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU									
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01									
Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU									
Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72									
Prazo: 1.610 dias									
Data Assinatura: 01/08/2013									
Publicação: 02/04/2009									
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU									
Firma: Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda									
INICIO: 05/08/2013									
TERMINO: 05/11/2016									
MES/ANO	01/08/2013	31/12/2013	31 /	01/01/2014	31 /	01/02/2014	29 /	01/03/2014	31 /
DIAS CORRIDOS	874	905	31 /	934	965	31 /	995	30 /	995
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	-1,1860%	-159.107,27							
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	-0,0853%	-12.169,67							
3.0 - CONSERVAÇÃO	5,3853%	767.863,06							
4.0 - DRENAGEM									
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3768%	53.727,81							
7.0 - TAPA BURACO									
8.0 - PAVIMENTAÇÃO									
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Topo buraco									
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base									
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,49%								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	53,91%	640.313,93							
FATURAMENTO SIMPLES		7.687.498,12							
FATURAMENTO ACUMULADO									7.687.498,12
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,49%								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	53,91%	640.313,93							
FATURAMENTO SIMPLES		7.687.498,12							
FATURAMENTO ACUMULADO									7.687.498,12

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng.º Antônio Carlos Terena
 Fiscal Pontaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA									
Obra: MT - 175									
Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU									
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01									
Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU									
Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72									
Prazo: 1.610 dias									
Data Assinatura: 01/08/2013									
Publicação: 02/04/2009									
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU									
Firma: Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda									
INICIO: 05/08/2013									
TERMINO: 05/11/2016									
MES/ANO	01/08/2013	31/12/2013	31 /	01/01/2014	31 /	01/02/2014	29 /	01/03/2014	31 /
DIAS CORRIDOS	1.026	1.056	31 /	1.087	1.118	31 /	1.148	30 /	1.148
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO									
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,7459%	106.368,76							
3.0 - CONSERVAÇÃO									
4.0 - DRENAGEM									
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.0 - TAPA BURACO									
8.0 - PAVIMENTAÇÃO									
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por									
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base									
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,75%								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	54,66%	106.368,76							
FATURAMENTO SIMPLES		7.793.856,88							
FATURAMENTO ACUMULADO									668.320,46
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,75%								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	54,66%	106.368,76							
FATURAMENTO SIMPLES		7.793.856,88							
FATURAMENTO ACUMULADO									8.462.177,34

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng.º Antônio Carlos Terena
 Fiscal Pontaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA

Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.610 dias
 Sub-trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação: 02/04/2009
 ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU
 Início: 05/08/2013 a 31/10/16 01/11/16 a 31/01/17 01/02/17 a 28/02/17 01/03/17 a 31/03/17 01/04/17 a 30/04/17
 Término: 05/11/2016 31 / 1179 92 / 1.271 28 / 1.299 31 / 1.330 30 / 1.360
 DIAS CORRIDOS PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$

1.0 - PAVIMENTAÇÃO	PS	351.544,82							
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,4655%	8.019,56							
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0562%								
4.0 - DRENAGEM									
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.0 - TAPA BURACO									
8.0 - PAVIMENTAÇÃO									
Diferença Transporte de brita p/ PNF até usina (DMT=37,05km) por									
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base									
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	2,52%								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	64,92%	359.564,38							
FATURAMENTO SIMPLES									
FATURAMENTO ACUMULADO		9.256.732,58							9.256.732,58
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	2,52%								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	64,92%	359.564,38							
FATURAMENTO SIMPLES									
FATURAMENTO ACUMULADO		9.256.732,58							9.256.732,58

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA

Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.610 dias
 Sub-trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação: 02/04/2009
 ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU
 Início: 05/08/2013 a 31/10/16 01/11/16 a 31/01/17 01/02/17 a 28/02/17 01/03/17 a 31/03/17 01/04/17 a 30/04/17
 Término: 05/11/2016 31 / 1179 92 / 1.271 28 / 1.299 31 / 1.330 30 / 1.360
 DIAS CORRIDOS PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$

1.0 - PAVIMENTAÇÃO	PS	351.544,82							
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,4655%	8.019,56							
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0562%								
4.0 - DRENAGEM									
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.0 - TAPA BURACO									
8.0 - PAVIMENTAÇÃO									
Diferença Transporte de brita p/ PNF até usina (DMT=37,05km) por									
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base									
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	2,52%								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	64,92%	359.564,38							
FATURAMENTO SIMPLES									
FATURAMENTO ACUMULADO		9.256.732,58							9.256.732,58
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	2,52%								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	64,92%	359.564,38							
FATURAMENTO SIMPLES									
FATURAMENTO ACUMULADO		9.256.732,58							9.256.732,58

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Nº Contrato 41487		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72		
Obr.: MT - 175		Data Assinatura 02/04/2009		Prazo: 1.610 dias		
Rodovia: ENTR. BR - 174 (CACHO) - JAURO		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Planej. Cons. Ltda		
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 42767				
TÉRMINO: 05/11/2016		01/12/17 a 31/12/17		01/01/18 a 31/01/18		
SERVIÇO	MES/ANO	30 /	31 /	1.605	3 /	1.608
	DIAS CORRIDOS	PS	VALOR R\$	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,8798%	125.452,00	4,5618%	2,4997%	356.472,00
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,3950%	56.325,00	3,3844%	0,9275%	132.245,46
3.0 - CONSERVAÇÃO		0,0871%	12.432,00	0,0873%	0,3679%	52.452,00
4.0 - DRENAGEM		0,0880%	12.546,00	0,1084%	0,1019%	14.526,00
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				15.452,00	1,3323%	189.966,64
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES				51.242,00	0,7526%	107.455,63
7.0 - TAPA BURACO				107.455,63	0,3702%	54.088,11
8.0 - PAVIMENTAÇÃO				52.789,06	0,3702%	204.944,33
9.0 - PAVIMENTAÇÃO				407.576,13	1,4373%	
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,09km) por						
Fornecimento de brita - Complemento para reconfeção base						
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,45%			7,80%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		79,72%			100,00%	
FATURAMENTO SIMPLES			206.748,00			1.112.108,17
FATURAMENTO ACUMULADO			11.366.528,73			14.258.614,72
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,45%			7,80%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		79,72%			100,00%	
FATURAMENTO SIMPLES			806.748,00			1.846.193,64
FATURAMENTO ACUMULADO			10.474.978,31			14.258.614,72

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será o soma de PS
 03) P6A - Será o soma acumulada do P65

SUBSTITUÍDO

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA-MT 032890
 RN Nº. 1214204066

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
 R. nº 1216-4774-9



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO


CONTRATO:	IC nº 222/2013/00/00-SETPU
RODOVIA:	MT-175/MT-248
TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB-TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EMPRESA:	GEO SOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO:	Período medição: 01/09/17 a 30/09/17

MEDIÇÃO: Referência: 37ª (Trigésima Sétima) Medição provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANHÃ	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TARDE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NOITE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
MM																															

CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"



Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9

Local/Data: Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017

Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890

CPF: 1214204066

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

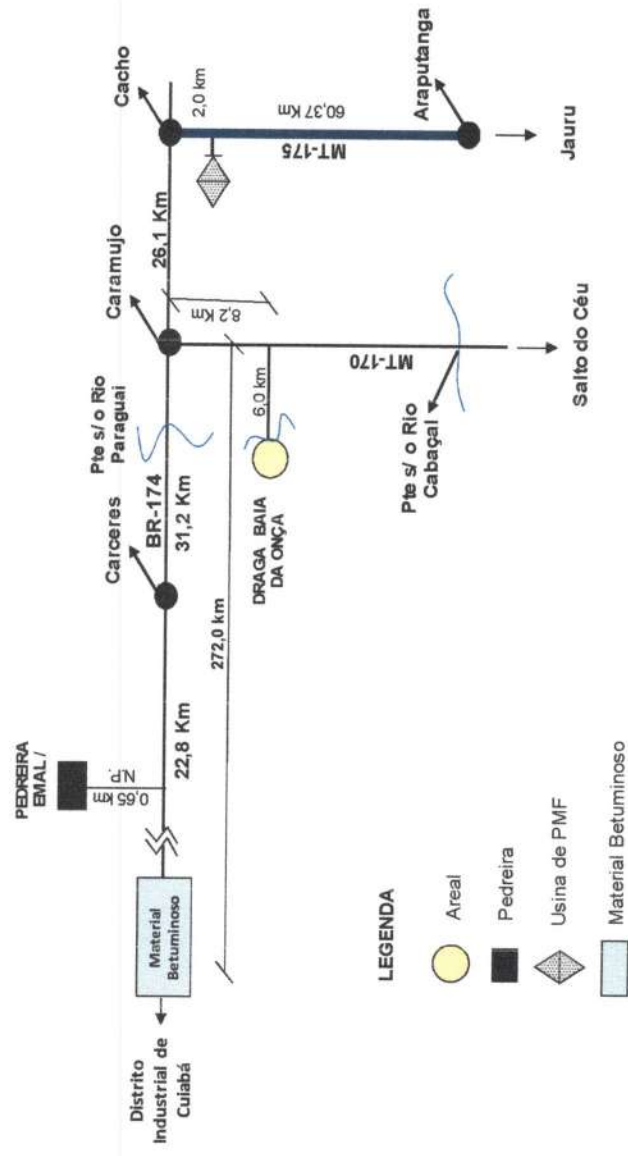

LEGENDA

- Areal
- Pedreira
- Usina de PMF
- Material Betuminoso

N.P. = NÃO PAVIMENTADO

	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU	
	Rodovia: MT-175	Trecho: : Entr. BR-174 (Cachço) – Jauru Sub-trecho : Entr. BR-174 (Cachço) - Araputanga Lote : 1

OBSERVAÇÕES:

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº. 124164774-9



Magnum

Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA-MT 032890
 RN Nº. 1214204066

Extensão: 62,37 km
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Referência: 37ª Medição provisória
 Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
 Ordem de Paralisação: 30/05/2014
 Referência: 37ª Medição provisória

ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
 MATRIZ DE SERVIÇOS
 MT 175/2017

SINFRA
 GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

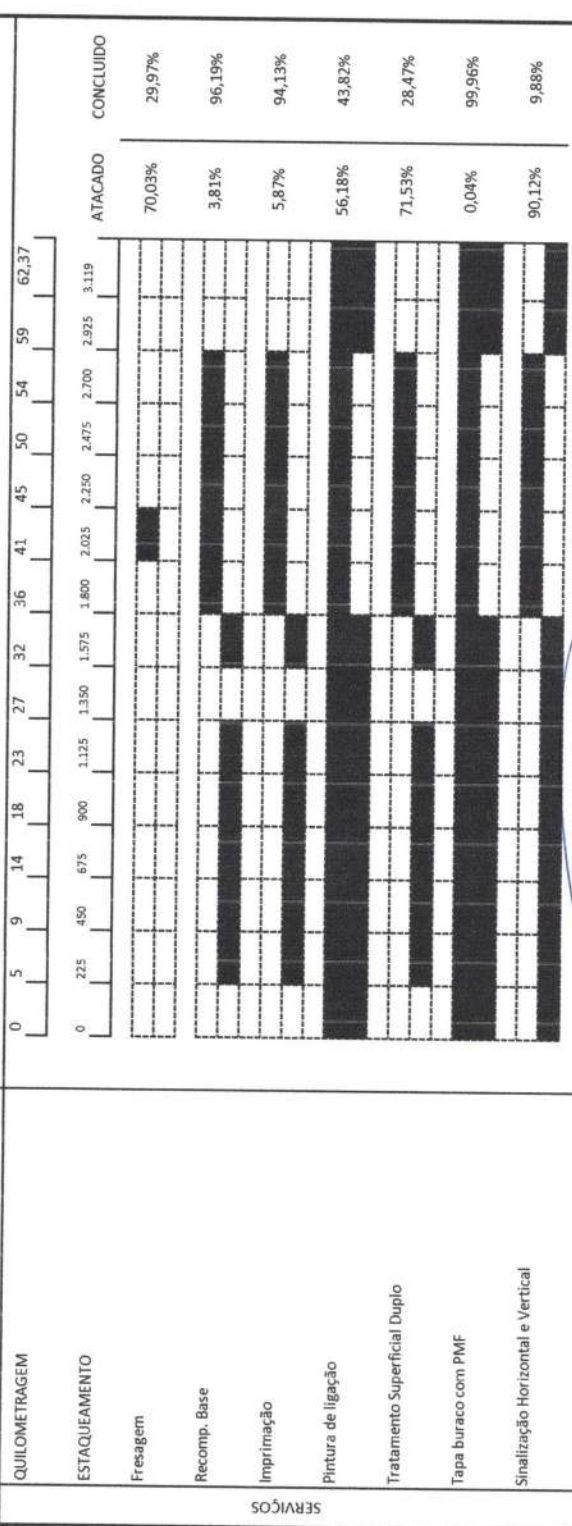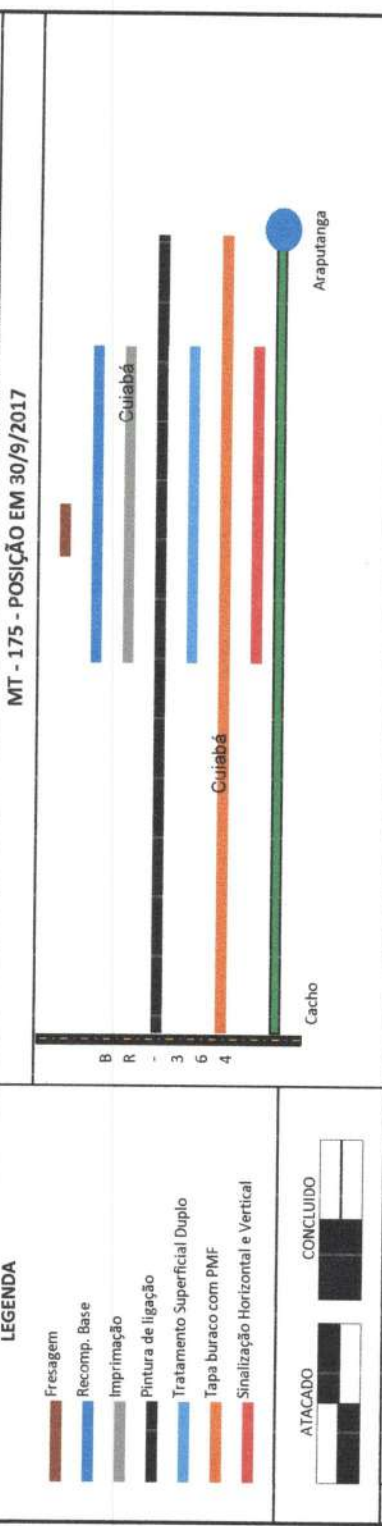

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2017

Magnum

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº. 121164774-9

Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA-MT 032890
 RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
RODOVIA: MT- 175 e MT-248
TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EXTENSÃO: 62,37
CONTRATO Nº.: 222/2013/00/00-SETPU
EMPRESA: GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO: 01/09/2017 à 30/09/2017



DIÁRIO DE OBRA

Protocolo/SINFRA

Folha: 31

Ass: *UGS*

N. DA FOLHA

2

DATA (dd/mm/aa)

02/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Reconfecção de Base LE - Est. 186 a Est.200

Serviços de Conservação

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN N°. 1214204066

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

3

DATA (dd/mm/aa)

03/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEO SOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - folga do pessoal

Eng° José Mura Junior
CREA 2601795043
ENG. DA CONSTRUTORA

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032896
RN N°. 1214204066

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

5

DATA (dd/mm/aa)

05/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de Imprimação LE - Est. 186 a Est.200

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Reconfecção de Base LD - Est. 200 a Est.272

Serviços de Conservação

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

Protocolo/SINFRA

Folha: 28

N. DA FOLHA ASS: 148

9

DATA (dd/mm/aa)

09/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - folga do pessoal

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN N°. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
11
DATA (dd/mm/aa)
11/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
------------	-----------------	----------------	---------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Execução de Imprimação LE - Est. 200 a Est.272

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Serviços de Conservação

Reconfeção de Base LD - Est. 430 a Est.480

<p>Engº José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA</p>	<p>Engº Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA</p>
--	---

Magnum G. de Freitas Oliveira
Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA-MT 032890
 RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

12

DATA (dd/mm/aa)

12/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Reconfeção de Base LD - Est. 349 a Est.378

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

[Linha de texto]

Engº José Mura Júnior
CREA 2601706043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum G. de Freitas Oliveira
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEO SOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de Imprimação LE - Est. 349 a Est.378

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Reconfeção de Base LD - Est. 480 a Est.520

Eng° José Mura Junior
CREA 2601708043
ENG. DA CONSTRUTORA

Magnum G. de Freitas Oliveira
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN N°. 1214204066

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

- Execução de Tratamento Superficial Duplo trevo - Est. 351 a Est.369
- Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378
- Recuperação Ambiental / Enleivamento - Est. 349 a Est.378
- Reconfeção de Base LD - Est. 580 a Est.630

Engº José Mura Junior
 CREA 2601705043
 ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
 Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA

Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA-MT 032890
 RN Nº. 1214204068



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de Tratamento Superficial Duplo trevo - Est. 351 a Est.369

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Serviços de Conservação

Reconfeção de Base LE - Est. 430 a Est.480

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

Protocolo/SINFRA

Folha: 49

Ass: UBS

N. DA FOLHA

20

DATA (dd/mm/aa)

20/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Serviços de Conservação

Recuperação Ambiental / Enleivamento - Est. 349 a Est.378

Reconfecção de Base LE - Est. 480 a Est.520

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
21
DATA (dd/mm/aa)
21/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Serviços de Conservação

Reconfecção de Base LE - Est. 520 a Est.560

Engº José Mura Junior
CREA 2601706043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum G. de Freitas Oliveira
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

Protocolo/SINFRA

Folha: 51

Ass: UAP

N. DA FOLHA

22

DATA (dd/mm/aa)

22/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Serviços de Conservação

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Recuperação Ambiental / Enleivamento - Est. 349 a Est.378

Reconfeção de Base LE - Est. 560 a Est.600

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN N°. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

Protocolo/SINFRA

Folha: 53

Ass: JAB

N. DA FOLHA

24

DATA (dd/mm/aa)

24/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades - folga do pessoal

Eng° José Mura Junior
CREA/2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN N°. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

25

DATA (dd/mm/aa)

25/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Aguardando Material Betuminoso

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Recuperação Ambiental / Enleivamento - Est. 349 a Est.378

Reconfecção de Base LE - Est. 600 a Est.630

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Serviços de Conservação

Recuperação Ambiental / Enleivamento - Est. 349 a Est.378

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Serviços de Conservação

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

Protocolo/SINFRA

Folha: 57

Ass: 018

N. DA FOLHA

28

DATA (dd/mm/aa)

28/09/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de Serviços de Drenagem - Est. 349 a Est.378

Recuperação Ambiental / Enleivamento - Est. 349 a Est.378

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Magnum G. de Fretas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA: 31

DATA (dd/mm/aa): 31/08/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Aguardando Material Betuminoso

Eng° José Mura Junior
 CREA 2601705043
 ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
 Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA

Magnum
 Magnum G. de Freitas Oliveira
 CREA-MT 032890
 RN Nº. 1214204066

Protocolo/SINFRA
Folha: 61
Ass: VAS


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contratada:	GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda.		
Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	Extensão: 62,37 km	Lote:	1




Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 41' 30,0"	MT-*175	IMPRIMAÇÃO
58º 05' 45,0"		

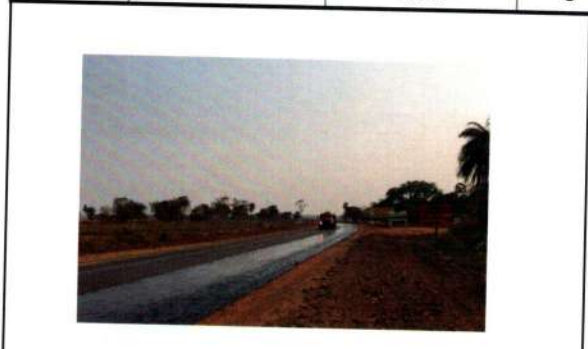


Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 40' 34,0"	MT-*175	TSD
58º 05' 19,0"		




Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 40' 35,0"	MT-175	TSD
58º 05' 20,0"		

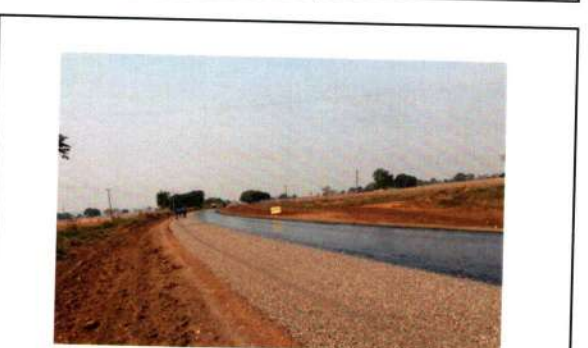

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 40' 35,0"	MT-175	TSD
58º 05' 20,0"		

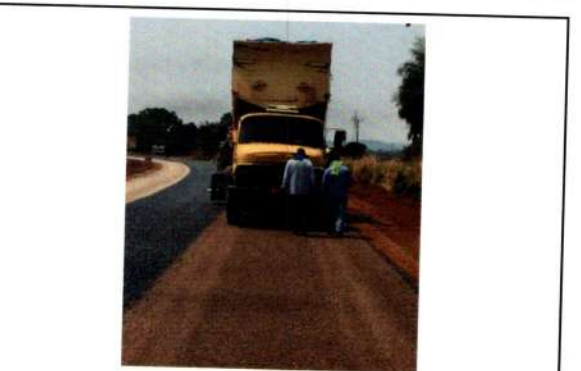

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 40' 52,0"	MT-*175	TSD
58º 05' 34,0"		

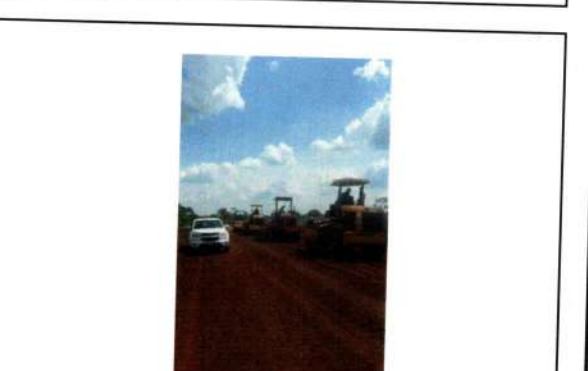

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 40' 35,0"	MT-*175	TSD
58º 05' 20,0"		

Local/Data: Cuiabá, 02 de outubro de 2017.

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN N.º. 1214204066

Eng.º Antônio Carlos Tehera
Fiscal Portaria N.º 018/2017/SAOB/SINFRA
RN n.º 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS


Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contratada:	GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda.		
Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	Extensão: 62,37 km	Lote:	1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 37' 37,0"	MT-*175	TAPA BURACO
58º 06' 57,0"		

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 37' 37,0"	MT-*175	TAPA BURACO
58º 06' 57,0"		

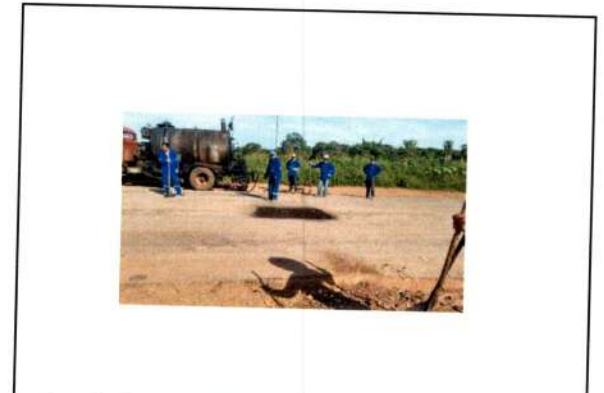

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 37' 37,0"	MT-175	TAPA BURACO
58º 06' 57,0"		

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 37' 37,0"	MT-175	TAPA BURACO
58º 06' 57,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 37' 37,0"	MT-*175	TAPA BURACO
58º 06' 57,0"		

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 37' 54,0"	MT-*175	TAPA BURACO
58º 12' 51,0"		

Local/Data: Cuiabá, 02 de outubro de 2017.

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1211204066

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contratada:	GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda.		
Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	Extensão: 62,37 km	Lote:	1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-*175	IMPRIMAÇÃO
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-*175	TSD
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-175	TSD
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-175	TSD c/ capa selante
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-*175	Imprimação
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-*175	TSD
58º 07' 04,0"		

Local/Data: Cuiabá, 02 de outubro de 2017.

Magnum
Magnum G. de Freitas Oliveira
CREA-MT 032890
RN Nº. 1214204066

Eng. Antônio Carlos Venuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9





Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.
Júlio Mangini Fernandes Neto
M.D. Superintendente de Controle e Execução de Obras. (SUCEO)
CUIABÁ/MT

Assunto: 37ª Medição Provisória.
Ref. I.C. Nº 222/2013

Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

Através do presente, encaminho a V.S.^a a 37ª Medição Provisória após conferencia técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 02 a 64.

Em 4 de dezembro de 2017.

Eng. Diogo Menezes Souza
Superintendente de Execução e Fiscalização.
SUEF I/SINFRA-MT

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
Rodovia: MT - 175 Data Assinatura 01/08/2013 Prazo: 1.610 dias
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação 02/04/2009 O. I. Serviço: 05/08/2013
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda
INICIO: 05/08/2013 01/09/13 a 31/08/2013 01/10/13 a 31/10/2013 01/11/13 a 30/11/2013 01/12/13 a 31/12/2013
TÉRMINO: 05/11/2016 27 / 27 30 / 57 31 / 88 30 / 118 31 / 149

SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO			1.8963%	270.391,12	1,2228%	174.359,62	1,2755%	181.868,74	0,7015%	100.027,81
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS			0,2206%	31.455,60	1,1845%	168.887,83	0,9367%	133.564,56	0,5152%	73.460,49
3.0 - CONSERVAÇÃO			1,5105%	215.381,17	0,0424%	6.050,56	0,2601%	37.081,84		
4.0 - DRENAGEM										
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	3,3913%	483.550,30	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,82	0,3768%	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO										
8.0 - PAVIMENTAÇÃO										
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	3,39%		4,00%		2,83%		2,85%		1,59%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	3,39%		7,40%		10,22%		13,07%		14,66%	
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		570.995,70		403.025,82		406.242,96		227.216,11
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.054.506,00		1.457.531,82		1.863.774,78		2.090.990,89
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	3,39%		4,00%		2,83%		2,85%		1,59%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	3,39%		7,40%		10,22%		13,07%		14,66%	
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		570.995,70		403.025,82		406.242,96		227.216,11
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.054.506,00		1.457.531,82		1.863.774,78		2.090.990,89

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P6S - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
Rodovia: MT - 175 Data Assinatura 01/08/2013 Prazo: 1.610 dias
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação 02/04/2009 Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU
INICIO: 05/08/2013 01/02/14 a 31/01/2014 01/03/14 a 31/03/2014 01/04/14 a 30/04/2014 01/05/14 a 31/05/2014
TÉRMINO: 05/11/2016 31 / 180 28 / 208 31 / 239 30 / 269 31 / 300

SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,6122%	87.296,99	0,3071%	43.785,19	0,4667%	66.543,17	0,7700%	109.797,06		
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,4496%	64.110,98	0,3686%	52.556,01	0,5655%	80.630,17	0,9475%	135.100,55		
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,1257%	17.923,07						
4.0 - DRENAGEM										
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,82	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO										
8.0 - PAVIMENTAÇÃO										
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	1,44%		1,18%		1,41%		2,09%		0,36%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	16,10%		17,28%		18,69%		20,78%		21,16%	
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		167.992,08		200.901,16		298.625,42		53.727,81
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75		2.665.019,91		2.963.645,33		3.017.373,14
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	1,44%		1,18%		1,41%		2,09%		0,36%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	16,10%		17,28%		18,69%		20,78%		21,16%	
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		167.992,08		200.901,16		298.625,42		53.727,81
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75		2.665.019,91		2.963.645,33		3.017.373,14

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P6S - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

North Oriani
 Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA											
Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72											
MT - 175 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.610 dias											
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação: 02/04/2009											
Sub-Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU											
Firma: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda											
MES/ANO 01/06/14 a 31/09/2014 01/10/14 a 04/05/2015 05/05/15 a 31/05/2015 07/06/15 a 30/06/2015											
DIAS CORRIDOS 122 / 422 185 / 638 27 / 665 30 / 695											
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,0548%	150.404,73	0,5351%	76.296,25	4,0918%	583.437,37	0,5351%	76.296,25	4,0918%	583.437,37	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	1,3155%	187.573,20	0,2681%	38.229,61	1,8491%	263.660,93	0,2681%	38.229,61	1,8491%	263.660,93	
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,0063%	896,00			0,0063%	896,00			
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,1304%	161.183,44	0,3768%	53.727,82			0,3768%	53.727,82			
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,50%		1,19%		5,94%		1,19%		5,94%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	24,66%		25,85%		31,79%		25,85%		31,79%		
FATURAMENTO SIMPLES											
FATURAMENTO ACUMULADO		499.161,37		169.149,68		847.098,30		169.149,68		847.098,30	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,50%	3.017.373,14	1,19%	3.516.534,51	5,94%	4.532.762,49	1,19%	3.516.534,51	5,94%	4.532.762,49	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	24,66%		25,85%		31,79%		25,85%		31,79%		
FATURAMENTO SIMPLES											
FATURAMENTO ACUMULADO		499.161,37		169.149,68		847.098,30		169.149,68		847.098,30	
FATURAMENTO ACUMULADO		3.017.373,14		3.516.534,51		4.532.762,49		3.516.534,51		4.532.762,49	
NOTAS											
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global											
02) P65 - Serd e soma do PS											
03) P6A - Serd e soma acumulada do P65											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA											
Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72											
MT - 175 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.610 dias											
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação: 02/04/2009											
Sub-Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU											
Firma: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda											
MES/ANO 01/07/15 a 31/07/2015 01/09/15 a 30/09/2015 01/10/15 a 31/10/2015 01/11/15 a 30/11/2015											
DIAS CORRIDOS 31 / 726 30 / 787 31 / 818 25 / 843											
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,9677%	280.569,41	2,0519%	292.574,51	1,9310%	275.336,97	2,0519%	292.574,51	1,9310%	275.336,97	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,5440%	77.569,50	0,6728%	95.928,76	2,0962%	299.176,73	0,6157%	299.176,73	0,6157%	299.176,73	
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,0171%	2.432,50	2,5903%	369.338,17	0,0171%	2.432,50	2,5903%	369.338,17	
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			0,2527%	36.037,36	0,4941%	70.454,30	0,2527%	36.037,36	0,4941%	70.454,30	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco											
Complemento de brita - Complemento para Reconstrução base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	2,51%		4,17%		8,45%		4,17%		8,45%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	34,30%		40,96%		49,42%		40,96%		49,42%		
FATURAMENTO SIMPLES		368.138,91		36.037,36		594.183,74		36.037,36		594.183,74	
FATURAMENTO ACUMULADO		4.890.921,40		5.248.389,34		5.842.573,08		5.248.389,34		5.842.573,08	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	2,51%		2,25%		4,17%		2,25%		4,17%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	34,30%		36,81%		40,96%		36,81%		40,96%		
FATURAMENTO SIMPLES		368.138,91		36.037,36		594.183,74		36.037,36		594.183,74	
FATURAMENTO ACUMULADO		4.890.921,40		5.248.389,34		5.842.573,08		5.248.389,34		5.842.573,08	
NOTAS											
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global											
02) P65 - Serd e soma do PS											
03) P6A - Serd e soma acumulada do P65											

Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda
 Eng. Antonio Carlos Teixeira
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 12164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA												
Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72												
Data Assinatura 01/08/2013 Prazo: 1.610 dias												
Publicação 02/04/2009												
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Fim: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda												
01/02/16 a 31/03/2016 01/03/16 a 31/03/2016 01/04/16 a 30/09/2016												
MÊS/ANO 31 / 874 31 / 905 29 / 934 31 / 965												
DIAS CORRIDOS PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$												
SERVIÇO												
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	-1,1860%	-169.107,27										
3.0 - CONSERVAÇÃO	-0,0853%	-12.165,67										
4.0 - DRENAGEM	5,3853%	767.965,06										
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,3768%	53.727,81										
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
7.0 - TAPA BURACO												
8.0 - PAVIMENTAÇÃO												
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco												
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base												
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,49%											
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64)	53,91%											53,91%
FATURAMENTO SIMPLES		640.313,93										
FATURAMENTO ACUMULADO		7.687.498,12										7.687.498,12
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,49%											
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64)	53,91%											53,91%
FATURAMENTO SIMPLES		640.313,93										
FATURAMENTO ACUMULADO		7.687.498,12										7.687.498,12

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) P65 - Será a soma do PS

03) P64 - Será a soma acumulada do P65

Naoto Otani
RN 1704394554
Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA												
Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72												
Data Assinatura 01/08/2013 Prazo: 1.610 dias												
Publicação 02/04/2009												
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Fim: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda												
01/05/16 a 31/05/2016 01/06/16 a 30/06/2016 01/07/16 a 31/07/2016 01/08/16 a 31/08/2016 01/09/16 a 30/09/2016												
MÊS/ANO 31 / 1.026 30 / 1.056 31 / 1.087 31 / 1.118												
DIAS CORRIDOS PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$												
SERVIÇO												
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS												
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,7459%	106.358,76										
4.0 - DRENAGEM												
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL												
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
7.0 - TAPA BURACO												
8.0 - PAVIMENTAÇÃO												
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) par												
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base												
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,79%											
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64)	54,66%											54,66%
FATURAMENTO SIMPLES		106.358,76										
FATURAMENTO ACUMULADO		7.793.856,88										7.793.856,88
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,79%											
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64)	54,66%											54,66%
FATURAMENTO SIMPLES		106.358,76										
FATURAMENTO ACUMULADO		7.793.856,88										7.793.856,88

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) P65 - Será a soma do PS

03) P64 - Será a soma acumulada do P65

Naoto Otani
RN 1704394554
Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 Início: 05/08/2013
 Término: 05/11/2016

Nº Contrato: IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Data Assinatura: 01/08/2013
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Prazo: 1.610 dias
 Firma: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda
 01/09/17 a 31/03/17
 01/04/17 a 30/04/17

SERVIÇO	PS	31 /	92 /	28 /	31 /	30 /	PS	31 /	30 /	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
10 - PAVIMENTAÇÃO													
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		2,2149%								315.815,33			
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,9358%								276.016,19			
4.0 - DRENAGEM													
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL													
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
7.0 - TAPA BURACO													
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,3672%								52.351,23			
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fomecimento de brita - Complemento para Reconfeção base													
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,52%											
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%											
FATURAMENTO SIMPLES										644.184,75			
FATURAMENTO ACUMULADO										9.541.352,95			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,52%											
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%											
FATURAMENTO SIMPLES										644.184,75			
FATURAMENTO ACUMULADO										9.541.352,95			
NOTAS													

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Naoto Otani
 RN 1704394954
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda
 Engº Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: MT - 175
 Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 Início: 05/11/2016
 Término: 05/11/2016

Nº Contrato: 41487
 Data Assinatura: 02/04/2009
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig.: 42767
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Prazo: 1.610 dias
 Firma: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda
 01/09/17 a 30/09/17
 01/10/17 a 31/10/17

SERVIÇO	PS	31 /	61 /	31 /	30 /	PS	31 /	30 /	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	
10 - PAVIMENTAÇÃO													
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		1,1653%							166.149,02	2.111,49%	301.057,39	125.562,00	
3.0 - CONSERVAÇÃO		0,0795%							11.338,00	0,1808%	25.776,92	125.452,00	
4.0 - DRENAGEM										2,1961%	313.134,58	25.623,00	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL													
6.0 - TREVO DE SONHO AZUL													
7.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES										3,2109%	457.825,18	10.254,00	
8.0 - TAPA BURACO													
9.0 - PAVIMENTAÇÃO													
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fomecimento de brita - Complemento para Reconfeção base													
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,24%								7,70%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%								75,86%			
FATURAMENTO SIMPLES										177.487,02			
FATURAMENTO ACUMULADO										9.718.839,97			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,24%											
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%											
FATURAMENTO SIMPLES										177.487,02			
FATURAMENTO ACUMULADO										9.925.083,62			
NOTAS													

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Naoto Otani
 RN 1704394954
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda
 Engº Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

GEOLOGIA ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Obra: MT - 175		Nº Contrato 41487		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72					
Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Data Assinatura 02/04/2009		Prazo: 1.610 dias					
Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng Plane Cons. Ltda					
Sub-trecho: MÉS/ANO		Processo Orig. 42767							
TERMINO: 05/11/2016		01/11/17 a 30/11/17		01/12/17 a 31/12/17		01/01/18 a 03/01/18			
SERVIÇO		PS / VALOR R\$ / 1.574		PS / VALOR R\$ / 1.605		PS / VALOR R\$ / 1.608			
DIAS CORRIDOS		PS / VALOR R\$ / 1.574		PS / VALOR R\$ / 1.605		PS / VALOR R\$ / 1.608			
10 - PAVIMENTAÇÃO		0,8798%	125.452,00	4,5618%	650.452,00	1,5089%	215.145,00		
20 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,39520%	56.325,00	3,3844%	482.562,00	0,5993%	85.452,00		
30 - CONSERVAÇÃO		0,0871%	12.425,00	0,0873%	12.425,00	0,3679%	52.452,00		
40 - DRENAGEM		0,0880%	12.546,00	0,1084%	15.452,00	0,8406%	119.853,36		
50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				0,3594%	51.242,00	0,4918%	70.125,00		
60 - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,7536%	107.455,63	0,1783%	25.425,00		
70 - TAPA BURACO				0,3702%	52.789,06	0,3793%	54.088,11		
80 - PAVIMENTAÇÃO				2,8585%	407.576,13	1,4373%	204.944,33		
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fornecedor de brita - Complemento para Reconfeccão base.									
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,45%		12,48%		5,80%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		81,71%		94,20%		100,00%			
FATURAMENTO SIMPLES			206.748,00		1.779.980,82		827.484,80		
FATURAMENTO ACUMULADO			11.651.149,10		13.431.129,92		14.258.614,72		
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,45%		12,48%		5,80%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		81,71%		94,20%		100,00%			
FATURAMENTO SIMPLES			206.748,00		1.938.472,77		1.560.543,27		
FATURAMENTO ACUMULADO			10.759.598,68		12.698.071,45		14.258.614,72		

NOTAS
 01) P5 - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Serd e soma do P5
 03) P6A - Serd e soma acumulada do P65

Nota:
 Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9
 Geosolo Eng Plane Cons Ltda

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contratada:	GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda.	
Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU	
Extensão:	Extensão: 62,37 km	Lote: 1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-175	Drenagem
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-175	Drenagem
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-175	Drenagem
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-175	Drenagem
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-175	Drenagem
58º 07' 04,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 11,5"	MT-175	Drenagem
58º 07' 04,0"		

Local/Data: Cuiabá, 02 de outubro de 2017.

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9



WWW.MT.GOV.BR
SUCEO/SINFRA
Fls. 72
Ass. ly

Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto, de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 37ª (Trigésima Sétima) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013


Através da presente, encaminho a V.S.ª 37ª (Trigésima Sétima) Medição Provisória, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

37ª (Trigésima Sétima) Medição Provisória..... R\$ 1.097.794,07

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 71

Em 15 de Dezembro de 2017.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT



IMPRIMIR

VOLTAR

Sector: SCEO/SINFRA

Fl. N°

73

Ass.:



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/11/2017 a 27/12/2017

Certificação Número: 2017112810284282463703

Informação obtida em 28/11/2017, às 11:04:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Sector: SCEO/SINFR.
Fl. Nº: 74
Ass.: C

Data: 07/12/2017 - 09:00:45

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0021014708****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **07/12/2017**Hora de emissão: **09:00:47**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **05/01/2018.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **22T229M2K7TMB2B2**

Página **1** de **2**

© Copyright 2001-2017 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:51:49 do dia 18/07/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2018.

Código de controle da certidão: **29A6.0D92.2EF9.046D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão n°: 137872061/2017
Expedição: 02/10/2017, às 08:11:32
Validade: 30/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.898.295/0001-28, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

- 0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
- 0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
- 0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
- 0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
- 0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 9.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

Selo: SCEO/SINFRA
FL. Nº. 38
Ass.:

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

07.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 24/10/2017

Responsável pela Expedição

Gekimar Joaquim de Jesus

Técnico PGE - Matr. 67478

Romes Júlio Tomaz

Procurador(a) do Estado

Romes Júlio Tomaz

Procurador do Estado

OAB-MT 3791

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: 9G7BPTYQBVNGYKZU79FTXT8HR21YMK

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Seigr. SCEO/SINFRA
Fl. N° 79
Ass.: [Signature]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 244242/2017	281941	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 262339	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250		
 07092017018982950001280010056524424261604517281941			
NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28	RG/INSCR. ESTADUAL		
ENDEREÇO Av. JARI GOMES, GOV, 10			
BAIRRO BOA ESPERANCA	FINALIDADE		

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

SUBSTITUÍDO

Cuiabá/MT, quinta-feira, 07 de setembro de 2017


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 06 de Dezembro de 2017.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT
SECRETARIA DE FAZENDA

ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO - MIRASSOL D OESTE

CNPJ: 03.755.477/0001-75

Certidão Negativa

Código de Cadastro

000058616

Contribuinte

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

Bairro

Cidade

GUIABA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

Número Complemento

10

CEP

78068480

UF

MT

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Municipal abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 16:00:03 do dia 27/10/2017

Válida até 25/01/2018

Código de Controle da Certidão/Número 936A7841B9E2C7E2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda

Rua Governador Jari Gomes, 10 - Boa Esperança
 CEP 78000-000 - Fone: (65)3627-6811 - Cuiabá - MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Setor: SCEQ/SINFR

Fl. Nº 81

Ass: C

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 18/12/2017 18:07:35	Código de Verificação de Autenticidade B7 B5 67	Número da Nota Fiscal 815
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço Edgard Prado Arze, Eng	Número 0	Complemento BLOCO DVOP	Bairro Centro Politico Administrativo	
CEP 78050-970	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail fransuise.17@hotmail.com	

Local dos Serviços

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

Referente a 37ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175
 Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1
 Conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
 Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA 1216-5
 CONTA CORRENTE: 8136-1
 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias		Alíquota 4,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.097.794,07	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 658.676,45	Base de Cálculo R\$ 439.117,62	Total do ISSQN R\$ 17.564,70	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 7.135,66	COFINS R\$ 32.933,82	INSS R\$ 12.075,73	IRRF R\$ 16.466,91	CSLL R\$ 10.977,94	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
----------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.018.204,01

Informações Complementares

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Engº. Antônio Carlos Tenuta
RNP N°. 121164774-9
Port. N°. ___/___/___ SINFRA



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda

Rua Governador Jari Gomes, 10 - Boa Esperança
CEP 78000-000 - Fone: (65)3627-6811 - Cuiabá - MT
Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Retor: SCEO/S
Fl. Nº. 82
Ass.:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 18/12/2017 18:07:35	Código de Verificação de Autenticidade B7 B5 67	Número da Nota Fiscal 815
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número 0	Complemento BLOCO DVOP	Bairro Centro Político Administrativo
CEP 78050-970	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone		e-mail fransuise.17@hotmail.com

Local dos Serviços

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

Referente a 37ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175
Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1
Conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1216-5
CONTA CORRENTE: 8136-1
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias		Alíquota 4,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.097.794,07	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 658.676,45	Base de Cálculo R\$ 439.117,62	Total do ISSQN R\$ 17.564,70	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 7.135,66	COFINS R\$ 32.933,82	INSS R\$ 12.075,73	IRRF R\$ 16.466,91	CSLL R\$ 10.977,94	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
----------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.018.204,01

Informações Complementares

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Eng.º Antônio Carlos Tenuta
RNP N.º 121164774-9
Port. N.º ____/____/____ SINFRA

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 83
C

Cuiabá, 18 de Dezembro de 2017.

À
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Nesta

Prezados Senhores,

Ref.: Contrato IC-222/2013/00/00
Restauração da Rodovia MT-175
Ass.: **DECLARAÇÃO**

Vimos pelo presente DECLARAR o compromisso de quitação do tributo de ISSQN junto à Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste em até 05 (cinco) dias após o pagamento por esta Secretaria da **Nota Fiscal nº 815**, referente à **37ª (trigésima sétima) Medição** de serviços da obra de Restauração da Rodovia MT-175, objeto do contrato IC-222/2013/00/00-SINFRA, e DECLARAR o compromisso do envio de cópia das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento à Secretaria.

nos mui

Sem mais para o momento, subscrevemo-

Cordialmente

GEOSOLO/ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.
CNPJ: 01.896.296/0001-26

José Mura Junior
CREA Nº. 2001705043

Gs Geosolo
ENGENHARIA PLANEJAMENTO
E CONSULTORIA LTDA.
Desde 1986



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE **Secretaria Adjunta de Obras**

DESTINATÁRIO **Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS**

Nº da Solicitação	1.372/2017	Data	18/12/2017
-------------------	------------	------	------------

Nome do credor	GEOSOLO ENG. PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA		
Processo nº	635564/2017		
Número do I.C.	222/2013		
Referência	37ª Medição		

Valor do contrato	R\$	14.258.614,72
Pago até esta data	R\$	9.718.839,97
Saldo do contrato	R\$	4.539.774,75

Valor desta programação	Nota de Empenho	Fonte
R\$ 1.097.794,07	17.000.445-1	137
R\$ 1.097.794,07		

Saldo atualizado do IC	R\$	3.441.980,68
------------------------	-----	--------------

SUBSTITUÍDO

Observações Referente ao serviço de rodovia pavimentada, na rodovia MT-175/248, trecho: Entrº BR-174 (Cacho) - Jauru.

ELABORADO

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Autorizado

ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

A Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Em análise ao processo, autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.

Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

SUBSTITUÍDO



ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 635564/2017 Contrato nº: 222/2013

Vigência: _____ Empresa Contratada: Geodo

Resumo do Objeto: Referente a 37ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentada Mídia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

[Handwritten Signature]

Assinatura do responsável pelo preenchimento
Silvia Pereira de Almeida
Assessor Técnico III
SINFRA/MT



TRÂMITE DE PROCESSO

SAOB/SINFRA

Folha nº 86

Ass.

PROTOCOLO Nº	635564
EXERCÍCIO	2017
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

Manoel Jorge Axxar de Saboia Campos
Assessor de Planejamento e Gestão
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

Folha nº

87

Ass.

F

CADASTRO IC 222-13

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

21 de dezembro de 2017 10:12

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, CGFO - Coordenadoria de Gestão Financeira das Obras <cgfo@sefaz.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, LIDIANE DE SOUZA CALAZANS <lidianecalazans@sinfra.mt.gov.br>, Jessica Carolina Borges Bastos <jessicabastos@sinfra.mt.gov.br>
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>

Bom dia,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: **2003.00078-3**NOME DO CREDOR: **Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda**CPF/CNPJ: **01.898.295/0001-28**IC: **222/2013 - 37º Medição Provisória e Reajustamento**SUBCONTA: **218**EMPENHO: **25101000117000445-1**PROCESSO: **635564/2017 e 635567/2017**

--

Att,

Fabio Yamamura Bueno

CGEO - Coordenadoria de Gestão do GEO-OBRAS

SINFRA - MT

(65) 3613-6718

**MT-175 Lote 1 - 37ª planilha nova 1312.xlsx**
2020K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato N°: 222 - Ano: 2013



GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

Obra/Serviço

Contrato N°/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

BEM PÚBLICO: Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho)- Jauru; Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT-175 / MT-248

Bairro: Trecho: Entr BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entr BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

Inclusão: 18/09/2013

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga

Origem de Recursos

Origem: Federal

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012 Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013 Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75"

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Montechi Vitorio

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Nome: ART FISC 2.pdf

Descrição: ART FISC 2

Nome: ART FISC 1.pdf

Descrição: ART FISC 1

Tamanho: 576,1 KB

Tamanho: 889,2 KB



Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA

Tamanho: 111.6 KB

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2

Tamanho: 679.3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 921.7 KB

Inclusão: 24/09/2013

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/10/2014

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Descrição: O.P

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / V/Inc.: 66219 (Cód: 66220)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 135.963,88

Inclusão: 25/11/2015

Data da Medição: 03/11/2015

Observação: 17º Medição Reajustamento

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / V/Inc.: 54960 (Cód: 54961)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 4.029,58

Inclusão: 08/07/2014

Data da Medição: 02/06/2014

Observação: 10º Medição Reajustamento

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10º Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 50420 (Cód: 54302)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 21.638,25

Inclusão: 08/06/2014

Data da Medição: 30/04/2014

Observação: 3º Medição Reajustamento

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód.: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód.: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód.: 66999)

Data da Medição: 01/12/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 18ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18ª Medição Reajustamento

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód.: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód.: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód.: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód.: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód.: 63761)

Data da Medição: 01/07/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód.: 64890)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód.: 64357)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 83503 (Cód.: 83504)

Data da Medição: 01/08/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 36ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 44.655,73

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajuste 36ª Medição.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.3 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 72451 (Cód.: 72790)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 24ª Medição Reajuste

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 84857 (Cód.: 84858)

Data da Medição: 02/10/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 37ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 299.421,82

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Inclusão: 21/12/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 37ª medição reaj.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 21/12/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 78734 (Cód.: 78735)

Data da Medição: 01/11/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 29ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 252.619,73

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 29ª Med Reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 76129 (Cód.: 76372)

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 28ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 187.167,90

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 28ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 28ª Medição reajuste

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 76127 (Cód.: 76371)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 27ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 141.460,20

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 05/12/2016

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 27º Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 27º Medição reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / V/Inc.: 69024 (Cód: 69025)

Data da Medição: 05/01/2016
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19º Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19º Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / V/Inc.: 53205 (Cód: 54304)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xlsx
Descrição: 5º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 66217 (Cód: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.083,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / V/Inc.: 54815 (Cód: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xlsx
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48847)

Data da Medição: 05/09/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xlsx
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49521)

Data da Medição: 07/10/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xlsx
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3º Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xlsx
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4º Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014



Medição da Obra/Serviço

Documentos da Medição		Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls		Tamanho: 2.0 MB		Inclusão: 06/05/2014	
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 4ª Medição					
Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)		Valor: R\$ 227.216,11		Período: 01/12/2013 a 31/12/2013		Inclusão: 06/05/2014	
Data da Medição: 09/01/2014		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Observação: 5ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls		Tamanho: 2.0 MB		Inclusão: 06/05/2014	
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 5ª Medição					
Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)		Valor: R\$ 205.135,78		Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		Inclusão: 07/05/2014	
Data da Medição: 10/02/2014		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Observação: 6ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls		Tamanho: 2.0 MB		Inclusão: 07/05/2014	
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 6ª Medição					
Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54816)		Valor: R\$ 167.992,08		Período: 01/02/2014 a 28/02/2014		Inclusão: 02/07/2014	
Data da Medição: 10/03/2014		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Observação: 7ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls		Tamanho: 2.0 MB		Inclusão: 02/07/2014	
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 7ª Medição					
Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)		Valor: R\$ 200.901,16		Período: 01/03/2014 a 31/03/2014		Inclusão: 02/07/2014	
Data da Medição: 10/04/2014		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Observação: 8ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls		Tamanho: 2.1 MB		Inclusão: 02/07/2014	
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 8ª Medição					
Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)		Valor: R\$ 298.625,42		Período: 01/04/2014 a 30/04/2014		Inclusão: 02/07/2014	
Data da Medição: 12/05/2014		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Observação: 9ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls		Tamanho: 2.0 MB		Inclusão: 02/07/2014	
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 9ª Medição					
Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)		Valor: R\$ 53.727,81		Período: 01/05/2014 a 31/05/2014		Inclusão: 08/07/2014	
Data da Medição: 02/06/2014		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Observação: 10ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls		Tamanho: 2.0 MB		Inclusão: 08/07/2014	
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 10ª Medição Provisória					
Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)		Valor: R\$ 499.161,37		Período: 01/10/2014 a 31/10/2014		Inclusão: 06/11/2014	
Data da Medição: 03/11/2014		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Observação: 11ª Medição Provisória			
Documentos da Medição		Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls		Tamanho: 2.0 MB		Inclusão: 06/11/2014	
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 11ª MEDIÇÃO					
Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)		Valor: R\$ 169.149,68		Período: 05/05/2015 a 31/05/2015		Inclusão: 11/06/2015	
Data da Medição: 01/06/2015		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Observação: 12ª Medição Provisória			

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13ª Medição Provisória

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 36.037,36

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1,4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 594.183,74

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1,4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66997)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.204.611,11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição.xlsx
Descrição: 18ª Medição

Tamanho: 1,5 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Revisora

Valor: R\$ 640.313,93

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx
Descrição: 19ª Medição

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 25/07/2016



Medição da Obra/Serviço

Documentos da Medição
Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx
Descrição: 20ª Medição
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)
Data da Medição: 01/03/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição
Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx
Descrição: 21ª Medição Provisória
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)
Data da Medição: 01/04/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição
Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx
Descrição: 22ª Medição
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)
Data da Medição: 02/05/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição
Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx
Descrição: 23ª Medição
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)
Data da Medição: 01/06/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24ª Medição Provisória
Valor: R\$ 106.358,76
Período: 01/05/2016 a 31/05/2016
Inclusão: 28/07/2016

Documentos da Medição
Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 24ª Medição.xlsx
Descrição: 24ª Medição
Tamanho: 2.5 MB
Inclusão: 28/07/2016

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 76124)
Data da Medição: 04/07/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 25ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016
Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição
Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 25ª Medição.xlsx
Descrição: 25ª Medição
Tamanho: 2.5 MB
Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 76126)
Data da Medição: 01/08/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 26ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/07/2016 a 31/07/2016
Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição
Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 26ª Medição.xls
Descrição: 26ª Medição
Tamanho: 3.1 MB
Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 76127)
Data da Medição: 05/09/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 27ª Medição Provisória
Valor: R\$ 668.320,46
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição
Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 27ª Medição.xlsx
Descrição: 27ª Medição
Tamanho: 2.7 MB
Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 76129)
Data da Medição: 04/10/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 28ª Medição Provisória
Valor: R\$ 434.990,86
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016
Inclusão: 29/11/2016

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 28ª Medição.xlsx
Descrição: 28ª Medição

Tamanho: 1,7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 28 (Cód.: 78734)

Data da Medição: 01/11/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 29ª Medição Provisória

Valor: R\$ 644.184,75

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 29ª Med.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 22/03/2017

Nº Medição: MPI / 30 (Cód.: 83497)

Data da Medição: 02/02/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 30ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/11/2016 a 31/01/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 30ª Medição OK.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2,5 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 31 (Cód.: 83498)

Data da Medição: 01/03/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 31ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 31ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4,0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 32 (Cód.: 83499)

Data da Medição: 03/04/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 32ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 33ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4,0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 33 (Cód.: 83500)

Data da Medição: 01/05/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 33ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 33ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4,0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 34 (Cód.: 83501)

Data da Medição: 01/06/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 34ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 34ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4,0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 35 (Cód.: 83502)

Data da Medição: 03/07/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 35ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 35ª ok.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2,4 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 36 (Cód.: 83503)

Data da Medição: 01/08/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 36ª Medição Provisória

Valor: R\$ 177.487,02

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Inclusão: 01/11/2017



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 36º med.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 37 (Cod: 84857)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 37º Medição Provisória

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Inclusão: 21/12/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 37º medição.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 21/12/2017

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 06/2017	Prazo Ex. Aditado (dias):	0	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 367.099,17	Srv. Extracontratuais:	-R\$ 367.099,17	Inclusão: 21/08/2017
Nº/Ano: 05/2017	Prazo Ex. Aditado (dias):	421	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Inclusão: 06/04/2017
Nº/Ano: 04/2016	Prazo Ex. Aditado (dias):	178	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Inclusão: 05/07/2016
Nº/Ano: 03/2015	Prazo Ex. Aditado (dias):	0	Srv. Acrescidos:	R\$ 2.918.335,05	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 2.918.335,05	Inclusão: 01/12/2015
Nº/Ano: 02/2015	Prazo Ex. Aditado (dias):	341	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Inclusão: 01/12/2015
Nº/Ano: 01/2014	Prazo Ex. Aditado (dias):	483	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Inclusão: 14/07/2015

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 10.816.634,04
Valor Total Aditado:	R\$ 2.551.235,88	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 14.258.614,72	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 10.816.634,04	Valor Total Executado:	R\$ 10.816.634,04
Valor Total Realjustes:	R\$ 1.703.769,97		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	1476
Prazo Execução Total Aditado (dias):	1423	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final (dias):	1783		



DESPACHO

À

Sr.ª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica.


Assunto: Medição inserida no GEO-OBRAS

Encaminho o processo de medição de obras devidamente inserido no Sistema Geo-Obras, assim como o espelho do e-mail enviado a SEFAZ/MT para cadastro.
Atenciosamente,

Fabio Yamamura Bueno
Coordenador de Gestão de Geo-Obras

SINFRA/MT

COORDENADOR – GEO-OBRAS/SINFRA





Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

SAUS/SINFRA
Fis. 94
Ass.: 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

252843/2017

292090

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



07122017018982950001280010056525284363165917292090

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 07 de dezembro de 2017


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 07 de Março de 2018.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



PROC N°: _____ 635564/2017 _____

FLS.: 95 _____ - _____ - _____

DATA.: 21 / 12 / 2017

À
COFIN,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo,
AUTORIZO pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

Prefeitura Cuiabá
Prefeitura Mirassol
SEFAZ – MT
PGE
Receita Federal
Caixa Econômica
Trabalhista

- folha 94
- folha 80
- folha 74
- folha 78
- folha 75
- folha 73
- folha 76/77

VENCIMENTO

07/03/2018
25/01/2018
05/01/2018
24/01/2018
14/01/2018
27/12/2017
30/03/2018

ISSQN

Com relação a guia de ISSQN convém lembrar que a empresa tem até o mês subsequente para cumprimento da obrigação, considerando que a referência inicial é estabelecida pela data de emissão da nota fiscal, ou seja: **18/12/2017**, a empresa tem até o mês **JANEIRO/2018** para cumprimento da obrigação.

Diante do exposto AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN quitado ao processo.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Secretário adjunto de Administração Sistêmica
em Substituição/SINFRA

RETENÇÕES / PROCESSO		635564/2017	
Número da Nota Fiscal/DANFE		815-	
Valor da Nota Fiscal			R\$ 1.097.794,07
Emissão Nota Fiscal		18/12/2017	
Credor		GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	
Cálculo do Imposto de Renda			
Valor Tributável			1.097.794,07
			1,50%
Valor da Retenção			R\$ 16.466,91
Cálculo do ISS / CUIABÁ			
Valor Tributável (Base de Cálculo)			
Percentual			5,00%
Valor da Retenção			R\$ 0,00
Cálculo do INSS			
Valor Tributável			109.779,40
Percentual			11,00%
Valor da Retenção			R\$ 12.075,73
Valor líquido da NF-E			R\$ 1.069.251,42
C-MT			
	26/12/2017		

96
 Nome
 Ass

T. S. M.



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.17.001787-1
Data do Doctº: 26/12/2017		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral		
Nº PED: 25101.0001.17.000489-6	Nº EMP: 25101.0001.17.000445-1	Nº ELI: 25101.0001.17.006551-3
Nº Protocolo: 56637/2014	Nº NOBLIST: *** ** *	Nº DOTLIST: *** ** *
Grupo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.137.1.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
9.09	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	1.097.794,07	Bens de Uso Comum do Povo

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº do Doctº Fiscal: 815	Data de Emissão: 18/12/2017
Código do Credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda	
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres/MT	
Histórico: PROCESSO 635564/2017, IC 222/2013, referente 37º medição periodo 01/09/17 á 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 95), NF 815		
Valor da Aquisição: *** 1.097.794,07	UM MILHÃO E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS *****	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDACÃO		25101.0001.17.006665-4
Nº EMP: 25101.0001.17.000445-1			Data do Doctº: 26/12/2017	
Nº PED: 25101.0001.17.000489-6			Data de pagamento: 26/12/2017	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.137.1.1
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
EX: *** **				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03643.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042719-8
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042719-8			Valor Liquidação: *** 1.097.794,07	
UM MILHÃO E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS *** **				
Histórico: PROCESSO 635564/2017, IC 222/2013, referente 37º medição periodo 01/09/17 á 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 95), NF 815				
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 56637/2014
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 4.791.243,00	*** 1.397.215,89	*** 1.097.794,07	*** 299.421,82

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDACÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 4.791.243,00	*** 1.397.215,89	*** 1.097.794,07	*** 299.421,82



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.17.006665-4
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 16.466,91	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 12.075,73	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 1.069.251,43	UM MILHÃO E SESENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *****
---	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 1.097.794,07
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.097.794,07
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 12.075,73
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 16.466,91
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 28.542,64



Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

DESPACHO

À SUCEO,

Encaminho o processo por solicitação.

Atenciosamente,

FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA





Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 100

MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE **Secretaria Adjunta de Obras**

DESTINATÁRIO **Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS**

Nº da Solicitação	061/2018	Data	20/02/2018
-------------------	----------	------	------------

Nome do credor	GEOSOLO ENG. PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA
Processo nº	635564/2017
Número do I.C.	222/2013
Referência	37ª Medição

Valor do contrato	R\$	14.258.614,72
Pago até esta data	R\$	9.718.839,97
Saldo do contrato	R\$	4.539.774,75

Valor desta programação	Nota de Empenho	Fonte
R\$ 1.097.794,07	18.000.005-8	151
R\$ 1.097.794,07		

Saldo atualizado do IC	R\$	3.441.980,68
------------------------	-----	--------------



Observações Referente ao serviço de rodovia pavimentada, na rodovia MT-175/248, trecho: Entrº BR-174 (Cacho) - Jauru.

ELABORADO

[Signature]

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Autorizado

[Signature]

ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

A Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Em análise ao processo, autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.

[Signature]

Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Agência Setor Público Cuiabá/ADMIN - 0019/2018
Cuiabá(MT), 02 Fevereiro de 2018.

Senhor Secretário,

Em referência a operação de crédito nº 20/00013-8 Restauração, Revitalização e Pavimentação de Rodovias Pavimentadas, vimos por meio desta, tratar a solicitação de análise da restituição de capital solicitada através do ofício 023/2018/UCF/SATIC/SINFRA, o qual informamos estar conforme.


Também informamos que para a unidade gestora de código 0003 o fundo é o nº 69 BB CP ADMINISTRATIVO ABSOLUTO.

Vale frisar novamente quanto ao procedimento operacional/contábil que deverá ser adotada por essa secretária o qual orientamos:

- 1- Concentrar a emissão de Ordem Bancária em determinado período temporal. Exemplo: Do dia 1º ao 15º será emitido apenas OBs relativo ao processo de Restituição.
- 2- Esta secretária deverá comunicar EXPRESSAMENTE ao banco em qual período utilizará o capital da restituição, para que possamos desvincular o saldo da aplicação com resgate automático do fundo nº 71 BB CP ADMINISTRATIVO DIFERENCIADO (aplicação original da operação) e vincular ao fundo nº 69 BB CP ADMINISTRATIVO ABSOLUTO o qual esta aplicado o saldo da restituição SEM RESGATE AUTOMÁTICO.
- 3- Deverão ser utilizados para emissão das Ordens Bancárias a seguinte UG/GESTÃO 25101/ 0003.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL
Ag. 3834-2 - Setor Público Cuiabá-MT


Wheên Gonçalo de Arruda Leite
Gerente Geral

Ilmo Sr.

MARCELO DUARTE MONTEIRO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Governo do Estado de Mato Grosso



PROCESSO Nº. 635564/2017

DATA: 20/02/2018

Ilma. Senhora,

MARCIANE PREVEDELLO CURVO

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica – SAADS

Senhora Secretária,

Considerando que a medição de serviços objeto do presente processo de pagamento encontra-se liquidada a pagar e devidamente inscrita em restos a pagar processados, relativo ao exercício financeiro de 2017;

Considerando o Ofício 0019/2018 à folha 101, emitido pela Agência Setor Público Cuiabá/ADMIN do BANCO DO BRASIL, o qual aprova a solicitação de restituição de capital da operação de crédito nº 20/00013-8 – Restauração e Pavimentação de Rodovias, no valor de R\$ 7.577.980,86 (sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos);

Considerando a solicitação e efetiva emissão de nova nota de empenho, em conformidade com, dentre outras, a orientação do BANCO DO BRASIL para utilização dos recursos liberados: "*deverão ser utilizados para emissão de Ordens Bancárias a seguinte UG/GESTÃO 25101/0003*".

A Secretaria Adjunta de Obras vem, respeitosamente, à vossa presença, solicitar (1) o estorno da nota de liquidação da despesa inscrita em restos a pagar e seu respectivo saldo de empenho e o (2) pagamento dessa mesma despesa mediante a indicação de nova nota de empenho, conforme a programação de pagamento à folha 100.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, reiterando os protestos de elevada estima e consideração e nos colocando à inteira disposição para esclarecer eventuais dúvidas.


Eng. Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB

J

COFILU,

Restituo os autos com novas
certidões atualizadas e nova
programação para cumprimento do
despacho volume 95.


Esg.ª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistemas/SINFA



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0003.18.000002-5
-----	--------------------------------	------------------------

Data do Doctº: 21/02/2018		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0003 - SINFRA - Recomposição de Capital		
Nº PED: 25101.0003.18.000005-6	Nº EMP: 25101.0003.18.000005-8	Nº ELI: 25101.0003.18.000002-5
Nº Protocolo: 56637/2014	Nº NOBLIST: *****	Nº DOTLIST: *****
Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0003.26.782.338.1289.0700.449000000.151.1.1		
Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Elemento de Despesa de Exercícios Anteriores: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
9.09	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	1.097.794,07	Bens de Uso Comum do Povo

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº do Doctº Fiscal: 815	Data de Emissão: 18/12/2017
Código do Credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda	
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres/MT	
Histórico: PROCESSO 635564/2017, IC 222/2013, referente 37º medição período 01/09/2017 á 30/09/2017, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 102), NF 815		
Valor da Aquisição: *** 1.097.794,07	UM MILHÃO E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS *****	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZCOFIN/SINFRA
Fls. 804
Ass: 9**ESTORNADO**
25101.0001.18.000326-8
ESTORNADO

LIQ		LIQUIDAÇÃO	
Nº EMP: 25101.0001.17.000445-1		Data do Doctº: 14/03/2018	
Nº PED: 25101.0001.17.000489-6		Data de pagamento: 02/01/2018	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística			
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral			
Data de Liberação: 26/12/2017		Liberador de Pagamento: Jefferson Marcos Delgado da Silva	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.137.1.1
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
NEX:*** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03643.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042719-8
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042719-8		Valor Liquidação: *** 1.097.794,07	UM MILHÃO E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS *** **

ESTORNADO

Histórico:
CONFORME SOLICITADA PELA SALOG/SINFRA PAG 58, informe que a referido pagamento foi EFETIVADA pela LIQ 25101000318000002-2 . E NOB 25101000318000021-3

Código do credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres - MT	Nº Processo de Pagamento 56637/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1			

ESTORNADO**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

ESTORNADO**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 4.791.243,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.397.215,89	Esta liquidação (R\$) *** 1.097.794,07	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 299.421,82
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 4.791.243,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.397.215,89	Esta liquidação (R\$) *** 1.097.794,07	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 299.421,82
---	--	--	--



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.18.000326-8	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 16.466,91	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** * * * * *			
INSS (R\$): *** 12.075,73	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: Documento de Estorno Nº Documento Estornado: 25101.0001.17.006665-4					
Valor Líquido: *** 1.069.251,43		UM MILHÃO E SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS * * * * * * * * * *			



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0003.18.000002-8	
Nº EMP: 25101.0003.18.000005-8			Data do Doctº: 21/02/2018		
Nº PED: 25101.0003.18.000005-6			Data de pagamento: 21/02/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0003 SINFRA - Recomposição de Capital					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0003.26.782.338.1289.0700.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Elemento - Exercícios Anteriores: 51 - OBRAS E INSTALACOES		
NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03290.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042666-3	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042666-3			Valor Liquidação: *** 1.097.794,07		UM MILHÃO E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS *** **
Histórico: PROCESSO 635564/2017, IC 222/2013, referente 37º medição periodo 01/09/2017 á 30/09/2017, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 102), NF 815					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 56637/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1					

DADOS DA DIÁRIA	
DIAS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: 25101000000022213	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.097.794,07	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.097.794,07	Esta liquidação (R\$) *** 1.097.794,07	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.097.794,07	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.097.794,07	Esta liquidação (R\$) *** 1.097.794,07	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0003.18.000002-8
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 16.466,91	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** * * * * *
INSS (R\$): *** 12.075,73	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 1.069.251,43	UM MILHÃO E SESENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS * * * * * * * * * *
---	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.92.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 1.097.794,07
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.097.794,07
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 12.075,73
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 16.466,91
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 28.542,64



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0003.18.000021-3
Data de Emissão: 22/02/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0003 - SINFRA - Recomposição de Capital		
Código Bancário: 03290.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042666-3	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres MT	
Nº EMP: 25101.0003.18.000005-8	Fonte de Recurso: 151	
LIQ: 25101.0003.18.000002-8		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014	Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1	Valor da Operação (R\$): *** 1.069.251,43	Valor por Extenso: UM MILHÃO E SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 006900 - Marciane Brevadello Curvo ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 21022018 153648	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL					
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2018	22 - DATA VENCTO. 21/03/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/85.124.212-05
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA				25 - CÓDIGO 9377	26 - VALOR 16.466,91
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Processo635564/2017, IC 222/2013, referente à NF 815. Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00
				MULTA	28 - VALOR 0,00
				JUROS	29 - VALOR 0,00
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 16.466,91
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85810000164-8 66910123201-8 80321937700-1 08512421205-0



Via Arrecadação

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 21022018 153648	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL					
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2018	22 - DATA VENCTO. 21/03/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/85.124.212-05
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA				25 - CÓDIGO 9377	26 - VALOR 16.466,91
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Processo635564/2017, IC 222/2013, referente à NF 815. Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00
				MULTA	28 - VALOR 0,00
				JUROS	29 - VALOR 0,00
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 16.466,91
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85810000164-8 66910123201-8 80321937700-1 08512421205-0



Via Contribuinte

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZCOFIN/SINFRA
Fls. 108
9

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0003.18.000025-6
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 22/02/2018

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0003 - SINFRA - Recomposição de Capital

Código Bancário:

03290.00000

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001042666-3

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3.

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

EMP: 25101.0003.18.000005-8

Fonte de Recurso: 151

LIQ: 25101.0003.18.000002-8

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R\$):


*** 16.466,91

Valor por Extenso:

DEZESSEIS MIL E
QUATROCENTOS E
SESSENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E UM CENTAVOS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO



 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)



 006900 - Marciane Brevedello Curvo
 ORDENADOR DE DESPESA


Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil**DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO**

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858100001648669101232018803219377001085124212050	*** **	23/03/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
16.466,91		dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		22013FCF41F50882		




DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		6 - VALOR DO INSS	12.075,73
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	12.075,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

32

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		6 - VALOR DO INSS	12.075,73
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	12.075,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

COFIN/SINFRA
Fls. 130
Ass: 9

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0003.18.000023-1
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 22/02/2018

Nº NOBLIST: _____ Nº DOTLIST: _____

Unidade Orçamentária:
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
0003 - SINFRA - Recomposição de Capital

Código Bancário: 03290.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042666-3	Regularização: Não	Nº NEX : ***
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3.

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Município UF: Brasília DF

EMP: 25101.0003.18.000005-8

LIQ: 25101.0003.18.000002-8 Fonte de Recurso: 151

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014 Tipo de OB:
39-FAT S/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 12.075,73	Valor por Extenso: DOZE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** * ***** ***** ***
------------------------	---	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

 Francisca Albuquerque Sousa Coordenadora Financeira _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO 006900 - Marciana Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA
---	--

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF		Código da Receita do Tributo
Sem Código de Barras	GPS	01.898.295/0001-28		2640
Código de Identificação do Tributo	Mês/Ano Competência	Valor Previsto do Pagamento do INSS	Valor de Outras Entidades	Atualização Monetária:
2640	2/2018	12.075,73	0,00	0,00
Valor Total (R\$): 12.075,73		Valor Total por extenso: doze mil e setenta e cinco reais e setenta e três centavos		



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	01A0420A867D7A19
-----------------------	------------------

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



COFIN

Fls: 111

Ass: 9

Cuiabá, 23 de Abril de 2018.

DESPACHO

À SAADS,

Encaminho o processo para o encarte do ISSQN.

Atenciosamente,


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



Hoje é Terça-feira, 21 de Agosto de 2018

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : LUCIANA DE LIMA CÂNDIDO CAMPOS / SINFRA / GS - GAB. SEC. EST DE INFRAEST. E LOG. - SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

Visualizar Processo

Número / Ano do Processo : 635564 / 2017

Data/hora Cadastro : 27/11/2017 às 15:55 // **Prioridade do Cadastro:**

Parte Interessada : GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ/IE :

Documento : IC 222/2013

Assunto : MEDIÇÃO DE OBRAS

Origem : EMPRESA

Cadastrado Por : PROTOCOLO / SINFRA

Município : CUIABÁ / MT

Resumo do Assunto : 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-175/MT-248. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Origem do Trâmite : SINFRA / SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

Data/hora Envio : 21/08/2018 às 11:45:05

Andamento

Informação : Segue processo para emissão de notificação, por ausência de comprovação do pagamento do imposto de ISSQN.

Documentos Juntados :

Juntado ao Processo :

Processos Apensos :

Apenso ao Processo :

Documentos de Apoio :

Disponibilizar na WEB? : Sim

Sigilo Total? : Não

Situação/Encontra-se com : Esta na unidade: SUOF - SUPERINTENDENCIA DE ORC., FIN. E CONT - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE / SINFRA para recebimento



Voltar

Sair

Desenvolvimento



Luciana de Lima Cândido Campos
Assessora Técnica
SAADS/SINFRA



MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR


SUOF
Fls. <u>113</u>
Rub. <u>✓</u>

Processo nº 635564/2017
Data: 28/09/2018

À UNISECI

Encaminhamos o presente processo conforme solicitação por e-mail

Josely Midon Campos da Luz
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA
Em substituição





NOTIFICAÇÃO N. 002/2018/SUOF/SAADS/SINFRA

AR: DJ16 6448106BR

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, **NOTIFICAR** a Empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ 01.898.295/0001-28, localizada na Rua Governador Jari Gomes, 10, Bairro Boa Esperança – Cuiabá MT CEP 78068-720, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, apresente a comprovação do recolhimento o ISSQN devido sobre as prestações de serviços executadas pertinentes ao cumprimento do Instrumento Contratual nº 222/2016, conforme abaixo.

Processo	Nº Nota Fiscal	Data Emissão	Referência	Valor R\$	ISSQN Devido
641014/2016	720	27/12/2016	29ª Medição Provisória	644.184,75	12.883,70
635564/2017	815	18/12/2017	37ª Medição Provisória	1.097.794,07	17.564,70
97607/2018	880	05/07/2018	40ª Medição Provisória	101.956,73	1.631,31
Total					32.079,71

Fundamentação Legal: Art. 11 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000; Art. 3º, incisos I a XXII da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 6º, §2º, inciso II da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 1º da Lei Estadual nº 10.162, de 10 setembro de 2014; Art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno nº 07/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado, Orientação Técnica 0002/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado; Parecer Jurídico nº 141/2016 da Unidade Jurídica SINFRA.


O não atendimento desta notificação ensejará a retenção e recolhimento do imposto junto as prefeituras competentes, com os devidos acréscimos legais, no ato do pagamento das próximas medições a serem efetuadas por esta Secretaria, independente do instrumento contratual a ser pago.

Não havendo mais pagamentos a serem efetuados por esta Secretaria, a Empresa será bloqueada junto ao Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, para que a retenção possa ser feita em qualquer pagamento efetuado pelo Governo do Estado, sendo ainda, tomadas as providências junto ao Procuradoria Geral do Estado, para inclusão da referida pendência junto a Dívida Ativa.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.



Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF



Eng.ª. Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SAADS

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

A Empresa

GEO SOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Rua Governador Jari Gomes, nº10, Bairro: Boa Esperança
CEP: 78068-720 – Cuiabá – MT

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
 EMS
 SEGURO / VALEUR DECLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

Prate Laveie Medeiros *29/08/2008*

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR

0844603

RUBRICA E MAT. DO EMITIDOR / SIGNATURE DE L'EMISSEUR

FMM *RS*

ENDERECO PARA DEVOLUCAO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

FC0463/16

115 X 160

SUCFIS
Fls *116*
Ass. *R*



SUOF
Fls. <u>117</u>
Rub. <u>OR</u>

Processo nº 635564/2017
Data: 28/12/2018

À COFIN


Senhora Coordenadora


Considerando as notificações expedidas às fls. 114/115 sem as respectivas regularizações.

Considerando o Parecer n.º 1.786/SGAC/2018 da Procuradoria Geral do Estado MT, de 26 de dezembro de 2018.


Considerando ainda que as pendências de comprovação de recolhimento de ISSQN deverão ser regularizadas pelo Processo n.º 587651/2018, uma vez que conforme Parecer supracitado, ***“Poderá ainda o Estado, efetuar o repasse do tributo devido aos municípios credores sempre que o pedido de pagamento não estiver instruído com comprovante de pagamento do imposto relacionado àquele serviço específico”***.

Encaminhamos o presente para demais providências de *check-list* e arquivo junto a CCONT.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT SECRETARIA DE FAZENDA GUIA DE RECOLHIMENTO		LINEJANES		31/10/2018		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> COFINS/SINFRA Vis FIs 122 Ass. </div>			
Código: 000058616 Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CPF/CNPJ: 01898295000128 RG/Inscriçã 130350842 Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 Bairro: BOA ESPERANCA CEP: 78068480 Cidade: CUIABA -			ISS REF. A NF Nº 815, SERVIÇOS PRESTADOS PARA MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO CNPJ: 03.507.415/0022-79.			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> COFINS/SINFRA FIs 118 Ass. </div>			
136 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER ----- 17.564,70 ----- 0,00 ----- 0,00 Total: 17.564,70 0,00 0,00 ISSQN									
Código de Baixa 2-419982-1-1		Vencimento 19/11/2018		Total de Parcelas 1		Valor da Parcelas 17.564,70		Número da Guia 1739 / 1739	
Autenticação Mecânica no Verso					VIA CONTRIBUINTE				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT SECRETARIA DE FAZENDA GUIA DE RECOLHIMENTO		LINEJANES		31/10/2018		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> VISTO </div>			
Código: 000058616 Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CPF/CNPJ: 01898295000128 RG/Inscriçã 130350842 Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 Bairro: BOA ESPERANCA CEP: 78068480 Cidade: CUIABA -			ISS REF. A NF Nº 815, SERVIÇOS PRESTADOS PARA MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO CNPJ: 03.507.415/0022-79.						
136 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER ----- 17.564,70 ----- 0,00 ----- 0,00 Total: 17.564,70 0,00 0,00 ISSQN									
Código de Baixa 2-419982-1-1		Vencimento 19/11/2018		Total de Parcelas 1		Valor da Parcelas 17.564,70		Número da Guia 1739 / 1739	
Autenticação Mecânica no Verso					VIA PROTOCOLO				

 237-2	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT	
Vencimento 19/11/2018	
Agência/Código do Cedente 5574-3/0003609-9	
Nosso Número 09/20000801454-1	
(=) Valor do Documento 17.564,70	
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 419982	Parcela 1
Cadastro 000058616	
Sacado GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E	
RECBO DOSACADO	

 237-2		23795.57404 92000.080140 54000.360906 3 77130001756470			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO					Vencimento 19/11/2018
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT - CNPJ:					Agência/Código do Cedente 5574-3/0003609-9
Data do Documento 05/09/2018	Número do Documento 2-419982-1-1	Espécie RC	Aceite N	Data de Processamento 10/31/2018	Nosso Número 09/20000801454-1
Uso do Banco		Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade X Valor	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor do Documento 17.564,70
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 01898295000128 - Sacado: 000058616 - GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 CEP: 78068480 Bairro: BOA ESPERANCA Cidade: CUIABA- Sacador/Avalista					



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/11/2018 - 17h20

Nº de controle: 198.428.304.946.461.767 | Documento: 0001070

COFINS/SINFRA

Fis. 234

Ass. 9

Conta de débito: Agência: 1966 | Conta: 0017900-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 001.898.295/0001-28



Código de barras: 23795 57404 92000 080140 54000 360906 3 77130001756470

Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Razao Social Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Nome Fantasia Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.755.477/0001-75

Nome do Pagador: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTR

CPF/CNPJ do pagador: 001.898.295/0001-28

Razao Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 08/11/2018

Data de vencimento: 19/11/2018

Valor: R\$ 17.564,70

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 17.564,70

Descrição: ISSQN NF815 GUIA 1739

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

rr8dA=Rw 9em?C8wV L*bLr#f2 slVE#Vod oslx5QE? Id3yL#y3 @J7LxZ86 NerAaLWL
EDroGS#R tFpQeS4E Sfo7iLXp jWPBEMgf wHNUw#5j gyYJrxMx vypiZ#SU qtYj3bbC
lnc2CipR K83m95YV 6pJgrp24 #BZyliiFH 5dJJylc? UA6SGf8X 08071178 20970100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUFC/SAAS/SINFRA**

VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	X		
Todos os documentos estão devidamente assinados?	X		
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, AQS, LIQ e NOB)?	X		
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)		X	
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	X		
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?		X	
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?	X		
O processo está corretamente paginado?	X		
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	X		

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONV.

Observações:

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 15, 07, 2017

Nome: Wesley Silveira

Assinatura: [Signature]



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

COFIN

Fis: 121

Ass: V8

Cuiabá 15 / 07 / 2019

DESPACHO

À CCONT

Encaminhamos o processo para arquivo com pagamento efetuado.

Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira
COFIN/SUFC/SAAS/SINFRA
