



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

APENSO 27

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO OBRAS PARALISADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

Membros da equipe

Emerson Augusto de Campos (Supervisor) – Auditor Público Externo
Patrícia Lopes Griggi Pedrosa – Auditora Pública Externa



Prefeitura Municipal de Castanheira

Conforme informações declaradas no Sistema Geo-Obras, extraídas por meio da ferramenta *Qlik Sense*, até 4/10/2019, é possível se obter os seguintes dados referentes às obras paralisadas sob a gestão da Prefeitura Municipal de Castanheira.

Tabela 1 – Quantidade de obras paralisadas com os respectivos valores iniciais, atuais, medidos e a medir:

	Quantidade de obras paralisadas	Valor inicial da obra	Valor atual da obra	Valor total medido	Valor total a medir
Paralisada	1	R\$500.000,00	R\$500.000,00	R\$0,00	R\$500.000,00
Paralisada por rescisão contratual	5	R\$10.179.652,87	R\$10.179.652,87	R\$4.081.551,89	R\$6.098.100,98
Iniciada/reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	3	R\$1.349.366,98	R\$1.349.366,98	R\$1.300.520,01	R\$48.846,97
TOTAL	9	R\$12.029.019,85	R\$12.029.019,85	R\$5.382.071,90	R\$6.646.947,95

Gráfico 1

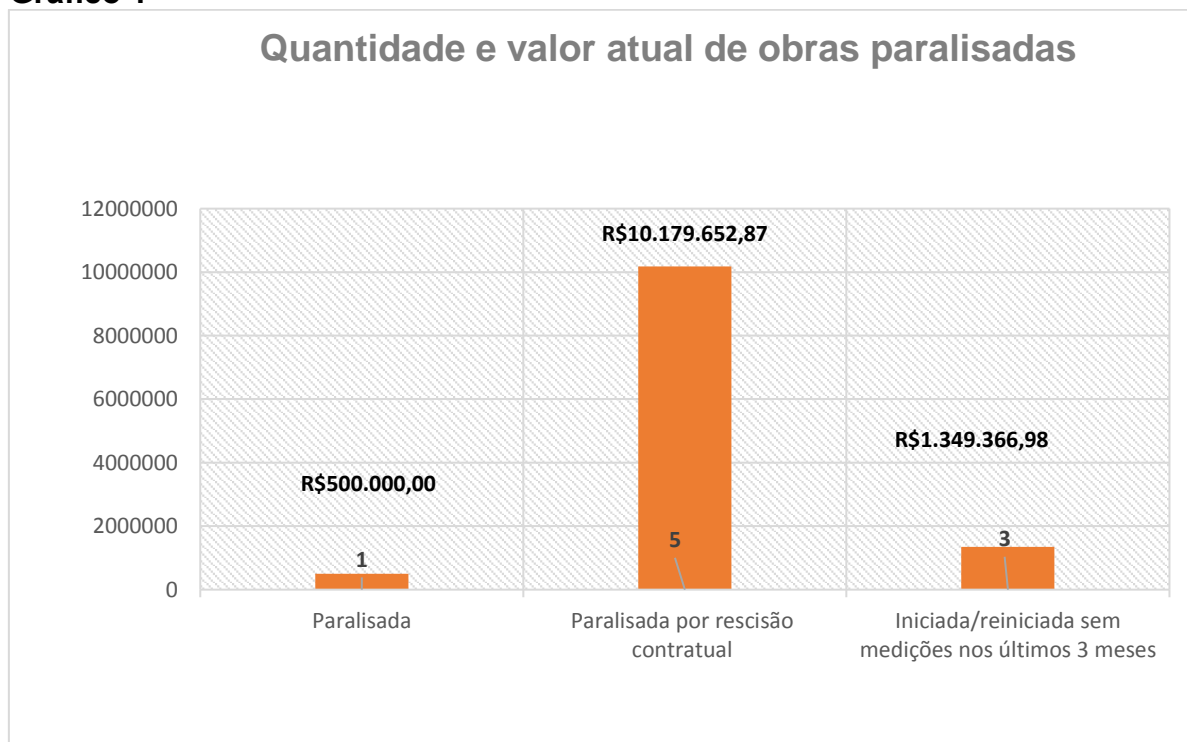




Gráfico 2

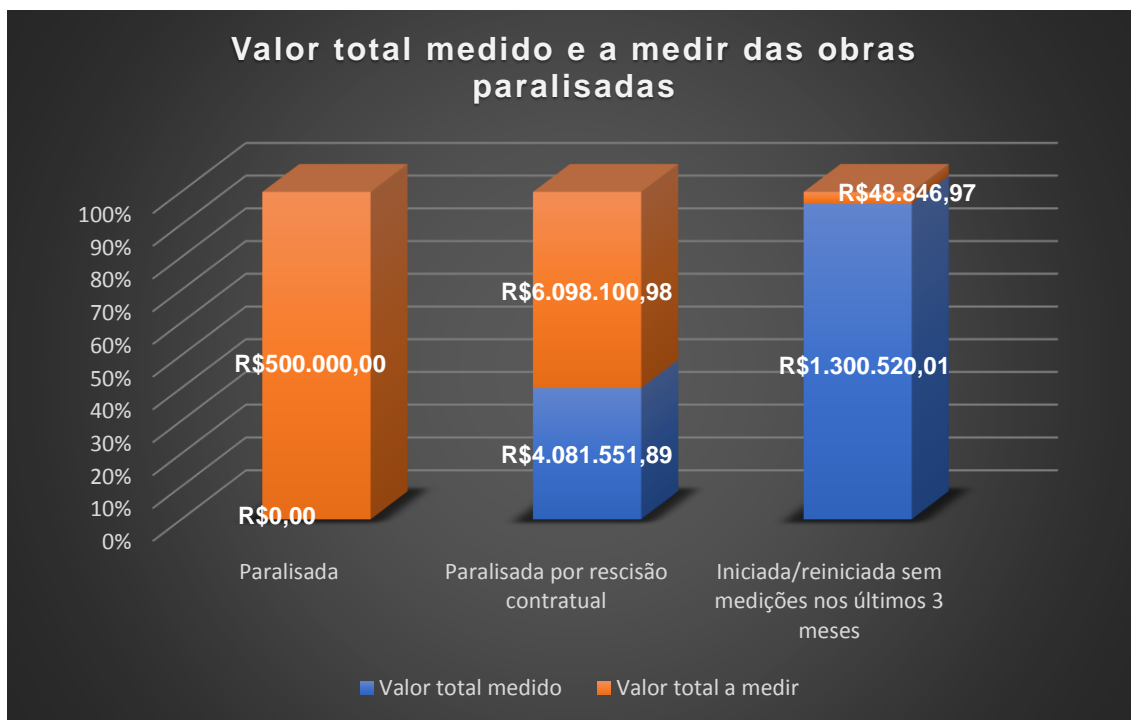


Tabela 2 – Relação das obras por situação, Contrato, objeto, valor atual, medido e a medir:

Situação da obra	Contrato	Ano	Objeto	Valor Atual	Valor Medido	Valor a Medir
Paralisada	62	2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS VIAS URBANAS.	R\$500.000,00	R\$0,00	R\$500.000,00
			Subtotal	R\$500.000,00	R\$0,00	R\$500.000,00
Paralisada por rescisão contratual	72	2008	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$836.004,63	R\$358.945,72	R\$477.058,91
Paralisada por rescisão contratual	018	2011	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$3.296.000,00	R\$1.647.691,02	R\$1.648.308,98
Paralisada por rescisão contratual	058	2012	Execução de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	R\$3.635.586,55	R\$1.216.504,67	R\$2.419.081,88
Paralisada por rescisão contratual	75	2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	R\$499.660,51	R\$401.787,83	R\$97.872,68
Paralisada por rescisão contratual	033	2016	Empreitada global para a construção de creche pre escola tipo 1 convencional.	R\$1.912.401,18	R\$456.622,65	R\$1.455.778,53
			Subtotal	R\$10.179.652,87	R\$4.081.551,89	R\$6.098.100,98
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	83	2014	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR 4 ASSENTAMENTO	R\$832.271,09	R\$836.773,10	-R\$4.502,01



Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	150	2018	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ENTORNO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA QUITERIA - COMPREENDENDO AV. 04 DE JULHO, ESQUINA COM JOSE BASÍLIO E RUA MATO GROSSO.	R\$113.654,77	R\$60.305,79	R\$53.348,98
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	100	2018	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$403.441,12	R\$403.441,12	R\$0,00
Subtotal				R\$1.349.366,98	R\$1.300.520,01	R\$48.846,97
