



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

APENSO 119

**RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO
OBRAS PARALISADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Membros da equipe

Emerson Augusto de Campos (Supervisor) – Auditor Público Externo
Patrícia Lopes Griggi Pedrosa – Auditora Pública Externa

Cuiabá-MT, outubro de 2019.



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Conforme informações declaradas no Sistema Geo-Obras, extraídas por meio da ferramenta *Qlik Sense*, até 4/10/2019, é possível se obter os seguintes dados referentes às obras paralisadas sob a gestão da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos.

Tabela 1 – Quantidade de obras paralisadas com os respectivos valores iniciais, atuais, medidos e a medir:

	Quantidade de obras paralisadas	Valor inicial da obra	Valor atual da obra	Valor total medido	Valor total a medir
Paralisada	1	R\$805.934,09	R\$805.934,09	R\$690.176,90	R\$115.757,19
Paralisada por rescisão contratual	4	R\$2.356.073,78	R\$2.405.099,92	R\$838.195,22	R\$1.566.904,70
Iniciada/reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	14	R\$10.051.832,71	R\$10.085.165,61	R\$7.858.659,65	R\$2.226.505,96
TOTAL	19	R\$13.213.840,58	R\$13.296.199,62	R\$9.387.031,77	R\$3.909.167,85

Gráfico 1

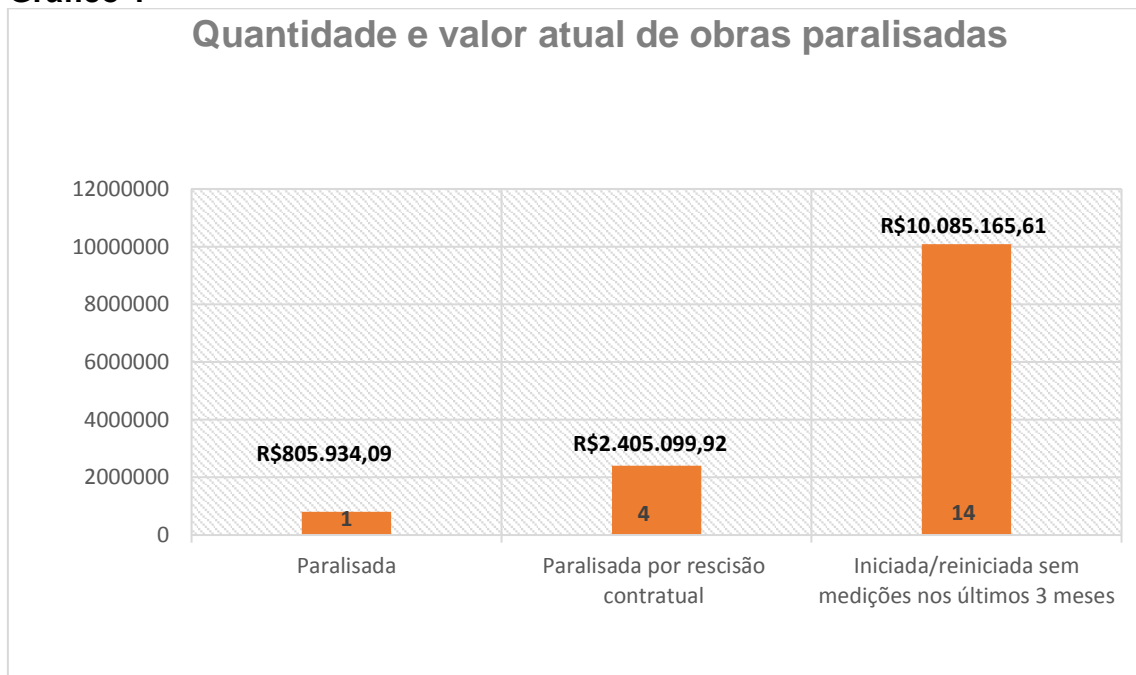




Gráfico 2

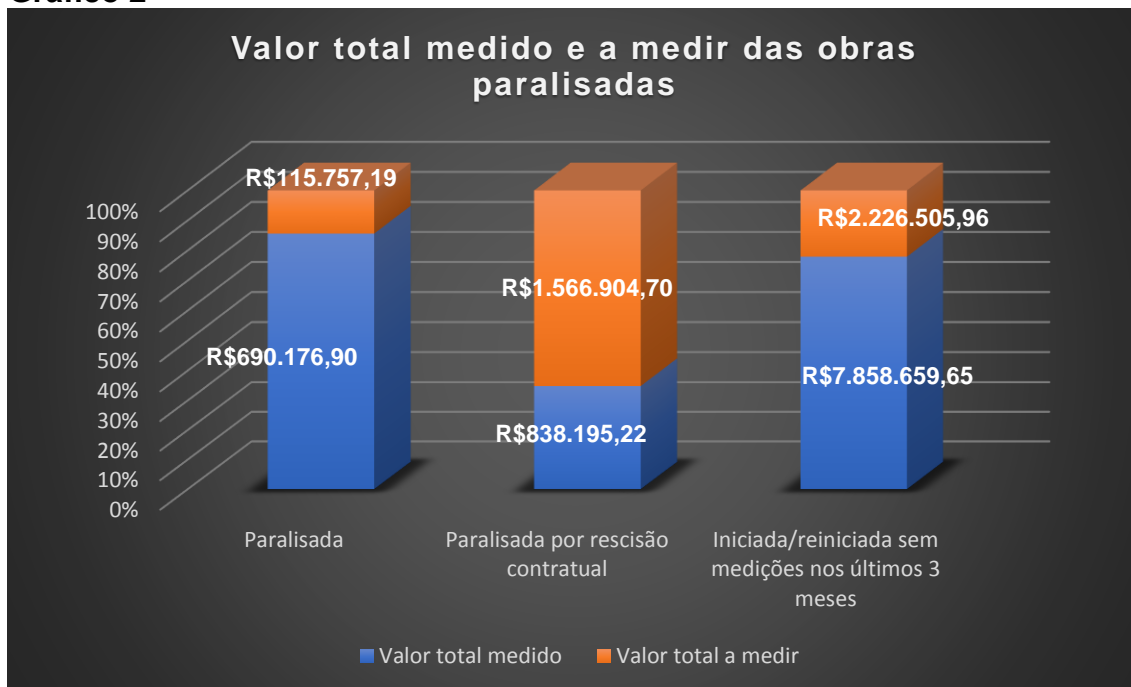


Tabela 2 – Relação das obras por situação, Contrato, objeto, valor atual, medido e a medir:

Situação da obra	Contrato	Ano	Objeto	Valor Atual	Valor Medido	Valor a Medir
Paralisada	055	2015	DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS	R\$805.934,09	R\$690.176,90	R\$115.757,19
			Subtotal	R\$805.934,09	R\$690.176,90	R\$115.757,19
Paralisada por rescisão contratual	71	2008	OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$407.634,22	R\$0,00	R\$407.634,22
Paralisada por rescisão contratual	070	2008	OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO	R\$409.188,51	R\$0,00	R\$409.188,51
Paralisada por rescisão contratual	72	2008	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$313.710,73	R\$0,00	R\$313.710,73
Paralisada por rescisão contratual	063	2011	“CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL”	R\$1.274.566,46	R\$838.195,22	R\$436.371,24
			Subtotal	R\$2.405.099,92	R\$838.195,22	R\$1.566.904,70
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	48	2008	reforma da escola Lourenço Peruchi	R\$208.812,62	R\$335.968,49	-R\$127.155,87
Iniciada sem medições	53	2008	reforma da escola estadual 15 de junho	R\$367.688,37	R\$175.118,55	R\$192.569,82



nos últimos 3 meses						
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	52	2008	reforma da escola estadual bento Alexandre	R\$367.688,37	R\$362.405,97	R\$5.282,40
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	078	2008	OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$524.700,34	R\$519.417,12	R\$5.283,22
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	076	2011	"MÃO DE OBRA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECUPERAÇÃO DE VIA PUBLICA PAVIMENTADA"	R\$471.621,52	R\$519.911,29	-R\$48.289,77
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	136	2013	PONTES SOBRE OS CORREGOS 5 DE FEVEREIRO, CAETE, DAS PITAS, CORGÃO, BOCA RICA, BARREIRÃO, GRANDE, FLORESTAN FERNANDES "CONSTRUÇÃO DE PONTES E GALERIAS"	R\$3.425.039,44	R\$3.194.811,62	R\$230.227,82
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	047	2014	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	R\$53.251,07	R\$235.112,36	-R\$181.861,29
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	056	2015	MÃO-DE-OBRA EM CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, TOTAL DE 3.000M².	R\$96.000,00	R\$17.536,75	R\$78.463,25
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	23	2015	MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	R\$88.106,51	R\$77.874,33	R\$10.232,18
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	80	2015	execução de Asfalto - Urbano em rede fluvial, Sub base, base e capa asfáltica com meio fio" no total de 100.000 (cem mil) / M2. E Execução de Serviços de Obra em Microrrevestimento asfáltico 150.000,00 M2.	R\$1.410.000,00	R\$492.642,13	R\$917.357,87
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	095	2015	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO (PONTE BARRA CLARA)	R\$1.639.363,97	R\$1.343.529,21	R\$295.834,76
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	087	2015	"REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL (HOSPITAL MUNICIPAL)	R\$578.557,77	R\$408.152,41	R\$170.405,36
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	042	2016	PONTE JOÃO BRACINHO - EXECUÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO PONTE JOAO BRACINHO	R\$504.989,95	R\$84.810,24	R\$420.179,71
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	43	2018	OBRA DE REFORMA DO AMBULATORIO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS	R\$349.345,68	R\$91.369,18	R\$257.976,50



			Subtotal	R\$10.085.165,61	R\$7.858.659,65	R\$2.226.505,96
--	--	--	----------	-------------------------	------------------------	------------------------
