



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

APENSO 82

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO OBRAS PARALISADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

Membros da equipe

Emerson Augusto de Campos (Supervisor) – Auditor Público Externo
Patrícia Lopes Griggi Pedrosa – Auditora Pública Externa



Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia

Conforme informações declaradas no Sistema Geo-Obras, extraídas por meio da ferramenta *Qlik Sense*, até 4/10/2019, é possível se obter os seguintes dados referentes às obras paralisadas sob a gestão da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia.

Tabela 1 – Quantidade de obras paralisadas com os respectivos valores iniciais, atuais, medidos e a medir:

	Quantidade de obras paralisadas	Valor inicial da obra	Valor atual da obra	Valor total medido	Valor total a medir
Paralisada por rescisão contratual	8	R\$5.896.608,56	R\$5.911.679,63	R\$1.243.127,40	R\$4.668.552,23
Iniciada/reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	3	R\$1.232.071,39	R\$1.232.071,39	R\$551.794,18	R\$680.277,21
TOTAL	11	R\$7.128.679,95	R\$7.143.751,02	R\$1.794.921,58	R\$5.348.829,44

Gráfico 1

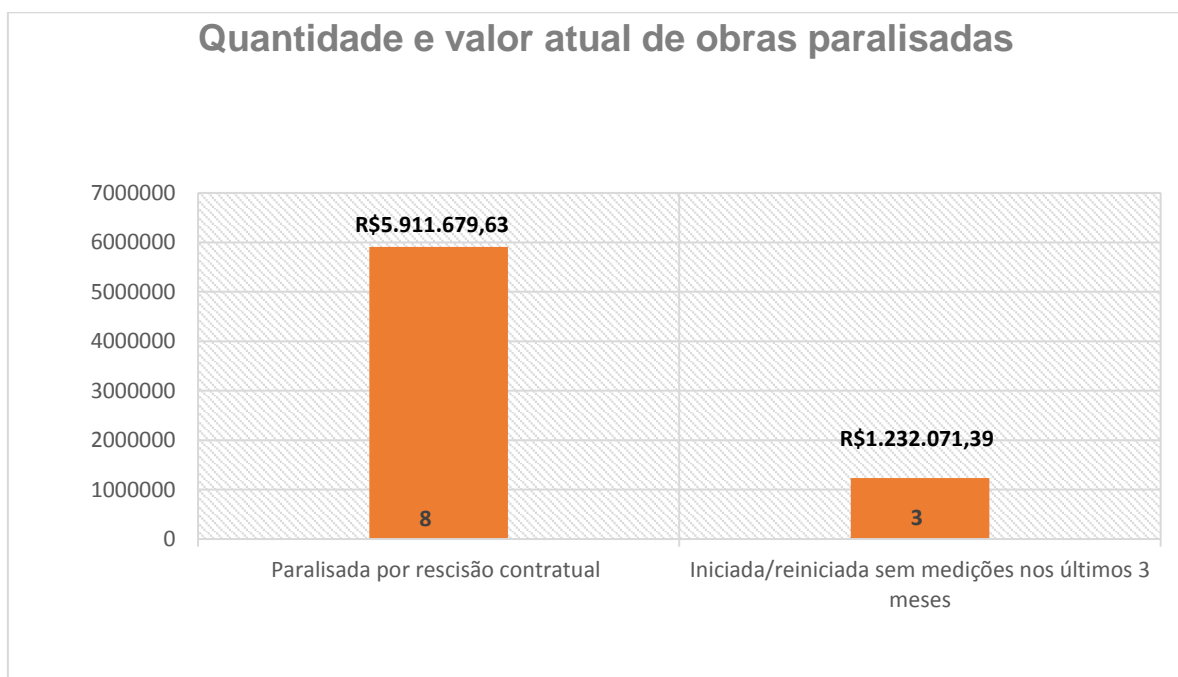




Gráfico 2

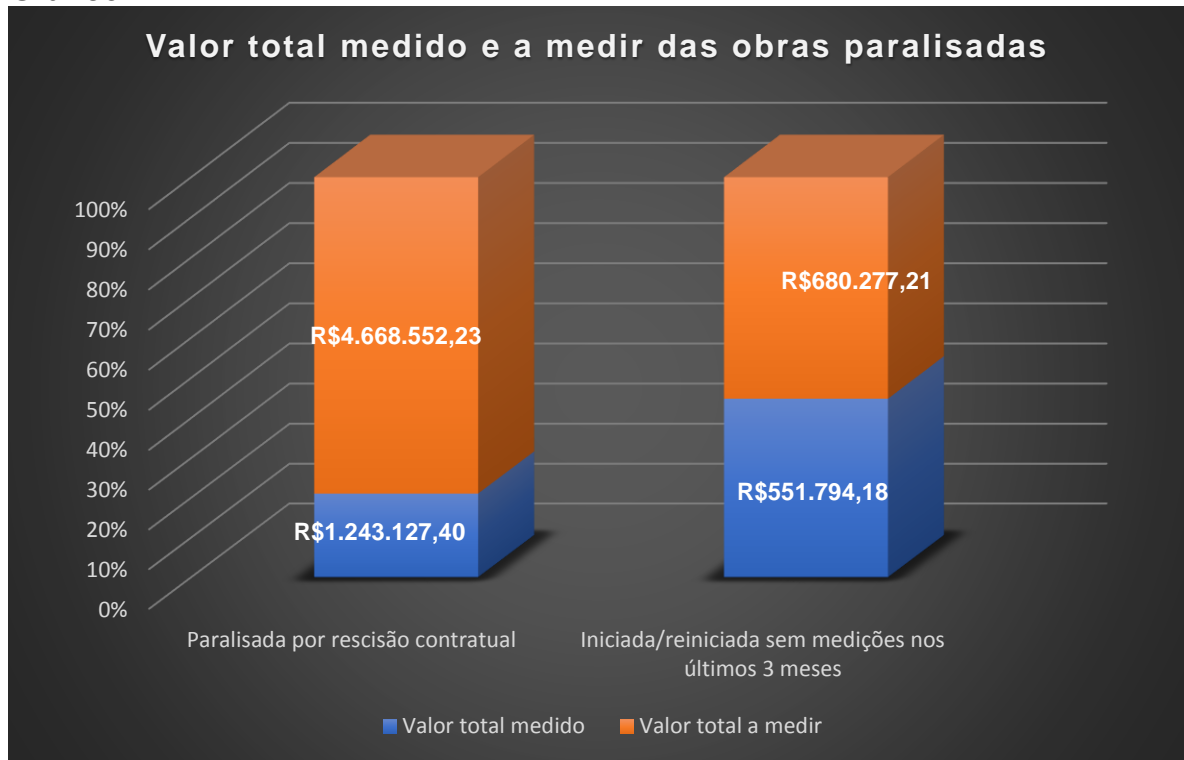


Tabela 2 – Relação das obras por situação, Contrato, objeto, valor atual, medido e a medir:

Situação da obra	Contrato	Ano	Objeto	Valor Atual	Valor Medido	Valor a Medir
Paralisada por rescisão contratual	038	2008	Execução de Obra, Sistema de Abastecimento de Água, Melhoria Sanitaria Domiciliares e Sistema de Esgotamento Sanitario.	R\$3.405.937,13	R\$721.366,58	R\$2.684.570,55
Paralisada por rescisão contratual	038	2011	Importação de Dados em Julho/2011 RECUPERAÇÃO DE 22,13 Km DE ESTRADAS VICINAIS PADRÃO ALIMENTADORA	R\$555.092,17	R\$171.131,35	R\$383.960,82
Paralisada por rescisão contratual	040	2011	Importação de Dados em Julho/2011 - Contrato: 040/2011 (Código: 19716) REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$193.685,22	R\$142.044,88	R\$51.640,34
Paralisada por rescisão contratual	037	2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO, BOA VISTA E REGIÃO DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA, CONFORME	R\$393.638,82	R\$0,00	R\$393.638,82



			CONTRATO REPASSE NºM0312147-53/2009			
Paralisada por rescisão contratual	037	2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0306527-37/2009	R\$248.011,40	R\$0,00	R\$248.011,40
Paralisada por rescisão contratual	082	2013	RECUPERAÇÃO DE 22,13 KM (VINTE E DOIS QUILÔMETROS E CENTO E TRINTA METROS) DE ESTRADAS VICINAIS PADRÃO ALIMENTADORA	R\$449.828,69	R\$0,00	R\$449.828,69
Paralisada por rescisão contratual	052	2014	Contratação de empresa especializada em Construção Civil para empreitada global da Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde), uma área a ser construída de 296,68 m² na rua João Medeiros s/n em Nova Brasilândia-MT.	R\$444.672,37	R\$0,00	R\$444.672,37
Paralisada por rescisão contratual	040	2015	Contratação de empresa de Engenharia para execução de obra pelo regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para Pavimentação asfáltica e Drenagem Superficial, Sinalização Viária Horizontal e Vertical em Ruas do distrito de Peresópolis no município de Nova Brasilândia-Mt, com área total de 5337,5100 m² conforme projetos e anexos integrantes do edital de licitação.	R\$220.813,83	R\$208.584,59	R\$12.229,24
			Subtotal	R\$5.911.679,63	R\$1.243.127,40	R\$4.668.552,23
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	084	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILANDIA-MT, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº839997/2016/MAPA/CAIXA PROCESSO Nº26281036020-05/2016.	R\$554.101,63	R\$345.030,50	R\$209.071,13
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	124	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA/MT, CONFORME TERMO DE	R\$309.126,76	R\$133.509,94	R\$175.616,82



			COMPROMISSO N° TC/PAC - 0118/2007.			
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	019	2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD NO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT.	R\$368.843,00	R\$73.253,74	R\$295.589,26
			Subtotal	R\$1.232.071,39	R\$551.794,18	R\$680.277,21
