



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

APENSO 93

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO OBRAS PARALISADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Membros da equipe

Emerson Augusto de Campos (Supervisor) – Auditor Público Externo
Patrícia Lopes Griggi Pedrosa – Auditora Pública Externa

Cuiabá-MT, outubro de 2019.



Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

Conforme informações declaradas no Sistema Geo-Obras, extraídas por meio da ferramenta *Qlik Sense*, até 4/10/2019, é possível se obter os seguintes dados referentes às obras paralisadas sob a gestão da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte.

Tabela 1 – Quantidade de obras paralisadas com os respectivos valores iniciais, atuais, medidos e a medir:

	Quantidade de obras paradas	Valor inicial da obra	Valor atual da obra	Valor total medido	Valor total a medir
Paralisada	3	R\$1.768.560,94	R\$1.768.560,94	R\$900.219,96	R\$868.340,98
Paralisada por rescisão contratual	3	R\$2.269.519,63	R\$2.269.519,63	R\$576.572,29	R\$1.692.947,34
Iniciada/reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	15	R\$6.703.075,41	R\$6.891.060,54	R\$3.821.626,16	R\$3.069.434,38
TOTAL	21	R\$10.741.155,98	R\$10.929.141,11	R\$5.298.418,41	R\$5.630.722,70

Gráfico 1

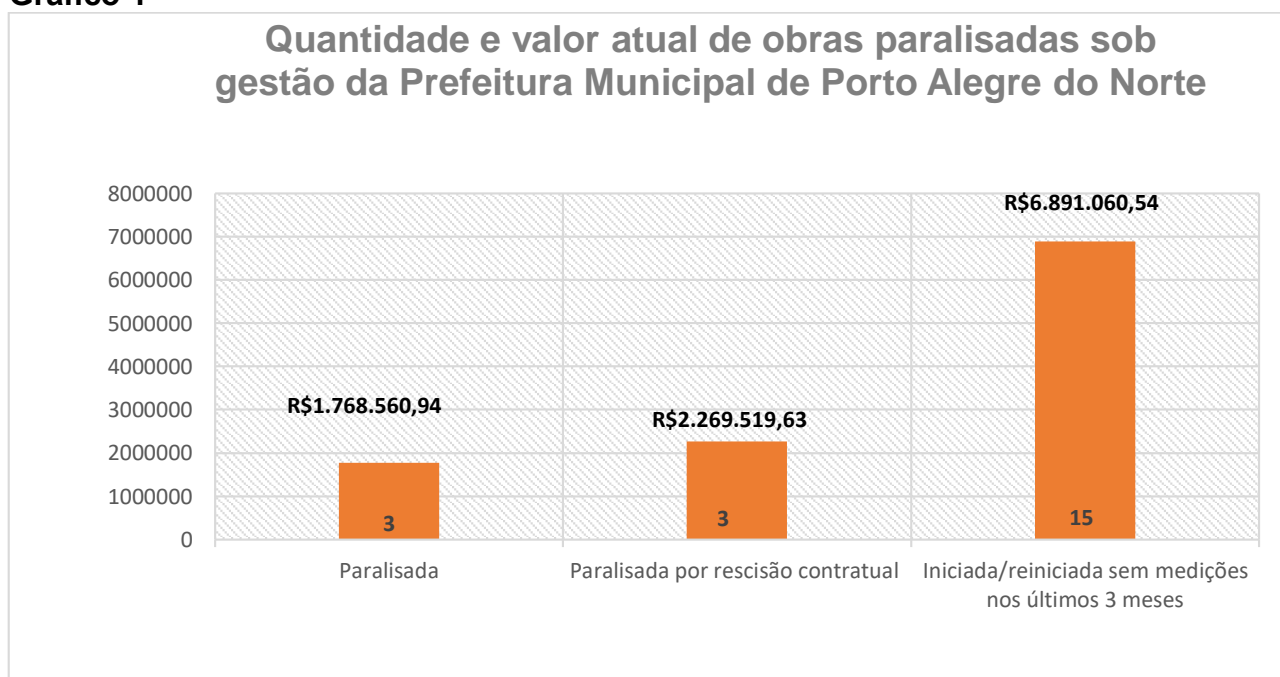




Gráfico 2

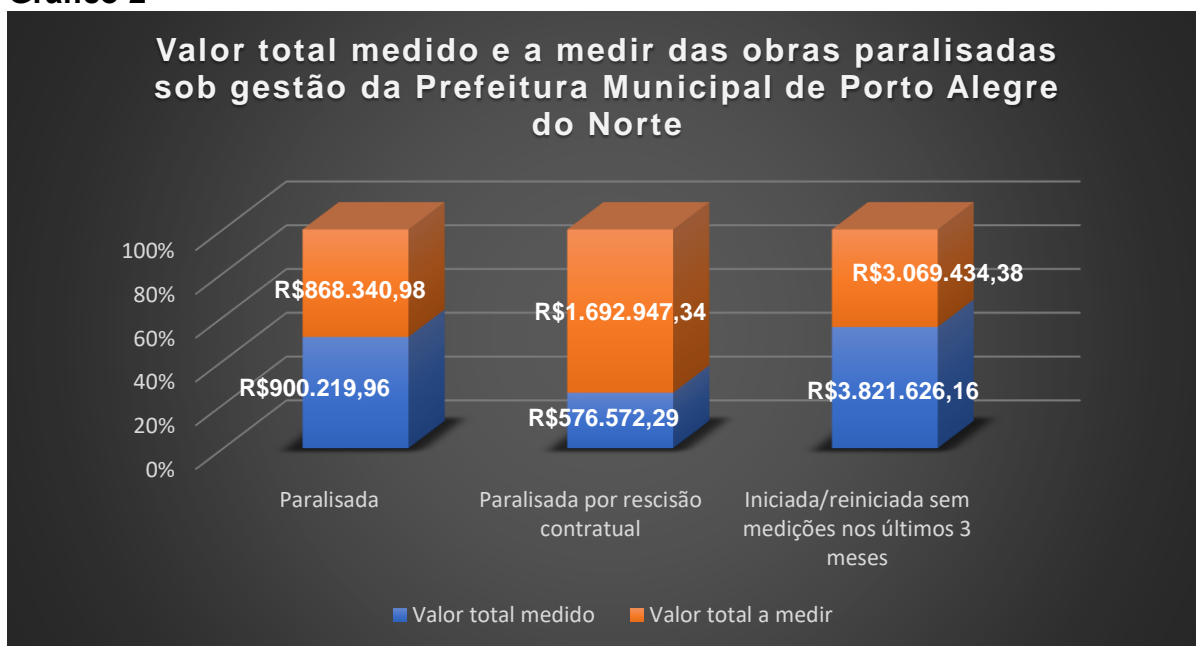


Tabela 2 – Relação das obras por situação, Contrato, objeto, valor atual, medido e a medir:

Situação da obra	Contrato	Ano	Objeto	Valor Atual	Valor Medido	Valor a Medir
Paralisada	135	2008	REC DE 37,837 KM DE ESTRADA VICINAL ASSENTAMENTO MARGARIDA UNIAO UIRAPURU	R\$849.449,10	R\$358.970,22	R\$490.478,88
Paralisada	58	2011	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA.	R\$502.890,47	R\$305.832,98	R\$197.057,49
Paralisada	22	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL JOSE GONÇALVES - ZONA RURAL DE NOVA FLORESTA	R\$416.221,37	R\$235.416,76	R\$180.804,61
			Subtotal	R\$1.768.560,94	R\$900.219,96	R\$868.340,98
Paralisada por rescisão contratual	46	2014	Construção de UBS - Setor Buriti - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT (Conforme Projeto Básico) Portaria GM nº340 de 04 de março de 2013	R\$401.198,06	R\$161.255,54	R\$239.942,52
Paralisada por rescisão contratual	09	2015	Contratação de empresa de engenharia visando a execução de Construção de Escola com 06 (seis) Salas (Projeto FNDE) no município de Porto Alegre do Norte/MT, conforme Termo de Compromisso PAR nº 29759/2014 celebrado entre o município de Porto Alegre do Norte/MT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE.	R\$934.225,53	R\$207.860,27	R\$726.365,26



Paralisada por rescisão contratual	08	2015	Contratação de empresa de engenharia visando a execução de Construção de Escola com 06 (seis) Salas (Projeto FNDE) no município de Porto Alegre do Norte/MT, conforme Termo de Compromisso PAR nº 29761/2014 celebrado entre o município de Porto Alegre do Norte/MT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE.	R\$934.096,04	R\$207.456,48	R\$726.639,56
Subtotal				R\$2.269.519,63	R\$576.572,29	R\$1.692.947,34
Iniciada	80	2009	Este contrato tem por objeto a Execução de obras de Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica, nas Avenidas Goiás e Piraguaçu e rua Mato Grosso no município de Porto Alegre do Norte-MT conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas constantes da Tomada de Preços nº 08/2009.	R\$1.028.507,74	R\$667.138,69	R\$361.369,05
Iniciada	89	2009	CONTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS DE 32 M CADA NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT	R\$452.697,20	R\$72.161,15	R\$380.536,05
Iniciada	28	2010	1.1 Este contrato tem por objeto a Execução de obras de Construção de 24 módulos sanitários, no município de Porto Alegre do Norte/MT. Conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas constantes da Tomada de Preços nº 15/2009	R\$129.066,04	R\$63.540,19	R\$65.525,85
Iniciada	77	2013	Construção de escola de educação infantil, no âmbito do programa nacional de Reestruturação e aparelhamento da rede pública de educação infantil - PROINFANCIA - NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT. (Conforme Projeto Básico) serviços remanescentes.	R\$385.102,59	R\$385.102,85	-R\$0,26
Iniciada	45	2014	Construção de UBS - NOVA FLORESTA DISTRITO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	R\$470.245,49	R\$452.716,77	R\$17.528,72
Iniciada	57	2014	Contratação de Empresa para Ampliação PSF II (Conforme Projeto Básico) e portaria nº 1.381 de 09 de junho de 2013 Programa Requalificação de Unidades Básicas de Saúde	R\$100.074,65	R\$91.407,16	R\$8.667,49
Iniciada	60	2014	Contratação de Empresa para Reforma do Centro de Saúde (Conforme Projeto Básico) e Portaria nº1.382 de 9 de julho de 2013 Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde.	R\$146.438,54	R\$120.311,01	R\$26.127,53



Iniciada	70	2014	Contratação de empresa de engenharia visando a execução de Construção de Quadra Coberta com Vestiário localizada na Avenida das Acácias no município de Porto Alegre do Norte/MT, conforme Termo de Compromisso PAC 2 10543/2014 celebrado entre o município de Porto Alegre do Norte/MT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.	R\$500.963,10	R\$120.790,34	R\$380.172,76
Iniciada	07	2015	Contratação de empresa de engenharia visando a execução de Construção da Sede do Novo Lar de Acolhimento de Crianças e Adolescentes do Município de Porto Alegre do Norte-MT, conforme Termo de Compromisso Celebrado entre a Prefeitura de Porto Alegre do Norte-MT e o Ministério do Trabalho da 23ª Região, vinculado ao Processo ACP nº 00151.2005.061.23.00-5	R\$452.393,18	R\$433.485,56	R\$18.907,62
Iniciada	024	2015	Contratação de empresa de engenharia devidamente habilitada visando a execução de serviços complementares referente a obra de construção de escola de educação infantil no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhamento da Rede Pública de Educação Infantil - Proinfância	R\$229.798,31	R\$229.797,87	R\$0,44
Iniciada	18	2015	Contratação de empresa de engenharia devidamente habilitada objetivando a construção de um Parque de Exposição no município de Porto Alegre do Norte-MT, conforme Contrato de Repasse Nº809310/2013 celebrado entre o município de Porto Alegre do Norte e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/CAIXA	R\$1.499.898,75	R\$722.893,02	R\$777.005,73
Iniciada	41	2015	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da UBS-Unidade Básica de Saúde do Setor Buriti por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, tudo conforme projeto básico, contendo memorial descritivo, resumo do orçamento, cronograma físico-financeiro em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais.	R\$377.201,71	R\$215.258,70	R\$161.943,01
Iniciada	34	2016	Contratação de empresa de engenharia visando a retomada de obra de construção de escola com 06 (seis) salas (Projeto FNDE) em Nova Floresta no município de Porto Alegre do Norte/MT.	R\$726.672,27	R\$93.422,55	R\$633.249,72



Iniciada	36	2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.	R\$64.658,00	R\$68.414,31	-R\$3.756,31
Iniciada	44	2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA LIBERTAÇÃO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT	R\$327.342,97	R\$85.185,99	R\$242.156,98
Subtotal				R\$6.891.060,54	R\$3.821.626,16	R\$3.069.434,38
