



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

## APENSO 6

### RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO OBRAS PARALISADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

#### Membros da equipe

**Emerson Augusto de Campos** (Supervisor) – Auditor Público Externo  
**Patrícia Lopes Griggi Pedrosa** – Auditora Pública Externa



## Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

Conforme informações declaradas no Sistema Geo-Obras, extraídas por meio da ferramenta *Qlik Sense*, até 4/10/2019, é possível se obter os seguintes dados referentes às obras paralisadas sob a gestão da Prefeitura Municipal de Água Boa.

**Tabela 1 – Quantidade de obras paralisadas com os respectivos valores iniciais, atuais, medidos e a medir:**

	Quantidade de obras paralisadas	Valor inicial da obra	Valor atual da obra	Valor total medido	Valor total a medir
Paralisada	5	R\$2.126.281,79	R\$2.161.281,79	R\$509.065,96	R\$1.652.215,83
Paralisada por rescisão contratual	23	R\$11.818.467,94	R\$11.882.175,45	R\$3.564.103,66	R\$8.318.071,79
Iniciada/reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	10	R\$3.142.800,77	R\$3.200.856,56	R\$2.247.243,41	R\$953.613,15
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>R\$17.087.550,50</b>	<b>R\$17.244.313,80</b>	<b>R\$6.320.413,03</b>	<b>R\$10.923.900,77</b>

**Gráfico 1**

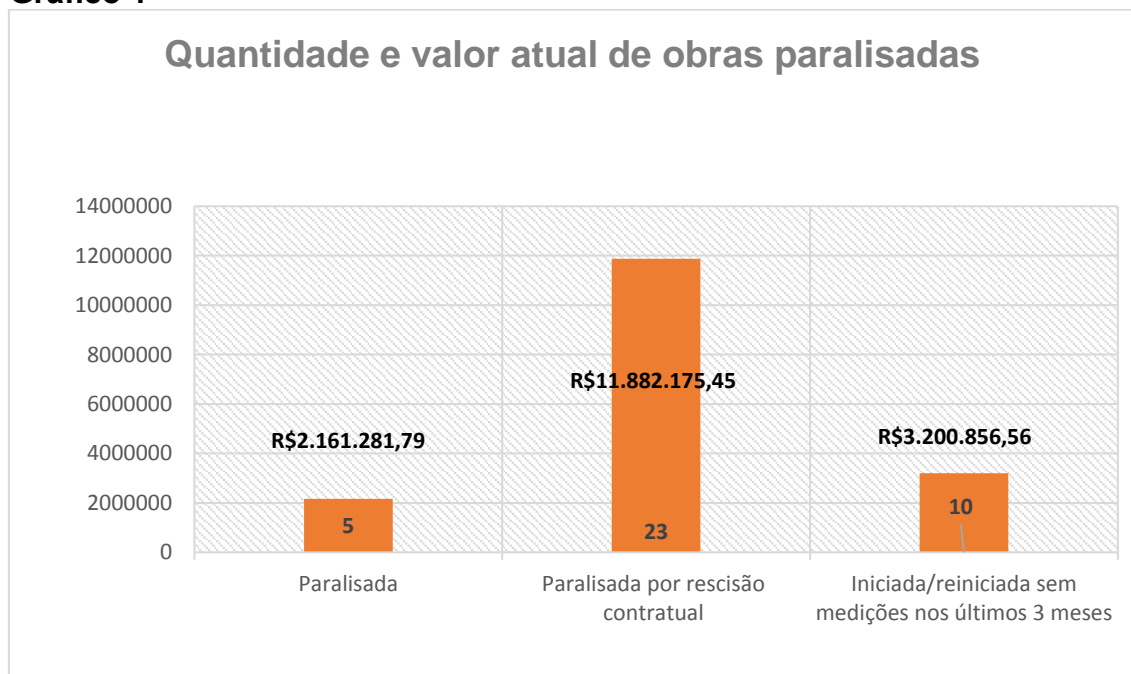
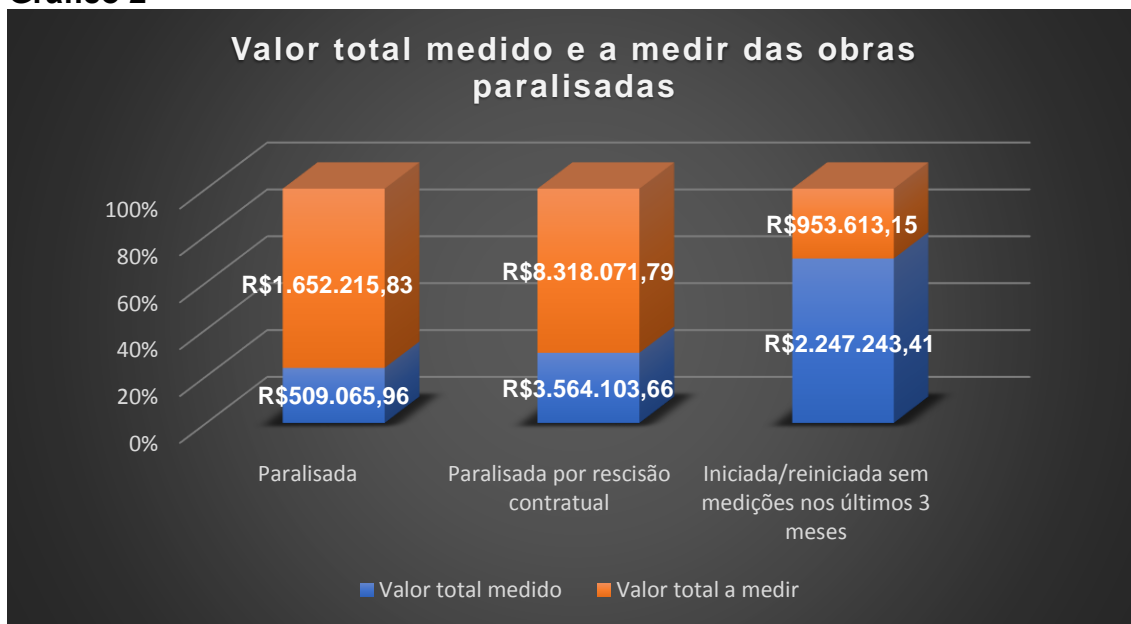




Gráfico 2



**Tabela 2 – Relação das obras por situação, Contrato, objeto, valor atual, medido e a medir:**

Situação da obra	Contrato	Ano	Objeto	Valor Atual	Valor Medido	Valor a Medir
Paralisada	134	2012	obra centro de convivência de idosos, com piscina e casa de máquinas na praça dos esportes	R\$401.385,92	R\$0,00	R\$401.385,92
Paralisada	132	2012	ACADEMIA DA SAÚDE	R\$165.764,79	R\$0,00	R\$165.764,79
Paralisada	136	2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NO PROJETO ASSENTAMENTO EMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	R\$865.702,02	R\$224.761,09	R\$640.940,93
Paralisada	042	2016	REFORMA ABATEDOURO DO PEIXE	R\$109.088,59	R\$50.000,00	R\$59.088,59
Paralisada	080	2016	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$619.340,47	R\$234.304,87	R\$385.035,60
			subtotal	<b>R\$2.161.281,79</b>	<b>R\$509.065,96</b>	<b>R\$1.652.215,83</b>
Paralisada por rescisão contratual	143	2009	DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO NO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - MT.	R\$1.470.666,18	R\$983.314,27	R\$487.351,91
Paralisada por rescisão contratual	147	2012	CONSTRUÇÃO DE MINI LATICINIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA INDUSTRIA DE LATICINIO NO DESTRITO DE CAPÃO VERDE	R\$397.785,34	R\$0,00	R\$397.785,34
Paralisada por rescisão contratual	092	2014	Construção de uma UBS-Unidade Básica de Saúde na Rua Almirante Barroso birro Bela Vista no municipio de Alto Paraguai.	R\$405.072,98	R\$196.989,14	R\$208.083,84
Paralisada por rescisão contratual	084	2014	Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde na Rua Mascarenha de Moraes, Centro no municipio de Alto Paraguai-MT.	R\$444.670,12	R\$303.065,44	R\$141.604,68



Paralisada por rescisão contratual	098	2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIARIAS E CALÇADAS DE VIAS URBANAS EM RUAS E AVENIDAS DA COHAB ELDORADO SEDE DO MUNICIPIO E NO DESTRITO DO CAPÃO VERDE NO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI_MT. com total de 28.881,44m2, conforme especificações constantes nos anexos do presente edital de concorrência n. 01/2014.	R\$1.681.780,32	R\$0,00	R\$1.681.780,32
Paralisada por rescisão contratual	093	2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, PADRAO FNDE/MEC	R\$961.808,49	R\$43.849,49	R\$917.959,00
Paralisada por rescisão contratual	135	2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIA, NA RUA GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI MT.	R\$507.370,91	R\$90.751,65	R\$416.619,26
Paralisada por rescisão contratual	090	2014	AMPLIAÇÃO DO CENTRO SAUDE HELIO CORREA	R\$233.823,04	R\$211.710,39	R\$22.112,65
Paralisada por rescisão contratual	094	2014	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT	R\$106.849,41	R\$99.713,47	R\$7.135,94
Paralisada por rescisão contratual	099	2014	CONCLUSÃO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COMPREENDENDO REDE, BUEIROS E PVs, NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO.	R\$273.648,85	R\$0,00	R\$273.648,85
Paralisada por rescisão contratual	105	2014	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO APOIADO METALICO DE 200 M³ NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - MT.	R\$215.206,15	R\$52.480,97	R\$162.725,18
Paralisada por rescisão contratual	048	2015	Construção de Praça dos Garimpeiros , no município de Alto Paraguai	R\$83.213,95	R\$68.207,01	R\$15.006,94
Paralisada por rescisão contratual	049	2015	Construção de Praça Santos Dumond, bairro Campo de Aviação, no município de alto Paraguai.	R\$273.413,84	R\$11.538,45	R\$261.875,39
Paralisada por rescisão contratual	099	2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS URBANAS	R\$510.204,74	R\$412.820,57	R\$97.384,17
Paralisada por rescisão contratual	096	2015	CONSTRUÇÃO DE BASE FISICA PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA PROCESSAMENTO DE MANDIOCA NO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	R\$602.376,58	R\$22.728,36	R\$579.648,22
Paralisada por rescisão contratual	100	2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS URBANAS NA RUA CASTELO BRANCO NO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	R\$272.857,53	R\$0,00	R\$272.857,53
Paralisada por rescisão contratual	060	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADAS NA COHAB BRILHO DO SOL	R\$278.793,02	R\$26.153,79	R\$252.639,23
Paralisada por rescisão contratual	048	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM CICLOFAIXA E CALÇADAS	R\$561.228,77	R\$11.535,69	R\$549.693,08



Paralisada por rescisão contratual	0024	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADAFAS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DA COHAB ELDORADO	R\$1.653.282,32	R\$501.980,24	R\$1.151.302,08
Paralisada por rescisão contratual	0024	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACADEMIA DE TERCEIRA IDADE NO DISTRITO DO CAPÃO VERDE	R\$501.095,50	R\$276.294,58	R\$224.800,92
Paralisada por rescisão contratual	058	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO EM VIAS URBANAS NA RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA	R\$261.693,14	R\$161.317,20	R\$100.375,94
Paralisada por rescisão contratual	059	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO EM VIAS URBANAS NA AVENIDA GETULIO VARGAS.	R\$117.801,71	R\$89.652,95	R\$28.148,76
Paralisada por rescisão contratual	088	2016	CONCLUSÃO DA OBRA DA MINI INDÚSTRIA DE LATÍCIPIO	R\$67.532,56	R\$0,00	R\$67.532,56
subtotal				<b>R\$11.882.175,45</b>	<b>R\$3.564.103,66</b>	<b>R\$8.318.071,79</b>
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	154	2010	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DA RUA MASCARENHAS E AV. ALMIRANTE BARROSO.	R\$269.840,00	R\$131.156,20	R\$138.683,80
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	127	2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 3000 METROS DE MEIO FIO E SAJETAS.	R\$96.000,00	R\$64.570,20	R\$31.429,80
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	79	2011	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PREDIO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO.	R\$54.995,86	R\$54.995,86	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	112	2011	REFORMA DO PSF DO TIRA SENTIDO	R\$35.363,35	R\$43.383,45	-R\$8.020,10
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	124	2011	RECUPERAÇÃO DE 3.51 KM E CONSTRUÇÃO DE 38.39 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO PROJETO EMA.	R\$770.225,35	R\$695.049,50	R\$75.175,85
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	096	2012	OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. MARZAVÃO DE SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT	R\$251.140,41	R\$29.775,46	R\$221.364,95
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	133	2012	Pavimentação Asfáltica com revestimento Tipo pré-misturado a Frio-PMF nas vias urbanas Rua Barão de Melgaço, Rua Major Simão, Rua Marechal Rondon, Rua Praça da Bandeira, Rua Santos Dumont, Rua XV de Novembro e Rua 7 de Setembro, com total de 12.658 m², no município de Alto Paraguai-MT	R\$376.928,06	R\$45.424,84	R\$331.503,22



Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	111	2012	OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "PEDRO DUARTE" E "BELA VISTA" NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT	R\$103.395,16	R\$28.083,88	R\$75.311,28
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	050	2016	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO, SOBRE O RIO FAZENDA VELHA ETAPA I DA RODOVIA DO PEIXE	R\$949.727,78	R\$869.344,12	R\$80.383,66
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	052	2016	CONSTRUÇÃO UBS II NA RUA ALMIRANTE BARROSO	R\$293.240,59	R\$285.459,90	R\$7.780,69
			subtotal	<b>R\$3.200.856,56</b>	<b>R\$2.247.243,41</b>	<b>R\$953.613,15</b>
