




**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**  
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar



ESTABELECIMENTO: SEDUC - Sede  
MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT.  
ENDEREÇO: AV. - B S/N CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANT
25.23	Fornecimento e Instalação de Luva de Correr para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 mm	UN	1,00
25.24	Fornecimento e Instalação de Luva de Correr para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	1,00
25.25	Fornecimento e Instalação de Luva de Correr para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 75 mm	UN	1,00
25.26	Fornecimento e Instalação de Luva de Correr para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 mm	UN	1,00
25.27	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm x 40 mm	UN	2,00
25.28	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 mm	UN	2,00
25.29	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	2,00
25.30	Fornecimento e Instalação de Curva 90° Longa para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 mm	UN	5,00
25.31	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 x 40 mm	UN	10,00
25.32	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 x 50 mm	UN	3,00
25.33	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 50 mm	UN	5,00
25.34	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 100 mm	UN	20,00
25.35	Fornecimento e Instalação de Cap para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	4,00

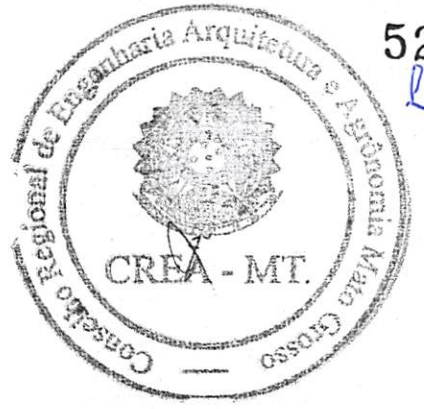



**GR** Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabela: **Chafiz Monteiro de Oliveira**  
Av. Ary Paes Barreto nº 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14466**  
R\$ 2,40

Seio de Controle Digital  
Em test. ( ) da verdade.

GIOCONDA G M M SIRIO-Esc. Juramentada  
Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Cod Ato 6  
<http://www.timeljus.br/eles>



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**  
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar



ESTABELECIMENTO: SEDUC - Sede

MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT.

ENDEREÇO: AV. - B S/N CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANT
25.36	Fornecimento e Instalação de Cap para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 mm	UN	6,00
25.37	Fornecimento e Instalação de Anel de Vedação para Esgoto DN 40 mm	UN	6,00
25.38	Fornecimento e Instalação de Anel de Vedação para Esgoto DN 50 mm	UN	8,00
25.39	Fornecimento e Instalação de Anel de Vedação para Esgoto DN 100 mm	UN	16,00
25.40	Fornecimento e Aplicação de Pasta Lubrificante com Bico Aplicador 80g	UN	2,00
25.41	Fornecimento e Instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 150 x 150 x 50 mm	UN	4,00
25.42	Fornecimento e Instalação de Porta Grelha Quadrada Prata 150 mm	UN	4,00
25.43	Fornecimento e Instalação de Grelha Quadrada De Alumínio 150 mm	UN	4,00
25.44	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07 m) conf. det. n. 15 dop 60 x 60 x 50 cm	UN	2,00
25.45	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07 m) conf. det. n. 15 dop 80 x 80 x 60 cm	UN	4,00
25.46	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07 m) conf. det. n. 15 dop 100 x 100 x 100 cm	UN	2,00
25.47	Execução de fossa séptica conf. det. n. 3.20 x 1.60 x 1.80 m	UN	1,00
25.48	Execução de filtro anaeróbico diâmetro 2.40 m e prof. 2.00 m	UN	1,00
25.49	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 2.00 m e prof. 2.00 m	UN	1,00
26.0	<b>DRENAGEM</b>		<b>sub total</b>





Serviço Registral e Notarial do Distrito de Cristo Rei  
 Tal. Sirio - **Chafiz Monteiro de OLIVEIRA**  
 Av. Paes Barreto n° 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com a original que me foi apresentada do que  
 dou fé.  
**ASV14465**       Selo de Controle Digital  
 R\$ 2,40      Em test. () da verdade.

GIOCONDA G M M SIRIO - Esc. Juramentada  
 Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 184 Cod. Ato 6  
<http://www.tmi.jus.br/selo>

*[Handwritten signature in blue ink]*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar




ESTABELECEMENTO: SEDUC - Sede

MUNICÍPIO : CUIABÁ - MT.

ENDEREÇO : AV. - B S/N CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANT
26.1	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 100 mm	ML	250,00
26.2	Fornecimento e Aplicação de Lastro de Brita Granítica, aplicado manualmente	M3	110,00
			sub total
27.0	<b>RESERVAÇÃO - ÁGUA POTÁVEL</b>		
27.1	Fornecimento e Instalação de Caixa de Água de Fibra de Vidro ou PVC, Incl Tampa, 2000 litros	UN	3,00
27.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kg/cm <sup>3</sup> ) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	M3	25,19
27.3	Fornecimento, Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira com tábua comum, com 02 reaproveitamentos	M2	180,40
27.4	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura (até 12,00 mm)	KG	881,60
27.5	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina ( bitola 4,00 a 5,00 mm )	KG	220,40
			sub total
28.0	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>		
28.1	Limpeza geral da obra	M2	1.855,91
			sub total

  
 José Ricardo Elias  
 Secretário Adjunto de Estrutura Escolar  
 SEDUC/MT

  
 Marlon Sebastião de Lima  
 Eng. Eletricista  
 CREA 12067242/00

ANEXO DA CERTIDÃO Nº. 51639/2011

ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MT SOB  
O Nº. 8644 REFERENTE OBRA OU

SERVIÇO CONSTANTE DA (S) ART. (S) Nº. (S)  
17T-0052029-14/11/2007, 17T00

EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (IS) Engº

Civil - LUCIO MARIO CAVALCANTI  
ADRIANO GOMES

Janilson da Silva  
Coordenador de Processos e  
Arquivos  
CPAN - Florianópolis/2007



Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabela: **Chafía Monteiro de Oliveira**  
Av. Páez Barreto nº 9183 Barro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Várzea Grande, Mato Grosso  
Rev. e: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com a original que me foi apresentada do que  
douto fé.  
**ASV14464**  
R\$ 2,40

Selo de Controle Digital  
Em test. ( ) da verdade.

GIOCONDA G M M SIRIO-Esc Juramentada  
Várzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cód. Serv. 184 Coc Ato 6  
<http://www.tmt.jus.br/selos>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA  
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000

www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

Pág. 1

## Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 62078

ART nº: 716428

Validade: Permanente

Protocolo: 2012013967

Expedição: 22/02/2012 14:11

Nome: ADRIANO SOARES

Titulação: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: MT09131/D

Registrado no Crea-MT desde: 28/06/2001

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Mato Grosso - CREA-MT CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 716428. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea. Assina a presente Certidão de Acervo Técnico o Coordenador do Setor de Acervo Técnico, conforme delegação do Presidente do CREA-MT.

ART: 716428

Início: 20/08/2010 Conclusão: / /

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o CREA-MT:

AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC

CPF/CNPJ: 03507415000810

Tipo: Obra/Serviço

Convênio: Não é convênio

Participação técnica: Responsável

Carteira:

ART Vinculada:

Motivo: Substituição de ART

Carteira: MT09131/D

ART Vinculada: 711808

Proprietário da Obra/Serviço: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

CPF/CNPJ: 03507415000810

Endereço da obra/serviço: AVENIDA IPIRANGA Nro:2560 E.E. ALINA DO NASCIMENTO BAIRRO: CIDADE ALTA CUIABA - MT

Dimensão: 0 Finalidade: Público

Valor do Contrato: 781.153,15 Honorários: 0,00

Atividade Técnica Descrição da Obra/Serviço

REFORMA

REFORMA \*

Quant Und.  
1108,940000 M2

### Resumo do Contrato

CONTRATO N.º 124/2010/SEDUC.

OBJETO: REFORMA GERAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, MURO NA E.E. ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT.

SERVIÇOS:

SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA, MOVIMENTO DE SOLOS, INFRA - ESTRUTURA, MESO E SUPER - ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS, ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, COBERTURA, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS, PISOS, FORROS E DIVISÓRIAS, VIDROS, PINTURA, SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES, URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, LIMPEZA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO.

JONILSON SAMPÓS DA SILVA

Coordenador

Portaria 035/2005



A Presente CERTIDÃO é válida somente com a presença da marca d'água do CREA-MT em todas as suas folhas

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.




Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabela : **CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA**  
Av. Ary Paes Barreto n.º 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

### AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

**ASV14444**  
R\$ 2,40



Em test. () da verdade..

\_\_\_\_\_  
GIOCONDA G M M SIRIO-Esc. Juramentada  
Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Cod. Arb. 6  
<http://www.fimfils.br/selos>





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO  
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
 Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033  
 www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: 62077

Protocolo: 2012013967

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº 9146, O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS.

Nº DA ART: 716428 DATA: 27/08/2010

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ADRIANO SOARES

TITULACAO:

Engenheiro Civil

CARTEIRA: MT09131/D

RNP: 1203449054

EMPRESA CONTRATADA: 5236-AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

DESCRICAÇÃO DA ATIVIDADE:

CONTRATO N.º 124/2010/SEDUC.

OBJETO: REFORMA GERAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, MURO NA E.E. ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT.

SERVIÇOS:

SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA, MOVIMENTO DE SOLOS, INFRA - ESTRUTURA, MESO E SUPER - ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS, ELEMENTOS DE VEDAÇÃO, COBERTURA, ESQUADRIAS, REVESTIMENTOS, PISOS, FORROS E DIVISÓRIAS, VIDROS, PINTURA, SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES, URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, LIMPEZA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO.

Atividades

1: Reforma DE Reforma \* - 1108,94 M2

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:

AVENIDA IPIRANGA Nro:2560 E.E. ALINA DO NASCIMENTO BAIRRO: CIDADE ALTA  
CUIABÁ - MT

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 20/08/2010 À 20/04/2011

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL

ART VINCULADA: 1322411

TIPO DE VINCULO: Complementar

DO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - ADRIANO SOARES

NÚMERO DA CARTEIRA: MT09131/D

RNP: 1203449054

Atividades

1: Reforma DE Reforma \* - 1108,94 M2

ART VINCULADA: 711808

TIPO DE VINCULO: Substituição de ART

DO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - ADRIANO SOARES

NÚMERO DA CARTEIRA: MT09131/D

RNP: 1203449054

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 22 de Fevereiro 2012



231


 Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
 Tabela: **CHAFA MONTEIRO DE OLIVEIRA**  
 Av. Ary Pires Barreto nº 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3958 fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com a original que me foi apresentada do que  
 dou fé.  
**ASV14443**  
 R\$ 2,40

Selo de Controle Digital  
 Em test. (  ) da verdade.

GIOCONDA G M M SIRIO-Esc. Juramentada  
 Varzea Grande/MT 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Doc. Ato 6  
<http://www.tim.lus.br/seios>





JONILSON SANTOS DA SILVA

Coordenador

Portaria 035/2005

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a presença da marca d'água do Crea-MT em todas as suas folhas

Handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.



Handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.

Handwritten signature in blue ink, located at the bottom of the page.

CR Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabela: **Chafiz Monteiro de Oliveira**  
Av. Ary Paes Barreto n.º 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Várzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6119 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14442**  
R\$ 2,40

→ Selo de Controle Digital  
Em test. ( ) da verdade.

GIOCONDA G M M SIRIO - Esc. Juramentada  
Várzea Grande/MT 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 184 Coc. At. 6  
<http://www.tjmt.jus.br/seles>





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Secretaria de Estado de Educação



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC – DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empresa Pública, situada à Rua Engº Edgar Prado Arze, nº 215 – Centro Político Administrativo – CPA – Cuiabá/MT, CNPJ Nº 03.507.415/0008-10, **ATESTA**, pelo presente, que a Empresa **AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 02.250.369/0001-88, sob responsabilidade técnica do profissional **ENGENHEIRO CIVIL ADRIANO SOARES**, CREA Nº 120344905-4, Registro Nacional, **EXECUTOU**, dentro dos prazos, normas e recomendações desta Secretaria, o objeto licitado na Tomada de Preços nº 006/2010, cujo início se deu na data de 01/09/2010 com a expedição da Ordem de Serviço e termino em 18/02/2012 e que tiveram como Objeto a execução dos seguintes serviços:

REFORMA GERAL + INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS + INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + MURO DA ESCOLA ESTADUAL ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS – CUIABÁ, conforme Contrato nº 124/2010 com as ART de Execução nº 716428 de 27/08/2010 e 711808 de 28/08/2010.

Os serviços descritos nas planilhas em anexo foram executados a contento e com desempenho satisfatório pela empresa.

Cuiabá-MT, 27 de Janeiro de 2012.



*NUCCIA MARIA G. ALMEIDA SANTOS*  
NUCCIA MARIA G. ALMEIDA SANTOS

Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento de Estrutura Escolar

*Nuccia Maria G. Almeida Santos*  
Nuccia Maria G. Almeida Santos  
Engenheira Civil  
CREA 1204735166  
SUEE/SEDUC

Secretaria de Estado de Educação  
Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215  
Centro Político Administrativo  
CEP: 78049-909 - Cuiabá-MT  
Fone: (65) 3613-6300  
www.seduc.mt.gov.br



Governo de  
**Mato Grosso**  
Mais por você

ANEXO DA CERTIDÃO Nº. 62077/2012

ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MT SOB


O Nº. 9146 REFERENTE OBRA OU

SERVIÇO CONSTANTE DA(S) ART. (S) Nº. (S)

716428 - 27/08/2010, 132411

EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (IS) ENGº

CIVIL - ADRIANO SOARES

  
Jonilson Santos da Silva  
Coordenador de Processos •  
Artespedes  
CPAN Portaria 008/2007

Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabellia - **CHAFA Monteiro de Oliveira**  
Av. Ary Paes Barreto nº 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14441**  
R\$ 2,40

 Selo de Controle Digital  
Em test. ( ) da verdade.


GIOCONDA G M M SIRIO - Esc. Juramentada  
Varzea Grande/MT 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Cod. Ato 6  
<http://www.tjmt.jus.br/seles>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**  
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

RS	custo/m2	765,70
----	----------	--------

Referência:  
 Boletim SINIFRA Set/2008

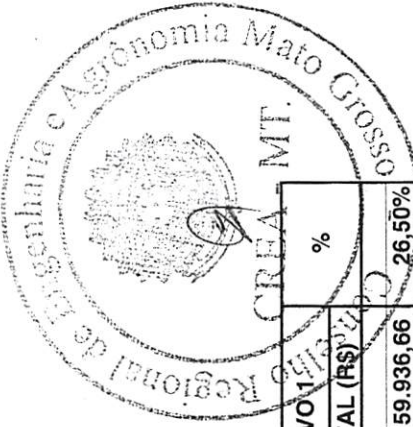

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	CONTRATO		ADITIVO		%
		SUB-TOTAL (R\$)		SUB-TOTAL (R\$)		
1.0	REFORMA GERAL	603.550,82		159.936,66		26,50%
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	93.639,89		(40.247,00)		-42,98%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.895,62		7.847,50		11,91%
4.0	MURO	18.066,82		14.549,39		80,53%
<b>TOTAL DA OBRA =</b>		<b>R\$ 781.153,15</b>		<b>R\$ 142.086,55</b>		<b>18,19%</b>

Cuiabá - MT, Junho de 2011

Importa o Presente Aditivo em:  
 #NOME?



*Prof. Maria G. Almeida Santos*  
**Marcia Maria G. Almeida Santos**  
 Engenheira Civil  
 CREA 1204735166  
 SUEE/SEDUC

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

 Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
 Tabelião - **Chafiz Monteiro de Oliveira**  
 Av. Ary Paes Barreto nº 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14440**  
 R\$ 2,40

  Selo de Controle Digital

Em test. (  ) da verdade.

GIOCONDA G M M/SIRO- Esc. Juramentada  
 Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 200 Ato 6  
<http://www.tjmt.us.br/seios>





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**  
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO

OBRA:

ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT

**REFORMA GERAL**

ENDEREÇO: AVENIDA PIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

BDI: 25,81%

INCC: 0,00%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		VALORES (R\$)			SALDO CONTRATUAL			
			CONTRATO	REVISADA 1	ADITIVO 1	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	Físico	Quant.	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	M2	25,00	15,00	(10,00)	340,20	8.505,00	(3.402,00)			
1.2	Fornecimento e instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas Dim. 5,00 x 2,50 m	M2	12,50	12,50	-	178,82	2.232,75	-			
1.3	Ligação provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	UN	1,00	1,00	-	1.842,26	1.842,26	-			
1.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	36,00	250,00	214,00	4,65	167,40	995,10			
1.5	Administração Local da Obra	mês	8,00	8,00	-	4.367,94	34.943,52	-			
				SUBTOTAL		SUBTOTAL	47.690,93	(2.406,90)			
2.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA										
2.1	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	37,33	53,85	16,52	22,91	855,23	378,53			
2.2	Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	M2	117,31	167,31	50,00	3,80	445,77	190,00			
2.3	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	M2	760,95	760,95	-	9,91	7.541,01	-			
2.4	Demolição de revestimento com argamassa	M2	412,79	542,58	129,79	3,80	1.568,60	493,20			
2.5	Demolição de revestimento de azulejo	M2	444,88	444,88	-	19,09	8.492,75	-			
2.6	Demolição de piso cerâmico	M2	201,26	265,88	64,62	5,33	1.072,71	344,44			
2.7	Demolição de piso revestido com granilite	M2	487,60	487,60	-	10,88	5.207,56	-			
2.8	Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento	M2	1.181,24	1.181,24	-	1,85	2.185,29	-			
2.9	Demolição de lombo de tábuas de pinho	M2	623,34	623,34	-	2,67	1.664,31	-			
2.10	Remoção de pintura a óleo ou esmalte	M2	378,29	378,29	-	3,65	1.380,75	-			
2.11	Demolição de concreto simples	M3	5,50	5,50	-	112,61	619,35	619,35			
2.12	Corte e retirada de estrutura metálica das paredes	ML	120,00	120,00	120,00	44,03	-	5.283,60			
				SUBTOTAL		SUBTOTAL	30.413,98	7.309,12			
3.0	MOVIMENTO DE SOLOS										
3.1	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	M3	18,15	23,00	4,85	25,87	469,54	125,46			
3.2	Aplioamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M3	19,11	45,00	25,89	9,59	185,17	250,87			
3.3	Escav. carga mat. jazida (incl. Limpeza camada veg., Expurgo, Incendiz-Jazida)-Rod. Pav	M3	41,82	79,50	37,68	10,09	421,96	380,19			
3.4	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> , distância até 10 km	m <sup>3</sup>	41,82	79,50	37,68	19,83	829,29	747,19			
3.5	Compactação de aterro	M3	41,82	79,50	37,68	3,46	144,69	130,37			
3.6	Reaterro manual de vala	M3	9,08	9,08	-	2,91	26,42	-			
				SUBTOTAL		SUBTOTAL	2.077,07	1.634,08			
4.0	INFRA - ESTRUTURA										
4.1	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	M3	0,96	3,50	2,54	316,88	304,20	604,87			
4.2	Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 25 mpa	M3	11,34	11,34	-	312,93	3.548,62	-			
4.3	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	11,34	11,34	-	63,06	715,10	-			
4.4	Forma de madeira para fundação com lâmba de 3a, 5 reaproveitamentos	M2	135,02	135,02	-	40,22	5.430,50	-			
4.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra	KG	634,78	634,78	-	9,30	5.903,45	-			
4.6	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra	kg	158,69	162,50	3,81	9,41	1.493,27	35,85			
				SUBTOTAL		SUBTOTAL	17.395,14	840,72			
5.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA										
5.1	Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 25 mpa	M3	10,21	25,25	15,04	348,80	3.561,24	5.245,95			
5.2	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M3	10,21	25,25	15,04	30,27	309,05	455,26			
5.3	Forma de madeira para estruturas em geral, 3 reaproveitamentos	M2	189,26	214,63	26,37	52,20	9.827,17	1.376,51			
5.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra	KG	571,94	2.020,00	1.448,06	9,30	5.319,04	13.466,95			
5.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra	kg	142,98	404,00	261,02	9,41	1.345,44	2.456,19			
				SUBTOTAL		SUBTOTAL	20.361,94	23.000,86			
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS										
6.1	Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica	M2	195,01	105,90	(89,11)	10,76	2.098,30	(958,82)			
				SUBTOTAL		SUBTOTAL	2.098,30	(958,82)			

  
 Maria B. Almeida Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA 1204735/160  
 SUEE/SEDUC

**CR** Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
 Tabellia: **CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA**  
 Av. Ary Paes Barreto - 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Várzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASY14439**  
 R\$ 2,40

☞ Selo de Controle Digital  
 Em test. ( AS ) da verdade.


GIOCONDA G M M SIRIO - Esc. Juramentada  
 Várzea Grande/MT 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Cod. Ato 6  
<http://www.timelife.br/selos>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

OBRA:

REFORMA GERAL

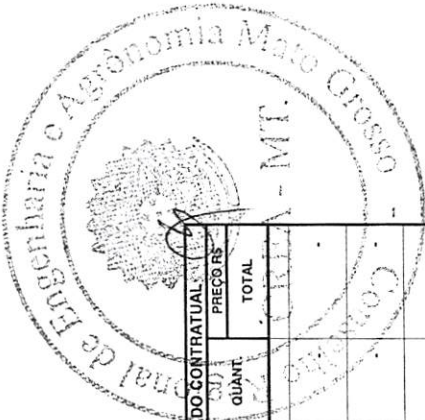

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		INCC:	VALORES (R\$)			SALDO CONTRATUAL			
			CONTRATO	REVISADA 1		UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	FÍSICO %	QUANT.	PREÇOS TOTAL	
7.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO				25,81%					0,00%		
7.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 -	M2	499,74	636,00		30,21	15.097,14	4.116,41				
7.2	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 -	M2	22,50	95,43		53,03	1.193,17	3.867,21				
7.3	Veriga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 mpas, controle tipo b	M3	2,44	5,45		1.428,02	3.484,36	4.296,34				
7.4	Fornecimento e Assentamento de Elemento Vazado de Cerâmica Tradicional Reto Assente c/ Argamassa de Cimento, Cal e Areia no Traço 1:2:8	M2	-	30,00		66,05	-	1.981,50				
8.0	COBERTURA					SUBTOTAL	19.774,67	14.263,46				
8.1	Fornecimento e Instalação Perfil metálico em U 40 x 80 x 40mm, com contravenamento em 30x75x30mm - chapa 14, com pintura anti corrosiva - estrutura da telha.	M	255,40	410,00		86,54	22.102,31	13.379,08				
8.2	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha trapezoidal tipo sanduiche com bandeja inferior lisa em aço pré-pintada eletrostaticamente nas duas faces, e=0,43 mm, termo acústica com EPS espessura 5cm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela borracha e parafuso	M2	1.106,94	1.305,00		129,50	143.607,73	25.389,77				
8.3	Fornecimento e Instalação Cantoneira Metálica estrutural 2" x 2" com chumbador a cada 1m - chapa 14, com pintura anti corrosiva para sustentação da telha	M	109,10	109,10		38,08	4.154,52	-				
8.4	Fornecimento e Instalação de Arremate de borda lateral	ML	16,10	206,00		19,50	313,95	3.703,05				
8.5	Fornecimento e Instalação de Arremate de Tapa Onida	ML	106,27	135,00		15,10	1.604,67	433,82				
8.6	Perfil metálico U de 50 x 30 mm - chapa 14, para fixação das telhas sobre as vigas e parede	ML	341,84	351,00		31,79	10.867,09	291,19				
8.7	Fornecimento e Instalação de Perfil metálico em U 42x15x42cm espessura de 3cm em chapa 14 para apoio das telhas metálicas.	UN	36,00	36,00		26,73	962,28	-				
8.8	Ruílo de chapa de aço galvanizado n.24 desenvolvimento 33 cm	M	174,94	174,94		27,35	4.784,60	-				
8.9	Calha de chapa galvanizado n.24 desenvolvimento 50 cm	M	5,98	15,50		37,09	221,79	353,09				
8.10	Joelho 90 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UN	27,00	27,00		15,65	422,55	-				
8.11	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	31,50	31,50		18,41	579,91	-				
9.0	ESQUADRIAS					SUBTOTAL	189.621,40	43.550,00				
9.1	Fornecimento e Instalação de 6 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir do tipo letra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.	M2	11,34	15,12		351,59	3.987,03	1.329,01				
9.2	Fornecimento e Instalação de 9 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" com visor em vidro 32 x 12 cm e fechadura cilíndrica de embutir do tipo letra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.	M2	17,01	17,01		361,70	6.152,51	-				
9.3	Fornecimento e Instalação de 7 Portas (0,80x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir do tipo letra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.	M2	11,76	10,08		351,59	4.134,69	(690,67)				
9.4	Fornecimento e Instalação de 4 Portas (0,70x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir do tipo letra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo.	M2	5,88	5,88		341,83	2.009,96	-				
9.5	Fornecimento e Instalação de Janelas de Alumínio tipo guilhotina (2,00x1,50x1,00)m, c/ Passa Prato em granito comp-2,00mxlg. 40cm, inclusive acessórios de fixação conforme detalhe padrão SEDUC.	UN	1,00	-		704,54	704,54	(704,54)				

Op

Lucia  
 Maria G. Almeida Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA 1204735166  
 SUEE/SEDUC

536  
 R

1\* Medição do Atividade - Reforma Geral Escolas Tocantins

**CR** Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
 Tabelião: **Chafiz Monteiro de Oliveira**  
 Av. Ary Paes Barreto nº 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com a original que me foi apresentada do que  
 dou fé  
**ASV14438**  
 R\$ 2,40

Selo de Controle Digital  
 Em test. ( ) da verdade.

GIOCONDA G M M S R I O - Esc Juramentada  
 Varzea Grande/MT 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184, Cód. Ato 6  
<http://www.tribtjus.br/seios>






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 Secretária Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

OBRA:

REFORMA GERAL

BDI: 25,81% INCC: 0,00%

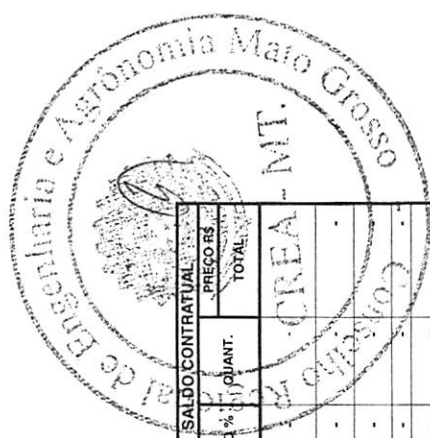

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE			VALORES (RS)			SALDO CONTRATUAL	
			CONTRATO	REVISADA 1	ADITIVO 1	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	FÍSICO	PREÇOS TOTAL
9.6	Fornecimento e assentamento de 6 portas e montante de alumínio de 0,60 x 1,70 m, suspensa a 10 cm do piso acabado, para os box dos banheiros masculino e feminino, inclusive fechadura tipo ferroliho, conforme memorial descritivo.	M2	6,12	6,12	-	629,05	3.849,78	-	-	-
9.7	Fornecimento e instalação de janela de correr com grade quadriculada (largura 2,00m x altura 1,20m batente de 12cm) Sasazaki linha Bellfort - P = 0,90m	UN	17,00	26,00	9,00	678,96	11.542,32	6.110,64	-	-
9.8	Fornecimento e instalação de janela basculante (largura 1,00m x altura 0,60m batente de 2,5cm) Sasazaki - P = 1,50m	UN	25,00	30,00	5,00	195,45	4.886,25	977,25	-	-
9.9	Recuperação de janelas existentes	m2	53,24	5,00	(48,24)	110,06	5.859,59	(5.309,29)	-	-
9.11	Fornecimento e instalação de janela basculante (largura 0,60m x altura 0,60m batente de 8cm) Sasazaki - peitoril conforme especificado no projeto.	UN	4,00	5,00	1,00	135,87	543,48	135,87	-	-
9.12	Fornecimento e instalação de janela de alumínio tipo guilhotina (1,50x1,20x1,00)m, c/ Passa Prato em granito comp.2,00mxlarg. 40cm, inclusive acessórios de fixação conforme detalhe padrão SEDUC.	UN	-	1,00	1,00	1.100,76	-	1.100,76	-	-
9.13	Portão de ferro metalon 30x20mm(1unid.0,8m e2,10m de altura) de correr	M2	-	1,70	1,70	86,34	-	146,77	-	-
9.14	Fornecimento e instalação de Portão reforçado (1x2,10m ) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n.19.	M2	-	2,10	2,10	341,83	-	717,84	-	-
9.15	janela de ferro sob encomenda, colocacao e acabamento basculante	m²	-	3,14	3,14	408,72	-	1.285,01	-	-
10.0	REVESTIMENTOS					SUBTOTAL	43.670,15	5.198,65		
10.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5 mm	M2	1.652,86	1.720,00	67,14	3,84	6.346,98	257,81	-	-
10.2	Reboco massa única para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:2:9, e=20 mm	M2	1.652,86	2.066,08	413,22	15,97	26.396,17	6.599,04	-	-
10.3	Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	M2	384,00	323,12	(60,88)	35,03	13.451,52	(2.132,62)	-	-
10.4	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm	M2	384,00	323,12	(60,88)	6,50	2.496,00	(395,72)	-	-
10.5	Canteleira de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo	M	12,00	21,60	9,60	11,02	132,24	105,79	-	-
10.6	PASTILHA DE PORCELANA, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	-	62,00	62,00	103,81	-	6.436,22	-	-
10.7	EMBOCO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, E=20 MM	m2	-	250,00	250,00	19,94	-	4.985,00	-	-
11.0	PISOS					SUBTOTAL	48.822,91	15.855,52		
11.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caibão de Estreito para Complementação do que Faltar	M2	370,60	630,27	159,67	5,17	1.916,00	825,49	50,00	1.370,74
11.2	Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, e=6 cm	M2	774,29	774,29	-	25,56	19.790,85	-	-	-
11.3	Revestimento de piso em granilite lundido no local formando quadros de 2,00 m2 de área ( no máximo) com junta plastica colorida e faixa perimétrica de 30 cm na cor preta, aplicação de 2 demãos de resina acrílica (20% Grana Branca)	M2	690,54	680,54	-	35,21	23.961,81	-	-	-
11.4	Rodapé de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:1:4, embulido	M	442,44	442,44	-	18,03	7.977,19	-	-	-
11.5	Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=3 cm	M2	93,75	267,23	173,48	19,45	1.823,43	3.374,18	-	-
11.6	Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm), PEI 05, Cor Bego Claro, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno	M2	93,75	267,23	173,48	31,58	2.960,62	5.478,49	-	-
11.7	Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro, dimensões mínimas de 300x300 com espessura de 8 mm, espessura da junta: 6 mm	M2	93,75	267,23	173,48	2,60	243,75	451,04	-	-
11.8	Fornecimento e Assentamento de Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7,00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cor Clara, PEI 05, incl Rejuntamento	M	128,00	141,69	13,69	13,57	1.736,96	185,77	-	-
11.9	Tinta a base de resina acrílica e quartzo em piso granilite com duas demãos, inclusive limpeza e lixamento	M2	196,00	490,28	294,28	12,33	2.416,68	3.628,47	-	-

*Handwritten signature and stamp:*  
 Engenheira Civil  
 CREA 1204735160  
 SUEE/SEDUC

**CR** Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
 Tabella: **Chafía Monteiro de Oliveira**  
 Av. Ary Paes Barreto n.º 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14437**  
 R\$ 2,40

☞ Selo de Controle Digital

Em test. ( *[assinatura]* ) da verdade.


GIOCONDA G M M SIRIO - Esc. Juramentada  
 Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Cod. Ato 6  
<http://www.tfmj.jus.br/selos>





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO

OBRA:  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

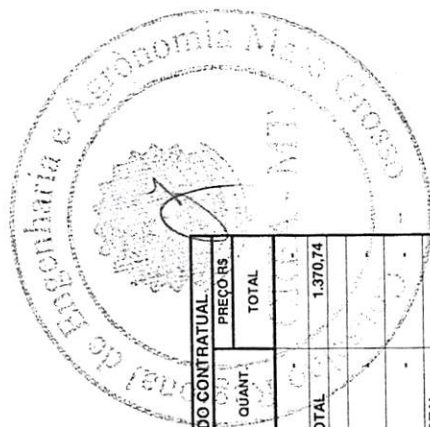

REFORMA GERAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE			VALORES (RS)			SALDO CONTRATUAL		
			CONTRATO	REVISADA 1	ADITIVO 1	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	FÍSICO %	QUANT.	PREÇOS TOTAL
11.10	RECUPERAÇÃO DE GRANULITE INCLUINDO ESTUQUE DE CIMENTO E BIANCO	M2	-	490,28	490,28	18,87	-	9.251,58	-	-	1.370,74
12.0	FORROS E DIVISÓRIAS										
12.1	Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa no traço 1:3. Cor cinza	M2	17,79	-	(17,79)	325,60	5.792,42	(6.792,42)	-	-	-
12.2	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA, DIMENSÕES 200 X 6000 MM	M2	-	34,94	34,94	46,22	-	1.614,92	-	-	-
13.0	VIDROS										
13.1	Vidro fantasia camelado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm	M2	57,24	-	-	73,64	4.215,15	-	-	-	-
14.0	PINTURA										
14.1	Emassamento de parede externa e interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura Látex	M2	1.033,30	-	-	9,80	10.126,34	-	-	-	-
14.2	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha: Renner, Coral ou Suviniil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada	M2	2.066,60	1.033,30	(1.033,30)	10,32	21.327,31	(10.663,65)	-	-	-
14.3	Pintura Com Esmalte Sintético/Liquibinho (1ª Linha: Renner, Suviniil ou Ipiranga) em Paredes, incl. livramento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo	M2	694,86	-	-	8,81	6.121,71	-	-	-	-
14.4	Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha: Renner, Suviniil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, Alambreado Novo, Estrutura Metálica da Quadra e Telhas Metálicas da quadra, inclusive livramento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	M2	478,41	-	-	21,02	10.056,17	-	-	-	-
14.5	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CAMADA, APLICADO COM ROLO	M2	-	1.188,20	1.188,20	14,24	-	16.919,96	-	-	-
15.0	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES										
15.1	Fornecimento de quadro de giz de 5,00x1,30m executado na obra, após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2:12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada, com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz.	UN	4,00	-	-	261,06	1.044,24	-	-	-	-
15.2	Fornecimento de quadro de giz de 4,50x1,30m executado na obra, após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2:12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada, com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz.	UN	4,00	-	-	234,95	939,80	-	-	-	-
15.3	Fornecimento e instalação de mastro p/bandeira em poste cônico inclusive pintura e pertences altura livre 5,00 m	UN	3,00	-	-	318,06	954,18	-	-	-	-
15.4	Execução de Escovômetro em alvenaria com 6 pontos de água, Azulejo h = 1,50m. Instalações de água e esgoto encontram-se no item instalações hidro-sanitária	UN	1,00	-	-	491,40	491,40	-	-	-	-
15.5	Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com portão e grade em metalón, inclusive tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo	UN	1,00	-	(1,00)	2.520,26	2.520,26	(2.520,26)	-	-	-
15.6	Execução de Abrigo Provisório para Resíduos Sólidos em tijolo maciço, com portão e grade em metalón, inclusive azulejo na parte interna, conforme detalhe construtivo	UN	1,00	-	-	440,34	440,34	-	100,00	1,00	440,34
15.7	Fornecimento e instalação de caixa de concreto pré-moldado para ar condicionado de 20.000 BTU	un	9,00	7,00	(2,00)	121,09	1.089,81	(242,18)	28,57	2,00	242,18
15.8	Fornecimento e instalação de Totem, conforme Detalhe SEDUC/SINFRA	UN	1,00	-	-	2.359,94	2.359,94	-	-	-	-
15.9	Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com reaproveitamento do portão existente, e instalação das tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo	UN	-	1,00	1,00	2.295,76	-	2.295,76	100,00	1,00	2.295,76
15.10	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM CONEXÕES SEM COSTURA, Ø 20 MM (3/4")	m	-	21,00	21,00	49,37	-	1.036,77	-	-	-

Handwritten signature and stamp: Maria L. Almeida Sam, Engenheira Civil, CREA 1201738168, SUCE/SEDUC

1\* Medição do Aditivo - Reforma Geral EE Alina Tocantins


 Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
 Tabela: **CHAFA MONTIELLO DE OLIVEIRA**  
 Av. Ary Paes Barreto n° 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

**ASV14436**  
R\$ 2,40


 Selo de Controle Digital  
 Em test( ) da verdade.

GIOCONDA G M M SIRIO - Esc. Juramentada  
 Varzea Grande/MT 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Ser.v. 194 Cod. Atos 6  
<http://www.tmmjus.br/SELIS>





539

 Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabelião: **Chafiz Monteiro de Oliveira**  
Av. Ary Paes Barreto nº 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14435**         
R\$ 2,40      Em test. (  ) da verdade.

\_\_\_\_\_  
GIOCONDA G M M S RIO - Esc. Juramentada  
Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184, Col. Ato 6  
<http://www.tjmt.lus.br/selns>





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

OBRA:

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

BDI: 25,81% INCC: 0,00%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		VALORES (R\$)		SALDO CONTRATUAL				
			CONTRATO	REVISADA 1	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	FÍSICO %	QUANT. TOTAL	PREÇO RS TOTAL	
1.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS										
1.1	Fornecimento e instalação de caixa de água metálica tipo taça com altura de fundo de 6.00 m inclusive pintura epox (interna e externa) base de fixação e instalação, de 5.000 litros, sem utilização do tuste	UN	1,00	-	(1,00)	15.411,73	15.411,73	(15.411,73)	-	-	-
1.2	Tomadeira de bôia em latão e bôia plástica Ø 20 mm(3/4 )	UN	1,00	1,00	-	33,87	33,87	-	-	-	-
1.3	Conjunto elevatório motor-bomba (centrifuga) de 1/2 hp	UN	2,00	2,00	(2,00)	538,30	1.076,60	(1.076,60)	-	-	-
1.4	Automático de bôia inferior	UN	1,00	1,00	(1,00)	44,07	44,07	(44,07)	-	-	-
1.5	Automático de bôia superior	UN	1,00	1,00	(1,00)	44,07	44,07	(44,07)	-	-	-
1.6	Fornecimento e instalação de Conector 1/2 cv modelo 3RT - 1016	UN	1,00	1,00	(1,00)	138,71	138,71	(138,71)	-	-	-
1.7	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 32 mm (1 1/4 )	UN	2,00	2,00	(2,00)	82,24	164,48	(164,48)	-	-	-
1.8	Válvula de retenção de pé com crivo Ø 32 mm (1 1/4 )	UN	2,00	2,00	(2,00)	61,60	123,20	(123,20)	-	-	-
1.9	Execução de Cisterna em Concreto Armado 15.000 lts, Dim. Compr.= 4,20 mts, Larg.= 2,70 mts, Prof.= 1,40 mts, Sendo impermeabilizada Internamente Com Imperm. Cristaliz. Chapisc. Com Aditivo de Alto Desempenho, e Argamassa Com Impermeab. PADRÃO SEDUC	UN	1,00	-	(1,00)	11.794,69	11.794,69	(11.794,69)	-	-	-
1.10	Mictório de louça Individual, inclusive jogo de metais, engate flexível, parafusos e sifão	UN	3,00	-	(3,00)	270,82	812,46	(812,46)	-	-	-
1.11	Chuveiro-ducha metálico	UN	2,00	2,00	-	59,41	118,82	-	100,00	2,00	118,82
1.12	Tomadeira de pressão metálica para pia	UN	9,00	9,00	-	58,61	527,49	-	-	-	-
1.13	Bacia de Louça Sifonada Branca, Inclusive anel de vedação, assento Plástico Standard Branco, bolsa de ligação, Joelho e Tubo de ligação	UN	10,00	8,00	(2,00)	189,73	1.897,30	(379,46)	-	-	-
1.13.1	Bacia de Louça com caixa aclopada Sifonada Branca, inclusive anel de vedação, assento Plástico Standard Branco, bolsa de ligação, Joelho e Tubo de ligação	UN	-	2,00	2,00	213,88	-	427,76	-	-	-
1.14	Fornecimento e instalação de bacia sanitária linha conforto P51 de louça pl PNEE-deka ou similar com acessórios	UN	2,00	2,00	-	462,79	925,58	-	-	-	-
1.15	Fornecimento e instalação de assento especial AP52, linha conforto para bacia sanitária PNEE deca ou similar	UN	2,00	2,00	-	517,32	1.034,64	-	-	-	-
1.16	Fornecimento e Instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rígido Cromado de 40mm - PNEE	UN	2,00	2,00	-	33,04	66,08	-	-	-	-
1.17	Fornecimento e Instalação de SPUD de Borracha Pl/Bacia Sanitária - PNEE	UN	2,00	2,00	-	2,44	4,88	-	-	-	-
1.18	Fornecimento e Instalação de Tubo de Descida Para Válvula de Descarga de PVC Rígido, Incl. Joelho e Anel de Borracha - PNEE	UN	2,00	2,00	-	9,64	19,28	-	-	-	-
1.19	Válvula de descarga metálica sem registro, com acabamento metálico e com canopla cromada Ø 32 mm (1 1/4 ) ou 40 mm (1 1/2 )	UN	12,00	12,00	-	131,75	1.581,00	-	-	-	-
1.20	Fornecimento e Instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 40 cm - PNEE	UN	2,00	2,00	-	2,52	5,04	-	-	-	-
1.21	Registro de gaveta bruto Ø 65 mm (2 1/2 )	UN	1,00	1,00	-	112,74	112,74	-	-	-	-
1.22	Registro de gaveta bruto Ø 50 mm (2 )	UN	4,00	4,00	-	101,76	407,04	-	-	-	-
1.23	Registro de gaveta com canopla Ø 40 mm (1 1/2 )	UN	2,00	2,00	-	100,69	201,38	-	-	-	-
1.24	Registro de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4 )	UN	4,00	4,00	-	56,53	226,12	-	-	-	-
1.25	Registro de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4 )	UN	5,00	5,00	-	60,72	303,60	-	-	-	-
1.26	Luva com lianga de PVC, soldável com bucha de latão, Ø 25 mmx3/4	UN	3,00	3,00	-	21,36	64,08	-	-	-	-
1.27	Adaptador soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 75 mmx2 1/2	UN	1,00	1,00	-	124,45	124,45	-	-	-	-
1.28	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	9,00	9,00	-	2,50	22,50	-	-	-	-
1.29	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 60mm x 2 pol	UN	8,00	8,00	-	12,99	103,92	-	-	-	-
1.30	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 50mm x 1,5 pol	UN	16,00	16,00	-	6,32	101,12	-	-	-	-

*Marcia Maria G. Almeida San*  
 Engenheira Civil  
 CREA 1204735166  
 SUEE/SEDUC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

240

CR Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabela: **Chafia MONTEIRO de OLIVEIRA**  
Av. Ary Paes Barreto nº 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14434**  
R\$ 2,40

 Selo de Controle Digital

Em test. ( ) da verdade.

\_\_\_\_\_  
GIOCONDA G M M SIRIO-Esc Juramentada  
Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 784-COD Ato 6  
<http://www.timl.us.br/seios>






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**  
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2580, BAIRRO CIDADE ALTA

OBRA:

**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**

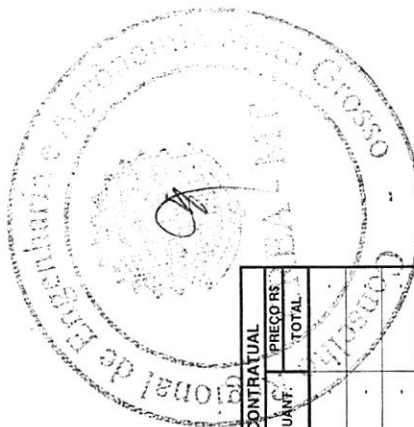

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID	QUANTIDADE		VALORES (R\$)			SALDO CONTRATUAL	
			CONTRATO	REVISADA 1	ADITIVO 1	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	FÍSICO %
1.31	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Balsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 75mm x 2,5 pol	UN	2,00	2,00	-	23,79	47,58	-	-
1.32	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução ( Curta ) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 50mm	UN	10,00	10,00	-	8,93	89,30	-	-
1.33	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução ( Curta ) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 60mm	UN	3,00	3,00	-	15,47	46,41	-	-
1.34	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25 mm	UN	5,00	5,00	-	6,21	31,05	-	-
1.35	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 50 mm	UN	3,00	3,00	-	6,95	20,85	-	-
1.36	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução ( Curta ) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 50mm	UN	2,00	2,00	-	8,93	17,86	-	-
1.37	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 25 mm	UN	5,00	5,00	-	10,13	50,65	-	-
1.38	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 75 mm	UN	9,00	-	(9,00)	40,79	367,11	(367,11)	-
1.39	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm	UN	26,00	26,00	-	4,45	115,70	-	-
1.40	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UN	5,00	5,00	-	10,76	53,80	-	-
1.41	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 60 mm	UN	9,00	9,00	-	18,09	162,81	-	-
1.42	Tubo de PVC rígido soldável marrom Ø 25 mm	M	34,28	120,00	85,72	8,62	295,49	738,50	162,81
1.43	Tubo de PVC rígido soldável marrom Ø 50 mm	M	12,53	36,00	23,47	22,28	279,16	522,91	-
1.44	Tubo de PVC rígido soldável marrom Ø 60 mm	M	27,01	27,01	-	32,90	888,62	-	-
1.45	Tubo de PVC soldável Ø 75 mm	M	102,28	-	(102,28)	48,90	5.001,49	(5.001,49)	888,62
1.46	Tubo soldável de PVC marrom Ø 80 mm	UN	13,00	13,00	-	21,59	280,67	-	-
1.47	Tubo soldável de PVC marrom Ø 75 mm	UN	4,00	4,00	(4,00)	36,45	145,80	(145,80)	-
1.48	Tubo soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UN	2,00	2,00	-	10,79	21,58	-	-
1.49	Fornecimento e instalação de Te 90º com Bucha de Laitão Central B 25mm x 1/2 pol	UN	11,00	11,00	-	9,82	108,12	-	-
1.50	Tubo de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm	UN	4,00	4,00	-	12,68	50,72	-	-
1.51	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3; lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm (caixa de gordura)	UN	4,00	8,00	4,00	209,20	836,80	836,80	-
1.52	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3; lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm	UN	3,00	3,00	-	297,36	892,08	-	-

BDI: 25,81% INCC: 0,00%

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the page, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.

*Marcia Maria G. Almeida Santos*  
 Engenheira Civil  
 CREA 1204735166  
 SUEE/SEDUC

**CR** Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
 Tabellã: **Chafía Monteiro de OLIVEIRA**  
 Av. Ary Paes Barreto n.º 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccattre@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14433**  
 R\$ 2,40

Em test. ( ) da verdade.  
 Selo de Controle Digital

**GIOCONDA G M M SIRIO**-Esc. Juramentada  
 Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Cód. Serv. 184 Cód. At. 6  
<http://www.timt.jus.br/selos>





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**  
 Secretária Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

OBRA:

**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**

INCC: 0,00%

25,81%

BDI:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		ADITIVO 1	ADITIVO 1	VALORES (R\$)		SALDO CONTRATUAL	
			CONTRATO	REVISADA 1			UNITÁRIO	CONTRATO	FÍSICO %	QUANT.
1.53	Caixa sifonada de PVC rígido, 100 x 100 x 50 mm	UN	2,00	2,00	-	-	18,47	36,94	-	-
1.54	Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 150 x 50 mm	UN	9,00	9,00	-	-	25,68	231,12	22,22	2,00
1.55	Fornecimento e instalação de Porta Greiha Redondo Branco 100 mm	UN	2,00	2,00	-	-	2,42	4,84	-	-
1.56	Fornecimento e instalação de Greiha Redonda Branca 100 mm	UN	2,00	2,00	-	-	14,89	29,78	-	-
1.57	Fornecimento e instalação de Porta Greiha Quadrada Prata 150 mm	UN	9,00	9,00	-	-	5,38	48,42	-	-
1.58	Fornecimento e instalação de Greiha Quadrada Branca 150 mm	UN	9,00	9,00	-	-	4,95	44,55	-	-
1.59	Fornecimento e instalação de Sifão Tipo Copo Em PVC Cromado - PNEE e Pias da cozinha	UN	15,00	15,00	-	-	35,42	531,30	-	-
1.60	Pias da cozinha e tanque	UN	18,00	18,00	-	-	5,33	95,94	-	-
1.61	Curva 90 curta de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UN	8,00	8,00	-	-	21,35	170,80	-	-
1.62	Curva 90 curta de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	UN	3,00	3,00	-	-	10,74	32,22	-	-
1.63	Joelho 45 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	UN	8,00	8,00	-	-	15,59	124,72	-	-
1.64	Joelho 45 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	UN	11,00	11,00	-	-	8,11	89,21	-	-
1.65	Joelho 90 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	UN	29,00	29,00	-	-	7,75	224,75	-	-
1.66	Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	UN	4,00	4,00	-	-	6,88	27,44	-	-
1.67	Fornecimento e instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 100 mm	UN	12,00	12,00	-	-	16,45	197,40	-	-
1.68	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	UN	11,00	11,00	-	-	22,66	249,26	-	-
1.69	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm	UN	9,00	9,00	-	-	34,96	314,64	-	-
1.56	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm	UN	6,00	6,00	-	-	14,27	85,62	-	-
1.57	Junção simples de PVC reforçado bege pérola, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm	UN	1,00	1,00	-	-	23,15	23,15	-	-
1.58	Luva simples de PVC branco ponta bolsa e virola, D=100 mm	UN	22,00	22,00	-	-	10,38	228,36	-	-
1.59	Luva simples de PVC branco ponta bolsa e virola, D=50 mm	UN	20,00	20,00	-	-	5,28	105,60	-	-
1.60	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	M	2,40	2,40	-	-	7,55	18,12	-	-
1.61	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	M	41,26	65,00	23,74	-	10,88	448,90	288,29	-
1.62	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	M	0,93	4,50	3,57	-	15,91	14,79	96,79	-
1.63	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	110,09	120,00	9,91	-	18,41	2.026,75	182,44	-
1.64	Redução mecânica de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm	UN	1,00	1,00	-	-	9,39	9,39	-	-
1.65	Fornecimento e instalação de bancada em aço inox para cozinha nas dimensões (0,80largura x 2,45comprimento) preenchida internamente com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4 com uma cuba nas dimensões (0,60largurax0,80comprimentox0,50profundidade) m em aço inox - Lavapaneles, conforme detalhe padrão SEDUC	UN	1,00	1,00	-	-	4.464,39	4.464,39	-	-
1.66	Fornecimento e instalação de bancada em aço inox para cozinha nas dimensões (0,60largurax3,00comprimento) preenchida internamente com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4 com duas cubas (0,45largurax0,50comprimentox0,35profundidade) m em aço inox, conforme detalhe padrão SEDUC	UN	1,00	1,00	-	-	8.264,02	8.264,02	-	-
1.67	Fornecimento e instalação de Terminal de Ventilação de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	4,00	4,00	-	-	8,85	35,40	-	-
1.68	Execução de fossa séptica conf. det. n. 4,00 x 2,10 x 2,35 m	UN	1,00	-	(1,00)	-	7.895,89	7.895,89	(7.895,89)	-
1.69	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros	un	0,00	4,00	4,00	-	657,04	2.628,16	-	-
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						SUBTOTAL	73.369,30	(37.747,71)	1.437,51
2.1	Tampo de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m	M	4,40	4,60	0,20	-	151,11	684,88	30,22	-
2.2	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão para lavatório de mesa padrão médio, engate flexível do PVC cromado 30cm, sifão metálico para lavatório cromado, válvula de escoamento metálico para lavatório.	UN	10,00	8,00	(2,00)	-	286,46	2.864,60	(872,92)	-
2.3	Fornecimento e instalação de lavatório L51 485x350mm coluna suspensa para L510 DECA ou similar e acessórios para WC PNEE	UN	2,00	2,00	-	-	566,15	1.132,30	-	-
2.4	Lavatório de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios(engate, sifão cromado, válvula)	UN	2,00	2,00	-	-	306,79	613,58	-	-

OP

Maia G. Almeida Santos  
 Engenharia Civil  
 CREA 1204735166  
 SUEEE/SEDUC

Murcia





843


 Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristó Rei  
 Tabela: **Chafia Monteiro de OLIVEIRA**  
 Av. Ary Paes Barreto nº 2183 Bairro Cristó Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccarreira@nra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com a original que me foi apresentada do que  
 dou fé.  
**ASV14431**  
 R\$ 2,40

Selo de Controle Digital  
 Em test. (  ) da verdade.

**GIOCONDA G M M SIRIO**-Esc. Juramentada  
 Varzea Grande/MT 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Cod. Ato 6  
<http://www.fimt.jus.br/selos>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 Secretária Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICIPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

OBRA:

**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		VALORES (RS)			SALDO CONTRATUAL		
			CONTRATO	REVISADA 1	ADITIVO 1	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	FÍSICO %	QUANT.
4.7	Tampão de ferro fundido para poço de visita empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	un	-	1,00	1,00	418,95	-	418,95	-	-
4.8	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	m3	-	0,50	0,50	478,81	-	239,40	-	-
						<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.914,91</b>		
						<b>TOTAL GERAL</b>		<b>93.639,89</b>		<b>93.639,89</b>
								<b>SUB TOTAL</b>		<b>60.405,42</b>
								<b>TOTAL GERAL</b>		<b>60.405,42</b>

INCC: 0,00%

25,81%

BDI:

Cuiabá - MT, Junho de 2011

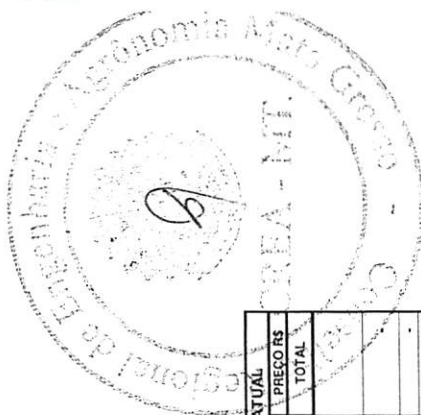

*Handwritten signature*  
 Maria S. Almeida Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA 1204735166  
 QUEE/SEDUC

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

442

GR Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabela nº **Chafiz Monteiro de Oliveira**  
Av. Ary Paes Barreto nº 9183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br


**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14430**  
R\$ 2,40

 **Selo de Controle Digital**  
Em test. ( ) da verdade.

GIOCONDA G M M SIRIO, Esc. Juramentada  
Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Cod. Atos 6  
<http://www.tim.lus.br/selos>



Manoel S. Almeida Santos  
Engenheira Civil  
CREA 1204735166  
SUEE/SEUDUC

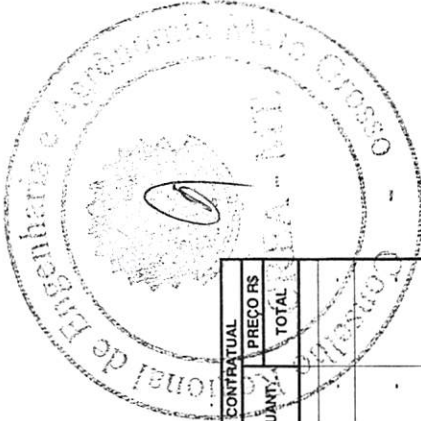

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
CUIABÁ - MATO GROSSO  
ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INCC: 0,00%

25,81%

OBRA:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		VALORES (RS)			SALDO CONTRATUAL				
			CONTRATO	REVISADA 1	ADITIVO 1	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	FÍSICO %	QUANT. TOTAL	PREÇO RS TOTAL	
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO											
1.1	Fornecimento e instalação de Padrão Trifásico. Em Aço Galvanizado h= 7,00 mts Aéreo 150 A "CP", D.I.T 05 - Conjunto completo incl aterramento	CJ	1,00	1,00	-	2.823,88	2.823,88	-	-	-	-	-
1.2	Execução de mureta em alvenaria de 1,5 vez de tijolo assente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratada e areia inclusive fundação em concreto ciclópico no traço 1:3:6 revestimento rústico com pingadeira e calação - para instalação de medidor de luz e força	M2	1,50	3,40	1,90	215,08	322,62	408,65	-	-	-	-
1.3	Cabo isolado em PVC seção 10 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	391,00	391,00	-	7,95	3.108,45	-	-	-	-	-
1.4	Cabo isolado em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	193,00	228,00	35,00	10,29	1.985,97	360,15	-	-	-	-
1.5	Cabo isolado em PVC seção 25 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	95,00	159,00	64,00	14,68	1.394,60	939,52	-	-	-	-
1.6	Fio isolado de PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	3.840,00	3.840,00	-	3,22	12.364,80	-	-	-	-	-
1.7	Fio isolado de PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	490,00	490,00	-	4,05	1.984,50	-	-	-	-	-
1.8	Cabo isolado em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 0,6/1kV - 70°C	M	70,00	116,00	46,00	30,71	2.149,70	1.412,66	-	-	-	-
1.9	Cabo isolado em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	9,00	9,00	-	19,29	173,81	-	-	-	-	-
1.10	Cabo isolado em PVC seção 70 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	M	36,00	36,00	-	40,88	1.471,68	-	-	-	-	-
1.11	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40,00 x 40,00 x 40,00 cm	CJ	1,00	1,00	-	85,68	85,68	-	-	-	-	-
1.12	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 60,00 x 60,00 x 60,00 cm	CJ	5,00	8,00	3,00	183,46	917,30	550,38	-	-	-	-
1.13	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 80,00 x 80,00 x 80,00 cm	CJ	1,00	1,00	-	321,11	321,11	-	-	-	-	-
1.14	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio 30x30x12 cm com tampa quadrada	UN	6,00	6,00	-	145,78	874,68	-	-	-	-	-
1.15	Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	13,00	25,00	12,00	7,56	98,28	90,72	-	-	-	-
1.16	Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	10,00	16,00	6,00	12,69	126,90	76,14	-	-	-	-
1.17	Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	9,00	0,00	(9,00)	20,91	188,19	(188,19)	-	-	-	-
1.18	Fornecimento e Instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	UN	39,00	54,00	15,00	13,51	526,89	202,65	-	-	-	-
1.19	Tomada dois pólos mais terra 20 A - 250 V	UN	10,00	0,00	(10,00)	11,59	115,90	(115,90)	-	-	-	-
1.20	Fornecimento e instalação de conjunto arator com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético Bipolar de 30A/250v para embutir UL, em caixa metálica de 4" x 4" x 2"	CJ	9,00	6,00	(3,00)	108,53	976,77	(325,59)	16,67	1,00	108,53	-
1.21	Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 4	UN	98,00	180,00	82,00	4,21	412,58	345,22	-	-	-	-
1.22	Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4	UN	66,00	20,00	(46,00)	3,74	246,84	(172,04)	-	-	-	-
1.23	Placa (espelho) para caixa, dimensões 4 x 2	UN	384,00	286,00	(98,00)	2,11	206,78	(603,46)	-	-	-	-
1.24	Placa (espelho) para caixa, dimensões 4 x 4	UN	66,00	20,00	(46,00)	3,42	225,72	(187,32)	-	-	-	-
1.25	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	29,00	29,00	-	12,77	370,53	-	-	-	-	-
1.26	Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	1,00	0,00	(1,00)	13,74	13,74	(13,74)	-	-	-	-
1.27	Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	2,00	2,00	-	58,11	116,22	-	-	-	-	-
1.28	Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	7,00	7,00	-	61,70	431,90	-	-	-	-	-
1.29	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 35A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	4,00	2,00	(2,00)	68,31	273,24	(136,62)	-	-	-	-
1.30	Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	UN	2,00	2,00	-	71,17	142,34	-	-	-	-	-
1.31	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 60A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	2,00	-	82,47	164,94	-	-	-	-	-
1.32	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 100A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	2,00	-	97,69	195,38	-	-	-	-	-
1.33	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 150A CA da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	1,00	1,00	-	270,76	270,76	-	-	-	-	-

\* Medição do Aditivo - Reforma Geral EE Alina Tocantins



Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabela: **CHAFA MONTEIRO DE OLIVEIRA**  
Av. Ary Paes Barreto nº 2183 Bairro Cristo Rei, CEP. 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

### AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

**ASV14429**

R\$ 2,40

Selo de Controle Digital

Em test. ( ) da verdade.

GIOCONDA G M M SIRIO-Esc. Juramentada  
Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Cod. Ato 6  
<http://www.tmat.jus.br/seles>




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

OBRA:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BDI: 25,81%

INCC: 0,00%

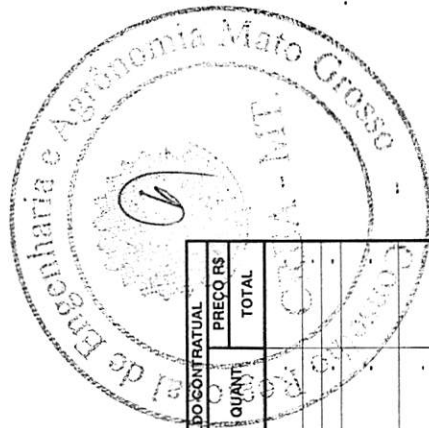

*[Handwritten signature]*

Alina G. Almeida Santos  
 Engenharia Civil  
 CREA 1204735196  
 SUBE/SP/EDUC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		VALORES (RS)			SALDO CONTRATUAL				
			CONTRATO	REVISADA 1	ADITIVO 1	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	FÍSICO %	QUANT. TOTAL	PREÇO RS TOTAL	
1.34	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2" à 1 pol.	ML	470,00	470,00	-	5,11	2.401,70	-	-	-	-	-
1.35	Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	460,00	460,00	-	3,74	1.720,40	-	-	-	-	-
1.36	Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	M	10,00	140,00	130,00	4,11	41,10	534,30	-	-	-	-
1.37	Escavação manual em fundações profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	M3	7,08	7,80	0,72	23,67	167,58	17,04	-	-	-	-
1.38	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 1 1/2" tipo Kanaflex de pvc ou similar	ML	40,00	60,00	20,00	5,27	210,80	105,40	-	-	-	-
1.39	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3" tipo Kanaflex de pvc ou similar	ML	16,00	16,00	-	10,22	163,52	-	-	-	-	-
1.40	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 4" tipo Kanaflex de pvc ou similar	ML	3,00	3,00	-	13,05	39,15	-	-	100,00	3,00	39,15
1.41	Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/3 pás de Madeira 60hz 110v c/ Interruptor tipo reostato p/2 setores e com capacitor	CJ	41,00	52,00	11,00	183,07	7.505,87	2.013,77	-	-	-	-
1.42	Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepôr	UN	93,00	111,00	18,00	78,30	7.281,90	1.409,40	19,82	22,00	1.722,60	-
1.43	Fornecimento e instalação de globo completo com lâmpada econômica espiral de	UN	38,00	36,00	(2,00)	46,85	1.780,30	(93,70)	-	-	-	-
1.44	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Embutir Metálico Com Porta P/12 Circuitos com barramento de 100 A	UN	2,00	1,00	(1,00)	92,75	185,50	(92,75)	-	-	-	-
1.45	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A	UN	1,00	1,00	-	231,24	231,24	-	-	-	-	-
1.46	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 32 Circuitos 100 A	UN	1,00	1,00	-	331,65	331,65	-	-	-	-	-
1.47	Fornecimento e instalação de Quadro de distribuição com 40 pos. e barramento de 225	UN	1,00	1,00	-	589,04	589,04	-	-	-	-	-
1.48	Fornecimento e instalação de terminal box reto 3/4"	UN	60,00	60,00	-	2,04	122,40	-	-	-	-	-
1.49	Fornecimento e instalação de Prensa cabo 3/4"	UN	140,00	140,00	-	3,81	533,40	-	-	100,00	140,00	533,40
1.50	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20,00 m	UN	2,00	2,00	-	24,11	48,22	-	-	-	-	-
1.51	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10,00 m	UN	1,00	1,00	-	19,63	19,63	-	-	-	-	-
1.52	Abraçadeira PVC TR-50 de 20 cm tipo Heilmann ou similar	UN	100,00	200,00	100,00	0,31	31,00	31,00	-	-	-	-
1.53	Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2 A - 250 V	UN	2,00	2,00	-	7,56	15,12	-	-	100,00	2,00	15,12
1.54	Fornecimento De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 1,20m	UN	8,00	8,00	-	21,51	172,08	-	-	100,00	8,00	172,08
1.55	Fornecimento e instalação de Solda Ecolômica 45	UN	8,00	8,00	-	13,33	106,64	-	-	100,00	8,00	106,64
1.56	Fornecimento e instalação de campainha de timbre tipo residencial 50/60hz para embutir com caixa metálica 4"X2"X2"	CJ	1,00	1,00	-	25,38	25,38	-	-	100,00	1,00	25,38
1.57	Fornecimento e instalação exaustor de cozinha de 30 cm de diâmetro	UN	2,00	2,00	-	282,24	524,48	-	-	-	-	-
1.58	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com	UN	0,00	1,00	1,00	231,24	-	231,24	-	-	-	-
1.59	Fornecimento e instalação de ventilador de Parede c/rot em sentido dir/inverso c/3	CJ	0,00	4,00	4,00	183,07	-	732,28	-	-	-	-
1.60	Eletroduto de PVC rígido de encaixe, com conexões, ø 25 mm (3/4")	m	0,00	186,00	186,00	8,00	-	1.488,00	-	-	-	-
1.61	Eletroduto de PVC rígido de encaixe, com conexões, ø 32 mm (1")	m	0,00	40,00	40,00	10,44	-	417,60	-	-	-	-
1.62	Condulete de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido ø 25 mm (3/4")	un	0,00	146,00	146,00	11,62	-	1.696,52	-	-	-	-
1.63	Dilijuntor monopolar termomagnético de 15 A em quadro de distribuição	UN	0,00	8,00	8,00	17,83	-	142,64	-	-	-	-

1\* Medição do Aditivo - Reforma Geral EE Alina Tocantins

248

**CR** Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabela: **Chafá Monteiro de Oliveira**  
Av. Ary Paes Barreto n° 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14428**  
R\$ 2,40

Em test. (   Selo de Controle Digital ) da verdade

GIOCONDA G M M SIRIO - Esc. Juramentada  
Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 184. Cód. Ato 8  
<http://www.timtlus.br/selos>





7AE

 Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
Tabela: **Chafia Monteiro de Oliveira**  
Av. Ary Paes Barreto nº 2183 Bairro Cristo Rei, CEP: 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6118 / E-mail: ccartrei@terra.com.br


**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.  
**ASV14427**  
R\$ 2,40

  Selo de Controle Digital

Em test. (  ) da verdade

GIOCONDA G M M SIRIO-Esc Juramentada  
Varzea Grande/MT, 26 fevereiro 2016  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 194 Ccc. Atô 60  
<http://www.tribunalmt.br/celes>



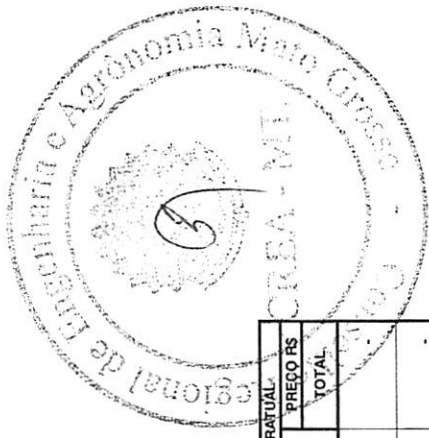

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**  
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICIPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGÁ, 2560. BAIRRO CIDADE ALTA

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

OBRA:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		VALORES (RS)			SALDO CONTRATUAL		
			CONTRATO	REVISADA 1	ADITIVO 1	ADITIVO 1	CONTRATO	ADITIVO 1	FÍSICO %	QUANT.
2.23	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 3x2.50 mm <sup>2</sup> , com isolamento para 0.60/1.00 Kv, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, antenax ou similar.	M	72,00	-	(72,00)	5,60	403,20	(403,20)	-	-
2.24	Fornecimento e instalação de Poste Duplo T 12 mts (300 kg), com Engastamento Simples, Incl Escavação e Relevo Apropriado, conf. Normalização Rede Cemate	UN	2,00	-	(2,00)	1.412,81	2.825,62	(2.825,62)	-	-
2.25	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução 60 x 25 mm ( 2 x 3/4 pol)	UN	2,00	-	(2,00)	11,62	23,24	(23,24)	-	-
2.26	Fornecimento de Parafuso cabeça quadrada "máquina", dim.16.00mm x 250,00mm, incl. Porca Quadrada Diam. Interno 16.00 mm	CJ	4,00	-	(4,00)	10,54	42,16	(42,16)	-	-
2.27	Fornecimento e instalação de Parafuso c/ Bucha S8	UN	32,00	-	(32,00)	0,31	9,92	(9,92)	-	-
2.28	Condutete em liga de alumínio fundido tipo T D 3	UN	2,00	-	(2,00)	90,13	180,26	(180,26)	-	-
			SUBTOTAL			90,13	6.585,24	(6.585,24)		
			TOTAL GERAL			65.895,62	7.847,50			
			SUBTOTAL							10.604,00
			TOTAL GERAL							10.604,00

Cuiabá - MT - Junho de 2011

*(Handwritten signature)*

*Marcia Maria G. Almeida Santos*  
 Engenheira Civil  
 CREA 1204735166  
 QUEB/SEDFUC





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar  
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337  
 CUIABÁ - MATO GROSSO  
 ESTABELECIMENTO: EE ALINA DO NASCIMENTO TOCANTINS  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT  
 ENDEREÇO: AVENIDA IPIRANGA, 2560, BAIRRO CIDADE ALTA

OBRA:

MURO

INCC: 0,00%

BDI: 25,81%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		VALORES (R\$)		SALDO CONTRATUAL	
			CONTRATO	REVISADA 1	ADITIVO 1	ADITIVO 1	FÍSICO %	QUANT.
1.0	ESQUADRIAS							
1.1	Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 3,00x2,20)m	M2	6,60		(6,60)	86,34	569,84	(569,84)
1.2	Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 1,00x2,20)m	M2	2,20		(2,20)	86,34	189,84	(189,84)
1.2	RECUPERAÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA CORRUGADA COM RECUPERAÇÃO DE TRILHOS	M2		8,60	8,60	44,03		378,65
1.2	Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 4,5x3,0)m	M2		13,50	13,50	86,34		1.165,59
						SUBTOTAL	799,78	794,46
2.0	REVESTIMENTOS							
2.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5 mm - aplicar sobre todo chapisco existente (interno e externo)	M2	926,18	1.852,36	926,18	3,84	3.556,53	3.556,53
2.2	Reboco massa única para parede interna e externa com argamasa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:2:3, e=20 mm - aplicado no lado externo do muro (fachada principal)	M2	194,31	235,00	40,69	15,97	3.103,13	649,81
						SUBTOTAL	6.659,66	4.206,34
3.0	PINTURAS							
3.1	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha:Renner, Coral ou Suvinil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Esmaltada - todo muro (Interno e externo)	M2	926,14	1.852,36	926,22	10,32	9.557,76	9.559,59
3.2	Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha:Renner, Suvinil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive fixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalta, pintura executada com compressor e pistola	M2	26,40	26,40		21,02	554,92	554,92
3.3	Pintura da logomarca do Estado	UN	2,00	2,00		287,35	534,70	534,70
						SUBTOTAL	10.647,38	9.559,59
						TOTAL GERAL	18.066,82	14.549,39
						SUBTOTAL	10.647,38	10.647,38
						TOTAL GERAL	11.407,16	11.407,16

*(Handwritten signature)*  
 Nuccia Maria L. Almeida Santos  
 Engenheira Civil  
 CREA 1204735166  
 SUEE/SEDUC


 Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei  
 Labelia: **Chafá Monteiro de Oliveira**  
 Av. Ary Paes Barreto n° 2183 Bairro Cristo Rei, CEP. 78118-090, Varzea Grande, Mato Grosso  
 Fone: (65) 3685-3258 Fax: (65) 3685-6112 / E-mail: ccartrei@terra.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Confere com a original que me foi apresentada do que  
 dou fé.  
**ASV14425**  
 R\$ 2,40


 **Selo de Controle Digital**  
 Em test. (  ) da verdade

**GIOCONDA G M M SIRIO**-Esc Juramentada  
 Varzea Grande/MT 26 fevereiro 2016  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 184 Cod. Art. 8  
<http://www.timt.jus.br/selos>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
 Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000  
 www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

Pág. 1

## Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 72967

ART nº: 1304989

Validade: Permanente

Expedição: 17/08/2012 15:38

Nome: JAIDES RALPH POTTRATZ

Titulação: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira: MT09982/D

Registrado no Crea-MT desde: 21/10/2002

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA-MT CERTIFICA, nos termos do art. 49º da Resolução nº 1025/09, do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), que consta nos assentamentos do Crea-MT a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica a seguir, registradas pelo profissional acima qualificado. CERTIFICA ainda, que a ART 1304989 define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Agricultura, Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia e outros, de acordo com a Lei 6.496/1977. Assina a presente Certidão de Acervo Técnico o Coordenador do Setor de Acervo Técnico ao final subscrito, conforme delegação de competência atribuída pelo Presidente do CREA-MT através da Portaria nº 035/2005.

ART: 1304989 Início: 28/11/2011 Conclusão: 06/08/2012

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o CREA-MT:

AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE

CPF/CNPJ: 01.375.138/0001-38

Tipo: Obra/Serviço

Convênio: Não é convênio

Participação técnica: Responsável

Carteira:

ART Vinculada:

Motivo: Normal

Carteira:

ART Vinculada:

Proprietário da Obra/Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNOORTE

CPF/CNPJ: 01.375.138/0001-38

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JULIO CAMPOS/GENERAL OZORIO E TIBAGI Nro:0 BAIRRO: DIVERSOS BRASNOORTE - MT

Dimensão: 0 Finalidade: Público

Valor do Contrato: 301.863,55 Honorários: 0,00

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und.
EXECUÇÃO	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1740,000000	M
EXECUÇÃO	SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	0,000000	KVA

### Resumo do Contrato

EXECUÇÃO DE REDE DUBTERRANEA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS AV JULIO CAMPOS, GENERAL OSORIO E TIBAGI SENDO IMPLANTADO 2 POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO (1 DE 15 KVA E OUTRO DE 30 KVA), IMPLANTAÇÃO DE 48 POSTES 15/200 E 144 LUMINARIAS COM LAMPADAS TUBULAR DE 250W.

JONILSON SALES DA SILVA


Coordenador

Portaria de Delegação No. 035/2005

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 72967

de JAIDES RALPH POTTRATZ

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.

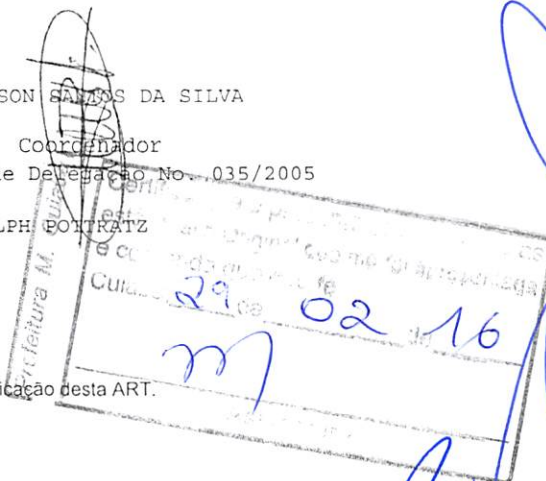



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033  
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

### CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: 72966

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº 9548, O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE** A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

Nº DA ART: 1304989 DATA: 25/01/2012

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
JAIDES RALPH POTTRATZ  
TITULACAO:  
Engenheiro Eletricista  
CARTEIRA: MT09982/D

RNP: 1201641691

EMPRESA CONTRATADA: 5236-AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

DESCRICAÇÃO DA ATIVIDADE:  
EXECUÇÃO DE REDE DUBTERRANEA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS AV JULIO CAMPOS, GENERAL OSORIO E TIBAGI SENDO IMPLANTADO 2 POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO (1 DE 15 KVA E OUTRO DE 30 KVA), IMPLANTAÇÃO DE 48 POSTES 15/200 E 144 LUMINARIAS COM LAMPADAS TUBULAR DE 250W.

Atividades  
1: Execução DE Rede de Iluminação Pública - 1740,00 M  
2: Execução DE SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA - 0,00 KVA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:  
AVENIDA JULIO CAMPOS/GENERAL OSORIO E TIBAGI Nro:0 BAIRRO: DIVERSOS  
BRASNORTE - MT

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 28/11/2011 À 31/01/2012  
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 1025/09 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).


E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SO POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 17 de Agosto 2012

JONILSON SANTOS DA SILVA

Coordenador

Portaria de Delegação No. 035/2005

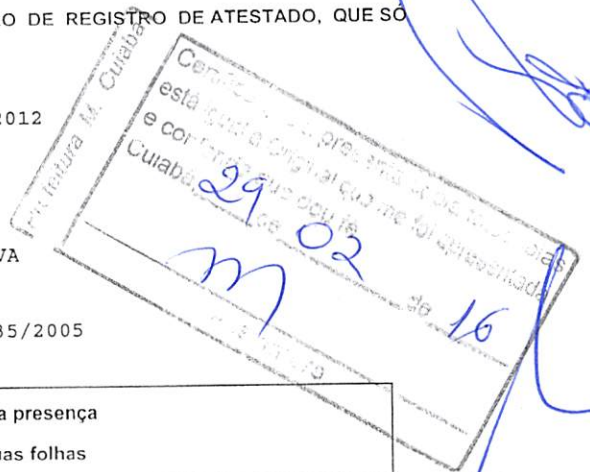

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a presença da marca d'água do Crea-MT em todas as suas folhas

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.
