Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA
Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595
e-mail: secex-educacao@tce.mt.gov.br

PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS

AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA

MUNICÍPIO DE JAURU/MT

ABRIL/2019

PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 15839-9/2017

Principal: Prefeitura Municipal de Jauru/MT

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino Luiz Henrique Moraes de Lima

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Municipal Professora Rosimeire Aparecida da Silva - localizada no Município de Jauru/MT

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Vilma Maria Prado – Técnica de Controle Público Externo

Zaine Viégas Silva Rodrigues Fernandes - Técnica de Controle Público Externo

Período de análise: 09 a **18** de abril de 2019

Gestores:

Pedro Ferreira de Souza – Prefeito Municipal – 2017/2019

Isabel Cristina Lemos – Secretária Municipal de Educação – 2017/ janeiro/2019

Valdeci Garcia Lopes – Secretária Municipal de Educação - Fevereiro/março/2019

Quésia Maria de Carvalho Cunha – Diretora Escolar – 2017

Almedina Mansueto de Almeida – 2018/2019 - Diretora Escolar – 2018/2019

SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES 4
2. OBJETO 4
3. PLANO DE AÇÃO 4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO 5
5. CONCLUSÃO 42
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 43

1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.

2. Como resultado da avaliação da Escola Municipal Professora Rosimeire Aparecida da Silva foram detectadas **20** inconformidades e os gestores notificados para apresentarem plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelos gestores da unidade jurisdicionada.

4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (Documento Digital nº **183989/2017**) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação elaborado pelos gestores ocorreu em 13/07/2017, portanto, dentro do prazo de **30** dias estabelecido pelo Relator nos Ofícios nº **556, 557, 558,** de **06 de junho de 2017**.

6. Conforme consta no relatório técnico de defesa (Documento Digital n° 335580/2017) o Gestor do município de Jauru encaminhou os Planos das ações das escolas do município em um único documento protocolado no processo de n° 158380/2017, sendo que para dar prosseguimento aos autos processuais o Plano de Ação da escola Professora Rosimeire Aparecida da Silva, foi juntado como anexo do relatório técnico de defesa (Documento Digital n° 253568/2017).

7. O Plano de Ação (documento nº 253568/2017) foi avaliado pela equipe técnica e considerado **aprovado**.

4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se a falta de telhas e/ou telhas quebradas no sanitário localizado ao lado da quadra esportiva. Nos demais sanitários da escola também há goteiras. Verificou-se ainda que várias salas apresentam problemas no telhado, uma vez que há goteiras/infiltrações (salas: 1° ano, 2° ano, 4° ano, 5° ano e sala dos professores). Assim, verifica-se a necessidade de reparos no telhado dos ambientes citados acima e/ou indicados nas fotos abaixo.
Providências a serem tomadas	Colocar as telhas que faltam, assim como trocar as telhas quebradas e reparar problemas de goteiras nas calhas do telhado.
Prazo para implementação	De julho a outubro de 2017.
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que foi trocada uma calha que solucionou algumas goteiras e infiltrações. As telhas dos sanitários da quadra de esportes não foram trocadas, assim como as paredes internas e externas dos sanitários permanecem sem reforma.

Foto 1: Telhado do sanitário da quadra – paredes internas.

Foto 2: Sanitário da quadra.

Foto 3: Parte externa dos sanitários da quadra.

Foto 04: Parede da sala de aula, foi resolvida a infiltração.

Foto 5: Sanitário masculino dentro da escola, sem goteiras.

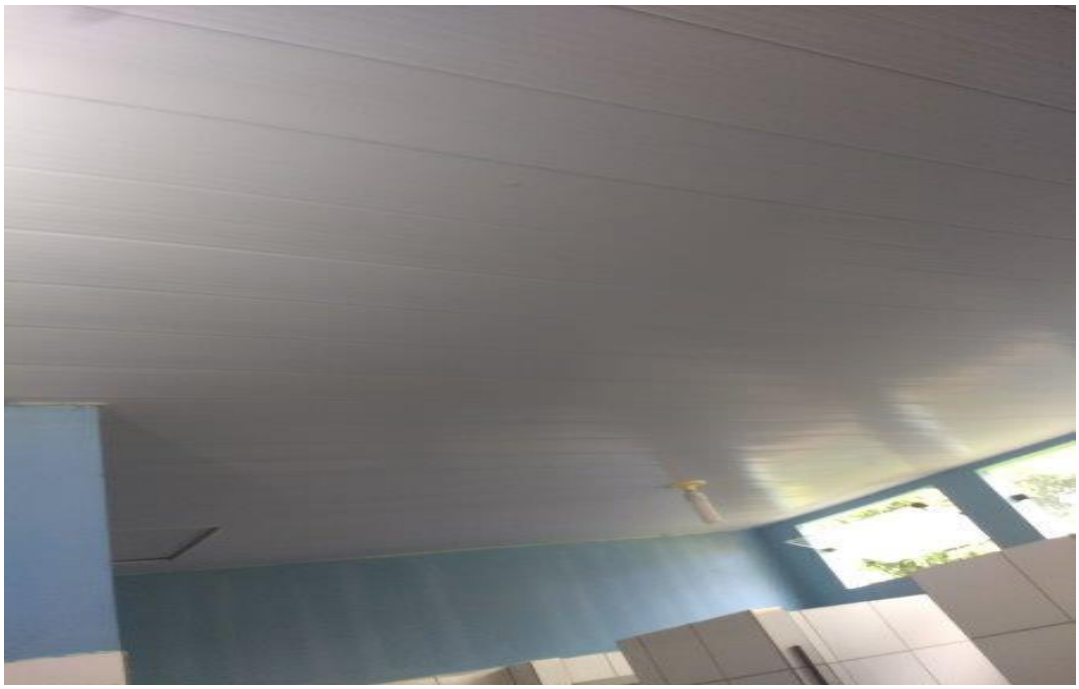

Foto 6: A parede foi pintada sem consertar o reboco.

ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que a escola apresenta rachaduras em vários ambientes. Verifica-se a necessidade de reparos nos locais indicado nas fotos abaixo.
Providências a serem tomadas	Realizar reparos nas rachaduras existentes. Realizar reparos de rebocos existentes.
Prazo para implementação	De julho a dezembro de 2018.
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que foram feitos alguns consertos nas paredes, entretanto permanece a rachadura da sala AEE, arquibancada da quadra de esportes. Em várias partes do muro da frente da escola foi apenas pintado, sem consertar as rachaduras.

Foto 7: Parede da sala do AEE.

Foto 8: Muro da escola com rachaduras.

Foto 9: Arquibancada da quadra de esportes.

Foto 10: Arquibancada da quadra de esportes.

Foto 11: O muro da frente da escola, continua rachado, foi passado uma tinta por cima.

Foto 12: Muro da frente da escola.

Foto 13: Parede externa da sala de aula – foi consertada a rachadura.

Foto 14: Reboco da sala do 3° ano foi arrumado.

ACHADO 3 – SANADO

Problemas identificados	Verifica-se a necessidade de reparos dos locais indicados nas fotos abaixo.
Providências a serem tomadas	Realizar reparos nas rachaduras existentes. Realizar reparos de rebocos existentes.
Prazo para implementação	De julho a dezembro de 2018.
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que foram feitos alguns reparos na área externa da escola, e feito a pintura nas salas de aula.

Foto 15: Parte interna da sala de aula.

Foto 16: Parede externa das salas de aula.

Foto 17: Parede do corredor.

Foto 18: O Banheiro feminino foi reformado.

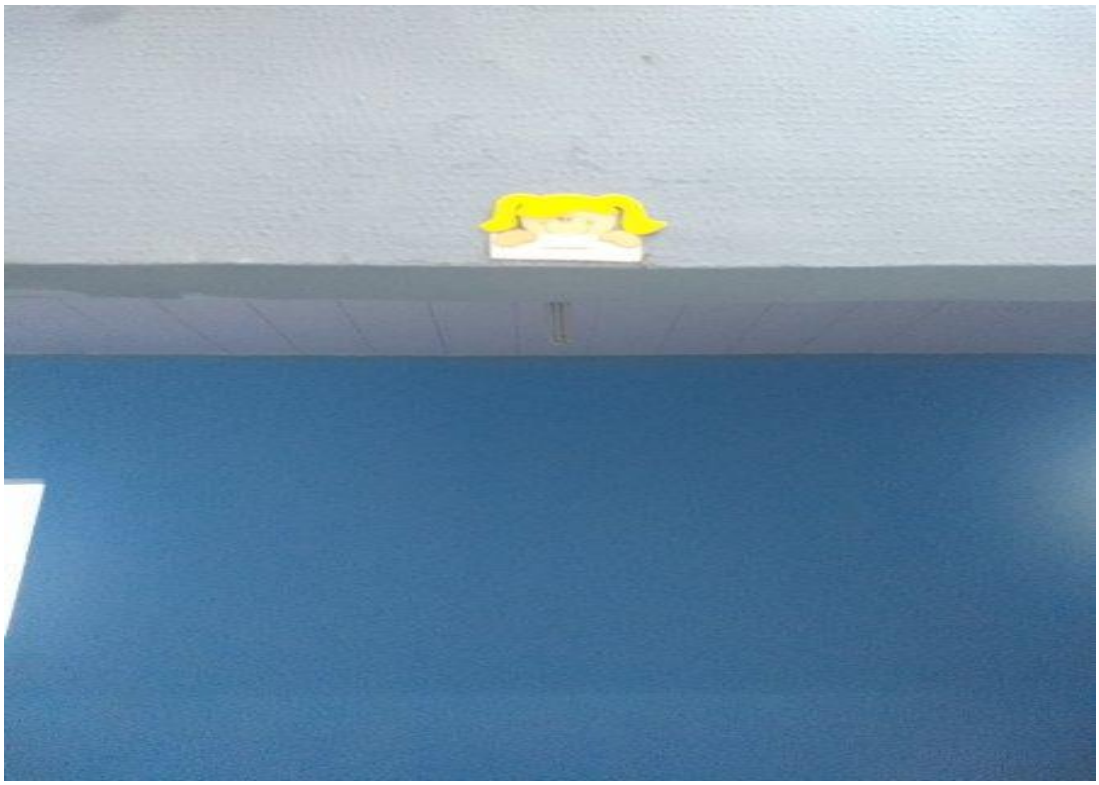

ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que o muro ao lado da quadra esportiva apresenta uma "barriga" (uma curvatura) para o lado da arquibancada. Esse mesmo muro também apresenta grandes rachaduras. Aparentemente o muro não possui coluna de sustentação. Conclui-se que há risco de desabamento do muro. Se houver queda, será sobre a arquibancada da quadra, a qual é utilizada pelos alunos, podendo ocorrer acidentes com vítimas fatais. Observe-se que do lado da arquibancada o muro é alto (cerca de 2 metros) aumentando a gravidade de situação. Verifica-se a necessidade de análise urgente por parte de engenheiro e, sendo o caso, reforma ou demolição e construção de novo muro.
Providências a serem tomadas	Reconstruir uma proteção para a arquibancada (muro de arrimo)
Prazo para implementação	De julho a dezembro 2017.
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que não foram corrigidas as irregularidades, o muro ao lado da quadra de esportes permanece sem reparos.

Foto 19: Muro da quadra de esportes.

Foto 20: Muro com rachaduras.

ACHADO 5 –MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que a água das chuvas escorre pelo teto, cai ao lado da quadra e torna a escorrer para dentro da quadra. Também se verificou que a arquibancada não possui cobertura. Verifica-se a necessidade de obras de engenharia, no sentido de se instalar calhas na aba da cobertura da quadra, bem como para construção de cobertura da arquibancada.
Providências a serem tomadas	Realizar a colocação de calha na aba da cobertura da quadra; Construir cobertura da arquibancada.
Prazo para implementação	Janeiro a dezembro de 2018; Janeiro a dezembro de 2019.
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que não foram colocadas as calhas e nem foi feita a cobertura da arquibancada.

Foto 21: Arquibancada da quadra de esportes sem cobertura.

Foto 22: Arquibancadas da quadra de esportes.

ACHADO 6 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se que alguns ambientes da escola estão com a pintura danificada, conforme fotos abaixo. Verifica-se a necessidade de pintura desses ambientes.
Providências a serem tomadas	Realizar a pintura necessária nos ambientes danificados da unidade escolar.
Prazo para implementação	dezembro 2018 a março de 2019
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que algumas paredes da escola foram pintadas.

Foto 23: Parede externa da escola com pintura nova.

Foto 24: Paredes do corredor foram pintadas.

ACHADO 7 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se a existência de janelas nas quais está faltando o vidro e/ou janelas danificadas. Também, verificou-se a existência de portas totalmente danificadas. Verifica-se a necessidade de reparos e instalação de vidros em algumas janelas, bem como a substituição de portas nos sanitários.
Providências a serem tomadas	Realizar as manutenções necessárias nas portas e nas janelas.
Prazo para implementação	julho a dezembro de 2017
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que a porta do sanitário feminino registrado no relatório preliminar foi retirada, o sanitário foi isolado e o espaço está sendo usado como almoxarifado de produtos de limpeza. Nas janelas foram colocados vidros novos e os encaixes foram consertados. As portas dos sanitários foram trocadas.

Foto 25: Janela com vidros novos.

Foto 26: Janela com vidros novos.

Foto 27: Janela da sala de aula.

Foto 28: Porta do Sanitário.

ACHADO 8 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que alguns dos bancos instalados nos corredores da escola estão danificados. Verifica-se a necessidade de reparos desses bancos.
Providências a serem tomadas	Fazer os reparos necessários nos bancos.
Prazo para implementação	julho a dezembro de 2017
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solução em andamento.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que foram feitos reparos em alguns bancos, porém foram localizados alguns bancos no corredor com necessidade de pequenos reparos.

Foto 29: Banco no corredor em perfeitas condições.

Foto 30: Banco com a ponta quebrada.

Foto 31: Banco com a ponta quebrada.

ACHADO 9 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se fiação exposta na cozinha e nos sanitários, conforme fotos abaixo. Faz-se necessário a correção do problema, inclusive com substituição dos interruptores que estão muitos danificados.
Providências a serem tomadas	Realizar manutenção nas instalações elétricas com colocação de canaleta de PVC e interruptores.
Prazo para implementação	julho a dezembro 2017
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que foram consertados os interruptores que estavam faltando e colocada a canaleta na fiação do ventilador instalado na cozinha.

Foto 32: Interruptor do sanitário foi colocado.

Foto 33: Interruptor trocado no sanitário masculino.

Foto 34: Ventilador na cozinha com canaleta.

ACHADO 10 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se que nos sanitários falta parte da instalação elétrica, das lâmpadas e dos interruptores. Alguns professores afirmaram que muitas tomadas das salas de aula não funcionam (embora não possa ser evidenciado por fotos). Verifica-se a necessidade de reparos/instalações na parte elétrica da escola.
Providências a serem tomadas	Realizar manutenção necessária nas instalações elétricas.
Prazo para implementação	julho a dezembro 2017
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que foram consertados, conforme registros fotográficos no achado 9.

ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que o vaso para especiais, no sanitário masculino, não está funcionando. Já o vaso para especiais, no sanitário feminino, está com o acionador de descarga danificado. Também há sanitário em que está ausente a caixa da descarga. No sanitário feminino, verificou-se ainda que falta parte do encanamento de uma pia, bem como que as torneiras instaladas nas pias são inadequadas (muito pequenas). Verifica-se necessidade de correção dessas falhas.
Providências a serem tomadas	Realizar reparos e manutenção nos sanitários.
Prazo para implementação	julho a dezembro 2017
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que o sanitário masculino para alunos especiais foi desativado e transformado em dispensa para materiais de limpeza, sendo que há a necessidade da construção de um novo sanitário masculino para alunos especiais. O sanitário feminino para alunas especiais continua com o acionador da descarga estragado. As torneiras das pias dos sanitários foram trocadas e o encanamento da pia foi consertado.

Foto 35: Dispensa onde era o sanitário masculino dos alunos especiais.

Foto 36: Sanitário feminino para alunas especiais.

Foto 37: Torneiras das pias do banheiro foram trocadas.

Foto 38: Pias do sanitário feminino.

ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que o ar condicionado de várias salas não estão funcionando e/ou são muito barulhentos (Salas: sala 1, do 1° ano, do 3° ano, do 4° ano, do 9° ano, do 1° ano do ensino médio e sala do projeto mais educação). Verifica-se a necessidade de uma manutenção geral nos aparelhos de ar condicionado da escola.
Providências a serem tomadas	Realizar reparo e manutenção nos aparelhos de ar condicionado da escola.
Prazo para implementação	julho a agosto de 2017
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solução em andamento.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que foram feitas a manutenção em alguns aparelhos, no entanto, o ar condicionado da sala 01 permanece fazendo barulho.

Foto 39: sala de aula n° 01

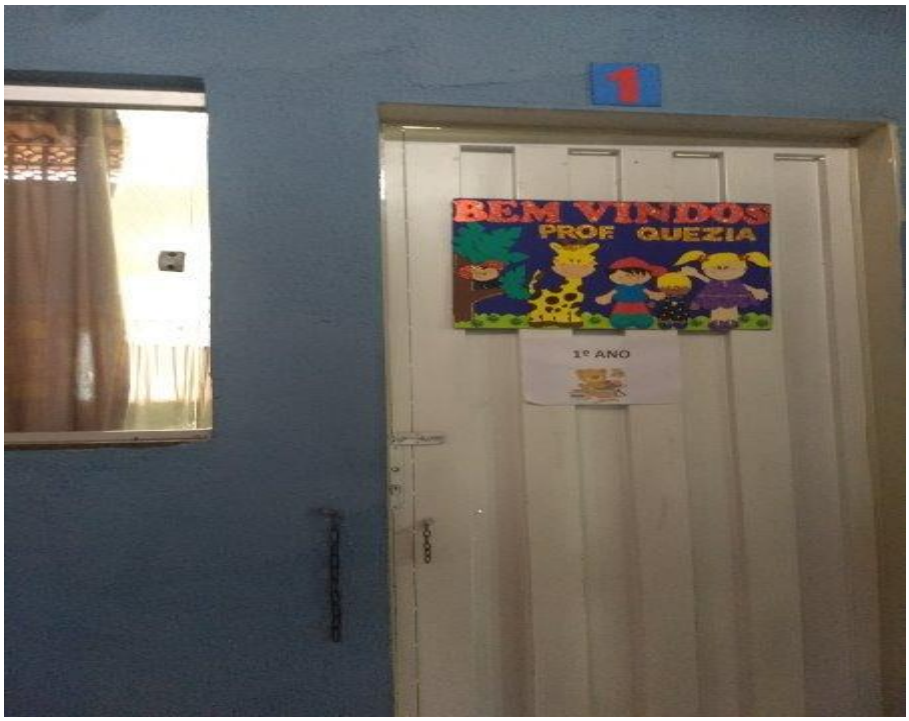

Foto 40: Ar condicionado da sala n° 01.

Foto 41: Ar condicionado funcionando.

ACHADO 13 – SANADO

Problemas identificados	Verificou-se que o quadro em todas as salas de aula está em estado precário, pois estão muito manchados. Verifica-se a necessidade de substituição dos quadros. Inclusive deve-se verificar a possibilidade de instalação de quadros de vidro.
Providências a serem tomadas	Substituir os quadros precários por novos.
Prazo para implementação	janeiro a junho de 2018.
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que todos os quadros foram trocados.

Foto 42: Quadro novo.

Foto 43: Quadro novo.

ACHADO 14 – SANADO

Problemas identificados	Com base nos relatos dos entrevistados, verificou-se que parte dos computadores estão estragados e outros necessitando de reparos. Verifica-se que os computadores necessitam de manutenção.
Providências a serem tomadas	Manter e dar continuidade as manutenções nos computadores.
Prazo para implementação	Permanente
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que os computadores estão todos funcionando.

Foto 44: Computador no laboratório funcionando normalmente.

ACHADO 15 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que a escola não possui extintores de incêndio. Faz-se necessário a aquisição de, pelo menos, um extintor de incêndio.
Providências a serem tomadas	Adquirir extintores de incêndio.
Prazo para implementação	julho a dezembro de 2017
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que a escola permanece sem extintores.

ACHADO 16 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que no espaço entre a escola e a quadra esportiva há uma grande quantia de ervas daninhas (risco de abrigar animais peçonhentos). Faz-se necessário a limpeza do local.
Providências a serem tomadas	Manter e dar continuidade a limpeza do pátio escolar de ervas daninhas.
Prazo para implementação	Permanente
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que não foi realizada a retirada da vegetação em volta da escola e da quadra de esportes.

Foto 45: Espaço entre a escola e a quadra com alta vegetação.

Foto 46: Espaço ao lado da quadra de esportes.

ACHADO 17 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que a escola não possui biblioteca. Desse modo, verifica-se a necessidade de construção/organização de espaço destinado à biblioteca.
Providências a serem tomadas	Construir sala específica e/ou adequar ambiente para o funcionamento de biblioteca.
Prazo para implementação	julho a dezembro de 2019
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que não foi adequado nenhum espaço na escola para a biblioteca, o prazo para implementação estipulado no plano de ação é até dezembro de 2019.

ACHADO 18 – MANTIDO

Problemas identificados	Verificou-se que na quadra esportiva faltam hastes para colocar a rede de voleibol, faltam cestas de basquetebol, as traves e redes de futebol estão danificadas. Também se apurou que faltam coletes para os alunos. Verifica-se a necessidade de aquisição de coletes, bem como aquisição e instalação de hastes de voleibol, cestas de basquetebol e traves e redes de futebol.
Providências a serem tomadas	Adquirir equipamentos esportivos (hastes, cestas, traves, redes e coletes), bem como realizar as instalações dos mesmos.
Prazo para implementação	julho a dezembro de 2018.
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que a quadra esportiva continua do mesmo jeito, não foi feito nenhum conserto e não foi adquirido coletes.

Foto 47: Trave enferrujada e quebrada.

Foto 48: Ausência da cesta de basquete e da rede da trave.

Foto 49: Ausência da cesta de basquete.

ACHADO 19 – MANTIDO

Problemas identificados	Apurou-se que o botijão de gás está instalado dentro da cozinha. Verifica-se a necessidade de se instalar o botijão do lado externo da cozinha (protegido por grades, para evitar furtos).
Providências a serem tomadas	Providenciar a mudança do botijão de gás para área externa da cozinha.
Prazo para implementação	janeiro a dezembro de 2018.
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Não solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que o botijão de gás continua dentro da cozinha.

Foto 50: Botijão de gás dentro da cozinha.

ACHADO 20 – SANADO

Problemas identificados	Atualmente a escola possui duas servidoras na cozinha no período matutino. Apurou-se a necessidade de mais uma auxiliar na cozinha nesse período, devido ao número de refeições fornecidas pela escola (café da manhã às 7h e 30min. e merenda às 9h, para cerca de 140 alunos; almoço às 11h e 30min. para cerca de 50 alunos). Cabe esclarecer que o café da manhã é fornecido devido a escola atender basicamente alunos da zona rural, muitos pegam o ônibus para ir à escola antes do amanhecer. Já o almoço é fornecido porque a escola participa do Projeto Novo + Educação. O projeto foi criado pelo governo para atender escolas que tiveram desempenho muito baixo na avaliação do IDEB. Por meio do programa, alunos que frequentam aulas no período matutino, acabam ficando na escola também no período vespertino para terem aulas de reforço, em especial das disciplinas de matemática e de língua portuguesa.
Providências a serem tomadas	Foi realizada a reorganização do quadro de servidores e a demanda já foi atendida
Prazo para implementação	A demanda já foi atendida.
Responsável	Prefeitura Municipal de Jauru
Status	**Solucionado.**
Análise da equipe técnica	Em visita a escola em 12.04.2019, constatou-se que a escola passou a funcionar somente em um período e agora são três funcionárias na cozinha.

Foto 51: Cozinha com 03 Funcionárias.

5. CONCLUSÃO

8. Dos **20** Achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **08** foram solucionados, **02** estão em processo de solução e **10** não foram solucionados.

Solucionados	Em solução	Não solucionados
03, 06, 07, 09, 10, 13, 14 e **20.**	**08** e **12**	**01, 02, 04, 05, 11, 15, 16, 17, 18** e **19.**

9. Diante do exposto, conclui-se que o gestor realizou reformas na escola, porém não foram suficientes para sanar grande parte dos apontamentos apresentados no relatório técnico preliminar, conforme demonstrado na tabela acima.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

10. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretária de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

a. Apensamento deste protocolo ao processo de levantamento principal da Prefeitura Municipal Jauru/MT;

b. Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares identificados neste relatório.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 24 de abril de 2019.

Assinatura digital
Vilma Maria Prado
Técnica de Controle Público Externo

Assinatura digital
Zaine Viégas Silva Rodrigues Fernandes
Técnica de Controle Público Externo
