

Sistema **GE** O B R A S **T C E / M T**

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Narda Consuelo Vitório Neiva Silva
Secretária de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Benedito Carlos Teixeira Seror
Auditor Público Externo

Fundamento:

Necessidade do aprimoramento dos processos de fiscalização de obras públicas:

- a existência de obras inacabadas e
- desvio de recursos públicos

Planejamento Estratégico: 2005/2011

- Aprimoramento, em 2008, das auditorias em obras e serviços de engenharia;
- Idealizado, desenhado, concebido, lançado e normatizado através das Resoluções Normativas nº 06/2008 e 06/2010.

3

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

Objetivo do Sistema Geo-Obras TCE-MT:

Permitir o acompanhamento da execução de obras e serviços de engenharia realizados pelas administrações públicas estadual e municipais do Estado de Mato Grosso, desde a fase de licitação, passando pela execução do contrato, indo até o recebimento definitivo das obras/serviços de engenharia.

4

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

O Sistema Geo-Obras / TCE-MT e seus Três Pilares

- Adoção de tecnologia disponível (georreferenciamento) na fiscalização de Obras Públicas.
- Auditoria de acompanhamento simultâneo.
- Participação do cidadão.

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

5

Estrutura:

- Módulo Jurisdicionado
 - Módulo Auditor
 - Módulo Cidadão
 - Módulo Parceiros

Trata-se de um sistema de fácil manuseio, autoexplicativo, com informações de natureza declaratória inseridas através do módulo jurisdicionado e disponibilizadas para todos os módulos.

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

6

Resultados: (setembro / 2008 até fevereiro / 2013)

I

- Informações coletadas
 - Licitações cadastradas: **9.830**
 - Contratos cadastrados: **10.579**
 - Obras cadastradas: **8.850 – R\$ 26.563.448.665,35**
 - Arquivos de licitações recebidos: **119.391**
 - Arquivos de contratos recebidos: **82.282**
 - Arquivos de obras recebidos: **92.574**
 - Volume total de arquivos recebidos: **134 GB**
 - Quantidade total de imagens recebidas: **139.896**
 - Volume total de imagens recebidas: **73 GB**
- 2008 até Agosto / 2011:**

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

7

Ferramenta que fortalece os gestores:

Os gestores públicos podem utilizar o Sistema GeoObras como um instrumento de gerenciamento, que além de possibilitar o acesso às informações, também permite emissão de relatórios gerenciais referentes às obras:

- Elaboração da LOA e orçamento da Administração
 - Licitação
 - Contratação
 - Execução
- Recebimento da obra

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

8

GEO-OBRA S TCE/MT (JURISDICONADO, PARCEIROS e CIDADÃO)

<http://www.tce.mt.gov.br/>



Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

9

GEO-OBRA S TCE/MT (JURISDICONADO, PARCEIROS e CIDADÃO)

<http://www.tce.mt.gov.br/>



Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

10



Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

11









Participação do Cidadão

- Acesso irrestrito a todos os cidadãos (sem exigência de cadastro).
- Filtros de busca:
 - órgão público
 - tipo de obra
 - município de localização
 - setor da sociedade beneficiado
 - situação da obra (em andamento, paralisada, concluída, etc..)
- Canal ágil para sugestões, críticas e principalmente denúncias, com a utilização de qualquer tipo de mídia (textos, fotos, videos, recortes de jornais digitlizados, etc..)

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror


Parcerias Controle Externo

Parcerias Assinadas

-  TCE-Piauí
-  TCE-Minas Gerais
-  TCE-Rio Grande do Sul
-  TCE-Pará
-  TCE-Rio Grande do Norte
-  TCE-Goiás
-  TCE-Espírito Santo
-  TCE-Rio de Janeiro

Parcerias em Andamento

-  TCM- Goiás
-  TCM- Ceará

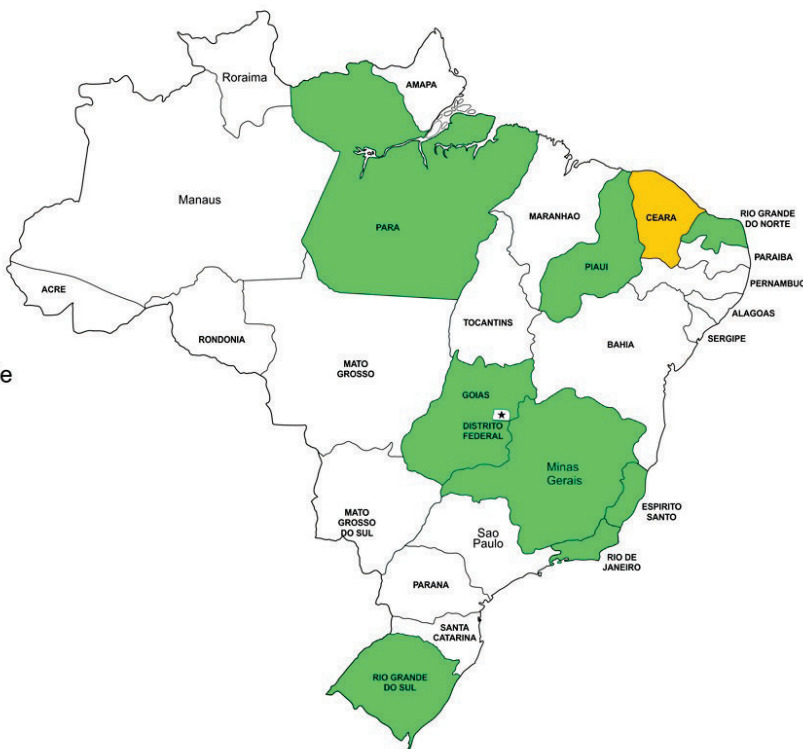

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

13

PARCERIA Auditoria Geral do Estado

Servidores cadastrados:

- ALYSSON SANDER DE SOUZA e
- EMERSON HIDEKI HAYASHIDA.

Solicitação de novos cadastros:

Ofício da AGE ao TCE/MT, via presidência, encaminhando relação dos interessados com os seguintes dados:

- Nome
- CPF
- E-mail
- Telefone fixo
- Celular

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

14


O TCE/MT oferece suporte técnico:

- Guia do Sistema GeoObras – Módulo do Fiscalizado
- Fórum do GeoObras – forum.tce.mt.gov.br/geoobras
- Treinamento por agendamento
- Atendimento pessoal e por telefone para tirar dúvidas


Fones: (065) 3613-7631/7632/2985

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

MÓDULO AUDITOR

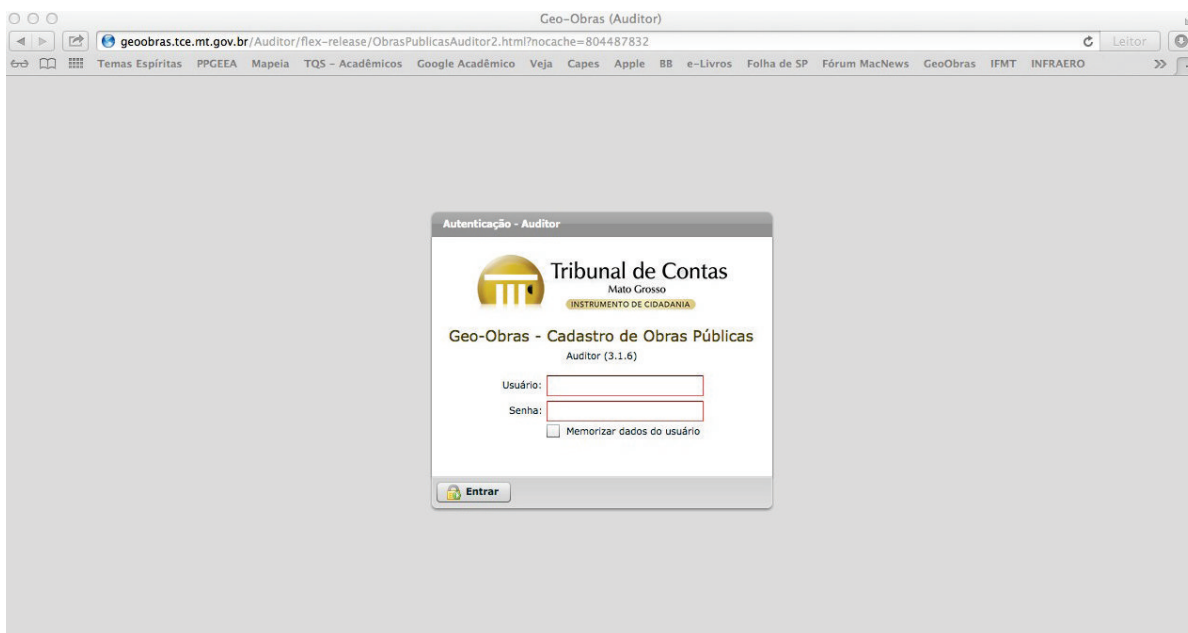


Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

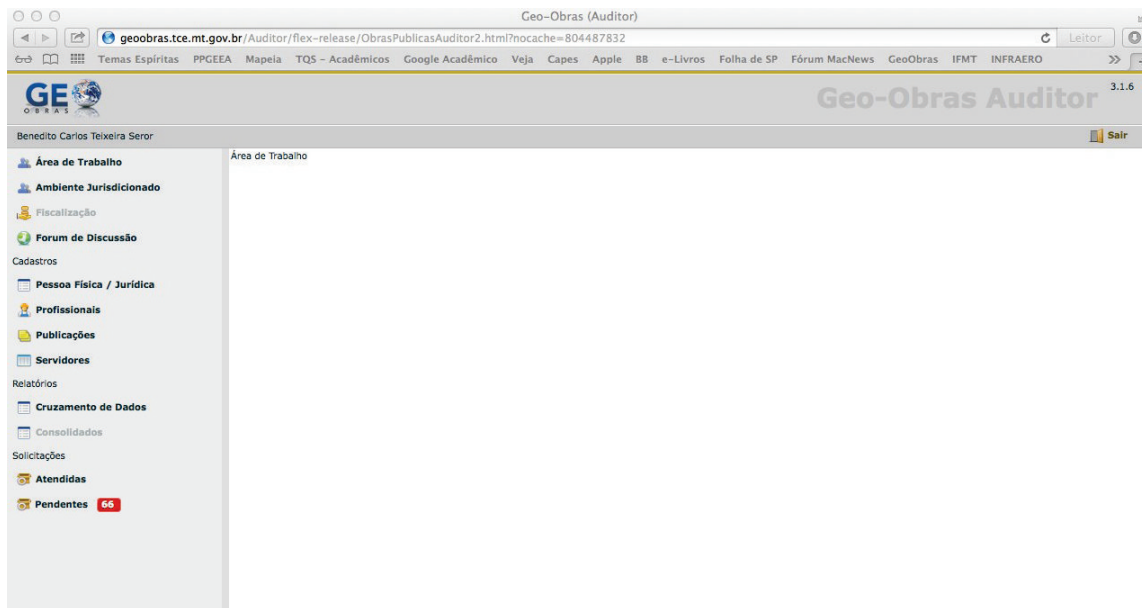

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

17

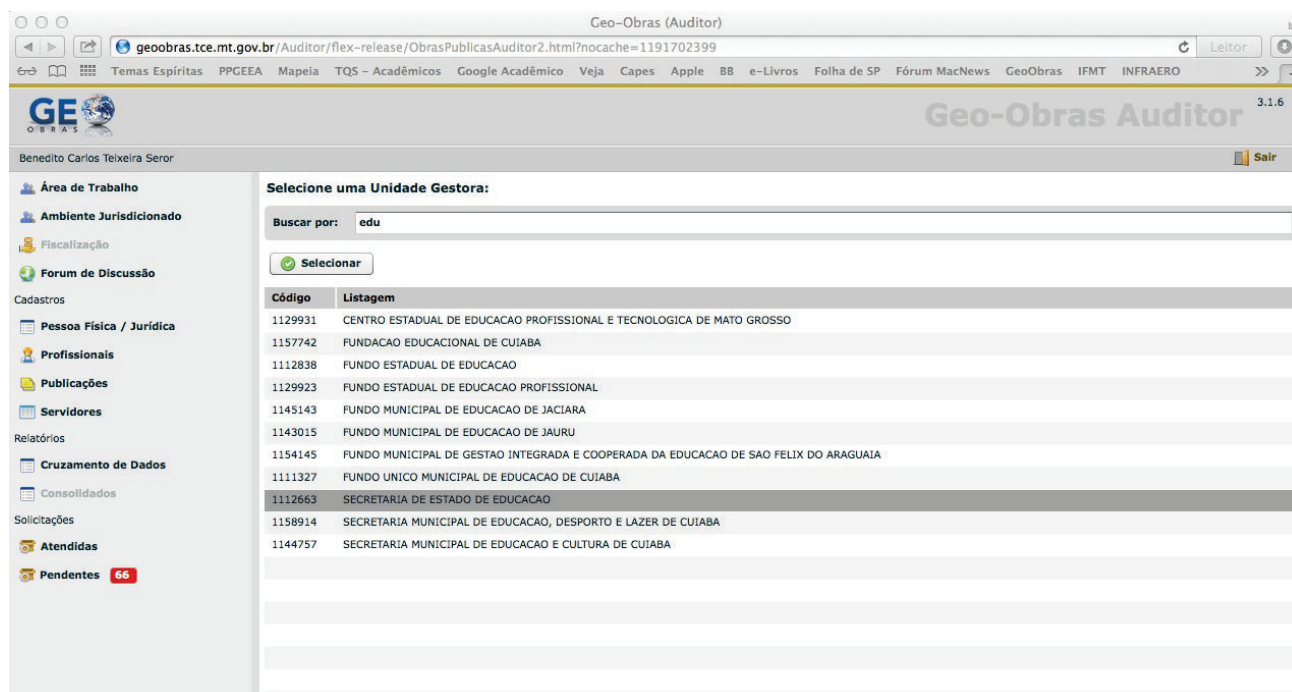

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

18

ObrasPublicasAuditor2.html?nocache=1191702399

geoobras.tce.mt.gov.br/Auditor/flex-release/ObrasPublicasAuditor2.html?nocache=1191702399#

Temas Espíritas PPGEEA Mapela TQS - Acadêmicos Google Acadêmico Veja Capes Apple BB e-Livros Folha de SP Fórum MacNews GeoObras IFMT INFRAERO

Geo-Obras Auditor 3.1.6

Benedito Carlos Teixeira Seror

Sair

Área de Trabalho
Ambiente Jurisdicionado
Fiscalização
Forum de Discussão
Cadastros
Pessoa Física / Jurídica
Profissionais
Publicações
Servidores
Relatórios
Cruzamento de Dados
Consolidados
Solicitações
Atendidas
Pendentes 66

Ambiente Jurisdicionado

1112663 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Operadores Obras por Execução Indireta Obras por Execução Direta Obras Vínculo

Nome: 29 registros Todos Ativos Inativos Bloqueados Histórico Visualizar em miniatura

<p>ADRIANA SILVEIRA HENR... CADASTRO: ATIVO SITUAÇÃO: DESBLOQUEADO</p> <p>E-mail: adriana.henrique@seduc.mt.gov.br Usuário: 72999489153 Telefone: 3613-6365 Celular: 9682-0624 Inclusão: 03/07/2012</p>	<p>AGRIZELDA MAGDA DE AR... CADASTRO: ATIVO SITUAÇÃO: DESBLOQUEADO</p> <p>E-mail: agrizelda.arruda@seduc.mt.gov.br Usuário: 52876020149 Telefone: 36217267 Celular: 99729253 Inclusão: 11/08/2010</p>	<p>AMAURIANE DE ANUNCIA... CADASTRO: ATIVO SITUAÇÃO: DESBLOQUEADO</p> <p>E-mail: amauriane.tartari@seduc.mt.gov.br Usuário: 94577773104 Telefone: (65) 3613-6313 Celular: (65) 9604-0312 Inclusão: 17/03/2009</p>
<p>ANA PAULA PEREIRA SEB... CADASTRO: ATIVO SITUAÇÃO: DESBLOQUEADO</p> <p>E-mail: ana.amaral@seduc.mt.gov.br Usuário: 85797600110 Telefone: 36136409 Celular: 92239466 Inclusão: 08/10/2008</p>	<p>CASSIA ERIKA LEMOS CADASTRO: ATIVO SITUAÇÃO: DESBLOQUEADO</p> <p>E-mail: cassia.lemos@seduc.mt.gov.br Usuário: 84837349153 Telefone: 65 36136590 Celular: 65 84342816 Inclusão: 27/03/2009</p>	<p>CHRISTIANE HEBE DA SIL... CADASTRO: INATIVO</p> <p>E-mail: christiane.silva@seduc.mt.gov.br Usuário: 00350620105 Telefone: 65-3613-6432 Celular: 65-9902-3046 Inclusão: 27/11/2008</p>
<p>CRISTIANE DE SOUZA SILVA CADASTRO: INATIVO</p>	<p>DANIEL MARTINS DOS SA... CADASTRO: ATIVO</p>	<p>DELZA GOMES DE SANTANA CADASTRO: ATIVO</p>

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

19

ObrasPublicasAuditor2.html?nocache=1191702399

geoobras.tce.mt.gov.br/Auditor/flex-release/ObrasPublicasAuditor2.html?nocache=1191702399#app=5f83&4331-selectedIndex=1

Temas Espíritas PPGEEA Mapela TQS - Acadêmicos Google Acadêmico Veja Capes Apple BB e-Livros Folha de SP Fórum MacNews GeoObras IFMT INFRAERO

Geo-Obras Auditor 3.1.6

Benedito Carlos Teixeira Seror

Sair

Área de Trabalho
Ambiente Jurisdicionado
Fiscalização
Forum de Discussão
Cadastros
Pessoa Física / Jurídica
Profissionais
Publicações
Servidores
Relatórios
Cruzamento de Dados
Consolidados
Solicitações
Atendidas
Pendentes 66

Ambiente Jurisdicionado

1112663 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Operadores Obras por Execução Indireta Obras por Execução Direta Obras Vínculo

Avisos Licitações Contratos Obras Projetos

Execução Indireta

OBRAS COM PRAZOS VENCIDOS E NÃO CONCLUÍDAS

Obras Paralisadas	<p>Bem Público: CEPROTEC Código da Obra: 3231 Contrato N°/Ano-Obra: 128/2007-1 Prazo inicial (dias): 240 Prazo Total Aditado (dias): 0 Situação da Obra: Iniciada Qtde. dias em execução: 1904 Previsão de Término: 23/07/2008 Data Situação: 27/11/2007 Qtde. dias paralisada: 0 Qtde. de Dias em Atraso: 1664 Inclusão 16/03/2009</p>
Contratos	<p>Bem Público: E.E. INDÍGENA ULISSÉS GUIMARÃES Código da Obra: 1709 Contrato N°/Ano-Obra: 210/2007-1 Prazo inicial (dias): 360 Prazo Total Aditado (dias): 0 Situação da Obra: Iniciada Qtde. dias em execução: 1832 Previsão de Término: 31/01/2009 Data Situação: 07/02/2008 Qtde. dias paralisada: 0 Qtde. de Dias em Atraso: 1472 Inclusão 26/01/2009</p>
	<p>Bem Público: EE SEVERIANO NEVES Código da Obra: 5612 Contrato N°/Ano-Obra: 184/2007-1 Prazo inicial (dias): 365 Prazo Total Aditado (dias): 160 Situação da Obra: Iniciada Qtde. dias em execução: 1867 Previsão de Término: 10/06/2009 Data Situação: 03/01/2008 Qtde. dias paralisada: 0 Qtde. de Dias em Atraso: 1342 Inclusão 09/06/2009</p>
	<p>Bem Público: E.E. JOSÉ LEITE DE MORAES Código da Obra: 14981 Contrato N°/Ano-Obra: 190/2007-1 Situação da Obra: Iniciada Data Situação: 03/01/2008</p>

Total de registros: 177

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

20

ObrasPublicasAuditor2.html?nocache=1191702399

geoobras.tce.mt.gov.br/Auditor/flex-release/ObrasPublicasAuditor2.html?nocache=1191702399#app=5f83&4331-selectedIndex=1

Leitor

Temas Espiritas PPGEEA Mapeia TQS - Acadêmicos Google Acadêmico Veja Capes Apple BB e-Livros Folha de SP Fórum MacNews GeoObras IFMT INFRAERO

Geo-Obras Auditor 3.1.6

Benedito Carlos Teixeira Seror

Sair

Área de Trabalho

Ambiente Jurisdicionado

Fiscalização

Forum de Discussão

Cadastros

Pessoa Física / Jurídica

Profissionais

Publicações

Servidores

Relatórios

Cruzamento de Dados

Consolidados

Solicitações

Atendidas

Pendentes 66

Ambiente Jurisdicionado

1112663 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Alterar UG

Operadores

Obras por Execução Indireta

Obras por Execução Direta

Obras Vínculo

Avisos

Licitações

Contratos

Obras

Projetos

Execução Indireta

Buscar por:

Área de Visualização

Documentos de Licitação

Relatórios

402 registros

Código	Dias Alterar Excluir	Data Inclusão	Modalidade Licitação	Número	Ano	Tipo de Licitação	Tipo do Objeto	Qtde. Lotes	Valor Total Proposta(s) Vencedora(s) (R\$)
24601	119	12/12/2012	Tomada de Preço	007	2012	Menor Preço	Obra	3	0,00
24500	98	21/11/2012	Concorrência Pública	027	2012	Menor Preço	Serviço de Engenharia	0	635.977,46
24499	98	21/11/2012	Concorrência Pública	004	2012	Menor Preço	Serviço de Engenharia	0	1.242.331,57
24474	90	13/11/2012	Convite	009	2012	Menor Preço	Obra	0	0,00
24440	77	31/10/2012	Concorrência Pública	020	2012	Menor Preço	Serviço de Engenharia	0	1.000.491,87
24421	71	25/10/2012	Concorrência Pública	021	2012	Menor Preço	Serviço de Engenharia	0	514.996,47
24420	71	25/10/2012	Concorrência Pública	013	2012	Menor Preço	Serviço de Engenharia	0	651.161,61
24419	71	25/10/2012	Concorrência Pública	010	2012	Menor Preço	Serviço de Engenharia	0	491.745,81
24418	71	25/10/2012	Concorrência Pública	012	2012	Menor Preço	Serviço de Engenharia	0	535.552,13
24409	70	24/10/2012	Concorrência Pública	026	2012	Menor Preço	Obra	0	1.190.829,76

Fora do Prazo p/ Alt./Exc. Dentro do Prazo p/ Alt./Exc. Aguardando Autorização p/ Alt./Exc. Liberado para Alteração Liberado para Exclusão

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

21

Licitação - Área de Visualização

Modalidade: Tomada de Preço Nº : 007 Ano: 2012

Resumo

Publicação

Origem de Recursos

Detalhes

Situação

Licitantes

Documentos

Contratos

Detalhes

Código: 24601

Tipo de Licitação: Menor Preço

Tipo do Objeto: Obra

Último Recebimento do Convite:

Quantidade de lotes: 3

Total Origem de Recursos (R\$): 576.379,73

Total Valor Orçado Administração (R\$): 568.208,53

Total Propostas Vencedoras (R\$): 0,00

Fiscalização

Verificar Pendências

Fechar

Fora do Prazo p/ Alt./Exc. Dentro do Prazo p/ Alt./Exc. Aguardando Autorização p/ Alt./Exc. Liberado para Alteração Liberado para Exclusão



Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

22

MÓDULO AUDITOR

Licitação - Relatórios

1 - Selecione o tipo do relatório que deseja emitir.
2 - Caso não seja selecionado nenhum filtro, o relatório irá trazer todos os dados.

Tipo do Relatório: **Relação Detalhada**  **Gerar Relatório**  **Limpar Filtros**

Filtros

Licitação
Modalidade: **Todas** Nº: Ano:
Tipo de Licitação: **Todos**
Tipo do Objeto: **Todas**
Data da Inclusão da Licitação: De até

Publicação
Veículo: **Todos**
Período de Publicação: De até

Origem de Recursos
☐ Federal ☐ Estadual ☐ Municipal
Origem: ☐ Próprio ☐ Vinculado Saúde ☐ Vinculado Educação
☐ Consórcio
Valor (R\$): De 0,00 até 0,00

Detalhes da Licitação
Valor orçado pela Adm. (R\$): De 0,00 até 0,00
Prazo de exec. estimado pela Adm. (dias): De até

Situação
Situação: **Todas**

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

23

MÓDULO AUDITOR

Geo-Obras Auditor 3.1.6

Benedito Carlos Teixeira Seror 

Área de Trabalho
Ambiente Jurisdicionado
Fiscalização
Forum de Discussão
Cadastros
Pessoa Física / Jurídica
Profissionais
Publicações
Servidores
Relatórios
Cruzamento de Dados
Consolidados
Solicitações
Atendidas
Pendentes **66**

Ambiente Jurisdicionado
1112663 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 

Operadores **Obras por Execução Indireta** **Obras por Execução Direta** **Obras Vínculo**

Avisos **Licitações** **Contratos** **Obras** **Projetos**

Execução Indireta

Buscar por:


Área de Visualização **Documentos de Contrato** **Relatórios** 486 registros

Código	Dias Alterar Excluir	Data Inclusão	Nº Contrato	Ano Contrato	Tipo do Objeto	Qtde Obras/Proj. Informados	Qtde Obras/Proj. Cadastrados	Data Assinatura	Situação	Contratada(o)
24079	154	16/01/2013	294	2012	Serviço de Engenharia	1	0	28/12/2012	Em Vigência	AROEIRA CONSTRUCOES LTDA
24062	147	09/01/2013	293	2012	Serviço de Engenharia	1	1	28/12/2012	Em Vigência	AROEIRA CONSTRUCOES LTDA
24061	147	09/01/2013	292	2012	Serviço de Engenharia	1	0	28/12/2012	Em Vigência	JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL
24030	140	02/01/2013	290	2012	Obra	1	0	20/12/2012	Em Vigência	EMAVE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
23967	127	20/12/2012	287	2012	Obra	1	0	20/12/2012	Em Vigência	APOLUS ENGENHARIA LTDA
23958	127	20/12/2012	280	2012	Serviço de Engenharia	1	0	14/12/2012	Em Vigência	SÃO BENEDITO CONSTRUÇÃO CIVIL
23950	127	20/12/2012	285	2012	Obra	1	0	17/12/2012	Em Vigência	JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA
23949	127	20/12/2012	286	2012	Obra	1	1	19/12/2012	Em Vigência	AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
23947	127	20/12/2012	283	2012	Obra	1	0	14/12/2012	Em Vigência	JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Fora do Prazo p/ Alt./Exc. **Dentro do Prazo p/ Alt./Exc.** **Aguardando Autorização p/ Alt./Exc.** **Liberado para Alteração** **Liberado para Exclusão**

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

24

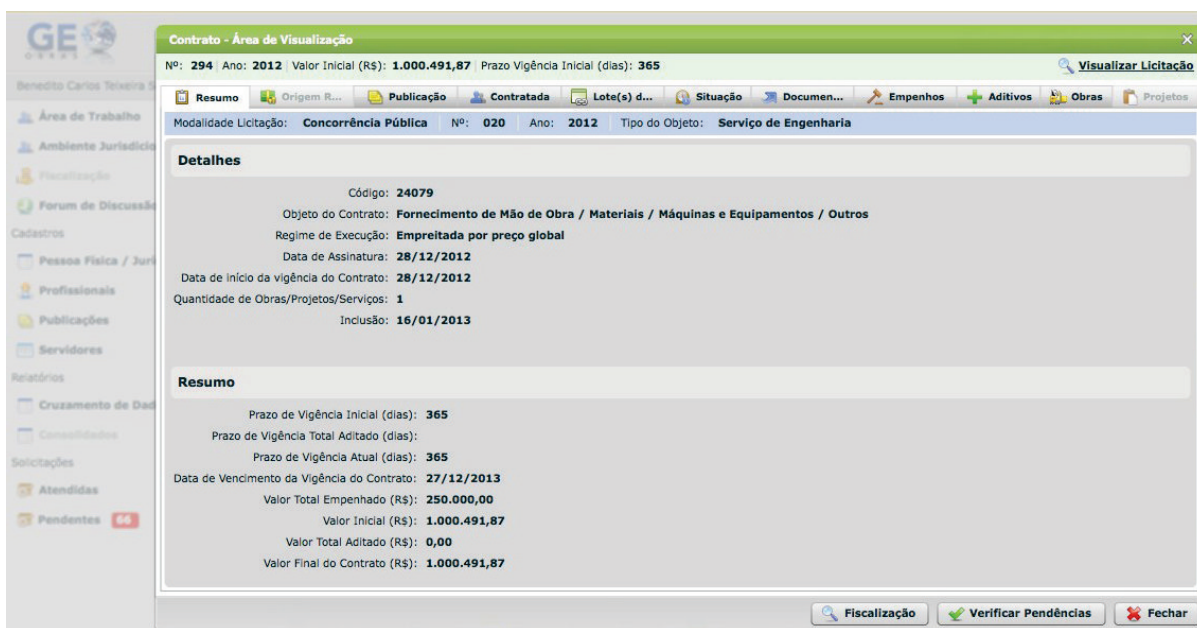

Contrato - Área de Visualização

Nº: 294 | Ano: 2012 | Valor Inicial (R\$): 1.000.491,87 | Prazo Vigência Inicial (dias): 365

Modalidade Licitação: **Concorrência Pública** | Nº: 020 | Ano: 2012 | Tipo do Objeto: **Serviço de Engenharia**

Detalhes

Código: 24079
 Objeto do Contrato: **Fornecimento de Mão de Obra / Materiais / Máquinas e Equipamentos / Outros**
 Regime de Execução: **Empreitada por preço global**
 Data de Assinatura: **28/12/2012**
 Data de Início da vigência do Contrato: **28/12/2012**
 Quantidade de Obras/Projetos/Serviços: **1**
 Inclusão: **16/01/2013**


Resumo

Prazo de Vigência Inicial (dias): **365**
 Prazo de Vigência Total Aditado (dias):
 Prazo de Vigência Atual (dias): **365**
 Data de Vencimento da Vigência do Contrato: **27/12/2013**
 Valor Total Empenhado (R\$): **250.000,00**
 Valor Inicial (R\$): **1.000.491,87**
 Valor Total Aditado (R\$): **0,00**
 Valor Final do Contrato (R\$): **1.000.491,87**

Fiscalização Verificar Pendências Fechar

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

25

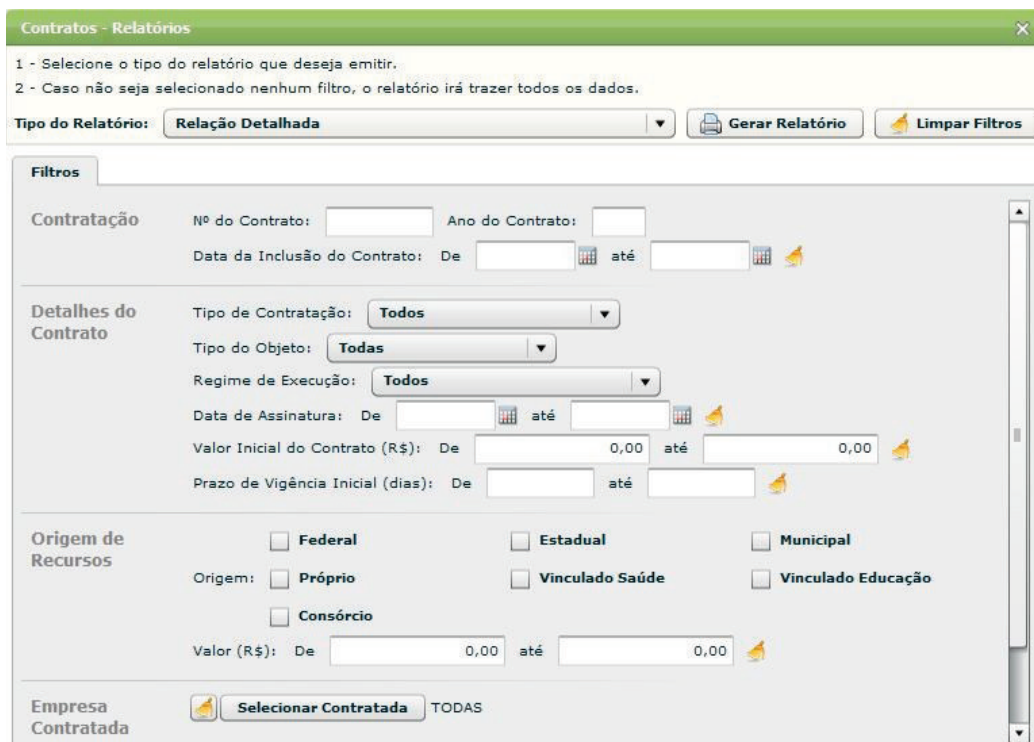

Contratos - Relatórios

1 - Selecione o tipo do relatório que deseja emitir.
 2 - Caso não seja selecionado nenhum filtro, o relatório irá trazer todos os dados.

Tipo do Relatório: **Relação Detalhada** Gerar Relatório Limpar Filtros

Filtros

Contratação

Nº do Contrato: Ano do Contrato:
 Data da Inclusão do Contrato: De até

Detalhes do Contrato

Tipo de Contratação: **Todos**
 Tipo do Objeto: **Todas**
 Regime de Execução: **Todos**
 Data de Assinatura: De até
 Valor Inicial do Contrato (R\$): De 0,00 até 0,00
 Prazo de Vigência Inicial (dias): De até

Origem de Recursos

☐ Federal ☐ Estadual ☐ Municipal
☐ Próprio ☐ Vinculado Saúde ☐ Vinculado Educação
☐ Consórcio
 Valor (R\$): De 0,00 até 0,00

Empresa Contratada

TODAS

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

26

Geo-Obras Auditor 3.1.6

Benedito Carlos Teixeira Seror

Área de Trabalho

- Área Jurisdicionado
- Fiscalização
- Forum de Discussão
- Cadastros
- Pessoa Física / Jurídica
- Profissionais
- Publicações
- Servidores
- Relatórios
- Cruzamento de Dados
- Consolidados
- Solicitações
- Atendidas
- Pendentes **66**

Ambiente Jurisdicionado

1112663 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO Alterar UG

Operadores: Obras por Execução Indireta | Obras por Execução Direta | Obras Vínculo

Execução Indireta

Buscar por:

Área de Visualização | Documentos de Obra | Relatórios 837 registros

Código	Dias Alterar Excluir	Data Inclusão	Contrato Nº/Ano-Obra	Situação da Obra	Data Situação	Bem Público	Tipo Serviço	Objeto
24139	173	04/02/2013	284/2012-1	Iniciada	18/01/2013	Escola Estadual "Onze de Março"	Reforma	contratação de empresa especial...
24137	170	01/02/2013	286/2012-1	Iniciada	18/01/2013	Escola Estadual "Governador Júlio Strn	Ampliação	Contratação de empresa especial...
24136	170	01/02/2013	293/2012-1	Iniciada	18/01/2013	Escola Estadual "Manoel Bandeira"	Reforma	Contratação de empresa especial...
24092	154	16/01/2013	274/2012-1	Iniciada	08/01/2013	Escola Estadual "13 de Maio"	Reforma	Contratação de empresa especial...
23936	127	20/12/2012	241/2012-1	Iniciada	18/12/2012	EE PROFª. VERA PEREIRA DO NASCIM	Reforma	Contratação de empresa especial...
23918	125	18/12/2012	245/2012-5	Iniciada	04/12/2012	E.E. 07 de Setembro	Reforma	Contratação de empresa especial...
23905	124	17/12/2012	245/2012-4	Iniciada	04/12/2012	E.E. Carlos Pereira Barbosa	Reforma	Contratação de empresa especial...
23903	124	17/12/2012	245/2012-3	Iniciada	04/12/2012	E.E. José Rodrigues dos Santos	Reforma	Contratação de empresa especial...
23902	124	17/12/2012	245/2012-2	Iniciada	04/12/2012	E.E. Marechal Dutra	Reforma	Contratação de empresa especial...

Fora do Prazo p/ Alt./Exc. Dentro do Prazo p/ Alt./Exc. Aguardando Autorização p/ Alt./Exc. Liberado para Alteração Liberado para Exclusão

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

27

Obra - Área de Visualização

Nº Contrato: 284 Ano Contrato: 2012 Sequencial Obra: 1 Visualizar Contrato

Bem Público: Escola Estadual "Onze de Março"

Detalhes

Código: 24139
Data da Situação: 18/01/2013
Situação da Obra: Iniciada

Valores da Obra (R\$):

Valor inicial obra (R\$): 1.434.671,82	Valor total medido (R\$): 0,00
Valor total aditado obra (R\$): 0,00	Valor total material (R\$): 0,00
Valor final obra (R\$): 1.434.671,82	Valor total máquinas/equipamentos (R\$): 0,00
Valor total medido (R\$): 0,00	Valor total executado obra (R\$): 0,00

Prazos de execução da Obra (dias):

Prazo execução inicial (dias): 365
Prazo execução total aditado obra (dias): 0
Prazo execução final obra (dias): 365

Fiscalização Verificar Pendências Fechar

Fora do Prazo p/ Alt./Exc. Dentro do Prazo p/ Alt./Exc. Aguardando Autorização p/ Alt./Exc. Liberado para Alteração Liberado para Exclusão

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

28

Obra - Relatórios

1 - Selecione o tipo do relatório que deseja emitir.
2 - Caso não seja selecionado nenhum filtro, o relatório irá trazer todos os dados.

Tipo do Relatório: Relação Detalhada Gerar Relatório Limpar Filtros

Filtros

Detalhes

Contrato Nº: Ano: Obra:

Valor Inicial da Obra (R\$): De 0,00 até 0,00

Prazo de Execução Inicial (dias): De até

Município: Todos

Tipo de Serviço: Todos

Sector Beneficiado: Todos

Tipo de Obra: Todos

Regime de Execução: Todos

Data da Inclusão da Obra: De até

Bem Público

Nome: (somente letras, sem acentos)

Origem de Recursos

☐ Federal ☐ Estadual ☐ Municipal

Origem: ☐ Próprio ☐ Vinculado Saúde ☐ Vinculado Educação

☐ Consórcio

Valor (R\$): De 0,00 até 0,00

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

29

Obra - Área de Visualização


Nº Contrato: 065 Ano Contrato: 2010 Sequencial Obra: 1

Visualizar Contrato

Resumo Controles Projetista Situação Medição Material Máquinas/Equipamentos Aditivo Fotos

Visualizar em lista

Código	Tipo de Foto	Tamanho	Extensão	Inclusão
148822	Vinculada à medição	3.4 MB	.JPG	14/12/2012
148821	Vinculada à medição	2.9 MB	.JPG	14/12/2012
148819	Vinculada à medição	2.6 MB	.JPG	14/12/2012
148818	Vinculada à medição	99.1 KB	.jpg	14/12/2012



Quantidade de Fotos: 4

Fiscalização Ver descrição foto Baixar Foto Verificar Pendências Fechar

Nota do Projeto por Atividade Verificar Nota do Projeto por Atividade Apresentar Autorização por Atividade Alterar para Informação Alterar para Exatidão

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

30



Geo-Obras Auditor 3.1.6

Benedito Carlos Teixeira Seror

Ambiente Jurisdicionado
1112663 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO Alterar UG

Operadores Obras por Execução Indireta Obras por Execução Direta Obras Vínculo

Execução Indireta

Buscar por:


Área de Visualização Documentos de Projeto Relatórios 1 registros

Código	Dias Alterar Excluir	Data Inclusão	Contrato Nº/Ano-Projeto	Situação do Projeto	Data Situação	Objeto	Valor Inicial Projeto(R\$)	Prazo Exec. Inicial(dias)	Contratado
266	117	11/12/2012	114/2012-1	Iniciado	31/10/2012	Contratação de empresa especializada para el	135.816,50	60	JER ENGENH

Fora do Prazo p/ Alt./Exc. Dentro do Prazo p/ Alt./Exc. Aguardando Autorização p/ Alt./Exc. Liberado para Alteração Liberado para Exclusão

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

31

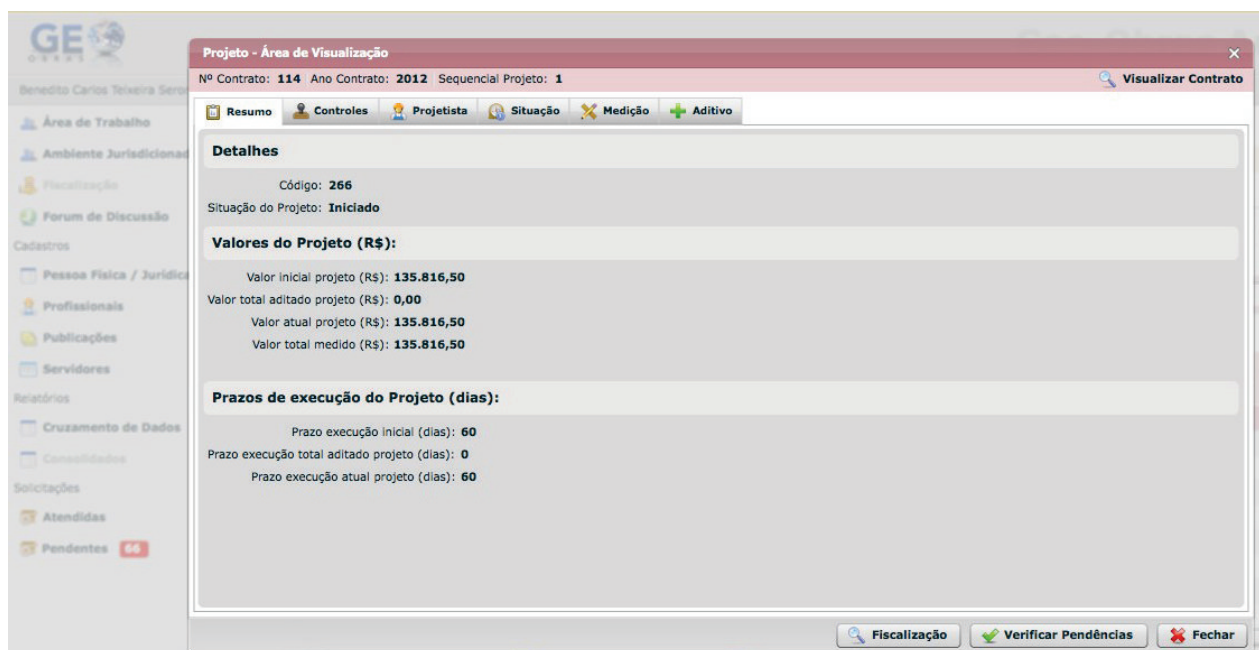

Projeto - Área de Visualização

Nº Contrato: 114 Ano Contrato: 2012 Sequencial Projeto: 1 Visualizar Contrato

Resumo Controles Projetista Situação Medição Aditivo

Detalhes

Código: 266
Situação do Projeto: Iniciado

Valores do Projeto (R\$):

Valor inicial projeto (R\$): 135.816,50
Valor total aditado projeto (R\$): 0,00
Valor atual projeto (R\$): 135.816,50
Valor total medido (R\$): 135.816,50

Prazos de execução do Projeto (dias):

Prazo execução inicial (dias): 60
Prazo execução total aditado projeto (dias): 0
Prazo execução atual projeto (dias): 60

Fiscalização Verificar Pendências Fechar

Narda Consuelo Vítório Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

32

Geo-Obras Auditor 3.1.6

Benedito Carlos Teixeira Seror [Sair](#)

Área de Trabalho

Ambiente Jurisdicionado

Fiscalização

Forum de Discussão

Cadastros

Pessoa Física / Jurídica

Profissionais

Publicações

Servidores

Relatórios

Cruzamento de Dados

Consolidados

Solicitações

Atendidas

Pendentes **66**

Cadastro de Profissionais

Buscar por:


Novo Alterar Excluir Relatórios 1416 registros

Código	Inclusão	Nome	Status (CREA/CAU)	CREA/CAU	CPF	Modalidade Profissional	Título
7156	26/07/2012	ADALBERTO DA SILVA SANTOS	Em Análise	1204109524	064.963.501-91	CIVIL	Engenh
5820	09/12/2010	Adalberto Lopes de Sousa Junior	Em Análise	120038216-1	970.264.171-34	ARQUITETURA	Arquitet
205	07/10/2008	ADALBERTO LUIZ ROCHA	Em Análise	1401500021	034.811.576-81	CIVIL	Técnico
6907	19/08/2011	ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL	Em Análise	1200688228	111.242.291-91	CIVIL	Engenh
5360	02/09/2010	Adalton Vieira de Melo	Em Análise	120.181.942-3	942.951.401-63	ARQUITETURA	Arquitet
366	27/11/2008	ADELAIDE APARECIDA HERMES RIBEIRO	Em Análise	120115688-2	452.105.861-20	CIVIL	Engenh
270	14/10/2008	ADELICIO BATISTA QUEIROZ	Em Análise	1828/D MT	202.557.561-00	AGRIMENSURA	Agrimen
5341	30/08/2010	ADELIR VANDERLEY KEMPFER	Em Análise	PR-89929/D	967.972.409-30	CIVIL	Engenh
1084	17/02/2009	ADEMAR MARQUES CURVO SOBRINHO	Em Análise	05601/D	411.224.961-68	CIVIL	Engenh
7013	31/01/2012	ADEMILSON LORENZON	Em Análise	1306148340	407.198.121-00	CIVIL	Engenh
488	09/01/2009	ADEMIR PINHEIRO DUARTE	Em Análise	1201027519	175.502.541-68	AGRIMENSURA	Agrimen
7057	12/04/2012	Adhemar Augusto de Castro Monte	Em Análise	MT02402/D	253.575.141-00	CIVIL	Engenh
492	12/01/2009	ADILSON GUIMARAES SOARES JUNIOR	Em Análise	1700859889	752.264.649-91	AGRIMENSURA	Agrimen
4137	12/02/2010	ADILSON PEREIRA DE QUEIROZ	Em Análise	1402621663	593.265.816-91	CIVIL	Engenh
7	12/06/2008	ADINALDO FERREIRA DOS SANTOS	Em Análise	11819/D-MT ou 023			
7298	23/01/2013	Admilton Catarino de Campos	Em Análise	A37162-9	523.212.661-04	ARQUITETURA	Arquitet

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

33

MENSAGEM



- O Sistema Geo-Obras / TCE-MT é um produto em permanente construção.
- Depende fundamentalmente da contribuição dos gestores jurisdicionados e da participação da coletividade para a transformação desta ferramenta num efetivo instrumento de cidadania.

Narda Consuelo Vitorio Neiva Silva
Benedito Carlos Teixeira Seror

OBRIGADO

34
